



รายงานความก้าวหน้า
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
ประจำเดือนมิถุนายน 2567

สัญญา GE-MS5/6-9

ผู้รับจ้าง : กิจการร่วม ITA (ITA Consortium)
มูลค่างาน (แก้ไขสัญญาครั้งที่ 2) : 6,366,189,971.71 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เริ่มงานก่อสร้าง : วันที่ 30 พ.ค. 2566
ครบกำหนด 960 วัน (เฟส 5 และงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ) : วันที่ 13 ม.ค. 2569
ครบกำหนดสิ้นสุดสัญญา 1200 วัน : วันที่ 10 ก.ย. 2569

ความก้าวหน้าของงาน เดือนพฤษภาคม 2567		+ เร็วกว่าแผน / - ช้ากว่าแผน
% แผนงานสะสม	2.783 %	+ 1.537 %
% ผลงานสะสม	4.320 %	

หมายเหตุ ผลงาน ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างของโครงการ



1. งานก่อสร้างบริเวณพื้นที่ตากตะกอน อาคารกำจัดตะกอน สถานีจ่ายไฟฟ้าและ Sludge Thickener Tank
2. งานก่อสร้างบริเวณอาคารโรงสูบน้ำดิบหมายเลข 3 ตั้งรับน้ำและวางแบ่งน้ำเข้าระบบผลิต ท่อ Overflow และท่อ Bypass
3. งานก่อสร้างบริเวณอาคารจ่ายสารเคมี
4. งานก่อสร้างบริเวณอาคารจ่ายคลอรีน
5. งานก่อสร้างบริเวณถังรับน้ำและวางแบ่งน้ำ
6. งานก่อสร้างบริเวณอาคารควบคุมระบบตกตะกอน
7. งานก่อสร้างบริเวณถังเก็บ PACL และบ่อรวบรวมน้ำเสียเคมี
8. งานก่อสร้างบริเวณระบบตกตะกอนและระบบกรองน้ำ
9. งานก่อสร้างบริเวณถังเก็บน้ำใส
10. งานก่อสร้างบริเวณโรงสูบน้ำ 2
11. งานก่อสร้างบริเวณอาคารจัดการคุณภาพน้ำ
12. งานก่อสร้างบริเวณบ่อตกตะกอนสำหรับเฟส 1-4
13. งานก่อสร้างบริเวณสวนการประปามหาสวัสดิ์

สัญญา G-TN-9A

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามประสิทธิ์

ค่าจ้างตามสัญญา : 2,707,700,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เริ่มงานก่อสร้าง : 9 กันยายน 2564

กำหนดส่งมอบงานตามมาตรการเร่งรัดฯ (ว 1459) : 14 มิถุนายน 2568

ความก้าวหน้าของงาน เดือนมิถุนายน 2567		+ เร็วกว่าแผน / - ช้ากว่าแผน
% แผนงานสะสม	63.79 %	- 3.52 %
% ผลงานสะสม	60.27 %	

หมายเหตุ ผลงาน ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2567




สัญญา G-TN-9C

ผู้รับจ้าง : บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด
 ค่าจ้างตามสัญญาใหม่ : 5,350,041,815.64 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 วันเริ่มสัญญา : 9 กันยายน 2564
 วันสิ้นสุดสัญญา : 26 มีนาคม 2568
 กำหนดส่งมอบงานตามมาตรการเร่งรัดฯ (ว.1459) : 1 ธันวาคม 2568

ความก้าวหน้าของงาน เดือนมิถุนายน 2567		+ เร็วกว่าแผน / - ช้ากว่าแผน
% แผนงานสะสม	54.04 %	+ 7.78 %
% ผลงานสะสม	61.82 %	

หมายเหตุ ผลงาน ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2567

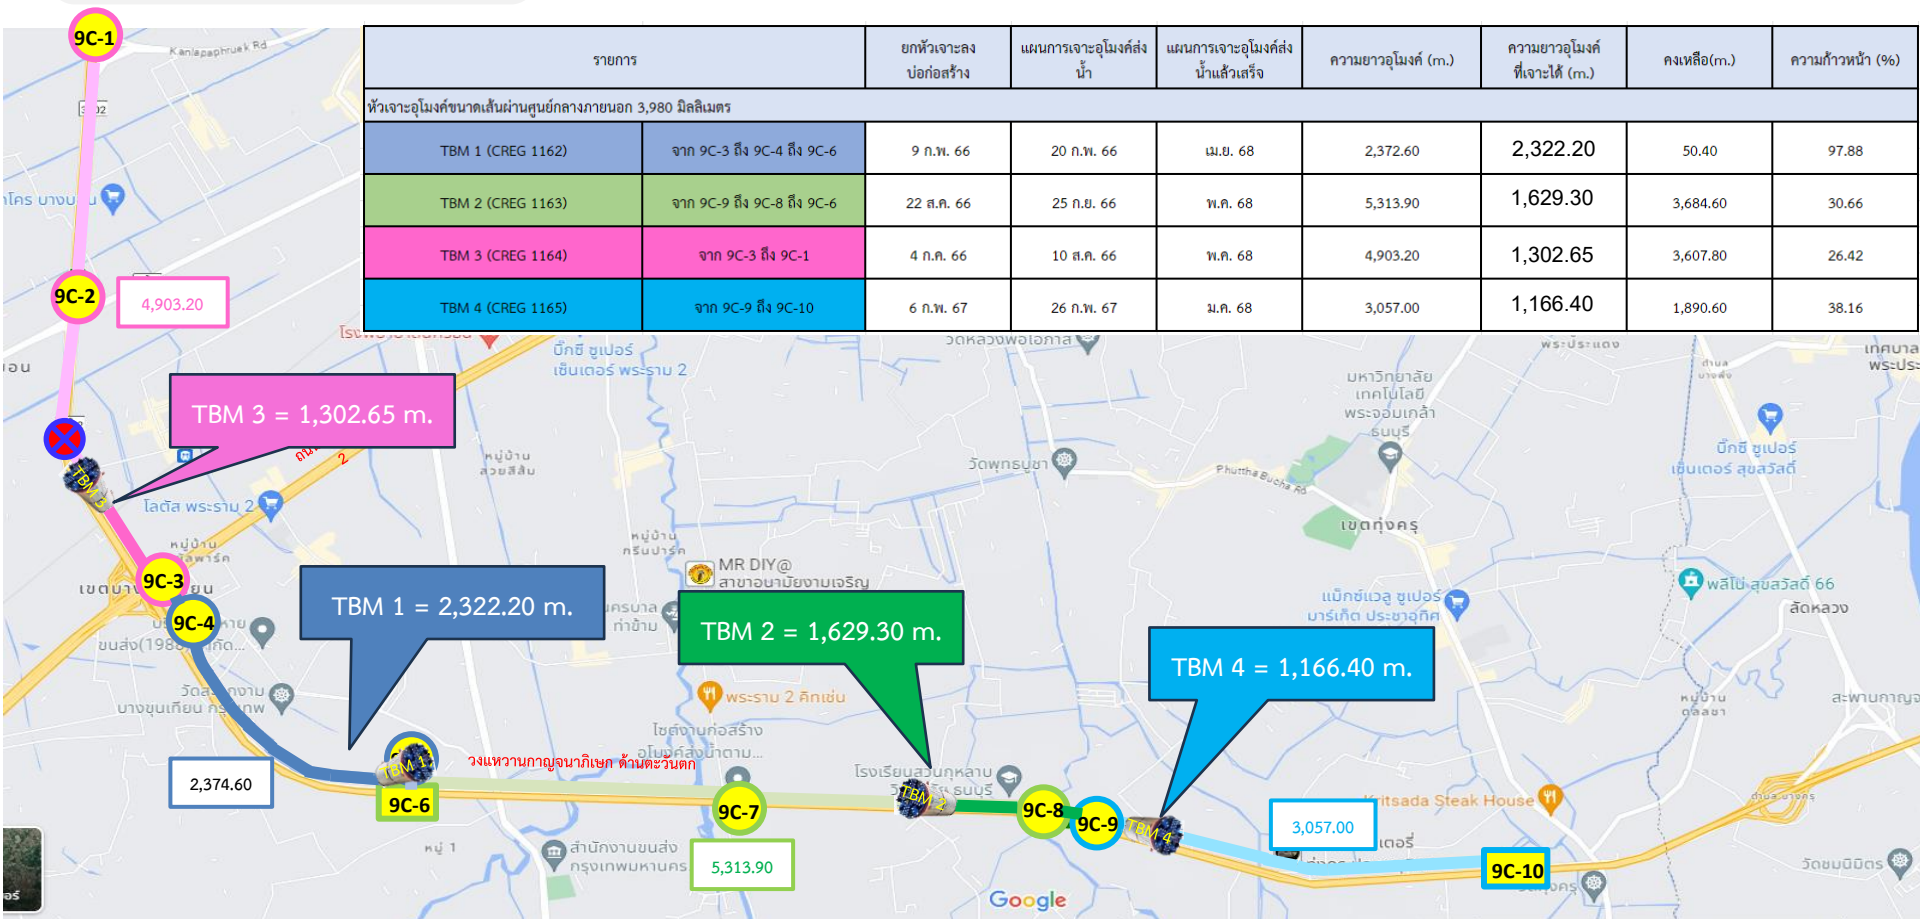

อยู่ระหว่างซ่อมบำรุงหัวเจาะ TBM1 เพื่อย้ายไปเจาะอุโมงค์ที่บ่อที่ 9C-2

สัญญา G-TN-9D

ผู้รับจ้าง : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
 ค่าจ้างตามสัญญา : 5,004,800,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 เริ่มงานก่อสร้าง : 9 กันยายน 2564
 สิ้นสุดสัญญา : 21 ธันวาคม 2567
 สิ้นสุดได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการ ว.1459 : 4 สิงหาคม 2568

ความก้าวหน้าของงาน เดือนมิถุนายน 2567		+ เร็วกว่าแผน / - ช้ากว่าแผน
% แผนงานสะสม	90.44 %	+ 2.54 %
% ผลงานสะสม	92.98 %	

หมายเหตุ ผลงาน ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2567

งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวถนนกาญจนาภิเษก และถนนทางรถไฟสายเก่าจากสถานีสูบน้ำบางมด ถึงสถานีสูบน้ำลำโรง พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ระยะทาง 13.43 กม. และงานก่อสร้างบ่อก่อสร้าง 7 บ่อ



สัญญา G-LA-9

ผู้รับจ้าง : บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด

ลงนามในสัญญา : 12 มกราคม 2566

ค่าจ้างตามสัญญา : 406,000,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


ระยะเวลาทำงานตามสัญญา : 780 วัน

เริ่มงานก่อสร้าง : 10 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา : 30 มีนาคม 2568

ความก้าวหน้าของงาน เดือนมิถุนายน 2567		+ เร็วกว่าแผน / - ช้ากว่าแผน
% แผนงานสะสม	39.17 %	+6.71 %
% ผลงานสะสม	45.88 %	

หมายเหตุ ผลงาน ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2567

ขอบเขตเขตงาน

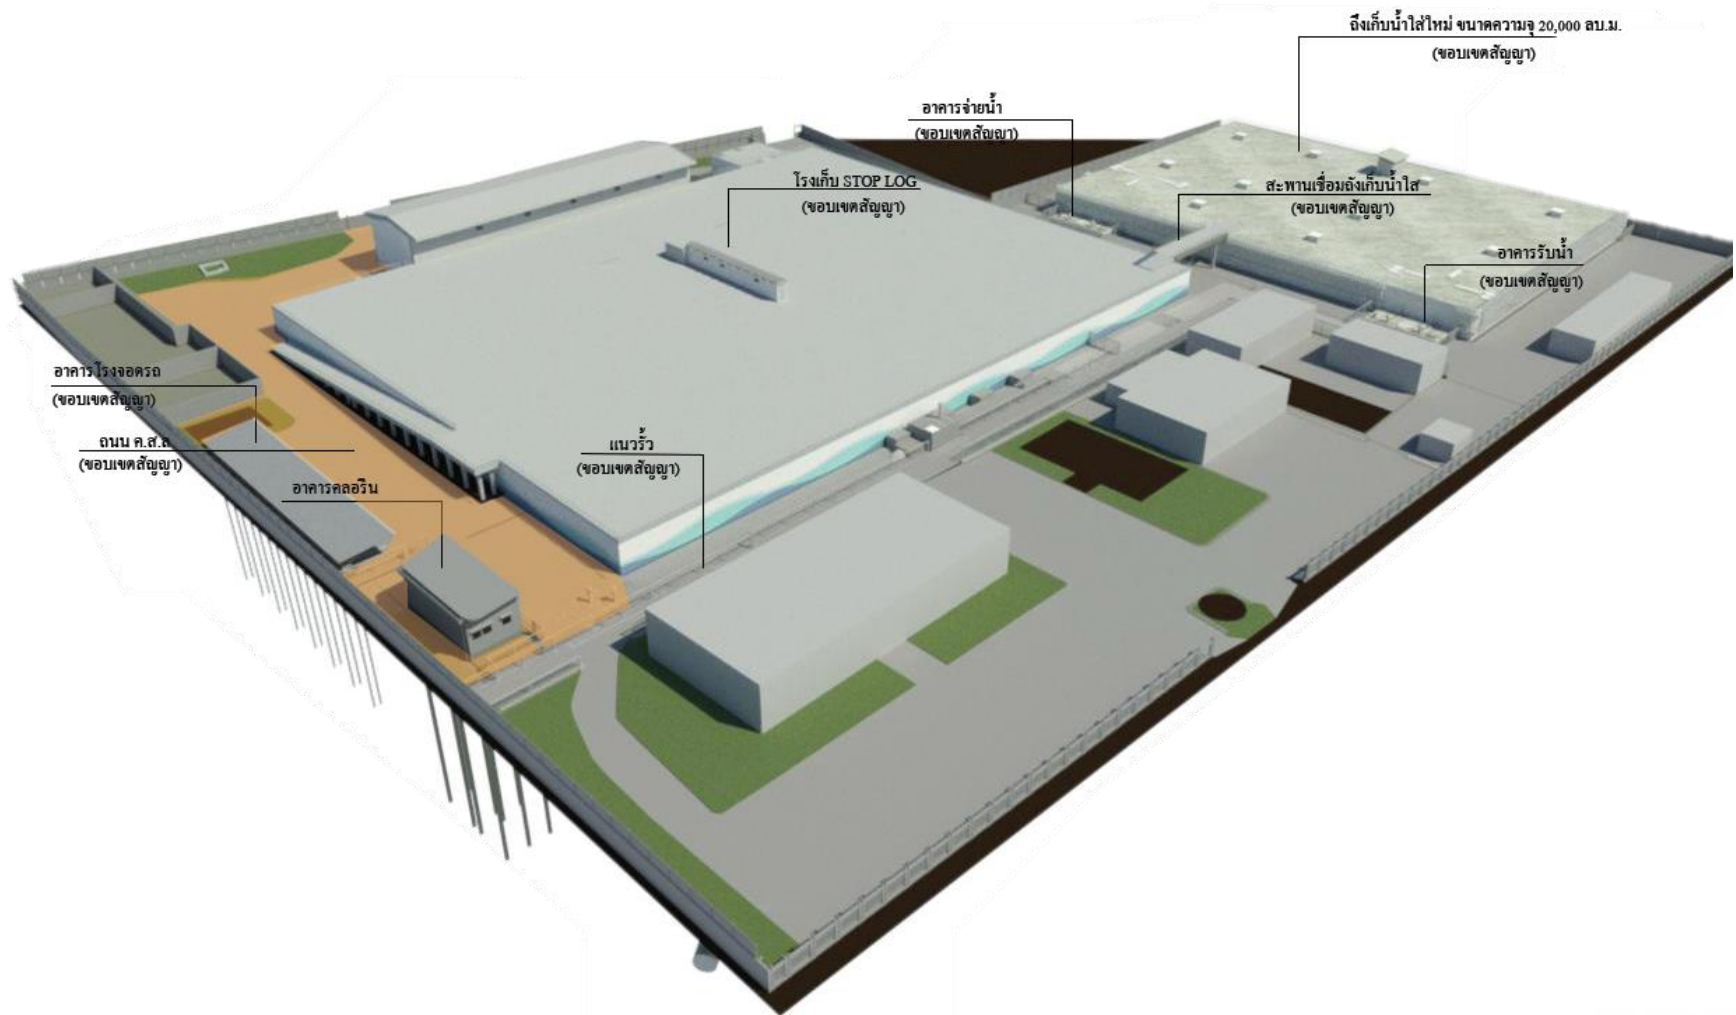

สัญญา G-SR-9

ผู้รับจ้าง : บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด

ลงนามในสัญญา : 30 มีนาคม 2566

ค่าจ้างตามสัญญา : 523,000,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


ระยะเวลาทำงานตามสัญญา : 780 วัน

เริ่มงานก่อสร้าง : 3 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา : 20 มิถุนายน 2568

ความก้าวหน้าของงาน เดือนมิถุนายน 2567		+ เร็วกว่าแผน / - ช้ากว่าแผน
% แผนงานสะสม	12.57 %	+29.55 %
% ผลงานสะสม	42.12 %	

หมายเหตุ ผลงาน ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2567

ขอบเขตเขตงาน

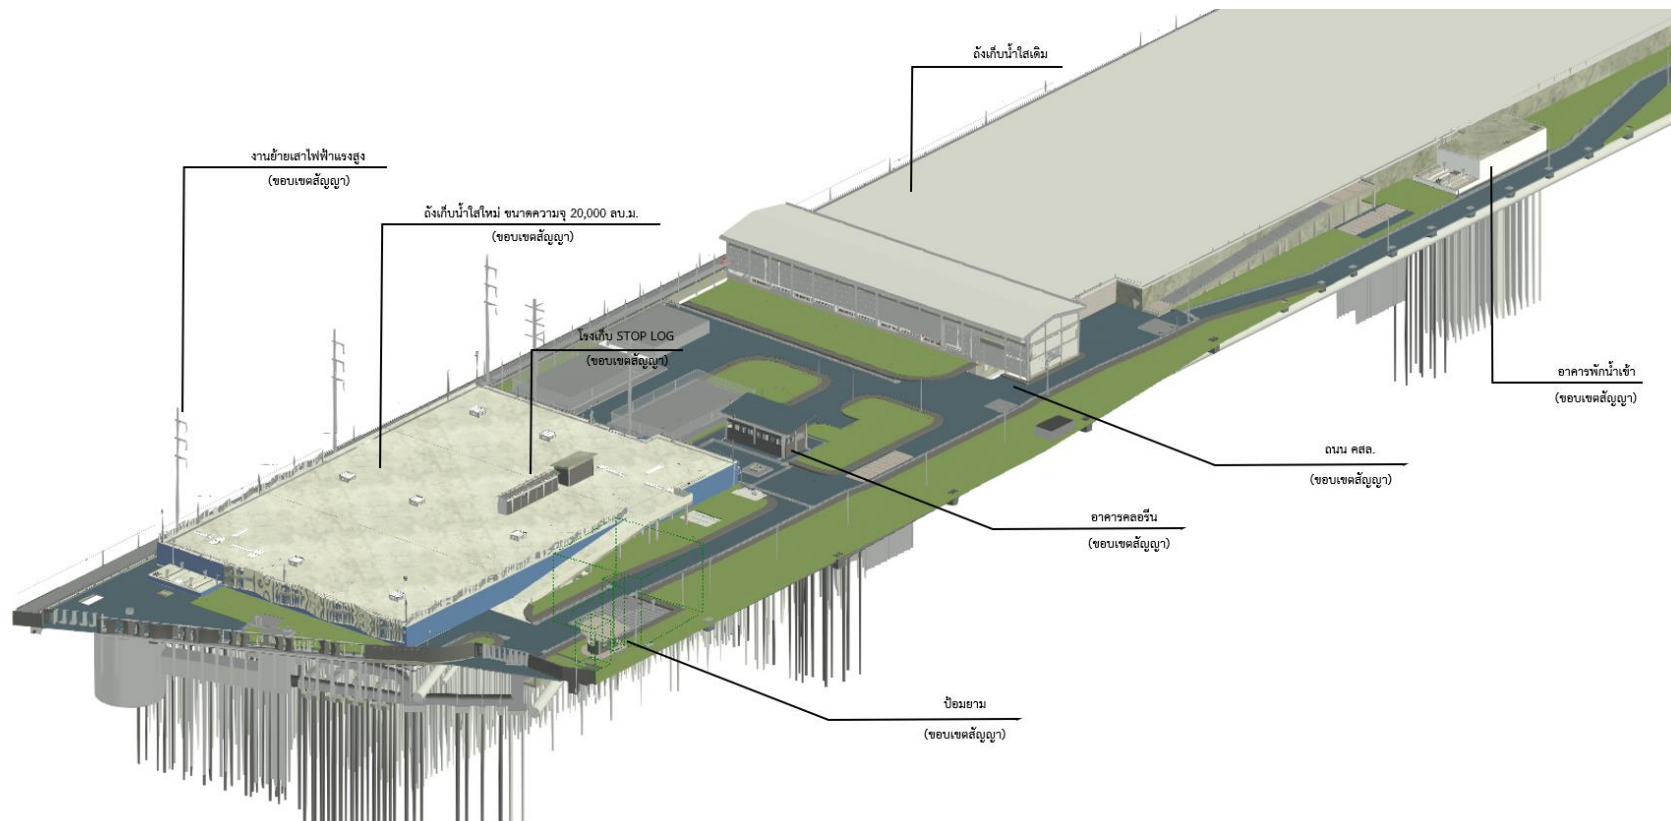

สัญญา GES-LK-9

ผู้รับจ้าง : กิจการร่วมค้า เอ อาร์ จี (ARG JOINT VENTURE)

ลงนามในสัญญา : 27 มิถุนายน 2566

ค่าจ้างตามสัญญา : 1,141,390,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


ระยะเวลาทำงานตามสัญญา : 960 วัน

เริ่มงานก่อสร้าง : 12 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา : 25 กุมภาพันธ์ 2569

ความก้าวหน้าของงาน เดือนมิถุนายน 2567		+ เร็วกว่าแผน / - ช้ากว่าแผน
% แผนงานสะสม	1.59 %	+11.10 %
% ผลงานสะสม	12.69 %	

หมายเหตุ ผลงาน ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2567

ขอบเขตเขตงาน

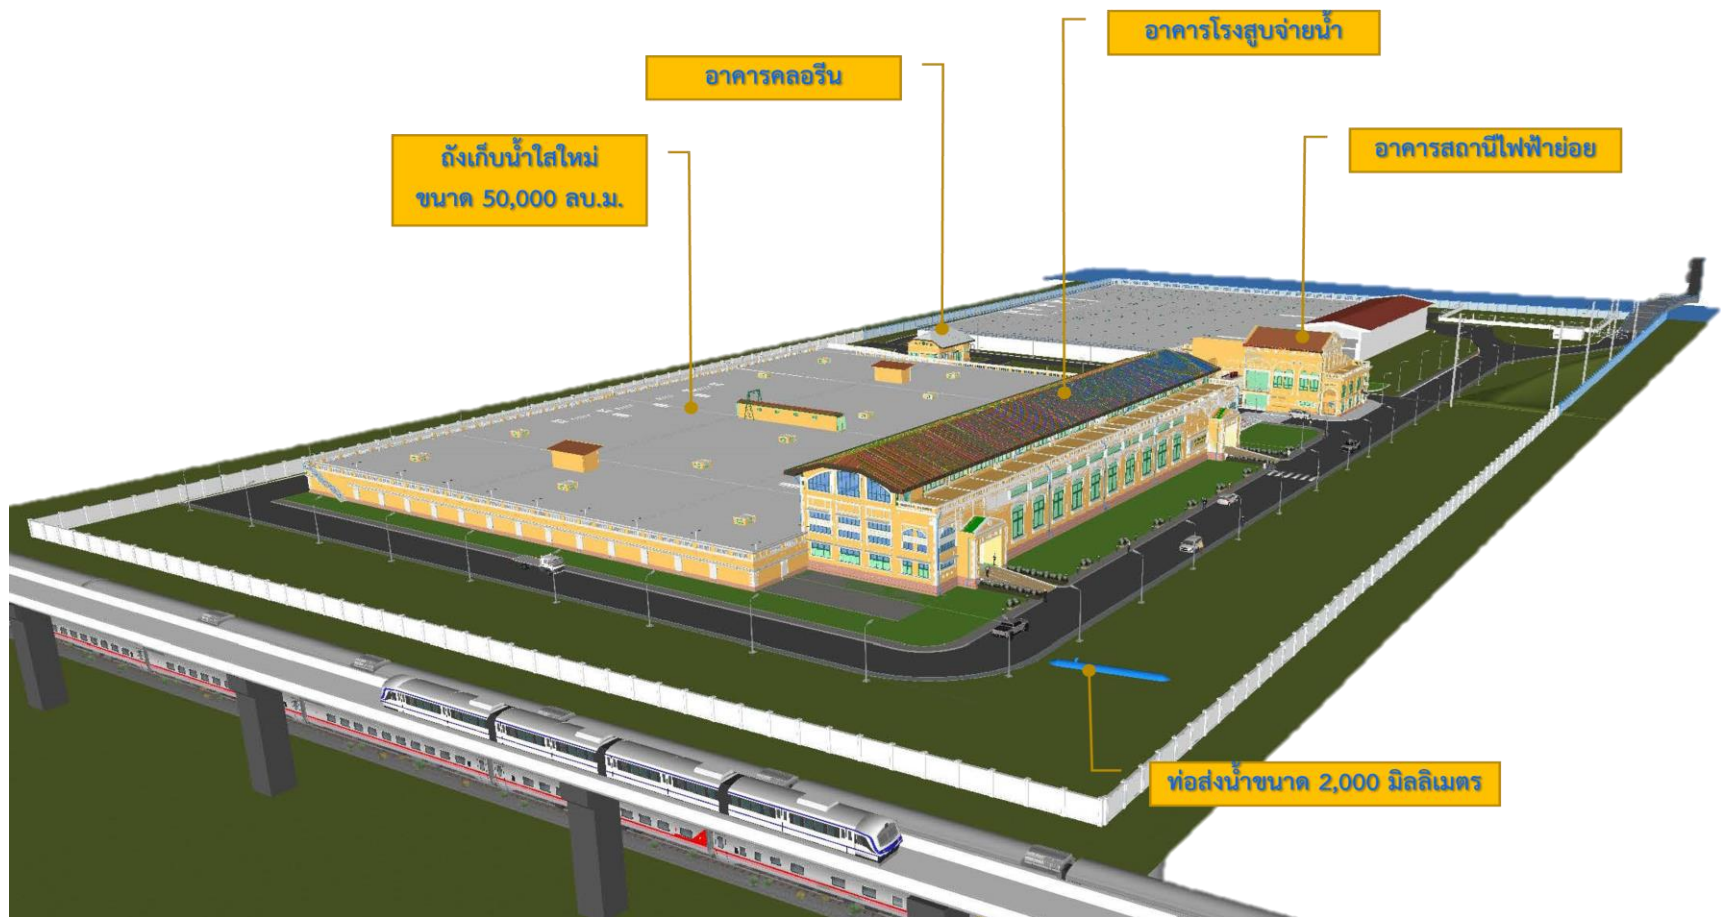

สัญญา G-MB-9(R1)

ผู้รับจ้าง : บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด


ค่าจ้างตามสัญญา : 697,800.000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เริ่มงานตามสัญญา : 19 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา : 5 กันยายน 2568

ความก้าวหน้าของงาน เดือนพฤษภาคม 2567		+ เร็วกว่าแผน / - ช้ากว่าแผน
% แผนงานสะสม	16.57 %	+10.63 %
% ผลงานสะสม	27.20 %	

หมายเหตุ ผลงาน ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ขอบเขตงาน

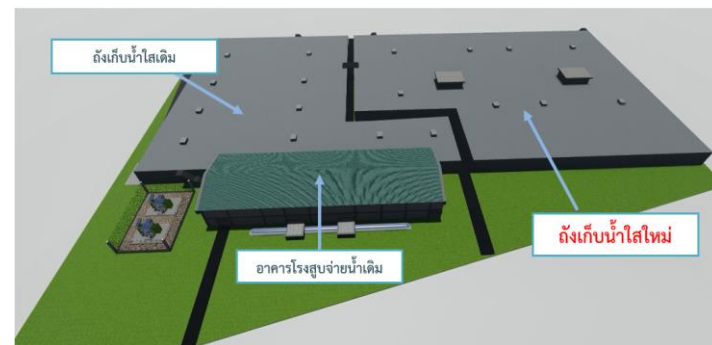

1. ถังเก็บน้ำใตขนาด 70,000 ลบ.ม.
2. Receiving Structure(ในถังเก็บน้ำใต)
3. อาคารคลอรีน
4. งานวางท่อส่งน้ำ ขนาด $\varnothing$ 2,300 มม.
5. จุดเชื่อมต่อระหว่างถัง
6. งานถนนรอบถังเก็บน้ำใต
