

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

เลขที่ ฉ.3

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงเพื่อปฏิบัติงาน

เรียน ผ.ก.บ.กฟส.อ.นครบุรี

ถึง กฟส.อ.นครบุรี

วันที่ 12 ก.ค. 2565

ด้วยข้าพเจ้า นายสมจินต์ พันธุศย์ ตำแหน่ง ผ.ก.บ.ฉ.3 เบอร์ติดต่อ 085-0169005 มีความประสงค์ขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการ ปรับปรุง/ก่อสร้าง/รื้อถอน ระบบจำหน่าย 22 kV / สายส่ง 115 kV บริเวณ ต.ร.ย.พิตี - บ้านดอนกรุด ตามอนุมัติเลขที่ ฉ.3 กว.(ว.ร.)-829/2564 ลว. 28 พ.ค. 2564 ซี่งงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เครวี จุดแบ่งแดน นครบุรี/โชคชัย ช่วง 1 - 2 อ.นครบุรี จ.นครราชสีมา โดยมีปริมาณงานจะดำเนินการ ดังนี้

1. รื้อถอนสายลุมิเนียมเปลือย 185 ต.มม. ระยะทาง 0.80 กม.
2. พาดสาย SAC 185 ต.มม. ปริมาณ 0.80 วงจร-กม.
3. รื้อถอนเสา 14.00 ม. จำนวน 12 ต้น

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. โดยมีแผนผังพื้นที่การดับกระแสไฟฟ้าโดยละเอียดตั้งเอกสารแนบทั้งนี้เวลาที่ขออนุมัติในครั้งนี้ไม่นับรวมเวลาที่จะดำเนินการ Switching ถ่ายเทโหลดก่อนและหลังการดับไฟปฏิบัติงาน หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาจะแจ้งให้ ผ.บ. และ ศกฟ.ฉ.3 ทราบเพื่อดำเนินจ่ายไฟคืนระบบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการขออนุมัติ ต่อไป

เรียน ผ.ก.บ.กฟส.อ.นครบุรี

ผ.ก.บ.เห็นควรอนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้

.....ตำแหน่ง.....เบอร์ติดต่อ

.....ประสานงานการดับไฟ ทั้งนี้มีข้อมูลผู้ใช้ไฟที่ได้รับ

ผลกระทบ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ใช้ไฟเฉพาะรายที่ติดตั้งหม้อแปลงรวมตั้งแต่ 300 kVA ขึ้นไป

จำนวน ราย ตามแผนผังแนบ

2. ผู้ป่วยติดเตียง ราย

3. ผู้ใช้ไฟรายสำคัญ ราย ทั้งนี้ กฟฟ..... ได้

วางแผนบรรเทาผลกระทบดังกล่าวแล้ว

(ลงชื่อ).....นายสุเทพ เนื่องกระโทก

ผ.ก.บ.ค.บ. ปฏิบัติงานแทน ผ.ก.บ.ค.บ.

ที่ ฉ.3 ค.บ. (กข.) 439/2565 12 ก.ค. 2565

เรียน อ.ก.บ.ฉ.3 (ผ.ก.บ.ฉ.3)

เพื่อโปรดพิจารณาและขออนุมัติ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายสุชาติ พันธุ์แก้ว) ผ.ก.บ.อ.นครบุรี
ผ.บ.รักษาการแทน ผ.ก.บ.ค.

บันทึกการดับไฟปฏิบัติ

เริ่มดับไฟ เวลา.....น. (นาย.....ผู้แจ้ง)

แจ้งงานแล้วเสร็จ เวลา.....น. (นาย.....ผู้แจ้ง)

จ่ายไฟคืนได้ เวลา.....น. (นาย.....ผู้แจ้ง)

(ผ.ก.บ.ฉ.3)
เลขที่รับ..... 874
วันที่รับ..... 18 ก.ค. 65
OMS.No..... 4539490088
รหัสอุปกรณ์..... KON04VS-607

ลงชื่อ.....

(นายสมจินต์ พันธุศย์)

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

เรียน อ.ก.บ.ฉ.3

ผ.ก.บ.พิจารณาแล้วเห็นว่า

- ☒ สามารถดำเนินการดับไฟได้ตามเสนอ พร้อมนี้
ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว
☐ ไม่สามารถดำเนินการดับไฟได้ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายนิรันดร์ แนวเงินดี)) ผ.ค.ฟ.

ผ.ค.ฟ.ก.บ.ฉ.3

ที่ ฉ.3 ก.บ. (ค.ฟ.) 2049/2565 18 ก.ค. 2565

เรียน ผ.ก.บ.กฟส.อ.นครบุรี(ผ.ก.บ.ค.ฟ.อ.ช.ค.บ.ค.บ.),

อ.ก.ค.ฉ.3(ผ.ก.บ.)


- ☒ อนุมัติ - และให้ควบคุมการปฏิบัติงานให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าตามเวลาที่กำหนดด้วย
☐ ไม่อนุมัติดับไฟได้ตามเสนอ จึงขอให้พิจารณากำหนดแผนงานดับไฟใหม่ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายศุภกร ศรีมงคล)

อ.ก.บ.ฉ.3 ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ฉ.3

115 KV Transmission Line

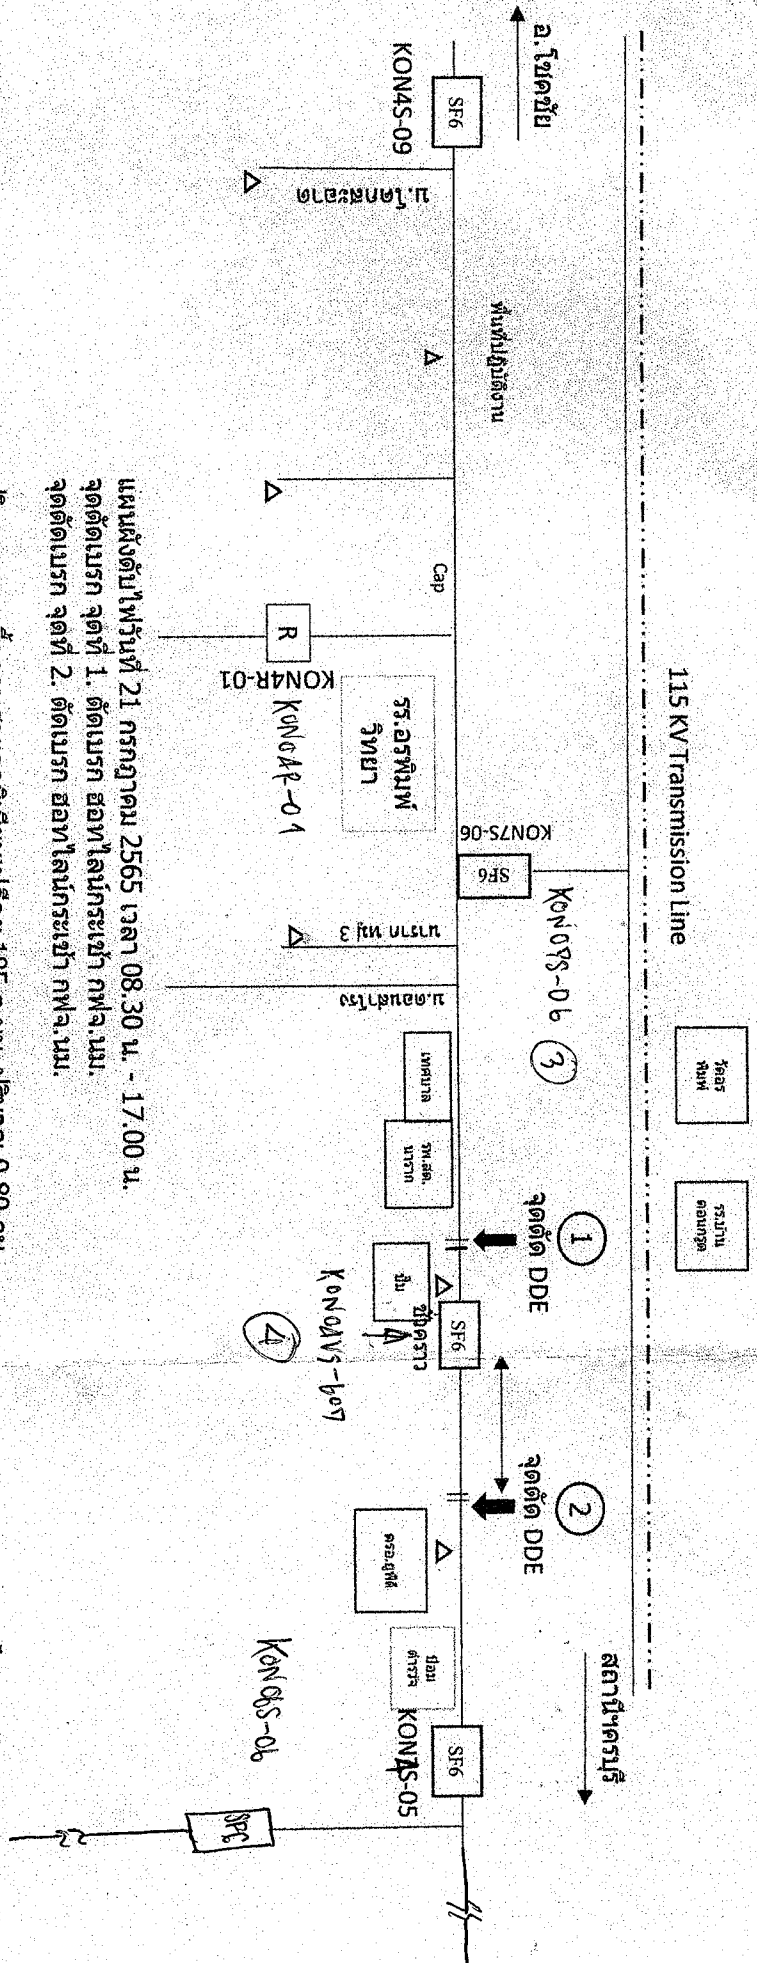

แผนผังระบบไฟฟ้าวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
 จุดตัดเบรก จุดที่ 1. ตัดเบรก ฮอทไลน์กระแสเข้า กฟจ.นม.
 จุดตัดเบรก จุดที่ 2. ตัดเบรก ฮอทไลน์กระแสเข้า กฟจ.นม.
 ปริมาณงาน - ร้อยละสายลึงมีเปลี่ยนเปลี่ยน 185 ต.นม. ปริมาณ 0.80 กม.
 - พาดสาย SAC 185 ต.นม. ปริมาณ 0.80 วงจร-กม.
 - ร้อยละสาย 14.00 น. จำนวน 16 ต้น พร้อมอุปกรณ์แก้ไข

แบบฟอร์มกำหนดขั้นตอนการดับไฟ (Switching Order)

เพื่อ ปรับปรุงระบบจำหน่าย.. วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น.

EO.....เป็นผู้ตรวจสอบ

☐ KYT/Safety Talk เวลา..... ผู้ดำเนินการ.....☐ Voltage Detector จำนวน....ชุด , สภาพ(__ปกติ / __ชำรุด) ☐ อุปกรณ์ทำกราวด์ จำนวน....ชุด , สภาพ(__ปกติ / __ชำรุด)

ผู้ประสานงานดับไฟ.....ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง.....

ขั้นตอนย้ายโหลดดับไฟปฏิบัติงาน

ขั้นตอน	การปฏิบัติงาน	รหัสอุปกรณ์	เวลา	หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
1	Off Auto	KON04VB-01		ศจพ.ฉ.3 SCADA	
2	Off Auto	KON07VB-01		ศจพ.ฉ.3 SCADA	
3	สับ	KON07S-06		ศจพ.ฉ.3 SCADA	
4	ปลด + Lock คาน	KON04VS-607		กฟส.คบ.	ปั้มเซลล์ ดอนกรุด
5	ลดโหลดหม้อแปลง	เข้าหาจุดปฏิบัติงาน		กฟส.คบ.	
6	ชี้แจงบริเวณ ปฏิบัติงาน/ไฟดับจาก..	KON04VS-607 เป็นปลายสาย		พนักงาน ศจพ.	ผู้ประสานงาน.....
7	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	จุด DDE 1,2		ผู้แจ้ง.....	
8	ตัดเบรก	จุด DDE 1		Hotline กระเช้า นม. ✓	
9	ตัดเบรก	จุด DDE 2		Hotline กระเช้า นม. ✓	
10	ชี้แจงบริเวณ ปฏิบัติงาน/ไฟดับจาก..	จุด DDE 1 ถึง จุด DDE 2		พนักงาน ศจพ.	ผู้ประสานงาน.....
11	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	จุด ปฏิบัติงาน		ผู้แจ้ง.....	
12	ทำกราวด์ คร่อม หัว-ท้าย	จุด ปฏิบัติงาน		ผู้แจ้ง.....	
13	จ่ายโหลดหม้อแปลง	ที่ไม่เกี่ยวข้อง		กฟส.คบ.	
14	On Auto	KON04VB-01		ศจพ.ฉ.3 SCADA	
15	On Auto	KON07VB-01		ศจพ.ฉ.3 SCADA	
16	ขั้นตอนปฏิบัติงานตามแผน แล้วเสร็จ				
17	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างชี้แจง ผลการปฏิบัติงานให้ผู้ประสานงานดับไฟ			ผู้ควบคุมงานชื่อ.....	ผู้ประสานงาน.....
18	ปลดกราวด์ คร่อม หัว-ท้าย	จุด ปฏิบัติงาน		ผู้แจ้ง.....	
19	Off Auto	KON04VB-01		ศจพ.ฉ.3 SCADA	
20	Off Auto	KON07VB-01		ศจพ.ฉ.3 SCADA	
21	ลดโหลดหม้อแปลง	เข้าหาจุดปฏิบัติงาน		กฟส.คบ.	
22	ชี้แจงบริเวณ ปฏิบัติงาน/ไฟดับจาก..	จุด DDE 1 ถึง จุด DDE 2		พนักงาน ศจพ.	ผู้ประสานงาน.....
23	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	จุด DDE 1,2		ผู้แจ้ง.....	
24	เชื่อมเบรก	จุด DDE 1		Hotline กระเช้า นม.	
25	เชื่อมเบรก	จุด DDE 2		Hotline กระเช้า นม.	
26	ชี้แจงบริเวณ ปฏิบัติงาน/ไฟดับจาก..	KON04VS-607 เป็นปลายสาย		พนักงาน ศจพ.	ผู้ประสานงาน.....
27	สับ	KON04VS-607		ผู้แจ้ง.....	
28	ปลด	KON07S-06		ศจพ.ฉ.3 SCADA	
29	จ่ายโหลดหม้อแปลง	ที่ไม่เกี่ยวข้อง		กฟส.คบ.	
30	On Auto	KON04VB-01		ศจพ.ฉ.3 SCADA	
31	On Auto	KON07VB-01		ศจพ.ฉ.3 SCADA	

☐ มท.แจ้งหน่วยงานภายนอก EGAT☐ บันทึกฝากโหลดข้ามเขตภายใน PEA กฟฉ.....☐ มท.แจ้งหน่วยงานภายนอก VSPP/SPP บริษัท.....☐ อื่นๆ

ลงชื่อ.....ผู้ออกสวิตซ์ซิง

(นายอำนาจ ภูริทัตโสภณ)

พช. ฉพ.ฉ.3 วันที่ 18/07/2565

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบสวิตซ์ซิง

(นายศักดิ์ดา ดังกลาง)

คพ.ฉ.3 วันที่ 18/07/2565

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติสวิตซ์ซิง

(นายนิรันดร์ แนวเงินดี.....)

พช.ฉ.ฉ.3 วันที่ 18/07/2565
