

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

สารบัญ

หน้า

- ◎ ตารางแสดงสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ๑ – ๑๐
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒
- สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ๑๑ – ๑๒
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
- สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๓ – ๑๔
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑
- สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ ๑๕ – ๑๙
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
- สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๐ – ๒๔
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑
- สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ ๒๕ – ๓๓
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑..... ๓๔ – ๔๓
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
- สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒..... ๔๔ – ๙๔

ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) (จำนวน ๓๒ โครงการ รายละเอียดโครงการปรากฏตามเอกสาร หน้า ๑๑-๙๔)

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้ แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) จำนวน ๑ โครงการ						
๑) ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียมขนาด ๔,๐๐๐ ที่นั่ง ระยะที่ ๑	สำนักการช่าง			√		
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๑ โครงการ						
๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬาและสะพาน คสล.(ระยะ ๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักการช่าง		√			
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) จำนวน ๔ โครงการ						
๑) ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.สายบ้านไทรน้อย-คลองนาหมอน (นบ.๒๐๔๔) ตำบลคลองขวาง อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักการช่าง		√			
๒) ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียมขนาด ๔,๐๐๐ ที่นั่ง (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักการช่าง			√		
๓) ก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถุกลสุขาภิบาล	กองทรัพย์ฯ	√				
๔) จ้างที่ปรึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	กองทรัพย์ฯ		√			

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก
		ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้			
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๔ โครงการ						
๑) ก่อสร้างรั้วรอบสนามกีฬา หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง		√			
๒) ค่าซ่อมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท จำนวน ๓๔ สายทาง และสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง					√
๓) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งสำหรับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของกองช่าง - รถยนต์ดับเพลิงถังน้ำในถังชนิดโฟม (๓,๕๐๐,๐๐๐) - เรือดับเพลิงกู้ภัย (๑๐,๐๐๐,๐๐๐)	สำนักงานช่าง			√		
๔) จำหน่ายแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แห่งใหม่ แห่งที่ ๓	สำนักงานช่าง		√			
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ จำนวน ๖ โครงการ						
๑) โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเต็มรักศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ		√			
๒) โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน)	กองการศึกษาฯ		√			

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๓) โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาพิทักษ์นันทเขต หมู่ที่ ๕ ตำบลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง			√		
๔) โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล (เดิม) ให้เป็นสนามหญ้าเทียม ตำบลบางกร่าง อำเภเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง			√		
๕) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบคลองขวาง หมู่ที่ ๔ ฝั่งตะวันตก ตำบลคลองขวาง อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานการช่าง		√			
๖) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบคลองลากค้อน (ตอนที่ ๑) ตำบลราษฎร์นิยม อำเภไทรน้อย เชื่อมต่อดำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานการช่าง		√			
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑๕ โครงการ						
๑) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมระบบสาธารณูปโภคโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย	กองการศึกษาฯ		√			
๒) โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนบางคูวัด	กองการศึกษาฯ		√			
๓) ค่าซ่อมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท จำนวน ๓๔ สายทาง และสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง					√

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๔) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานการช่าง			√		
๕) โครงการก่อสร้างปั๊มหีตียบเรือพร้อมสะพานขึ้นลงบริเวณวัดไผ่ล้อม ตำบลเกาะเกร็ด อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานการช่าง			√		
๖) โครงการก่อสร้างถนนมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานเฉลิมศักดิ์-วัดโคกอน (นบ.๒๐๑๓) ตอนที่ ๓ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี - โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายวัดทางนาปรัง-วัดไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี - โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดิน คสล.ป้องกันคันทางเคลื่อนตัว ถนนสายเลียบคลองแตน ตอนที่ ๑ ช่วงที่ ๒ ตำบลบางพลับ ถึงตำบลคลองข่อย อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง		√			
๗) โครงการจ่ายเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง	สำนักงานการคลัง				√	
๘) โครงการซ่อมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ พร้อมกำแพง คสล. ป้องกันการเคลื่อนตัวของคันทางสาย นบ.๓๐๘๘ บ้านคลองเจ็ก-บ้านสุหร้าแดง ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง			√		

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๙) โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร คสล. โหล่ทางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ พร้อมกำแพง คสล. ป้องกันการเคลื่อนตัวของคันทางถนนสายเลียบบ คลองตรงตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง			√		
๑๐) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคันกันน้ำพระอุดม (นบ.๒๐๒๑) ตอนที่ ๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง		√			
๑๑) โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.สายบ้านไทรน้อย-บ้านคลองนาหมอน (นบ.๒๐๔๔) ตอนที่ ๓ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง			√		
๑๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดโปรดเกษ-ถนนหลวงสายชัยพฤกษ์ ตำบล คลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง		√			
๑๓) โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์คลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง			√		
๑๔) โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บางพลับ ตำบลบางพลับ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง			√		
๑๕) โครงการจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	√				
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๔๑ โครงการ						
๑) โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์ ต่างๆ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	√				

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๒) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนชอและฮ์ศึกษา	กองการศึกษาฯ			√		
๓) โครงการก่อสร้างอาคารลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดแดง	กองการศึกษาฯ			√		
๔) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	√				
๕) โครงการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดตึก ในสังกัดองค์การบริหาร- ส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ			√		
๖) โครงการจัดหาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา จำนวน ๓๓ ห้อง และระดับมัธยมศึกษา ๑ ห้อง	กองการศึกษาฯ			√		
๗) โครงการจัดหาสื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กลไก ไฟฟ้า สมองกล	กองการศึกษาฯ	√				
๘) โครงการห้องปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ นวัตกรรมการศึกษา และเทคโนโลยีการศึกษา (โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย)	กองการศึกษาฯ		√			
๙) โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์และไมโครบิท (โรงเรียน นนทบุรีวิทยาลัย)	กองการศึกษาฯ	√				
๑๐) โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	กองการศึกษาฯ		√			

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๑๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย นบ.๔๐๒๑ บ้านหนองนก-ทางเขน-บ้าน เต็มรัก ต.บางคูรัด อ.บางคูรัด จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานการช่าง			√		
๑๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกษตรพัฒนา ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานการช่าง			√		
๑๓) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองตาคล้าย (ตอนที่ ๒) พร้อม กำแพงกันดินป้องกันคันทางเคลื่อนตัว หมู่ที่ ๖ ต.คลองขวาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานการช่าง		√			
๑๔) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองใต้ใหม่ฝั่งตะวันตก ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานการช่าง			√		
๑๕) โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองลากค้อน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๕ ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย เชื่อมต่อ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานการช่าง			√		
๑๖) โครงการก่อสร้าง คสล.สายเลียบคลองสอง หมู่ที่ ๔ ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานการช่าง			√		
๑๗) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และราวเหล็กกันตกถนนสายเลียบ คลองประปามหาสวัสดิ์ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณสามอำเภอ คือ อ.บางใหญ่ อ.บางบัวทอง และ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานการช่าง			√		

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๑๘) โครงการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับหัวหน้าส่วนราชการขนาดเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ ตำแหน่ง มาใช้ในราชการ	สำนักงานการช่าง	√				
๑๙) โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนสายบ้านคลองเจ็ก-บ้านสุหร่าแดง พร้อมกำแพงกันดิน คสล. ตำบลละหาร เชื่อมตำบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง			√		
๒๐) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ใต้ถุนยก ตำบลขุนศรี อำเภอนาทม จังหวัดนันทบุรี	สำนักงานการช่าง			√		
๒๑) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง (โดยวิธี PAVEMENT IN -PLACE RECYCLING) ถนนสายเลียบบคลองประปา (กม.ที่ ๙+๐๓๐ ถึง กม.ที่ ๑๑+๒๙๕) ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี	สำนักงานการช่าง			√		
๒๒) โครงการก่อสร้างถนนสาย นบ ๓๐๘๖ บ้านบางไทร บ้านคลองตาซ้อง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง			√		
๒๓) โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลทิววัฒนา อำเภอนาทม จังหวัดนันทบุรี	สำนักงานการช่าง			√		
๒๔) โครงการจัดเช่ารถยนต์มาใช้ในการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองราชการต่างๆ	สำนักงานการช่าง	√				
๒๕) โครงการจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ๒ แห่ง	สำนักงานการช่าง	√				

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๒๖) โครงการจ้างดูแลและบำรุงรักษาสนามฟุตบอลภายในสนามนนทบุรีสเตเดียม หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง	√				
๒๗) โครงการจ่ายเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง	สำนักงานการคลัง				√	
๒๘) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำคู่มือประกอบการดำเนินการให้เป็นไป ตามผังเมือง รวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) สำหรับพนักงานท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง	√				
๒๙) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาสำรวจ จัดเก็บข้อมูลทางกายภาพของถนนสาธารณะและ จัดทำหมุดพิกัด ควบคุมแนวเส้นทางถนนโครงการสายบังคับ เพื่อรองรับการปฏิบัติให้ เป็นไปตามผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)	กองผังเมือง		√			
๓๐) โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อให้บริการ ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)	กองผังเมือง	√				
๓๑) โครงการขยายเขตบริการประปาในพื้นที่ที่มีประปาเข้าถึงไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง		√			
๓๒) โครงการจ้างเหมาดำเนินการเดินระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล	กองทรัพยากรฯ		√			
๓๓) โครงการจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยประจำสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	กองทรัพยากรฯ		√			

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๓๔) โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัด น้ำชะขยะมูลฝอยศูนย์กำจัดขยะ นนทบุรี	กองทรัพยากรฯ		√			
๓๕) โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ			√		
๓๖) โครงการจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ		√			
๓๗) โครงการก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการภายในสถานที่ กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ			√		
๓๘) โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยขององค์การ- บริหารส่วนจังหวัด	กองทรัพยากรฯ			√		
๓๙) โครงการบ่อปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Pound) ภายในสถานที่กำจัด มูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ			√		
๔๐) โครงการอาคารเอนกประสงค์ในการบริหารจัดการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ			√		
๔๑) โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๕๐๐KVA แบบมีเทอร์ลเลอร์ลากจูง	กองทรัพยากรฯ			√		
รวม		๑๒	๒๓	๓๓	๒	๒

สรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวประชุมไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓ ซึ่งมีจำนวน ๑ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๕๘) จำนวน ๑ โครงการ

PERT / CPM / S-CURV (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																									
				☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ	☐ ๔.ยกเลิกโครงการ																						
๑	ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาด ๔,๐๐๐ ที่นั่ง ระยะที่ ๑	สำนักงานช่าง	๑๒๔,๔๕๒,๐๐๐.๐๐	เดือน <table border="1"> <thead> <tr> <th>กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ</th> <th>เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๓)</th> <th>ต.ค.๖๒</th> <th>พ.ย.๖๒</th> <th>ธ.ค.๖๒</th> <th>ม.ค.๖๓</th> <th>ก.พ.๖๓</th> <th>มี.ค.๖๓</th> <th>เม.ย.๖๓</th> <th>พ.ค.๖๓</th> <th>มิ.ย.๖๓</th> <th>ก.ค.๖๓</th> <th>ส.ค.๖๓</th> <th>ก.ย.๖๓</th> </tr> </thead> </table>												กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓																
	กิจกรรม A.....ออกแบบ..ประมาณราคา.....																												
	กิจกรรม b.....จัดจ้าง.....																												
	กิจกรรม c.....ดำเนินการตามสัญญา.....																												
	กิจกรรม d.....																												
	กิจกรรม e.....																												
	รวม																												

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล.....

ขั้นตอน / เหตุผล / ผลกระทบ :เสนอขออนุมัติราคากลาง/TOR.....

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓ ซึ่งมีจำนวน ๑ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๕๙) จำนวน ๑ โครงการ

PERT/CPM/S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬาและสะพาน คสล. (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓. ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ											
				กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๓) เดือน ๑๔:๒๕ ๑๔:๒๖ ๑๔:๒๗ ๑๔:๒๘ ๑๔:๒๙ ๑๔:๓๐ ๑๔:๓๑ ๑๕:๐๑ ๑๕:๐๒ ๑๕:๐๓ ๑๐๐%											
				กิจกรรม A งานงวดที่ ๑. ๑,๘๙๒,๘๐๐.๐๐ ๑,๘๙๒,๘๐๐.๐๐ ๘๕											
				กิจกรรม B งานงวดที่ ๒. ๑,๐๒๙,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๒๙,๐๐๐.๐๐ ๖๑											
				กิจกรรม C งานงวดที่ ๓. ๒,๗๐๔,๘๐๐.๐๐ ๒,๗๐๔,๘๐๐.๐๐ ๓๘											
				กิจกรรม D งานงวดที่ ๔. ๗,๐๒๔,๔๐๐.๐๐ ๑๕											
				กิจกรรม E งานงวดที่ ๕. ๑,๑๖๙,๐๐๐.๐๐ ๐											
				รวม ๑๓,๘๒๐,๐๐๐.๐ ๕,๖๒๖,๖๐๐.๐๐											

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล

ขั้นตอน / เหตุผล / ผลกระทบ : ..สัญญาจ้างเลขที่ ๗๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้าย ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ แก้ไขงวดงาน

สรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓ ซึ่งมีจำนวน ๔ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๕๙) จำนวน ๒ โครงการ

PERT / CPM / S-CURV (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑	ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.สาย คลองนาหมอน (นบ ๒๐๔๔) ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	๑๑๑,๑๗๗,๓๓๔.๐๐ โอนงบประมาณเพิ่ม ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๑,๑๗๗,๓๓๔.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ																		
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน																						
			ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓	ต.ธ.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	๑๐๐%
กิจกรรม A.....งานงวดที่ ๑.....๑๑,๔๗๔,๑๐๐....																									๙๑.๐๐
กิจกรรม b.....งานงวดที่ ๒.....๑๑,๔๗๔,๑๐๐....																									๘๒.๕๐
กิจกรรม c.....งานงวดที่ ๓.....๑๑,๔๗๔,๑๐๐....																									๗๑.๐๐
กิจกรรม d.....งานงวดที่ ๔.....๑๑,๔๗๔,๑๐๐....																									๖๐.๕๐
กิจกรรม e.....งานงวดที่ ๕.....๑๔,๔๙๓,๖๐๐....																									๕๐.๐๐
กิจกรรม f.....งานงวดที่ ๖.....๑๒,๖๘๑,๙๐๐....																									๓๘.๐๐
กิจกรรม g.....งานงวดที่ ๗.....๑๒,๖๘๑,๙๐๐....																									๒๘.๕๐
กิจกรรม h.....งานงวดที่ ๘.....๑๓,๘๘๙,๗๐๐....																									๑๙.๐๐
กิจกรรม i.....งานงวดที่ ๙.....๑๐,๒๖๖,๓๐๐....																									๙.๕๐
กิจกรรม j.....งานงวดที่ ๑๐.....๑๐,๘๗๐,๒๐๐....																									๐.๐๐
รวม		-																							

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล

ขั้นตอน / เหตุผล / ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๑ เมษายน ๒๕๖๔.....

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๕๙) จำนวน ๒ โครงการ

PERT / CPM / S-CURV (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๒	ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาด ๔,๐๐๐ ที่นั่ง (ระยะที่๒) หมู่ที่ ๙ ต.บางเลน อ.บางใหญ่	สำนักการช่าง	๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
				เดือน												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๓)	๑๔:๖:๕	๑๔:๖:๕	๑๔:๖:๕	๑๔:๖:๕	๑๔:๖:๕	๑๔:๖:๕	๑๔:๖:๕	๑๔:๖:๕	๑๔:๖:๕	๑๔:๖:๕	๑๔:๖:๕	๑๔:๖:๕	
กิจกรรม A.....ออกแบบ..ประมาณราคา.....																
กิจกรรม b.....จัดจ้าง.....																
กิจกรรม c.....ดำเนินการตามสัญญา.....																
กิจกรรม d.....																
กิจกรรม e.....																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล.....																
ขั้นตอน / เหตุผล / ผลกระทบ :เสนอขออนุมัติราคากลาง/TOR.....																

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๓	ก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลัก สุขาภิบาล	กองทรัพยากรฯ	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน													
			ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
	กิจกรรม A เบิกจ่ายงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย)	๑,๕๘๖,๕๐๖.๖๖				➔										
	กิจกรรม b															
	กิจกรรม c															
	กิจกรรม d															
	กิจกรรม e															
	รวม	๑,๕๘๖,๕๐๖.๖๖														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๔	จ้างที่ปรึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบ รวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	กองทรัพยากรฯ	๒๕,๐๐๐,๐๐๐ กัณเงิน ๑๓,๔๓๖,๒๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม Aเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓.....			๓,๒๔๔,๙๐๐					➔									
กิจกรรม b																	
กิจกรรม c																	
กิจกรรม d																	
กิจกรรม e																	
รวม			๓,๒๔๔,๙๐๐														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																	

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓ ซึ่งมีจำนวน ๔ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๓ โครงการ
- ยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐) จำนวน ๔ โครงการ

PERT/CPM/S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๑	โครงการก่อสร้างรั้วรอบสนามกีฬา หมู่ที่ ๔ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑๒,๔๓๔,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ						
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑มี.ค.๖๓)	เดือน													
			๑๔/๑๔	๑๔/๑๕	๑๔/๑๖	๑๔/๑๗	๑๔/๑๘	๑๔/๑๙	๑๔/๒๐	๑๔/๒๑	๑๔/๒๒	๑๔/๒๓	๑๔/๒๔	๑๔/๒๕	๑๔/๒๖	
กิจกรรม A สักรว																
กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา																
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																
กิจกรรม e.....																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๖	ค่าซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท จำนวน ๓๔ สายทาง และสายที่อยู่ใน ในความรับผิดชอบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักการช่าง	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ คงเหลือจำนวน ๘,๒๔๔,๐๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☒ ๔. ยกเลิกโครงการ									
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑มี.ค.๖๓)	เดือน													
			๑๔:๒๕	๑๔:๒๖	๑๔:๒๗	๑๔:๒๘	๑๔:๒๙	๑๔:๓๐	๑๔:๓๑	๑๕:๐๑	๑๕:๐๒	๑๕:๐๓	๑๕:๐๔	๑๕:๐๕		
กิจกรรม A																
กิจกรรม b																
กิจกรรม c																
กิจกรรม d																
กิจกรรม e																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทักท้วง โครงการไม่ได้ระบุสายทางที่ชัดเจน.....																

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมนทุริให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๑	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับการปฏิบัติงานในความ รับผิดชอบของกองช่าง ๑.รถยนต์ดับเพลิงถึงน้ำในถังชนิดโฟม ๗,๕๐๐,๐๐๐ ๒.เรือดับเพลิงกู้ภัย ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	๑๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ							
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๖)	เดือน													
				๑๔:๒๕	๑๔:๒๖	๑๔:๒๗	๑๔:๒๘	๑๔:๒๙	๑๔:๓๐	๑๔:๓๑	๑๕:๐๑	๑๕:๐๒	๑๕:๐๓	๑๕:๐๔	๑๕:๐๕	๑๕:๐๖	
กิจกรรม A สอบถามราคาผู้จัดจำหน่าย																	
กิจกรรม b จัดทำร่างขอบเขต (TOR)																	
กิจกรรม c จัดซื้อจัดจ้าง																	
กิจกรรม d																	
กิจกรรม e.....																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ซึ่งได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะแล้วเสร็จขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบและกำหนดราคากลาง และได้อนุมัติเงินเพื่อขยายเวลาเบิกจ่ายเงินจากผู้ว่าราชการจังหวัด																	
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นบ ๕๑๐๐๕/๒๐๓๘ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติ TOR																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๒	จ้างออกแบบอาคารสำนักงาน อบจ.นนทบุรีแห่งใหม่ แห่งที่ ๓	สำนักการช่าง	๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๓,๘๒๐,๐๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ						
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน												
				มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	๑๐๐%
กิจกรรม A งานงวดที่ ๑ (๓๘๒,๐๐๐)			๓๘๒,๐๐๐.๐๐													๗๐
กิจกรรม b งานงวดที่ ๒ (๗๖๔,๐๐๐)																๕๐
กิจกรรม c งานงวดที่ ๓ (๗๖๔,๐๐๐)																๓๐
กิจกรรม d งานงวดที่ ๔ (๗๖๔,๐๐๐)																๑๐
กิจกรรม e งานงวดที่ ๕ (๑,๑๔๖,๐๐๐)																๐
รวม			๓,๘๒๐,๐๐๐.๐๐													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ.....อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง เลขที่ 30/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาจ้าง 5 ธันวาคม 2563.....																

สรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓ ซึ่งมีจำนวน ๙ โครงการ)


จากการติดตามไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๖ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๑	โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเต็มรัก ศึกษา ในสังกัด อบจ.นนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๑๑,๓๘๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง									→								
กิจกรรม b ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตรวจสอบราคากลาง										→							
กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง											→						
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญาจ้าง												→					
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : อยู่ระหว่างขยายเวลาก่อนนี้ผูกพันกับผู้ว่าราชการจังหวัด หลังจากนั้นจะดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารโดยใช้วิธี e-bidding ครั้งที่ ๓ ตามลำดับ																	


โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเต็มรักศึกษาในสังกัด อบจ.นนทบุรี

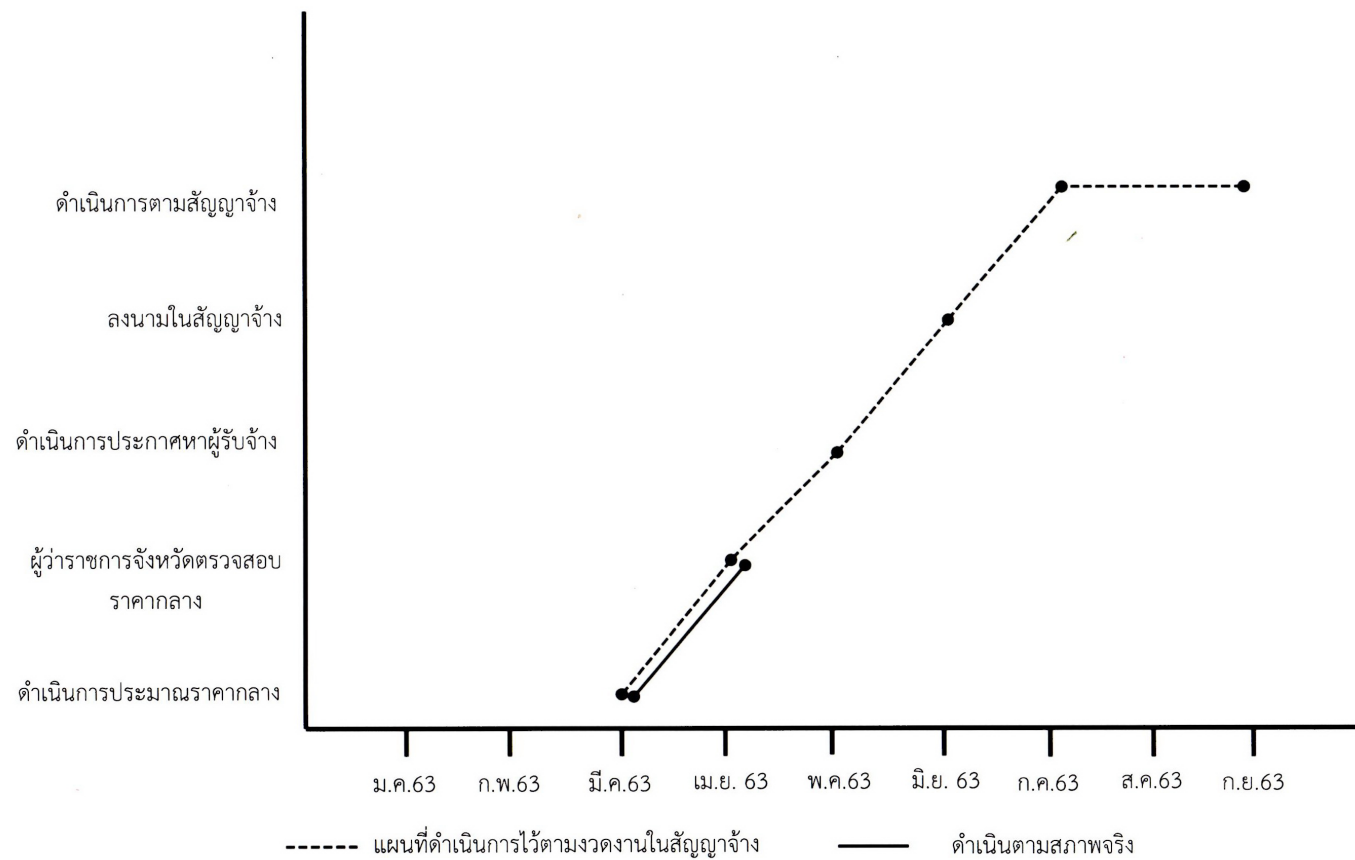

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน										
๒	โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บริเวณโรงเรียนสังกัด อบจ.นนทบุรี (โรงเรียน สุขเหล้าลากค้อน)	กองการศึกษาฯ	๒,๗/๘๒,๖๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ										
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๓)	เดือน											
			ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓
	กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง													
	กิจกรรม b ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตรวจสอบราคากลาง													
	กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง													
	กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง													
	กิจกรรม e ดำเนินการตามสัญญาจ้าง													
	รวม													

☐ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : อยู่ระหว่างการทำสัญญาจ้าง..ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย
ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๓๑/๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค.๖๓ วันสิ้นสุด ๒๙ พ.ค.๖๓.....

โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนสังกัด อบจ.นนทบุรี (โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน)

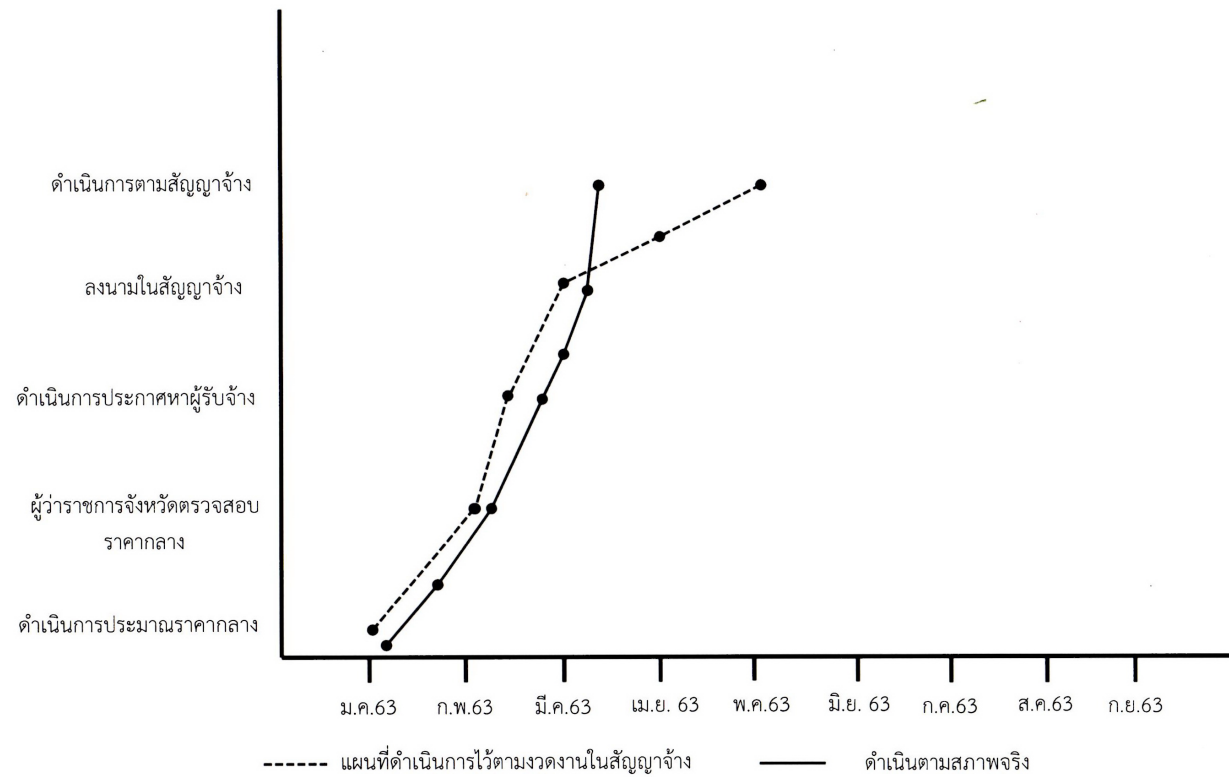

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑
(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐) จำนวน ๔ โครงการ
PERT/CPM/S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน														
๑	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พิทักษ์นันทเขต หมู่ที่ ๕ ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง	๙,๔๓๓,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ								
				กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๓)		เดือน										
								๑๔:๒๕	๑๔:๒๖	๑๔:๒๗	๒๕:๒๕	๒๕:๒๖	๒๕:๒๗	๒๕:๒๘	๒๕:๒๙	๒๕:๓๐	๒๕:๓๑	
				กิจกรรม A สสำรวจ														
				กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา														
				กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง														
				กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา														
กิจกรรม e.....																		
รวม																		
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																		
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง.....																		

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
๒	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล (เดิม) สนามหญ้าเทียม ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตามรูปแบบรายละเอียดข้อกำหนด อบจ.นนทบุรี	สำนักการช่าง	๔๐,๘๙๖,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ								
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๖๓)	เดือน												
			๑๔:๒๕	๑๔:๒๖	๑๔:๒๗	๑๔:๒๘	๑๔:๒๙	๑๔:๓๐	๑๔:๓๑	๑๔:๓๒	๑๔:๓๓	๑๔:๓๔	๑๔:๓๕	๑๔:๓๖	
กิจกรรม A สักราง															
กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา															
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง															
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา															
กิจกรรม e.....															
รวม															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เลียบบคลองขวาง หมู่ที่ ๔ ฝั่งตะวันตก ตำบลคลองขวาง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดนนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานการช่าง	๑๖,๔๕๓,๐๐๐.๐๐	☒ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ				☐ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ				☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ				☐ ๔. ยกเลิกโครงการ	
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๓)	เดือน													
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	๑๐๐%
กิจกรรม A.....งวดที่ ๑ (๔,๔๒๖,๔๙๓.๘๐).....			๔,๔๒๖,๔๙๓.๘๐														๖๙
กิจกรรม b.....งวดที่ ๒ (๓,๔๐๔,๙๙๕.๒๓).....			๓,๔๐๔,๙๙๕.๒๓														๓๙
กิจกรรม c.....งวดที่ ๓ (๓,๕๑๘,๔๙๕.๐๗).....			๓,๕๑๘,๔๙๕.๐๗														๐
กิจกรรม d.....																	
กิจกรรม e.....																	
๑๑,๓๔๙,๙๘๔.๑๐ รวม			๑๑,๓๔๙,๙๘๔.๑๐														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๖๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.....ตรวจงานงวดที่ ๑ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เลียบบคลองลากค้อน (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๕ ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย เชื่อมต่อ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑๖,๒๓๔,๐๐๐.๐๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๑๒,๑๖๐,๐๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ							
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๓)	เดือน													
				ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓	ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	๑๐๐%		
กิจกรรม A งวดที่ ๑ (๔,๘๖๔,๐๐๐)															๖๕		
กิจกรรม b งวดที่ ๒ (๓,๐๔๐,๐๐๐)															๔๐		
กิจกรรม c งวดที่ ๓ (๔,๒๕๖,๐๐๐)															๐		
กิจกรรม d.....																	
กิจกรรม e.....																	
รวม ๑๒,๑๖๐,๐๐๐																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓.....																	

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓ ซึ่งมีจำนวน ๑๕ โครงการ)


จากการติดตามไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๑๓ โครงการ
- ยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓


ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๑	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมระบบสาธารณูปโภคโรงเรียนนันทบุรีวิทยาลัย	กองการศึกษา	๘๑,๑๓๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน												
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
	กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง															
	กิจกรรม b ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตรวจสอบราคากลาง															
	กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง															
	กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง															
	กิจกรรม e ดำเนินการตามสัญญาจ้าง															
	เบิกจ่ายงวดที่ ๑ - ๖		๒๖,๑๒๖,๖๙๙	←→												
	เบิกจ่ายงวดที่ ๗ - ๙		๑๙,๐๖๕,๔๒๙						↔							
	รวม		๔๕,๑๙๒,๑๒๘													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๖๓/๖๒ ลงวันที่ ๕ ก.ค.๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๖ ก.ค.๖๓.....																

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมระบบสาธารณูปโภคโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

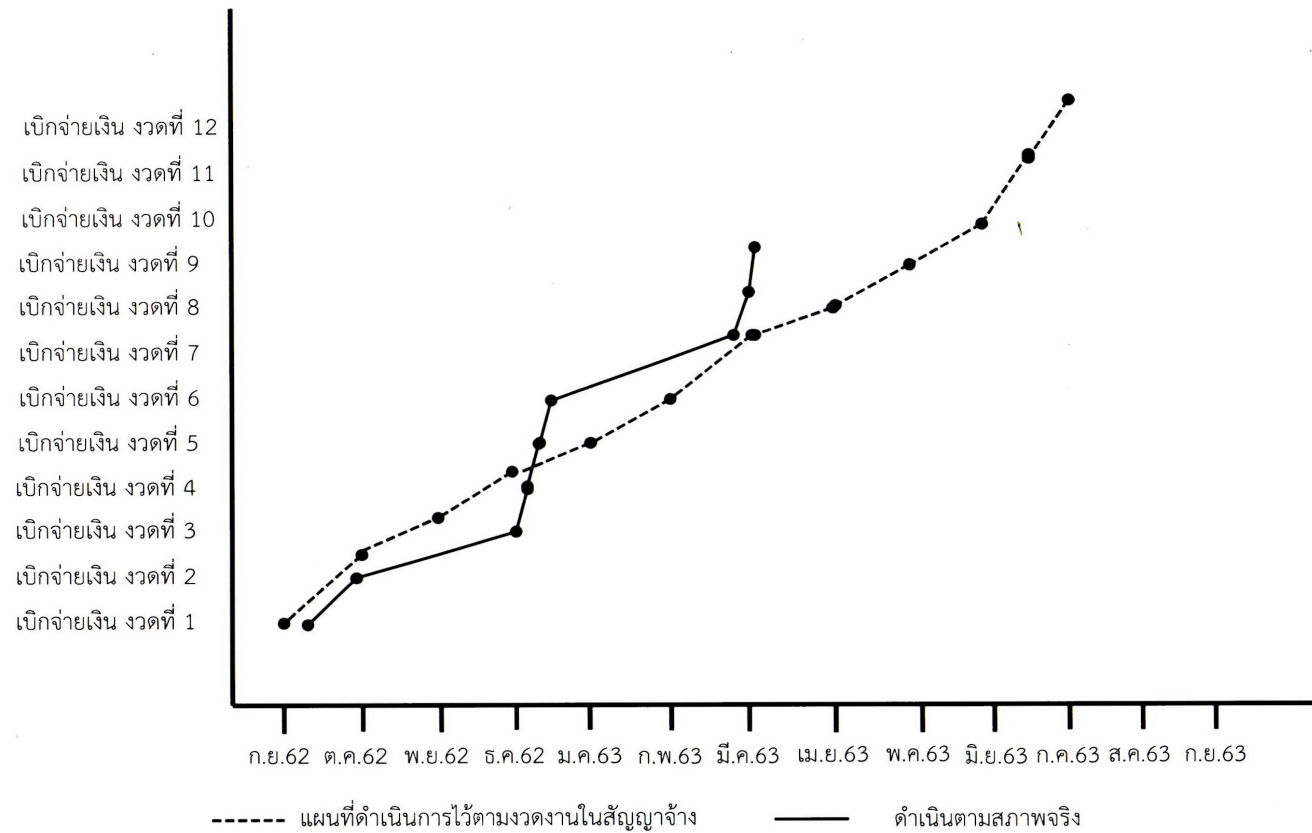

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๒	โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนบางคูรัด	กองการศึกษาฯ	๓๕,๕๕๘,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
	กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง																
	กิจกรรม b ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตรวจสอบราคากลาง																
	กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง																
	กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง																
	กิจกรรม e ดำเนินการตามสัญญาจ้าง เบิกจ่ายงวดที่ ๑ – ๖ เบิกจ่ายงวดที่ ๗ – ๙		๑๔,๕๑๕,๑๖๐ ๑๕,๕๐๔,๘๓๐														
	รวม		๓๐,๐๑๙,๙๙๐														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๒๖/๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๒ สิ้นสุด ๑๒ ก.ย.๖๓.....																	

โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนบางคูวัด

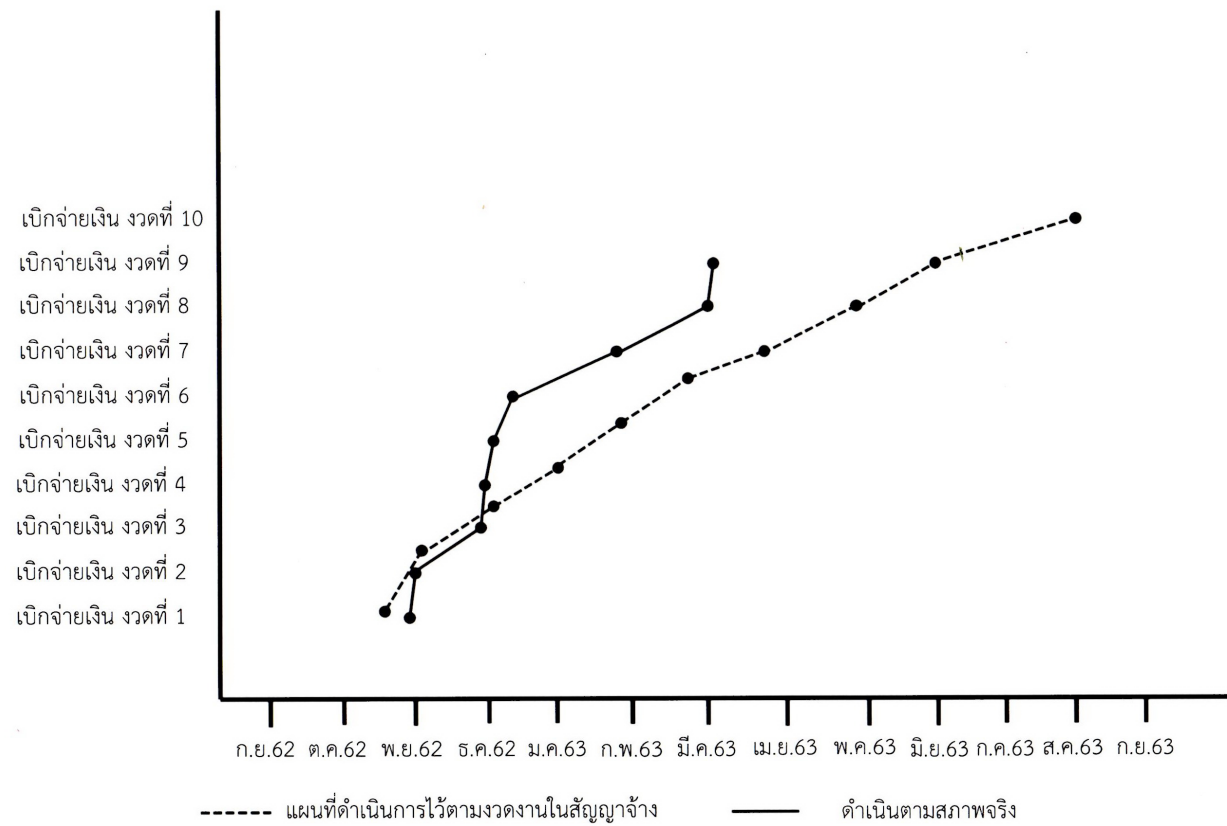

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๖๑) จำนวน ๑๑ โครงการ

PERT/CPM/S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
๑	ค่าซ่อมบำรุงรักษามางหลวงชนบท จำนวน ๓๔ สายทาง และทางที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ เงินคงเหลือ ๑๔,๕๑๕,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☐ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☒ ๔. ยกเลิกโครงการ					
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน											
				๑๔:๒๕	๑๔:๒๖	๑๔:๒๗	๑๔:๒๘	๑๔:๒๙	๑๔:๓๐	๑๔:๓๑	๑๕:๐๑	๑๕:๐๒	๑๕:๐๓	๑๕:๐๔	๑๕:๐๕
กิจกรรม A จัดทำร่างขอบเขต															
กิจกรรม b ดำเนินการจัดจ้าง															
กิจกรรม c ดำเนินการตามสัญญา															
กิจกรรม d															
กิจกรรม e															
รวม															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล															
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทักท้วง ไม่ได้ระบุสายทางที่ชัดเจน.....															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๒	โครงการการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พื้นที่ ๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง	๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ										
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)		เดือน													
				๑๔.๕.๖๓	๑๔.๖.๖๓	๑๔.๗.๖๓	๑๔.๘.๖๓	๑๔.๙.๖๓	๑๕.๑.๖๓	๑๕.๒.๖๓	๑๕.๓.๖๓	๑๕.๔.๖๓	๑๕.๕.๖๓	๑๕.๖.๖๓	๑๕.๗.๖๓		
กิจกรรม Aสำรวจ.....																	
กิจกรรม b ..ออกแบบ งบประมาณราคา..																	
กิจกรรม cจัดจ้าง.....																	
กิจกรรม dดำเนินการตามสัญญา..																	
กิจกรรม e																	
		รวม															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างออกแบบ.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
๓	โครงการการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือ พร้อมสะพานขึ้นลงบริเวณวัดไผ่ล้อม ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๒,๔๗๕,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ								
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๓)	เดือน												
			๑๔.๖.๕	๑๔.๖.๗	๑๔.๖.๘	๑๔.๖.๙	๑๔.๖.๑๐	๑๔.๖.๑๑	๑๔.๖.๑๒	๑๔.๖.๑	๑๔.๖.๒	๑๔.๖.๓	๑๔.๖.๔	๑๔.๖.๕	
กิจกรรม A สำรอง															
กิจกรรม b ออกแบบประมาณราคา															
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง															
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา															
กิจกรรม e															
รวม															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล															
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :ประมาณราคา/ตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้าง เนื่องจากมีหน่วยงานมาทำการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือในตำแหน่งเดียวกัน.....															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ								
๔	โครงการก่อสร้างถนนมาตรฐานทางหลวง ท้องถิ่น จำนวน ๓ โครงการ	สำนักการช่าง	๑๘,๘๗๒,๔๙๖.๐๐												
	๔.๑โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพาน เฉลิมศักดิ์-วัดโคกนอ (นบ.๒๐๑๓) ตอนที่ ๓ ตำบลบางศรีทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี		๔,๓๓๔,๐๐๐.๐๐												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน											
				๑๔:๓	๑๔:๔	๑๔:๕	๑๔:๖	๑๔:๗	๑๔:๘	๑๔:๙	๑๔:๑๐	๑๔:๑๑	๑๔:๑๒	๑๔:๑	๑๔:๒
	กิจกรรม A สักรว														
	กิจกรรม b ออกแบบประมาณราคา														
	กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง														
	กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา														
กิจกรรม e															
รวม															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... 															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๕	๔.๒โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายวัดทองนาปรัง-วัดไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลบางศรีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	สำนักงาน	๔,๑๖๕,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ										
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน													
				๑๔.๒	๑๔.๓	๑๔.๔	๑๔.๕	๑๔.๖	๑๔.๗	๑๔.๘	๑๔.๙	๑๕.๑	๑๕.๒	๑๕.๓	๑๕.๔	๑๕.๕	
กิจกรรม A สำรอง																	
กิจกรรม b ออกแบบประมาณราคา																	
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																	
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																	
กิจกรรม e																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ : อยู่ระหว่างประมาณราคา.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน															
๔	๔.๓โครงการซ่อมถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดิน คสล. ป้องกันคันทางเคลื่อนตัวถนนสายเลียบบคลองแอน ตอนที่ ๑ ช่วงที่ ๒ ตำบลบางพลับ ถึงตำบลคลองข่อย อำเภอบางกร่าง จังหวัดฉะเชิงเทรา	สำนักงานการช่าง	๓๐,๓๗๓,๔๙๖.๐๐ ก่อนหักผูกพันแล้ว ๗,๖๖๖,๐๐๐.๐๐	☒ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ															
				กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๓)		เดือน											
						๑๔:๒๕	๑๔:๒๖	๑๔:๒๗	๑๔:๒๘	๑๔:๒๙	๑๔:๓๐	๑๔:๓๑	๑๔:๓๒	๑๔:๓๓	๑๔:๓๔	๑๔:๓๕			
				กิจกรรม A.....งวดที่ ๑.	๓,๓๗๓,๐๔๐.๐๐	๓,๓๗๓,๐๔๐.๐๐													
				กิจกรรม b.....งวดที่ ๒.	๔๙๖,๕๘๐.๐๐	๔๙๖,๕๘๐.๐๐													
				กิจกรรม cงวดที่ ๓.	๓,๒๙๖,๓๘๐.๐๐	๓,๒๙๖,๓๘๐.๐๐													
				กิจกรรม d															
กิจกรรม e																			
รวม		๗,๖๖๖,๐๐๐.๐๐	๗,๖๖๖,๐๐๐.๐๐																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																			
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินครบทุกงวด สัญญาเลขที่ ๖๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้าย																			
สัญญาจ้าง ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒																			

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๓/	โครงการจ่ายเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง	สำนักงานคลัง	๕๐๐,๐๐๐ โอนลด ๒๕๐,๐๐๐.- คงเหลือ ๒๕๐,๐๐๐.-	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน												
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
กิจกรรม A																
กิจกรรม b																
กิจกรรม c																
กิจกรรม d																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :																
ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๕	โครงการซ่อมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์- คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ พร้อมกำแพง คสล. ป้องกันการเคลื่อนตัวของคันทางสาย นบ.๓๐๘๘ บ้านคลองเจ็ก - บ้านสุเหร่าแดง ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง	๓๖,๑๔๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ							
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน													
				ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	
กิจกรรม A สักรวออกแบบ																	
กิจกรรม b ประมาณราคา																	
กิจกรรม c จัดซื้อจัดจ้าง																	
กิจกรรม d																	
กิจกรรม e																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ..... 																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๖	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร คสล. ไหล่ทางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ พร้อมกำแพง คสล. ป้องกันการเคลื่อนตัวของคันทาง ถนนสายเลียบคลองตรง ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักการช่าง	๒๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ						
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)		เดือน												
				ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓	
กิจกรรม A แก้ไขที่แบบแปลน																
กิจกรรม b ตั้งคณะกรรมการร่าง TOR																
กิจกรรม c จัดซื้อจัดจ้าง																
กิจกรรม d																
กิจกรรม e																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคันกันน้ำพระอุดม(นบ.๒๐๒๑) ตอนที่ ๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑๒,๐๖๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ							
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน														
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	๑๐๐%		
กิจกรรม A งานงวดที่ ๑		๔,๐๒๗,๔๔๘.๙๔	๔,๐๒๗,๔๔๘.๙๔												๗๗%		
กิจกรรม b งานงวดที่ ๒		๒,๘๖๓,๔๔๔.๒๔													๔๕%		
กิจกรรม c งานงวดที่ ๓		๒,๐๕๘,๔๔๔.๘๖													๐		
กิจกรรม d																	
กิจกรรม e																	
รวม		๘,๙๔๙,๔๔๗.๖๔	๔,๐๒๗,๔๔๘.๙๔														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ตรวจงานงวดที่ ๑ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																
๘	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. สายบ้านไทรน้อย-บ้านคลองนาหมอน (นบ.๒๐๔๔) ตอนที่ ๓ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง	๖๒,๙๓๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ				☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ				☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ				☐ ๔. ยกเลิกโครงการ				
				กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๖)		เดือน												
						๑๔:๒	๑๔:๖	๑๔:๑๐	๑๔:๔	๑๔:๘	๑๔:๑๒	๑๔:๑๖	๑๔:๒๐	๑๔:๒๔	๑๔:๒๘	๑๕:๑	๑๕:๕	๑๕:๙		
				กิจกรรม A สำรวจ																
				กิจกรรม b ออกแบบประมาณราคา																
				กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																
				กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																
กิจกรรม e																				
		รวม	-																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																				
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :ผู้ชนะประกวดราคาถูกแจ้งเวียนเป็นผู้ทำงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒.....																				

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																				
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดโปรดเกษ-ถนนหลวงสายชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑๐,๘๐๒,๐๐๐.๐๐ ก่อนหักผูกพันแล้ว ๗,๗๓๘,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ														
				เดือน <table border="1"> <thead> <tr> <th>ค.ย.๕๖</th> <th>ก.ย.๕๖</th> <th>พ.ย.๕๖</th> <th>ธ.ย.๕๖</th> <th>ก.พ.๕๗</th> <th>ม.พ.๕๗</th> <th>เม.ย.๕๗</th> <th>พ.ค.๕๗</th> <th>มิ.ย.๕๗</th> <th>ก.ค.๕๗</th> <th>ส.ค.๕๗</th> <th>๑๐๐%</th> </tr> </thead> </table>												ค.ย.๕๖	ก.ย.๕๖	พ.ย.๕๖	ธ.ย.๕๖	ก.พ.๕๗	ม.พ.๕๗	เม.ย.๕๗	พ.ค.๕๗	มิ.ย.๕๗
	ค.ย.๕๖	ก.ย.๕๖	พ.ย.๕๖	ธ.ย.๕๖	ก.พ.๕๗	ม.พ.๕๗	เม.ย.๕๗	พ.ค.๕๗	มิ.ย.๕๗	ก.ค.๕๗	ส.ค.๕๗	๑๐๐%												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มี.ค.๕๗)																					
	กิจกรรม A งวดที่ ๑	๒,๕๕๕,๘๖๑.๔๐	๒,๕๕๕,๘๖๑.๔๐																					
	กิจกรรม b งวดที่ ๒	๒,๒๕๗,๑๗๔.๖๐											๖๒.๒											
	กิจกรรม c งวดที่ ๓	๒,๙๒๔,๙๖๔.๐๐											๓๓											
	กิจกรรม d												๐											
กิจกรรม e																								
รวม		๗,๗๓๘,๐๐๐.๐๐	๒,๕๕๕,๘๖๑.๔๐																					
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																								
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๔ เมษายน ๒๕๖๓																								

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๑๐	โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ คลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑๔,๘๓๒,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ						
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน													
			ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓		
กิจกรรม A สักรวจ																
กิจกรรม b ออกแบบประมาณราคา																
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																
กิจกรรม e																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๑๑	โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ บางพลับ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง	๒๗,๑๒๓,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ							
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๓)	เดือน													
				๑๔.๕	๑๔.๖	๑๔.๗	๑๔.๘	๑๔.๙	๑๕.๐	๑๕.๑	๑๕.๒	๑๕.๓	๑๕.๔	๑๕.๕	๑๕.๖	๑๕.๗	
กิจกรรม A สำรอง																	
กิจกรรม b ออกแบบประมาณราคา																	
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																	
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																	
กิจกรรม e																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :อยู่ระหว่างออกแบบประมาณราคา.....																	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
๑๕	โครงการจ้างเหมาจัดทำมูลฝอยติดเชื้อของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๒๗,๓๐๐,๐๐๐	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ											
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน											
				ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒
	กิจกรรม A เบิกจ่ายเงินงวดที่...๑๐	๒,๒๓/๓,๐๔๐.๔๒					→								
	กิจกรรม b เบิกจ่ายเงินงวดที่...๑๑	๒,๒๓/๓,๐๔๐.๔๒					→								
	กิจกรรม c เบิกจ่ายเงินงวดที่...๑๒ (งวดสุดท้าย)	๒,๒๓/๓,๐๔๐.๔๒					→								
	รวม		๖,๔๑๙,๑๒๑.๒๖												
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :															

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓ มีจำนวน ๔๑ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๐ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๓๐ โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒) จำนวน ๑๖ โครงการ

PERT / CPM / S-CURVE(ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์ต่างๆของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน-จังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๖,๓๐๐,๐๐๐	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง																	
กิจกรรม b อนุมัติราคากลาง																	
กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง																	
กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง																	
กิจกรรม e ดำเนินการตามสัญญาจ้าง				←————→													
รวม			๒,๕๑๕,๔๐๓.๗๒														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน										
๒	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนชอและฮศึกษา	กองการศึกษาฯ	๖,๕๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ										
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๓)	เดือน											
			ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ต.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓
	กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง		←————→											
	กิจกรรม b อนุมัติราคากลาง													
	กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง													
	กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง													
	รวม													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง และ TOR ยังไม่มีการเบิกจ่าย.....														

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๓	โครงการก่อสร้างอาคารลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดแดง	กองการศึกษาฯ	๘,๙๘๔,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๓)	เดือน												
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
	กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง			←————→												
	กิจกรรม b อนุมัติราคากลาง															
	กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง															
	กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง															
	รวม															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง และ TOR ยังไม่มีการเบิกจ่าย.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๕	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนวัดตึก ในสังกัดองค์การบริหารส่วน- จังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๔๔๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิก โครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง																	
กิจกรรม b อนุมัติราคากลาง																	
กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง																	
กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง																	
กิจกรรม e ดำเนินการตามสัญญาจ้าง																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๖	โครงการจัดหาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับ ประถมศึกษา จำนวน ๓๓ ห้อง และระดับ มัธยมศึกษา ๑ ห้อง	กองการศึกษาฯ	๓๔,๙๙๖,๓๖๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน													
			ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง																
กิจกรรม b ขออนุมัติราคากลาง																
กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง																
กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง						← →										
กิจกรรม e ดำเนินการตามสัญญาจ้าง																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาจ้าง.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๓/	โครงการจัดหาสื่อพัฒนาความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ กลไก ไฟฟ้า สมองกล	กองการศึกษาฯ	๑๒,๕๐๐,๐๐๐	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน												
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง																
กิจกรรม b ขออนุมัติราคากลาง																
กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง																
กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง																
กิจกรรม e ดำเนินการตามสัญญาจ้าง			๑๒,๓๗๐,๐๐๐				←	→								
รวม			๑๒,๓๗๐,๐๐๐													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๘	โครงการห้องปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ นวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา (โรงเรียนนันทบุรีวิทยาลัย)	กองการศึกษาฯ	๒,๔๘๓,๔๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง																	
กิจกรรม b อนุมัติราคากลาง																	
กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง																	
กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง																	
กิจกรรม e ดำเนินการตามสัญญาจ้าง							←	→									
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๙	โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์และไมโครบิท (โรงเรียนนันทบุรีวิทยาลัย)	กองการศึกษาฯ	๒,๔๒๕,๕๕๐	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง																	
กิจกรรม b อนุมัติราคากลาง																	
กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง																	
กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง																	
กิจกรรม e ดำเนินการตามสัญญาจ้าง			๒,๓๙๗,๐๐๐				←————→										
รวม			๒,๓๙๗,๐๐๐														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๘	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	กองการศึกษาฯ	๒๘,๐๕๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง																	
กิจกรรม b ขออนุมัติราคากลาง																	
กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง																	
กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง																	
กิจกรรม e ดำเนินการตามสัญญาจ้าง							←————→										
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย นบ.๔๐๒๑ บ้านหนองนกยางเขน- บ้านเต็มรัก ต.บางคูรัด อ.บางคูรัด จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๗,๒๕๓,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ							
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๓)	เดือน														
			ต.ค.๖๒	ต.ค.๖๓	ต.ค.๖๔	ต.ค.๖๕	ต.ค.๖๖	ต.ค.๖๗	ต.ค.๖๘	ต.ค.๖๙	ต.ค.๗๐	ต.ค.๗๑	ต.ค.๗๒	ต.ค.๗๓			
กิจกรรม A สำรอง																	
กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา																	
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																	
กิจกรรม d																	
กิจกรรม e																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน															
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เกษตรพัฒนา ต.คลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๓๕,๐๓๒,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ				☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ				☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ				☐ ๔. ยกเลิกโครงการ			
				กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน												
						๑๔/๖๓	๑๕/๖๓	๑๖/๖๓	๑๗/๖๓	๑๘/๖๓	๑๙/๖๓	๒๐/๖๓	๒๑/๖๓	๒๒/๖๓	๒๓/๖๓	๒๔/๖๓	๒๕/๖๓		
				กิจกรรม A....สำรวจ.....															
				กิจกรรม b....ออกแบบประมาณราคา.....															
				กิจกรรม c....จัดจ้าง.....															
				กิจกรรม d....ดำเนินการตามสัญญา.....															
	รวม																		

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล
 ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☒ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เลียบคลองตากลาย (ตอนที่ ๒) พร้อมกำแพงกันดินป้องกันคันทาง เคลื่อนตัวหมู่ที่ ๖ ต.คลองขวาง เชื่อม หมู่ที่ 5 ต.ราชภูรินิคม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑๕,๙๔๗,๐๐๐.๐๐													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๓)	เดือน													
			๑๔:๕๕	๑๔:๕๖	๑๔:๕๗	๑๔:๕๘	๑๔:๕๙	๑๕:๐๐	๑๕:๐๑	๑๕:๐๒	๑๕:๐๓	๑๕:๐๔	๑๕:๐๕	๑๐๐%		
	กิจกรรม A.....งวดที่ ๑ (๓,๔๑๗,๕๙๙.๙๖).....	๒,๘๐๑,๒๗๙.๑๘												๗๐		
	กิจกรรม b.....งวดที่ ๒ (๔,๕๕๖,๗๙๙.๙๔).....	๓,๖๘๗,๙๕๖.๐๓												๓๐		
	กิจกรรม c.....งวดที่ ๓ (๓,๔๑๗,๕๙๙.๙๕).....	๒,๖๒๓,๕๗๙.๓๐												๐		
	กิจกรรม															
	กิจกรรม															
	๑๑,๓๙๑,๙๙๙.๘๕	รวม	๙,๑๑๒,๘๑๔.๕๑													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓...แก้ไขแบบแปลน/ตัดค่างาน เนื่องจาก อบต. ก่อสร้างทับซ้อนสัญญา																
ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินครบทุกงวดแล้ว.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ										
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เลียบคลองใต้ใหม่ฝั่งตะวันตก ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๓๑,๙๓๘,๐๐๐.๐๐														
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๖๓)	เดือน														
			๑๔/๒๕	๑๔/๒๖	๑๔/๒๗	๑๔/๒๘	๑๔/๒๙	๑๔/๓๐	๑๔/๓๑	๑๔/๓๒	๑๔/๓๓	๑๔/๓๔	๑๔/๓๕	๑๔/๓๖	๑๔/๓๗		
	กิจกรรม A สักราง																
	กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา																
	กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																
	กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																
	กิจกรรม e.....																
	รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ระหว่างประมาณราคา.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เลียยคลองลากค้อน (ตอน ๒) ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑๗,๙๕๘,๐๐๐.๐๐													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน												
				๑๔:๔	๑๔:๖	๑๔:๘	๑๔:๑๐	๑๔:๑๒	๑๔:๑๔	๑๔:๑๖	๑๔:๑๘	๑๔:๒๐	๑๔:๒๒	๑๔:๒๔	๑๔:๒๖	
	กิจกรรม A สำรวจ															
	กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา															
	กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง															
	กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา															
	กิจกรรม e.....															
	รวม															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ระหว่างประมาณราคา.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน														
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เลียบคลองสอง หมู่ที่ ๔ ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๖,๘๓๓,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ				☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ				☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ				☐ ๔. ยกเลิกโครงการ		
				กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน											
						ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	เม.ค.๖๓	พ.ค.๖๓	
				กิจกรรม A สั้วร่ว														
				กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา														
				กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง														
				กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา														
				กิจกรรม e.....														
รวม																		
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง..... 																		

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และราวกันตกถนนสายเลียบริมคลอง ประปามหาสวัสดิ์ ครอบคลุมพื้นที่ บริเวณสามอำเภอ คือ อ.บางใหญ่ อ.บางบัวทอง และ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๗,๖๐๐,๐๐๐.๐๐													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน												
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
กิจกรรม A สักรว																
กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา																
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																
กิจกรรม d.....																
กิจกรรม e.....																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ระหว่างแก้ไขแบบ ประมาณราคา..... 																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน															
๘	โครงการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ ขนาด เครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ ตำแหน่ง มาใช้ในราชการ	สำนักงาน	๖๖๖,๔๐๐.๐๐	☒ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ				☐ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ				☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ				☐ ๔. ยกเลิกโครงการ			
				กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน												
							๑๔.๖๓	๑๕.๖๓	๑๖.๖๓	๑๗.๖๓	๑๘.๖๓	๑๙.๖๓	๒๐.๖๓	๒๑.๖๓	๒๒.๖๓	๒๓.๖๓	๒๔.๖๓	๒๕.๖๓	
				กิจกรรม A															
				กิจกรรม b															
				กิจกรรม c															
				กิจกรรม d															
				กิจกรรม e															
รวม																			
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																			
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :เป็นโครงการที่ก่อหนี้ผูกพันเกินหนึ่งปีงบประมาณ(งบปีพ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้เบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ																			
ขณะนี้ระหว่างดำเนินการตามสัญญาเช่ารถยนต์ เลขที่ ๖๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เลขที่ CNTR-๑๐๑๓/๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒.....																			

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๑๐	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ไต้มน้อย ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ตามแบบอบจ.นนทบุรี	สำนักการช่าง	๒๕,๙๗๕,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ						
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน												
				ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓	
กิจกรรม A สักรว																
กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา																
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																
กิจกรรม e.....																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ระหว่างออกแบบ.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ลาดยาง (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ถนนสาย เลียบคลองประปา (กม.ที่ ๙+๐๓๐ ถึง กม.๑๑+๒๙๕) ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี	สำนักการช่าง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ										
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน													
				๑๔:๒	๑๔:๓	๑๔:๔	๑๔:๕	๑๔:๖	๑๔:๗	๑๔:๘	๑๔:๙	๑๔:๑๐	๑๔:๑๑	๑๔:๑๒	๑๔:๑๓		
กิจกรรม A สำรวจ																	
กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา																	
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																	
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																	
กิจกรรม e.....																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ระหว่างสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนสาย นบ.๓๐๘๖ บ้านบางไทร-บ้านคลองตาซ้อน ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี	สำนักงานการช่าง	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ							
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน														
			๑๔:๕	๑๔:๖	๑๔:๗	๑๔:๘	๑๔:๙	๑๔:๑๐	๑๔:๑๑	๑๔:๑๒	๑๔:๑	๑๔:๒	๑๔:๓	๑๔:๔			
กิจกรรม A สักรวจ																	
กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา																	
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																	
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																	
กิจกรรม e.....																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ระหว่างสำรวจ ออกแบบ.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน														
๑๓	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ต.ทิววัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	สำนักงาน	๕,๒๕๘,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ				☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ				☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ				☐ ๔. ยกเลิกโครงการ		
				กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน											
				ค.ย.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ย.๖๒	ม.ย.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ย.๖๒	เม.ย.๖๓	พ.ย.๖๒	มิ.ย.๖๓	ก.พ.๖๓	ต.ย.๖๒	พ.ย.๖๒			
				กิจกรรม A สำรวจ														
				กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา														
				กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง														
				กิจกรรม d.....														
				กิจกรรม e.....														
รวม																		
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ระหว่างปรับปรุงแบบแปลน ประมาณราคา..... 																		

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
๑๔	โครงการจัดเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่กองราชการต่างๆ	สำนักการช่าง	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	☒ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ				☐ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ				☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ	
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑มี.ค.๖๓)	เดือน											
				ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	พ.ค.๖๓
	กิจกรรม A														
	กิจกรรม b														
	กิจกรรม c														
	กิจกรรม d														
กิจกรรม e															
รวม															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล															
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินครบทุกงวด ตามสัญญาเช่ารถยนต์ เลขที่ 16/2559 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เลขที่ CNTR-0038/60															
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ได้เบิกจ่ายเงินงวดที่ 12 เดือนสิงหาคม 2562.....															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
๑๕	โครงการจ้างเหมาบริษัท รักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ ๒ แห่ง	สำนักงานช่าง	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	☒ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☐ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ					
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน												
			ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	
กิจกรรม A															
กิจกรรม b															
กิจกรรม c															
กิจกรรม d															
กิจกรรม e															
รวม															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล															
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินครบทุกงวดแล้ว ตามสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขที่ ๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑.....															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๑๗	โครงการจ้างดูแลและบำรุงรักษา สนามฟุตบอลนนทบุรีสเตเดียม หมู่ที่ ๙ ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๗๒๐,๐๐๐.๐๐	☒ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน													
			๑๔:๓๓	๑๔:๓๔	๑๔:๓๕	๑๔:๓๖	๑๔:๓๗	๑๔:๓๘	๑๔:๓๙	๑๔:๔๐	๑๔:๔๑	๑๔:๔๒	๑๔:๔๓	๑๔:๔๔		
กิจกรรม A																
กิจกรรม b																
กิจกรรม c																
กิจกรรม d																
กิจกรรม e																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินครบทุกงวดแล้ว ตามสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขที่ ๖๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒....																

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน														
๒๕	โครงการจ่ายเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง	สำนักงานคลัง	๑,๐๐๐,๐๐๐ (โอนลด ๕๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐)	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ														
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑มี.ค. ๖๓)	เดือน														
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓			
	กิจกรรม A																	
	กิจกรรม b																	
	กิจกรรม c																	
	กิจกรรม d																	
	รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																		

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๒๖	โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำคู่มือประกอบ การดำเนินการให้เป็นไป ตามผังเมืองรรมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) สำหรับพนักงานท้องถิ่นใน จังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง	๕๐๐,๐๐๐	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
				เดือน												
				กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ												
				เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๓)												
	กิจกรรม A ส่งมอบงานงวดที่ ๑ รายงานขั้นต้น (Inception Report) วันที่ ๓๐.ก.ย. ๒๕๖๒ และ คณะกรรมการการตรวจรับงานวันที่ ๘.ต.ค. ๒๕๖๒															
กิจกรรม b ส่งมอบงานงวดที่ ๒ รายงานฉบับกลาง (Interim Report) วันที่ ๑๕.ธ.ค. ๒๕๖๒ และ คณะกรรมการการตรวจรับงานวันที่ ๒๓ธ.ค. ๒๕๖๒																
กิจกรรม c ส่งมอบงานงวดที่ ๓ รายงานฉบับสมบูรณ์(Final Report) จำนวน ๓ เล่ม วันที่ ๑๐ม.ค. ๒๕๖๓ และ คณะกรรมการการตรวจรับงาน วันที่ ๑๓.ม.ค. ๒๕๖๓																
กิจกรรม d บริษัทส่งมอบงานคู่มือ ๑๒๐ ในวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๓ และ คณะกรรมการการตรวจรับงาน วันที่ ๒๔ ม.ค.๖๓ เรียบร้อยแล้ว																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :																
ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๒๓	โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพของถนนสาธารณะและจัดทำหมุดพิกัดควบคุมแนวเส้นทางถนนโครงการสายบังคับเพื่อรองรับการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)	กองผังเมือง	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม A ดำเนินการส่งมอบงานในงวดที่ ๒ และได้จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๒๕๖๒ ณ โรงแรมแกรนด์ราชนาถกฤต อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี			๑,๑๔๓,๘๙๖				↔										
กิจกรรม b จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา วันที่ ๒๔ ม.ค.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อบจ.นนทบุรี เพื่อตรวจสอบกลั่นกรองรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) งวดที่ ๒							↔										
กิจกรรม c จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ วันที่ ๖ ก.พ.๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาตรวจสอบรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) งวดที่ ๒			๒,๒๙๕,๓๙๒					↔									
กิจกรรม d จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ วันที่ ๖ ก.พ.๖๓ เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีบริษัทที่ปรึกษาที่ปรึกษา ขอสถวนสิทธิค่าปรับและขยายระยะเวลาดำเนินงาน เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)										↔							
รวม			๓,๔๔๓,๖๘๘														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๒๘	โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)	กองผังเมือง	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน												
				ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	
กิจกรรม A งวดที่ ๑. ส่งมอบเอกสารแผนการดำเนินโครงการ(Project Planning) ที่แสดงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานเมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค.๒๕๖๒ ตรวจรับงานวันที่ ๒๖ ส.ค.๒๕๖๒			๑,๑๙๐,๐๐๐	↔												
กิจกรรม b งวดที่ ๒. ส่งมอบสรุปข้อมูล สรุปความต้องการของโปรแกรม (Requirement Specification) นำเสนอตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมประยุกต์ (Prototype) และจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับซอฟต์แวร์ระดับมาตรฐาน เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๖๒ ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๒๕๖๒			๔,๓๖๐,๐๐๐				↔									
กิจกรรม c งวดที่ ๓. ส่งมอบงานและเอกสารนำเข้าข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับซอฟต์แวร์ระดับมาตรฐาน และจัดหาอุปกรณ์และฮาร์ดแวร์ในการดำเนินโครงการ (System Design) เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๒๕๖๒ ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค.๒๕๖๒			๓,๕๓๐,๐๐๐					↔								
กิจกรรม d งวดที่ ๔. ส่งมอบโปรแกรมประยุกต์ผ่านเว็บและผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่, เอกสารการดำเนินงานงวดที่ ๔. แผนพับ และคู่มือการใช้งานโปรแกรม, คู่มือดูแลรักษาระบบ และคู่มือการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูล เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๖๓ ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๓			๒,๑๔๘,๔๔๐							↔						
รวม			๑๑,๓/๐๘,๔๔๐													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๒๙	โครงการขยายเขตบริการประปาในพื้นที่ที่มีประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน													
			ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
	กิจกรรม A ดำเนินการวางท่อประปา จำนวน ๕๙ เส้นทาง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผู้เข้าร่วม จำนวน ๙ แห่ง															
	กิจกรรม b															
	กิจกรรม c															
	กิจกรรม d															
	รวม	๒๒,๖๙๐,๒๕๖.๕๖														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๓๐	โครงการจ้างเหมาดำเนินการเดินระบบกำจัดขยะ มูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล	กองทรัพยากรฯ	๑๐๕,๐๐๐,๐๐๐ กันเงินไว้ ๖๙,๙๔๓,๓๒๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน												
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
	กิจกรรม A เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๔		๔,๙๓๔,๑๓๐				→									
	กิจกรรม b เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๙		๔,๙๓๔,๑๓๐					→								
	กิจกรรม c เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๐		๔,๙๓๔,๑๓๐						→							
	กิจกรรม d															
	รวม		๒๖,๒๑๔,๕๑๐													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๓๑	โครงการจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยประจำ สถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน- จังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๒,๗๘๐,๕๐๐ กันเงิน ๑,๖๑๐,๖๑๙.๕๔	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม A เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๔			๒๒๙,๙๓๐.๗๘				→										
กิจกรรม b เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๙			๒๒๙,๙๓๐.๗๘					→									
กิจกรรม c เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๐			๒๒๙,๙๓๐.๗๘						→								
กิจกรรม d เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๑			๒๒๙,๙๓๐.๗๘						→								
รวม			๙๑๙,๗๒๓.๑๒														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๓๒	โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอยศูนย์กำจัดขยะหนองบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ กันเงินไว้ ๑๓๙,๖๘๓,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
	กิจกรรม A เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑		๖,๙๔๔,๓๕๐						→								
	กิจกรรม b เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒		๖,๙๔๔,๓๕๐						→								
	กิจกรรม c เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓		๖,๙๔๔,๓๕๐						→								
	กิจกรรม d เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๔		๖,๙๔๔,๓๕๐						→								
	รวม		๒๗,๙๓๗,๔๐๐														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๓๓	โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอยขององค์การ- บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีภายในสถานที่กำจัดมูล ฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ กันเงินไว้ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน														
			ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓			
กิจกรรม A																	
กิจกรรม b																	
กิจกรรม c																	
กิจกรรม d																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเซ็นสัญญา																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๓๔	โครงการจ้างเหมาการจัดมูลฝอยติดเชื้อของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๒๕,๐๐๐,๐๐๐ กันเงินไว้ ๒๕,๙๘๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน												
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
	กิจกรรม A เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๔	๓,๑๒๒,๕๐๐				→										
	กิจกรรม b เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๕	๓,๑๒๒,๕๐๐					→									
	กิจกรรม c เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๖	๓,๑๒๒,๕๐๐						→								
	กิจกรรม d															
	รวม	๙,๓๖๗,๕๐๐														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๓๕	โครงการอาคารล่างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อม อาคารบริการภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อบจ.นบ. ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๕,๐๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๓)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
	กิจกรรม A																
	กิจกรรม b																
	กิจกรรม c																
	กิจกรรม d																
	รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : อยู่ระหว่างการประมาณราคาและจัดทำ TOR																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๓๖	โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ ฝังกลบขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน- จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๓/๘,๓/๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม A																	
กิจกรรม b																	
กิจกรรม c																	
กิจกรรม d																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :จะทำการซื้อขายในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๙ แปลง.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๓๓/	โครงการบ่อปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Pond) ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรี ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๑๑,๕๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม A																	
กิจกรรม b																	
กิจกรรม c																	
กิจกรรม d																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : อยู่ระหว่างการจัดทำประมาณการและจัดทำ TOR																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๓๘	โครงการอาคารอเนกประสงค์ในการบริหารจัดการ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๙,๘๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๓)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
	กิจกรรม A																
	กิจกรรม b																
	กิจกรรม c																
	กิจกรรม d																
	รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : อยู่ระหว่างประมาณราคาและจัดทำ TOR																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๓๙	โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๕๐๐ KVA แบบมีเทอร์โมลเลอร์ลากจูง	กองทรัพยากรฯ	๓,๓๓/๓,๒๕๕	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๓)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม A																	
กิจกรรม b																	
กิจกรรม c																	
กิจกรรม d																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง.....																	
