

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

สารบัญ

หน้า

- ◎ ตารางแสดงสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ๑ – ๙
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒
 - สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ๑๐ – ๑๑
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
 - สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๒ – ๑๓
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑
 - สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ ๑๔ – ๑๗
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 - สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๘ – ๒๑
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑
 - สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ ๒๒ – ๒๙
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 - สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑..... ๓๐ – ๔๖
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 - สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒..... ๕๗ – ๗๙

ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๖๒
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) (จำนวน ๕๕ โครงการ รายละเอียดโครงการปรากฏตามเอกสาร หน้า ๑๐-๓/๙)

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้ แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) จำนวน ๑ โครงการ						
๑) ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียมขนาด ๔,๐๐๐ ที่นั่ง ระยะที่ ๑	สำนักการช่าง			√		
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๑ โครงการ						
๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬาและสะพาน คสล.(ระยะ ๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักการช่าง		√			
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) จำนวน ๓ โครงการ						
๑) ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.สายบ้านไทรน้อย-คลองนาหมอน (นบ.๒๐๔๔) ตำบลคลองขวาง อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักการช่าง		√			
๒) ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียมขนาด ๔,๐๐๐ ที่นั่ง (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักการช่าง			√		
๓) จ้างที่ปรึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	กองทรัพย์ฯ		√			

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๓ โครงการ						
๑) ก่อสร้างรั้วรอบสนามกีฬา หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง		√			
๒) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งสำหรับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ของกองช่าง - รถยนต์ดับเพลิงถังน้ำในถังชนิดโฟม (๓,๕๐๐,๐๐๐) - เรือดับเพลิงกู้ภัย (๑๐,๐๐๐,๐๐๐)	สำนักงานช่าง			√		
๓) จ้างออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แห่งใหม่ แห่งที่ ๓	สำนักงานช่าง		√			
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ จำนวน ๕ โครงการ						
๑) โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเต็มรักศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร- ส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ			√		
๒) โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร- ส่วนจังหวัดนนทบุรี (โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน)	กองการศึกษาฯ		√			

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๓) โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาพิทักษ์นันทเขต หมู่ที่ ๕ ตำบลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง			√		
๔) โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล (เดิม) ให้เป็นสนามหญ้าเทียม ตำบลบางกร่าง อำเภเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง		√			
๕) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบคลองลากค้อน (ตอนที่ ๑) ตำบลราษฎร์นิยม อำเภไทรน้อย เชื่อมต่อดำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง		√			
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑๓ โครงการ						
๑) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมระบบสาธารณูปโภคโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย	กองการศึกษาฯ		√			
๒) โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนบางคูวัด	กองการศึกษาฯ	√				
๓) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง			√		

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๔) โครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือพร้อมสะพานขึ้นลงบริเวณวัดไผ่ล้อม ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานการช่าง			√		
๕) โครงการก่อสร้างถนนมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานเฉลิมศักดิ์-วัดโค่นอน (นบ.๒๐๑๓) ตอนที่ ๓ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี - โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายวัดทางนาปรัง-วัดไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง		√	√		
๖) โครงการจ่ายเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง	สำนักงานการคลัง				√	
๗) โครงการซ่อมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ พร้อมกำแพง คสล. ป้องกันการเคลื่อนตัวของคันทางสาย นบ.๓๐๔๘ บ้านคลองเจ๊ก-บ้านสุเหร่าแดง ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง			√		

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๘) โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร คสล. ใหญ่ทางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ พร้อมกำแพง คสล. ป้องกันการเคลื่อนตัวของคันทางถนนสายเลียบบ คลองตรง ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง		√			
๙) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคันกันน้ำพระอุดม (นบ.๒๐๒๑) ตอนที่ ๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง		√			
๑๐) โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.สายบ้านไทรน้อย-บ้านคลองนาหมอน (นบ.๒๐๔๔) ตอนที่ ๓ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง			√		
๑๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดโปรดเกษ-ถนนหลวงสายชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง		√			
๑๒) โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์คลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง		√			
๑๓) โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บางพลับ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง			√		
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๒๙ โครงการ						
๑) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนซอและฮักศึกษา	กองการศึกษาฯ					√

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๒) โครงการก่อสร้างอาคารลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดแดง	กองการศึกษาฯ			√		
๓) โครงการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดตึก ในสังกัดองค์การบริหาร – ส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	√				
๔) โครงการจัดหาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา จำนวน ๓๓ ห้อง และระดับมัธยมศึกษา ๑ ห้อง	กองการศึกษาฯ	√				
๕) โครงการห้องปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ นวัตกรรมการศึกษา และเทคโนโลยีการศึกษา (โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย)	กองการศึกษาฯ	√				
๖) โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	กองการศึกษาฯ	√				
๗) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย นบ.๔๐๒๑ บ้านหนองนก-ทางเขน-บ้าน เต็มรัก ต.บางคูรัด อ.บางคูรัด จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง			√		
๘) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกษตรพัฒนา ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง		√			
๙) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบบคลองใต้ใหม่ฝั่งตะวันตก ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง			√		

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๑๐) โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองลากค้อน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๕ ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย เชื่อมต่อ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานการช่าง			√		
๑๑) โครงการก่อสร้าง คสล.สายเลียบคลองสอง หมู่ที่ ๔ ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานการช่าง		√			
๑๒) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และราวเหล็กกั้นตถนนสายเลียบคลองประปามหาสวัสดิ์ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณสามอำเภอ คือ อ.บางใหญ่ อ.บางบัวทอง และ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานการช่าง			√		
๑๓) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ใต้ถุน ตำบลขุนศรี อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง			√		
๑๔) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง (โดยวิธี PAVEMENT IN -PLACE RECYCLING) ถนนสายเลียบคลองประปา (กม.ที่ ๙+๐๓๐ ถึง กม.ที่ ๑๑+๒๙๕) ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี	สำนักงานการช่าง			√		
๑๕) โครงการก่อสร้างถนนสาย นบ ๓๐๘๖ บ้านบางไทร บ้านคลองตาซ้อ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง			√		

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๑๖) โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลทิววัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง			√		
๑๗) โครงการจ่ายเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง	สำนักงานการคลัง				√	
๑๘) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาสำรวจ จัดเก็บข้อมูลทางกายภาพของถนนสาธารณะและจัดทำหมุดพิกัด ควบคุมแนวเส้นทางถนนโครงการสายบังคับ เพื่อรองรับการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)	กองผังเมือง		√			
๑๙) โครงการขยายเขตบริการประปาในพื้นที่ที่มีประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง		√			
๒๐) โครงการจ้างเหมาดำเนินการเดินระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล	กองทรัพยากรฯ	√				
๒๑) โครงการจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยประจำสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	√				
๒๒) โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัด น้ำชะขยะมูลฝอยศูนย์กำจัดขยะ นนทบุรี	กองทรัพยากรฯ		√			
๒๓) โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ			√		

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๒๔) โครงการจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	√				
๒๕) โครงการก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ			√		
๒๖) โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	กองทรัพยากรฯ	√				
๒๗) โครงการบ่อปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Pound) ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ			√		
๒๘) โครงการอาคารอเนกประสงค์ในการบริหารจัดการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ			√		
๒๙) โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๕๐๐KVA แบบมีเทอร์ลเลอร์ลากจูง	กองทรัพยากรฯ			√		
รวม		๙	๑๙	๒๔	๒	๑
รวมจำนวนทั้งสิ้น		๕๕				

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

(เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวประชุมไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓ ซึ่งมีจำนวน ๑ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๕๘) จำนวน ๑ โครงการ

PERT / CPM / S-CURV (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๑	ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาด ๔,๐๐๐ ที่นั่ง ระยะที่ ๑	สำนักการช่าง	๑๒๔,๔๕๒,๐๐๐.๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ		☐ ๔.ยกเลิกโครงการ							
				เดือน													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	๑๔/๖/๕๘	๑๔/๗/๕๘	๑๔/๘/๕๘	๑๔/๙/๕๘	๑๔/๑๐/๕๘	๑๔/๑๑/๕๘	๑๔/๑๒/๕๘	๑๕/๑/๕๙	๑๕/๒/๕๙	๑๕/๓/๕๙	๑๕/๔/๕๙	๑๕/๕/๕๙	๑๕/๖/๕๙	
กิจกรรม A.....ออกแบบ..ประมาณราคา.....																	
กิจกรรม b.....จัดจ้าง.....																	
กิจกรรม c.....ดำเนินการตามสัญญา.....																	
กิจกรรม d.....																	
กิจกรรม e.....																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล.....																	
ขั้นตอน / เหตุผล / ผลกระทบ :เสนอขออนุมัติราคากลาง/TOR.....																	

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓ ซึ่งมีจำนวน ๑ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๕๙) จำนวน ๑ โครงการ

PERT/CPM/S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬาและสะพาน คสล. (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓. ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ												
				เดือน												
				กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ												๑๐๐%
				เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๓)												
				๑๔/๖	๑๕/๖	๑๖/๖	๑๗/๖	๑๘/๖	๑๙/๖	๒๐/๖	๒๑/๖	๒๒/๖	๒๓/๖	๒๔/๖	๒๕/๖	
				กิจกรรม A งานงวดที่ ๑.	๑,๘๙๒,๘๐๐.๐๐	๑,๘๙๒,๘๐๐.๐๐										๘๕
				กิจกรรม B งานงวดที่ ๒.	๑,๐๒๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๒๙,๐๐๐.๐๐										๖๑
				กิจกรรม C งานงวดที่ ๓.	๒,๗๐๔,๘๐๐.๐๐	๒,๗๐๔,๘๐๐.๐๐										๓๘
				กิจกรรม D งานงวดที่ ๔.	๗,๐๒๔,๔๐๐.๐๐											๑๕
				กิจกรรม E งานงวดที่ ๕.	๑,๑๖๙,๐๐๐.๐๐											๐
				รวม	๑๓,๘๒๐,๐๐๐.๐	๕,๖๒๖,๖๐๐.๐๐										

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล

ขั้นตอน / เหตุผล / ผลกระทบ : ..สัญญาจ้างเลขที่ ๗๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้าย ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ แก้ไขงวดงาน

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

(เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓ ซึ่งมีจำนวน ๓ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๕๙) จำนวน ๒ โครงการ

PERT / CPM / S-CURV (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑	ก่อสร้างขยายผิวจราจร คลส.สาย คลองนาหมอน (นบ ๒๐๔๔) ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	๑๑๑,๑๗๗,๓๓๔.๐๐ โอนงบประมาณเพิ่ม ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๑,๑๗๗,๓๓๔.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ																			
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓)	เดือน																๑๐๐%							
			ต.ย.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ย.๖๒	ม.ย.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ย.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ต.ค.๖๓	ก.ย.๖๓	ต.ย.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ย.๖๓	ม.ย.๖๓	ก.พ.๖๔	มี.ย.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	๑๐๐%	
กิจกรรม A.....งานงวดที่ ๑.....๑๑,๔๗๔,๑๐๐....																										๕๑.๐๐
กิจกรรม b.....งานงวดที่ ๒.....๑๑,๔๗๔,๑๐๐....																										๘๒.๕๐
กิจกรรม c.....งานงวดที่ ๓.....๑๑,๔๗๔,๑๐๐....																										๗๑.๐๐
กิจกรรม d.....งานงวดที่ ๔.....๑๑,๔๗๔,๑๐๐....																										๖๐.๕๐
กิจกรรม e.....งานงวดที่ ๕.....๑๔,๔๙๓,๖๐๐....																										๕๐.๐๐
กิจกรรม f.....งานงวดที่ ๖.....๑๒,๖๘๑,๙๐๐....																										๓๘.๐๐
กิจกรรม g.....งานงวดที่ ๗.....๑๒,๖๘๑,๙๐๐....																										๒๘.๕๐
กิจกรรม h.....งานงวดที่ ๘.....๑๓,๘๘๙,๗๐๐....																										๑๙.๐๐
กิจกรรม i.....งานงวดที่ ๙.....๑๐,๒๖๖,๓๐๐....																										๙.๕๐
กิจกรรม j.....งานงวดที่ ๑๐.....๑๐,๘๗๐,๒๐๐....																										๐.๐๐
รวม																										

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล

ขั้นตอน / เหตุผล / ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๑ เมษายน ๒๕๖๔.....

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๕๙) จำนวน ๒ โครงการ

PERT / CPM / S-CURV (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๒	ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาด ๔,๐๐๐ ที่นั่ง (ระยะที่๒) หมู่ที่ ๙ ต.บางเลน อ.บางใหญ่	สำนักงานช่าง	๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ				☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ				☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ				☐ ๔.ยกเลิกโครงการ
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	เดือน												
				๑๔/๖๔	๑๔/๖๕	๑๔/๖๖	๑๔/๖๗	๑๔/๖๘	๑๔/๖๙	๑๔/๗๐	๑๔/๗๑	๑๔/๗๒	๑๔/๗๓	๑๔/๗๔	๑๔/๗๕	
กิจกรรม A.....ออกแบบ..ประมาณราคา.....																
กิจกรรม b.....จัดจ้าง.....																
กิจกรรม c.....ดำเนินการตามสัญญา.....																
กิจกรรม d.....																
กิจกรรม e.....																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล.....																
ขั้นตอน / เหตุผล / ผลกระทบ :เสนอขออนุมัติราคากลาง/TOR.....																

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๓	จ้างที่ปรึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	กองทรัพยากรฯ	๒๕,๐๐๐,๐๐๐ กัณเงิน ๑๓,๔๓๖,๒๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
	กิจกรรม A																
	กิจกรรม b																
	กิจกรรม c																
	กิจกรรม d																
	กิจกรรม e																
	รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์เพิ่มเติม.....																	

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓ ซึ่งมีจำนวน ๓ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๓ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐) จำนวน ๓ โครงการ

PERT/CPM/S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๑	โครงการก่อสร้างรั้วรอบสนามกีฬา หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑๒,๔๓๙,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ						
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	เดือน												
				๑๔:๕๕	๑๔:๕๗	๑๔:๕๙	๑๕:๐๑	๑๕:๐๓	๑๕:๐๕	๑๕:๐๗	๑๕:๐๙	๑๕:๑๑	๑๕:๑๓	๑๕:๑๕	๑๕:๑๗	
	กิจกรรม A สสำรวจ															
	กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา															
	กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง															
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																
กิจกรรม e.....																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ : อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง.....																

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมชนบทให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๒	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับการปฏิบัติงานในความ รับผิดชอบของกองช่าง ๑.รถยนต์ดับเพลิงถึงน้ำถึงชนิดโฟม ๗,๕๐๐,๐๐๐ ๒.เรือดับเพลิงกู้ภัย ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	๑๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ				☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ				☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ				☐ ๔. ยกเลิกโครงการ
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๖)	เดือน												
				๑๖:๕	๑๖:๗	๑๖:๘	๑๖:๙	๑๖:๑๐	๑๖:๑๑	๑๖:๑๒	๑๖:๑	๑๖:๒	๑๖:๓	๑๖:๔	๑๖:๕	๑๖:๖
กิจกรรม A สอบถามราคาผู้จัดจำหน่าย																
กิจกรรม b จัดทำร่างขอบเขต (TOR)																
กิจกรรม c จัดซื้อจัดจ้าง																
กิจกรรม d																
กิจกรรม e.....																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ซึ่งได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะแล้วเสร็จขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบและกำหนดราคากลาง และได้อนุมัติเงินเพื่อขยายเวลาเบิกจ่ายเงินจากผู้ว่าราชการจังหวัด																
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นบ ๕๑๐๐๕/๒๐๓๘ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติ TOR																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๓	จ้างออกแบบอาคารสำนักงาน อบจ.นนทบุรีแห่งใหม่ แห่งที่ ๓	สำนักงานช่าง	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๓,๘๒๐,๐๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ							
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓)	เดือน													
				ม.ค.๖๓	ม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓	ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	๑๐๐%		
กิจกรรม A งานงวดที่ ๑ (๓๘๒,๐๐๐)			๓๘๒,๐๐๐.๐๐												๗๐		
กิจกรรม b งานงวดที่ ๒ (๗๖๔,๐๐๐)			๗๖๔,๐๐๐.๐๐												๕๐		
กิจกรรม c งานงวดที่ ๓ (๗๖๔,๐๐๐)			๗๖๔,๐๐๐.๐๐												๓๐		
กิจกรรม d งานงวดที่ ๔ (๗๖๔,๐๐๐)															๑๐		
กิจกรรม e งานงวดที่ ๕ (๑,๑๔๖,๐๐๐)															๐		
รวม			๑,๙๑๐,๐๐๐.๐๐														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ.....อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาจ้าง ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓.....																	

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓ ซึ่งมีจำนวน ๕ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๕ โครงการ


ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓


ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๑	โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเต็มรัก ศึกษา ในสังกัด อบจ.นนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๑๑,๓๘๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓)	เดือน														
ต.ค. ๖๒			พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓				
	กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง							→									
	กิจกรรม b ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตรวจสอบราคากลาง								→								
	กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง									→							
	กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง										→						
	รวม																

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :


ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างการประกวดราคา.....

โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเต็มรักศึกษาในสังกัด อบจ.นนทบุรี

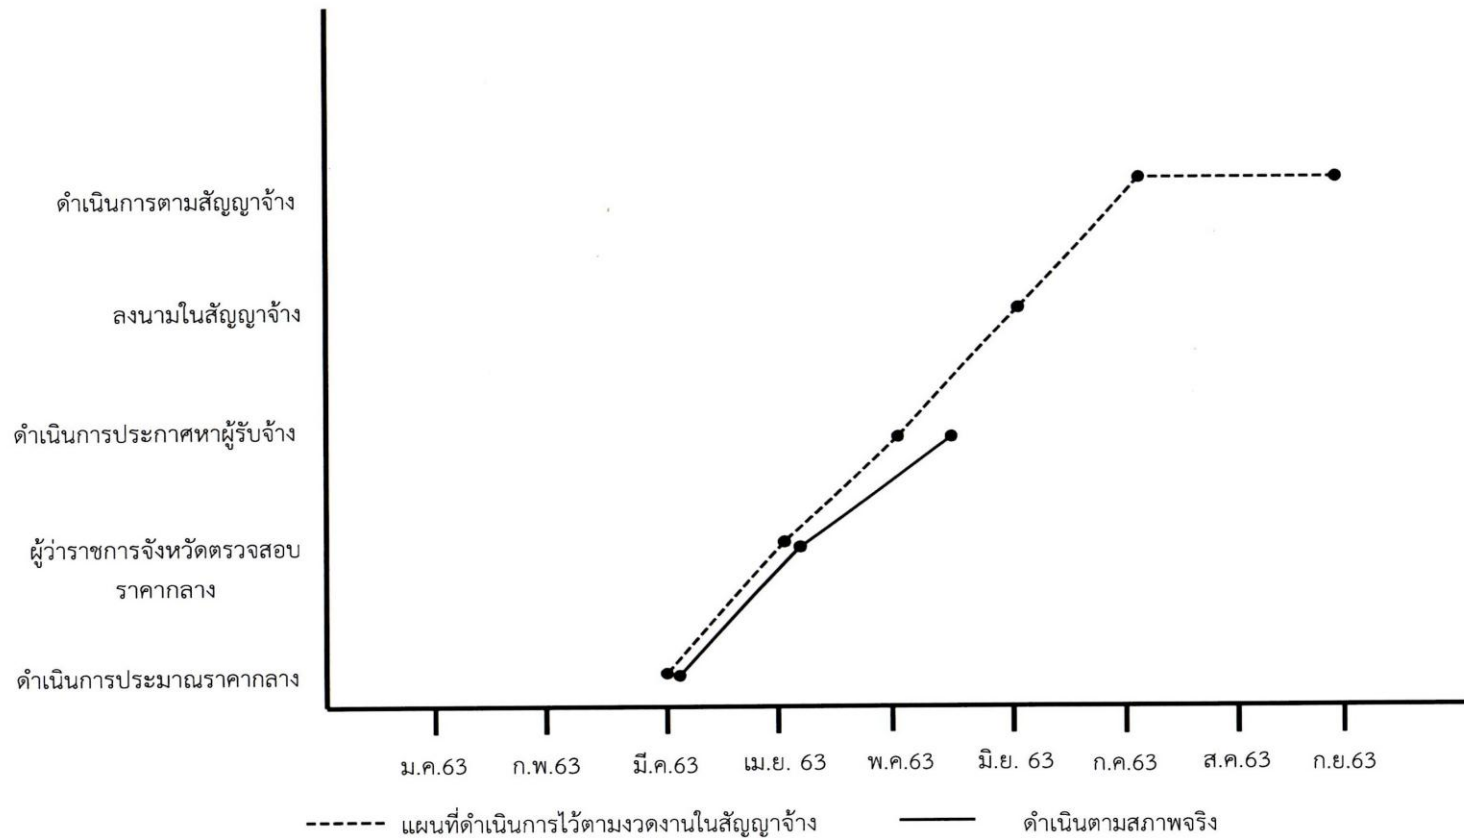

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๒	โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บริเวณโรงเรียนสังกัด อบจ.นนทบุรี (โรงเรียน สุเหล่าลากค้อน)	กองการศึกษาฯ	๒,๓/๘๒,๖๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง																	
กิจกรรม b ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตรวจสอบราคากลาง																	
กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง																	
กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง																	
กิจกรรม e ดำเนินการตามสัญญาจ้าง																	
รวม			๑,๙๓๘,๐๐๐														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๓๑/๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค.๖๓ วันสิ้นสุด ๒๙ พ.ค.๖๓ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว.....																	

โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนสังกัด อบจ.นนทบุรี (โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน)

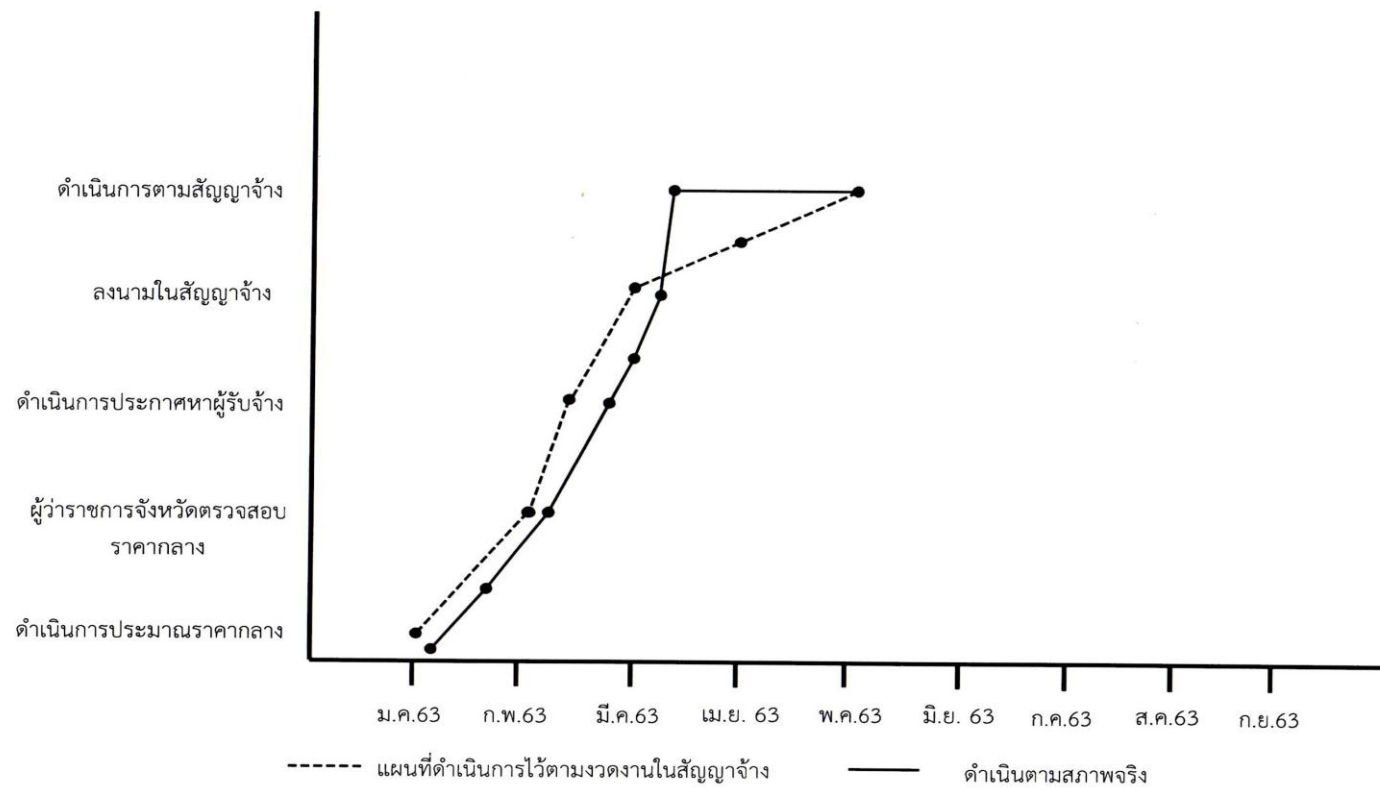

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑
(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐) จำนวน ๓ โครงการ
PERT/CPM/S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน														
๓	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พิทักษ์นทเขต หมู่ที่ ๕ ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักการช่าง	๙,๔๑๓,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ								
				กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๓)		เดือน												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ธ.ค.	
						รวม												
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ : ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง..... 																		

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๔	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล (เดิม) สนามหญ้าเทียม ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตามรูปแบบรายละเอียดข้อกำหนด อบจ.นนทบุรี	สำนักงานการช่าง	๔๐,๘๙๖,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ						
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	เดือน													
			มิ.ย.๖๓	ก.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓	ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ย.๖๓	ก.พ.๖๔	มี.ย.๖๔	เม.ย.๖๔	๑๐๐%		
กิจกรรม	งวดที่ ๑	๓,๒๕๕,๙๒๐												๙๕		
กิจกรรม	งวดที่ ๒	๘,๑๓๙,๘๐๐												๕๗		
กิจกรรม	งวดที่ ๓	๖,๕๑๑,๘๔๐												๔๔		
กิจกรรม	งวดที่ ๔	๕,๒๙๐,๘๗๐												๒๘		
กิจกรรม	งวดที่ ๕	๑๕,๔๖๕,๖๒๐												๘		
กิจกรรม	งวดที่ ๖	๒,๐๓๔,๙๕๐												๐		
รวม		๔๐,๖๙๙,๐๐๐														

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล

ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๔๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔.....

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ										
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เลียบบคลองลากค้อน (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๕ ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย เชื่อมต่อ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑๖,๒๓๔,๐๐๐.๐๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๑๒,๑๖๐,๐๐๐														
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	เดือน ก.พ.๖๓ มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓ พ.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓ ส.ค.๖๓ ก.ย.๖๓ ต.ค.๖๓ พ.ย.๖๓ ธ.ค.๖๓ ๑๐๐%														
กิจกรรม A งวดที่ ๑ (๔,๘๖๔,๐๐๐)																	
กิจกรรม b งวดที่ ๒ (๓,๐๔๐,๐๐๐)																	
กิจกรรม c งวดที่ ๓ (๔,๒๕๖,๐๐๐)																	
กิจกรรม d.....																	
กิจกรรม e.....																	
รวม ๑๖,๑๖๐,๐๐๐																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓.....																	

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓ ซึ่งมีจำนวน ๑๓ โครงการ)


จากการติดตามไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๑๑ โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ จำนวน ๑ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓


ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน														
๑	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมระบบสาธารณูปโภคโรงเรียนนันทบุรีวิทยาลัย	กองการศึกษาฯ	๔๑,๑๓/๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ														
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓)	เดือน														
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓			
	กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง																	
	กิจกรรม b ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตรวจสอบราคากลาง																	
	กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง																	
	กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง																	
	กิจกรรม e ดำเนินการตามสัญญาจ้าง																	
	เบิกจ่ายงวดที่ ๑ – ๖		๒๖,๑๒๖,๖๙๙	←————→														
	เบิกจ่ายงวดที่ ๗ – ๑๒		๔๔,๔๘๖,๐๐๑							←————→								
	รวม		๓/๐,๓/๑๒,๓/๐๐															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๖๓/๖๒ ลงวันที่ ๕ ก.ค.๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๔ ก.ค.๖๓ เบิกจ่ายแล้ว																		

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมระบบสาธารณูปโภคโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

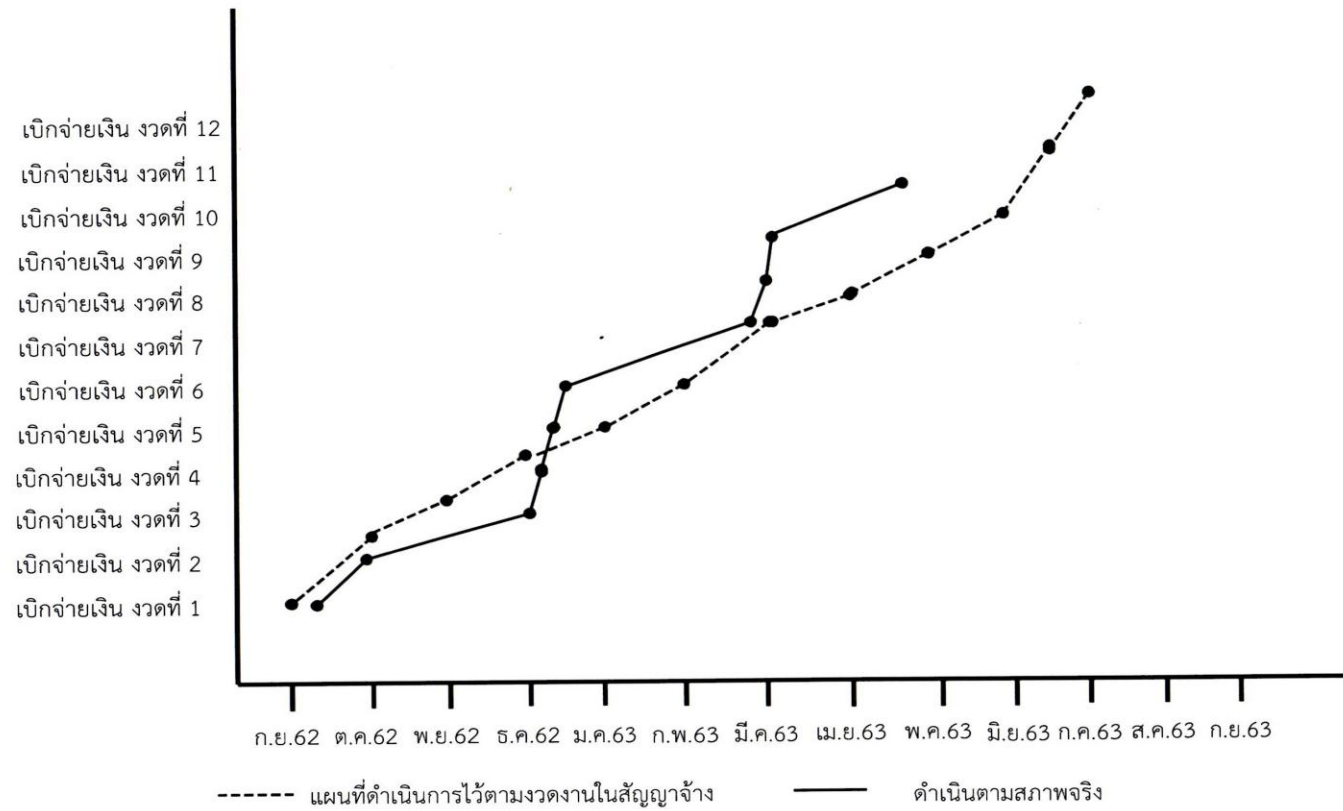

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๒	โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนบางคูรัด	กองการศึกษาฯ	๓๕,๕๕๘,๐๐๐	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
	กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง																
	กิจกรรม b ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตรวจสอบราคากลาง																
	กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง																
	กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง																
	กิจกรรม e ดำเนินการตามสัญญาจ้าง เบิกจ่ายงวดที่ ๑ – ๖ เบิกจ่ายงวดที่ ๗ – ๑๐		๑๔,๕๑๕,๑๖๐ ๑๘,๔๓๓,๔๘๐														
	รวม		๓๒,๘๙๘,๐๐๐														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๒๖/๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๒ สิ้นสุด ๑๒ ก.ย.๖๓.....																	

โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนบางคูรัด

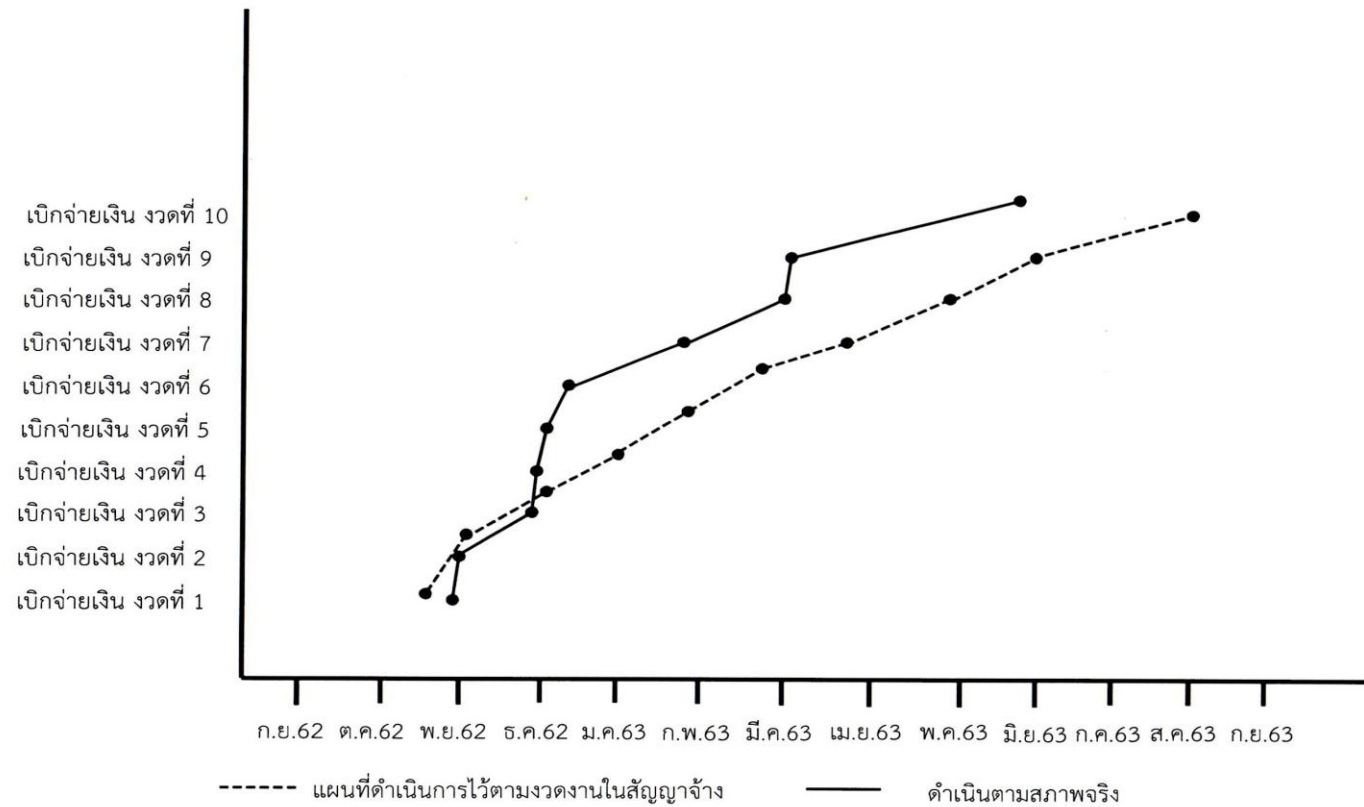

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๖๑) จำนวน ๑๐ โครงการ

PERT/CPM/S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
๓	โครงการการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง	๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ					
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓)	เดือน											
				๑๖:๓๐	๑๖:๔๕	๑๖:๕๐	๑๖:๕๕	๑๗:๐๐	๑๗:๐๕	๑๗:๑๐	๑๗:๑๕	๑๗:๒๐	๑๗:๒๕	๑๗:๓๐	
	กิจกรรม Aสำรวจ.....														
	กิจกรรม b ..ออกแบบ งบประมาณราคา..														
	กิจกรรม cจัดจ้าง.....														
	กิจกรรม dดำเนินการตามสัญญา..														
	กิจกรรม e														
		รวม													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างออกแบบ.....															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ								
๔	โครงการการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือ พร้อมสะพานขึ้นลงบริเวณวัดไผ่ล้อม ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๒,๔๗๕,๐๐๐.๐๐												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	เดือน											
				ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
	กิจกรรม A สักรว														
	กิจกรรม b ออกแบบประมาณราคา														
	กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง														
	กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา														
	กิจกรรม e														
		รวม													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล															
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :ประมาณราคา/ตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้าง เนื่องจากมีหน่วยงานมาทำการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือในตำแหน่งเดียวกัน.....															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๕	โครงการก่อสร้างถนนมาตรฐานทางหลวง ท้องถิ่น จำนวน ๓ โครงการ	สำนักการช่าง	๑๘,๘๗๒,๔๙๖.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ												
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพาน เฉลิมศักดิ์-วัดโคกนอน (นบ.๒๐๑๓) ตอนที่ ๓ ตำบลบางศรีทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี		๕,๓๓๔,๐๐๐.๐๐													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓)	เดือน												
				พ.ค.๖๓	พ.ค.๖๓	พ.ค.๖๓	พ.ค.๖๓	พ.ค.๖๓	พ.ค.๖๓	พ.ค.๖๓	พ.ค.๖๓	พ.ค.๖๓	พ.ค.๖๓	พ.ค.๖๓	พ.ค.๖๓	๑๐๐%
	กิจกรรม A งวดที่ ๑	๑,๔๕๗,๗๖๗.๐๐														๕๓
	กิจกรรม b งวดที่ ๒	๑,๗๓๖,๑๓๓.๐๐														๐
	กิจกรรม c															
กิจกรรม d																
กิจกรรม e																
รวม		๓,๖๙๓,๙๐๐.๐๐														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายวัดทองนาปรัง-วัดไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลบางศรีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง	๔,๑๖๕,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ						
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	เดือน												
				ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	
กิจกรรม A สำรวจ																
กิจกรรม b ออกแบบประมาณราคา																
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																
กิจกรรม e																
รวม			-													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ : งบประมาณราคา																

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๖	โครงการจ่ายเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง	สำนักงานคลัง	๕๐๐,๐๐๐ โอนลด ๒๕๐,๐๐๐.- คงเหลือ ๒๕๐,๐๐๐.-	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม A																	
กิจกรรม b																	
กิจกรรม c																	
กิจกรรม d																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ								
๗	โครงการซ่อมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์-คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ พร้อมกำแพง คสล. ป้องกันการเคลื่อนตัวของคันทางสาย นบ.๓๐๘๘ บ้านคลองเจ๊ก - บ้านสุเหร่าแดง ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง	๓๖,๑๔๐,๐๐๐.๐๐												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐มิ.ย.๖๓)	เดือน											
				ค.ย.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	พ.ย.๖๓
กิจกรรม A สักรวจออกแบบ															
กิจกรรม b ประมาณราคา															
กิจกรรม c จัดซื้อจัดจ้าง															
กิจกรรม d															
กิจกรรม e															
รวม															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล															
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :ดำเนินการสำรวจออกแบบ.....															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๘	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร คสล. ไหล่ทางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ พร้อมกำแพง คสล. ป้องกันการเคลื่อนตัวของคันทาง ถนนสายเลียบคลองตรง ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง	๒๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ							
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	เดือน													
				มิ.ย. ๖๓	ก.ย. ๖๓	ธ.ย. ๖๓	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔	ธ.ย. ๖๔	ก.พ. ๖๕	๑๐๐%	
	กิจกรรม A งานงวดที่ ๑	๕,๑๘๑,๑๐๐.๐๐														๘๒	
	กิจกรรม b งานงวดที่ ๒	๗,๖๗๓,๘๐๐.๐๐														๕๗	
	กิจกรรม c งานงวดที่ ๓	๕,๖๔๒,๕๐๐.๐๐														๒๓	
	กิจกรรม d งานงวดที่ ๔	๔,๐๖๒,๖๐๐.๐๐														๐	
กิจกรรม e																	
รวม	๒๒,๕๖๐,๐๐๐.๐๐																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ								
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคันกันน้ำพระอุดม(นบ.๒๐๒๑) ตอนที่ ๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑๒,๐๖๐,๐๐๐.๐๐												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐มิ.ย.๖๓)	เดือน											
				๑๔.๖	๑๔.๗	๑๔.๘	๑๔.๙	๑๕.๐	๑๕.๑	๑๕.๒	๑๕.๓	๑๕.๔	๑๕.๕	๑๐๐%	
	กิจกรรม A งานงวดที่ 1	๔,๐๒๗,๔๔๘.๙๔	๔,๐๒๗,๔๔๘.๙๔											๗๗	
	กิจกรรม b งานงวดที่ 2	๒,๘๖๓,๙๙๙.๒๔												๔๕	
	กิจกรรม c งานงวดที่ 3	๒,๐๕๘,๔๙๙.๘๖												๐	
	กิจกรรม d														
	กิจกรรม e														
	รวม	๘,๙๔๙,๙๙๗.๖๔	๘,๐๒๗,๔๔๘.๙๔												
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล															
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ตรวจงานงวดที่ ๑ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓.....															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๑๐	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล สายบ้านไทรน้อย-บ้านคลองนาหมอน (นบ.๒๐๔๔) ตอนที่ ๓ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักการช่าง	๖๒,๙๓๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ			☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ			☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ			☐ ๔. ยกเลิกโครงการ			
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	เดือน													
			ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓		
กิจกรรม A สำรอง																
กิจกรรม b ออกแบบประมาณราคา																
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																
กิจกรรม e																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :ผู้ชนะประกวดราคาถูกแจ้งเวียนเป็นผู้ทำงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดโปรดเกษ-ถนนหลวงสายชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักการช่าง	๑๐,๘๐๒,๐๐๐.๐๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๗,๗๓๘,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ			☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ			☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ			☐ ๔. ยกเลิกโครงการ			
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	เดือน												
				มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	๑๐๐%
	กิจกรรม A งวดที่ ๑	๒,๕๕๕,๘๖๑.๔๐	๒,๕๕๕,๘๖๑.๔๐													๖๒.๒
	กิจกรรม b งวดที่ ๒	๒,๒๕๗,๑๗๔.๖๐														๓๓.๐๓
	กิจกรรม c งวดที่ ๓	๒,๙๒๔,๙๖๔.๐๐														๐
	กิจกรรม d															
	กิจกรรม e															
รวม		๗,๗๓๘,๐๐๐.๐๐	๒,๕๕๕,๘๖๑.๔๐													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๔ เมษายน ๒๕๖๓																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
	โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ คลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑๔,๘๓๒,๐๐๐.๐๐													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	เดือน												
				พ.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓	ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	๑๐๐%	
	กิจกรรม A งานงวดที่ ๑	๔๓๐,๕๐๐.๐๐													๗๒.๕	
	กิจกรรม b งานงวดที่ ๒	๓,๔๔๔,๐๐๐.๐๐													๕๕.๕	
	กิจกรรม c งานงวดที่ ๓	๒,๔๕๒,๐๐๐.๐๐													๓๑.๕	
	กิจกรรม d งานงวดที่ ๔	๒,๐๙๑,๐๐๐.๐๐													๓.๕	
	กิจกรรม e งานงวดที่ ๕	๓,๓๘๒,๕๐๐.๐๐													๐	
	รวม	๑๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน														
	โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาหอเนกประสงค์ บางพลับ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง	๒๗,๑๒๓,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ											
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	เดือน														
				๑๔/๖๓	๑๕/๖๓	๑๖/๖๓	๑๗/๖๓	๑๘/๖๓	๑๙/๖๓	๒๐/๖๓	๒๑/๖๓	๒๒/๖๓	๒๓/๖๓	๒๔/๖๓	๒๕/๖๓			
กิจกรรม A สักรว																		
กิจกรรม b ออกแบบประมาณราคา																		
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																		
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																		
กิจกรรม e																		
รวม																		
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																		
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง.....																		

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓ มีจำนวน ๒๙ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๑๙ โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ
- ยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒) จำนวน ๒๙ โครงการ

PERT / CPM / S-CURVE(ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๑	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนชอและฮัศึกษา	กองการศึกษาฯ	๖,๕๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ๔.ยกเลิกโครงการ													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
	กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง											↔					
	กิจกรรม b อนุมัติราคากลาง																
	กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง																
	กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง																
	รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :ยกเลิกโครงการในปี ๒๕๖๒ เพื่อมาดำเนินการตั้งงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่ในปี ๒๕๖๓.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๒	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดแดง	กองการศึกษาฯ	๘,๓๘๔,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓)	เดือน												
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง				← →												
กิจกรรม b อนุมัติราคากลาง																
กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง																
กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง และ TOR ยังไม่มีการเบิกจ่าย.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๓	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนวัดตึก ในสังกัดองค์การบริหารส่วน- จังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษา	๔๔๐,๐๐๐	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง																	
กิจกรรม b อนุมัติราคากลาง																	
กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง							←→										
กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง									↔								
กิจกรรม e ดำเนินการตามสัญญาจ้าง										↔							
รวม			๔๔๐,๐๐๐														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : สัญญาเลขที่ ๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ เม.ย.๖๓ สิ้นสุด ๑๕ มิ.ย.๖๓ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๔	โครงการจัดหาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับ ประถมศึกษา จำนวน ๓๓ ห้อง และระดับ มัธยมศึกษา ๑ ห้อง	กองการศึกษาฯ	๓๔,๙๙๖,๓๖๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
				กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓)	เดือน										
	ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒				ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
	กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง																
	กิจกรรม b ขออนุมัติราคากลาง																
	กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง																
	กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง																
	กิจกรรม e ดำเนินการตามสัญญาจ้าง								↔								
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุ ยังไม่มีการเบิกจ่าย.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน										
๕	โครงการห้องปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ นวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา (โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย)	กองการศึกษาฯ	๒,๔๘๓,๔๐๐	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ										
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓)	เดือน											
			ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓
	กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง						↔							
	กิจกรรม b อนุมัติราคากลาง							↔						
	กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง								↔					
	กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง								↔					
	กิจกรรม e ดำเนินการตามสัญญาจ้าง								↔	→				
	รวม	๒,๔๓๓,๐๐๙.๓๕												
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :เลขที่สัญญา ๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว.....														

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๖	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	กองการศึกษาฯ	๒๘,๐๕๐,๐๐๐	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓)	เดือน													
				ก.ย. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง								↕									
กิจกรรม b ขออนุมัติราคากลาง									↕								
กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง									↕								
กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง										↕							
กิจกรรม e ดำเนินการตามสัญญาจ้าง										↕							
รวม			๒๓,๒๙๓,๔๓๖.๖๔														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :เลขที่สัญญา ๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว.....																	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๖๒) จำนวน ๑๑ โครงการ

PERT / CPM / S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย นบ.๔๐๒๑ บ้านหนองนกยางเขน- บ้านเต็มรัก ต.บางคูรัด อ.บางคูรัด จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๗,๒๕๓,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ						
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	เดือน													
			๑๔:๔๕	๑๔:๕๕	๑๕:๐๕	๑๕:๑๕	๑๕:๒๕	๑๕:๓๕	๑๕:๔๕	๑๕:๕๕	๑๖:๐๕	๑๖:๑๕	๑๖:๒๕	๑๖:๓๕	๑๖:๔๕	
กิจกรรม A สำรวจ																
กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา																
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																
กิจกรรม d																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา.....																

ติดตามผลงานปี ๒๕๖๐ เงินเหลือจ่าย (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) / กองช่าง/งานถนน
สำรวจข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน															
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เกษตรพัฒนา ต.คลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๓๕,๐๓๒,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ				☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ				☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ				☐ ๔. ยกเลิกโครงการ			
				กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓)	เดือน												
							ม.ค./ป	ก.พ./ป	มี.ค./ป	เม.ย./ป	พ.ค./ป	มิ.ย./ป	ก.ค./ป	ส.ค./ป	ก.ย./ป	ต.ค./ป	ธ.ค./ป	๑๐๐%	
				กิจกรรม งานงวดที่ ๑ (๖,๘๑๗,๕๐๐)															๗๖
				กิจกรรม งานงวดที่ ๒ (๗,๓๒๒,๕๐๐)															๕๖
				กิจกรรม งานงวดที่ ๓ (๕,๐๕๐,๐๐๐)															๒๗
				กิจกรรม งานงวดที่ ๔ (๖,๐๖๐,๐๐๐)															๐
				รวม ๒๕,๒๕๐,๐๐๐															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๕ เมษายน ๒๕๖๔..... 																			

ติดตามผลงานปี ๒๕๖๐ เงินเหลือจ่าย (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) / กองช่าง/งานถนนวัดน้
สำรวจข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เลียบคลองโตะใหม่ฝั่งตะวันตก ต.บางคูวัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานการช่าง	๓๑,๙๓๘,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ			☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ			☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ			☐ ๔. ยกเลิกโครงการ			
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐มิ.ย.๖๓)	เดือน												
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
กิจกรรม A สักรว																
กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา																
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																
กิจกรรม e.....																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ระหว่างประมาณราคา.....																

ติดตามผลงานปี ๒๕๖๐ เงินเหลือจ่าย (โอนทิ้งจ่ายเป็นรายการใหม่) / กองช่าง/งานถนนวัดน้
 สักรวข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																																																																																																																					
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เลียบคลองลากค้อน (ตอน ๒) ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานการช่าง	๑๗,๙๕๘,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ																																																																																																															
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	เดือน <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>๑๔:๕๕</th> <th>๑๔:๕๖</th> <th>๑๔:๕๗</th> <th>๑๔:๕๘</th> <th>๑๔:๕๙</th> <th>๑๕:๐๐</th> <th>๑๕:๐๑</th> <th>๑๕:๐๒</th> <th>๑๕:๐๓</th> <th>๑๕:๐๔</th> <th>๑๕:๐๕</th> <th>๑๕:๐๖</th> <th>๑๕:๐๗</th> <th>๑๕:๐๘</th> <th>๑๕:๐๙</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">กิจกรรม A สำรอง</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">กิจกรรม e.....</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">รวม</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>														๑๔:๕๕	๑๔:๕๖	๑๔:๕๗	๑๔:๕๘	๑๔:๕๙	๑๕:๐๐	๑๕:๐๑	๑๕:๐๒	๑๕:๐๓	๑๕:๐๔	๑๕:๐๕	๑๕:๐๖	๑๕:๐๗	๑๕:๐๘	๑๕:๐๙	กิจกรรม A สำรอง															กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา															กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง															กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา															กิจกรรม e.....															รวม														
๑๔:๕๕	๑๔:๕๖	๑๔:๕๗	๑๔:๕๘	๑๔:๕๙	๑๕:๐๐	๑๕:๐๑	๑๕:๐๒	๑๕:๐๓	๑๕:๐๔	๑๕:๐๕	๑๕:๐๖	๑๕:๐๗	๑๕:๐๘	๑๕:๐๙																																																																																																											
กิจกรรม A สำรอง																																																																																																																									
กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา																																																																																																																									
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																																																																																																																									
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																																																																																																																									
กิจกรรม e.....																																																																																																																									
รวม																																																																																																																									
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																																																																																																																									
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ระหว่างประมาณราคา.....																																																																																																																									

ติดตามผลแบบปี ๒๕๖๐ เงินเหลือจ่าย (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) / กองช่าง/งานถนนวัฒนธรรม
 สํารวจข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เลียบคลองสอง หมู่ที่ ๔ ต.ทิววัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๖,๘๓๓,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ						
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	เดือน พ.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓ ธ.ค.๖๓ ก.พ.๖๓ ต.ค.๖๓ พ.ย.๖๓ ธ.ค.๖๓ ม.ค.๖๔ ก.พ.๖๔ มี.ค.๖๔ ๑๐๐%													
กิจกรรม A งานงวดที่ ๑ (๒,๔๓๑,๗๔๐)																
กิจกรรม b งานงวดที่ ๒ (๓,๘๘๖,๒๖๐)																
กิจกรรม c																
กิจกรรม d																
กิจกรรม e																
รวม 6,818,000																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๔๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓.....																

คิดตามผลงานปี ๒๕๖๐ เงินเหลือจ่าย (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) / กองช่าง/งานถนนวัดนน
สำรวจข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และราวเหล็กกันตกถนนสายเลียบบคลอง ประปามหาสวัสดิ์ ครอบคลุมพื้นที่ บริเวณสามอำเภอ คือ อ.บางใหญ่ อ.บางบัวทอง และ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานการช่าง	๗,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ						
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	เดือน													
			มิ.ย. ๖๓	ก.ย. ๖๓	ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	
กิจกรรม A สักรวจ																
กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา																
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																
กิจกรรม d.....																
กิจกรรม e.....																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน(TOR).....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โต๊ะน้อย ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๒๕,๙๗๕,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ							
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	เดือน														
			๑๔/๖๓	๑๕/๖๓	๑๖/๖๓	๑๗/๖๓	๑๘/๖๓	๑๙/๖๓	๒๐/๖๓	๒๑/๖๓	๒๒/๖๓	๒๓/๖๓	๒๔/๖๓	๒๕/๖๓	๒๖/๖๓	๒๗/๖๓	
กิจกรรม A สั้วรวง																	
กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา																	
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																	
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																	
กิจกรรม e.....																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ระหว่างออกแบบ.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ลาดยาง (โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING) ถนนสายเลียบบ คลองประปา (กม.ที่ ๙+๐๓๐ ถึง กม. ๑๑+๒๙๕) ต.บางคูวัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ							
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	เดือน														
			ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔		
กิจกรรม A สักรวจ																	
กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา																	
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																	
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																	
กิจกรรม e.....																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ระหว่างสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
	โครงการก่อสร้างถนนสาย นบ.๓๐๘๖ บ้านบางไทร-บ้านคลองตาซ้อน ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี	สำนักงานการช่าง	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ							
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐มิ.ย.๖๓)	เดือน													
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.พ.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.พ.		
กิจกรรม A สํารวจ																	
กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา																	
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																	
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																	
กิจกรรม e.....																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ระหว่างสำรวจ ออกแบบ.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ต.ทิววัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๕,๒๕๘,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ			☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ			☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ			☐ ๔. ยกเลิกโครงการ			
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	เดือน													
			๑๔:๖:๓๕	๑๔:๖:๓๕	๑๔:๖:๓๕	๑๔:๖:๓๕	๑๔:๖:๓๕	๑๔:๖:๓๕	๑๔:๖:๓๕	๑๔:๖:๓๕	๑๔:๖:๓๕	๑๔:๖:๓๕	๑๔:๖:๓๕	๑๔:๖:๓๕	๑๔:๖:๓๕	
กิจกรรม A สำรอง																
กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา																
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																
กิจกรรม d.....																
กิจกรรม e.....																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ : ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง.....																

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน
๑๓	โครงการจ่ายเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง	สำนักการคลัง	๑,๐๐๐,๐๐๐ (โอนลด ๕๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐)	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓)	เดือน ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ มี.ค. ๖๓ เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓
กิจกรรม A				
กิจกรรม b				
กิจกรรม c				
กิจกรรม d				
รวม				
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :				

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒) จำนวน ๒ โครงการ

PERT / CPM / S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน														
	โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพของถนนสาธารณะ และจัดทำหมุดพิกัดควบคุมแนวเส้นทางถนนโครงการสายบังคับ เพื่อรองรับการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรณนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)	กองผังเมือง	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ														
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๓)		เดือน														
				ค.ย. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ย. ๖๒	ม.ย. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ต.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓			
	กิจกรรม A สัมมนาครั้งที่ ๑ รายงานขั้นต้น (Inception Report) วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ มติที่ประชุมเห็นชอบในรายงานขั้นต้น และเห็นชอบให้เบิกจ่ายค่าจ้างในงวดที่ ๑	๑,๑๔๙,๘๙๖	๒๕ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ต.ค. ๖๒															
	กิจกรรม b สัมมนาครั้งที่ ๒ รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มติที่ประชุมเห็นชอบในรายงานความก้าวหน้า และเห็นชอบให้เบิกจ่ายค่าจ้างในงวดที่ ๒	๒,๒๙๕,๙๙๒	๒๔ ม.ค. ๖๓ - ๖ ก.พ. ๖๓															
	กิจกรรม c สัมมนาครั้งที่ ๓ รายงานฉบับกลาง (Interim Report) วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ มติที่ประชุมไม่เห็นชอบรายงานฉบับกลาง ให้ไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน	๓,๔๔๓,๖๘๘									๒๒ พ.ค. ๖๓ - ๕ มิ.ย. ๖๓							
	กิจกรรม d สัมมนาครั้งที่ ๓ รายงานฉบับกลาง (Interim Report) ฉบับแก้ไขแล้ว วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มติที่ประชุมเห็นชอบในรายงานฉบับกลาง และเห็นชอบให้เบิกจ่ายค่าจ้างในงวดที่ ๓		๒๙ มิ.ย. ๖๓ - ๑ ก.ค. ๖๓															
	กิจกรรม e ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานครั้งที่ ๔ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ซึ่งมีเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลถนนโครงการตามร่างแผนผังโครงการคมนาคมและขนส่งเมืองรณนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) พร้อมด้วยการกำหนดหมุดควบคุมแนวถนนโครงการและรังวัดค่าพิกัดดาวเทียมกำหนดตำแหน่งสัญญาณ ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓																	
	รวม	๖,๘๘๙,๕๗๖																

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๑๙	โครงการขยายเขตบริการประปาในพื้นที่ที่มีประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓)	เดือน													
			ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
	กิจกรรม A ดำเนินการวางท่อประปา จำนวน ๕๙ เส้นทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๙ แห่ง ได้ดำเนินการ วางท่อประปาแล้วเสร็จ จำนวน ๒๒ เส้นทาง คาดว่าจะแล้ว เสร็จประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓															
	กิจกรรม b															
	กิจกรรม c															
	กิจกรรม d															
	รวม	๒๒,๖๙๐,๒๕๖.๕๖														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
๒๐	โครงการจ้างเหมาดำเนินการเดินระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล	กองทรัพยากรฯ	๑๐๕,๐๐๐,๐๐๐ กันเงินไว้ ๖๙,๙๔๙,๓๒๐	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ											
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓)	เดือน												
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓
	กิจกรรม A เบิกจ่ายเงินงวดที่...๑๑	๘,๙๓๘,๑๓๐								→					
	กิจกรรม b เบิกจ่ายเงินงวดที่...๑๒ (งวดสุดท้าย)	๘,๙๓๘,๑๓๐									→				
	กิจกรรม c														
	กิจกรรม d														
	รวม	๑๙,๕๑๘,๓๐๐													

☐ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :

ส่งมอบงานงวดที่ 12 (งวดสุดท้าย)

ส่งมอบงานงวดที่ 11

ส่งมอบงานงวดที่ 10

ส่งมอบงานงวดที่ 9

ส่งมอบงานงวดที่ 8

ส่งมอบงานงวดที่ 7

ส่งมอบงานงวดที่ 6


ส่งมอบงานงวดที่ 5

ส่งมอบงานงวดที่ 4

ส่งมอบงานงวดที่ 3

ส่งมอบงานงวดที่ 2

ส่งมอบงานงวดที่ 1

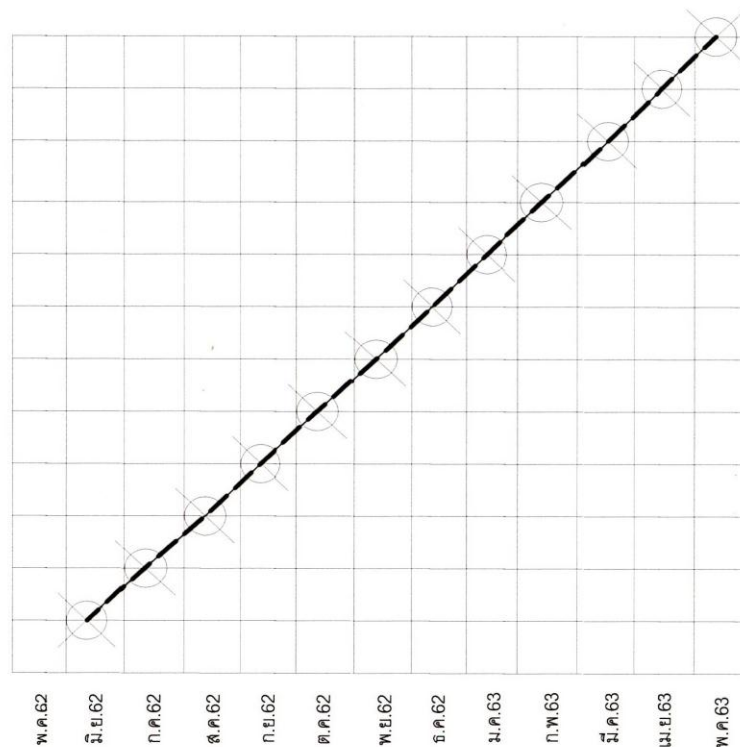

— แผนงาน
- - - ผลการดำเนินงาน

โครงการจ้างเหมาดำเนินการเดินระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบถุกหลักสุขาภิบาล

ปีงบประมาณ 2562

6-8-63

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๒๑	โครงการจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยประจำ สถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน- จังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๒,๓๘๐,๕๐๐ กัณเงิน ๑,๖๑๐,๖๑๙.๕๔	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม A เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๒.(งวดสุดท้าย)			๒๓๑,๐๓๘.๘๖							→							
กิจกรรม b																	
กิจกรรม c																	
กิจกรรม d																	
รวม			๙๑๙,๓๒๓.๑๒														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																	

ส่งมอบงานงวดที่ 12 (งวดสุดท้าย)

ส่งมอบงานงวดที่ 11

ส่งมอบงานงวดที่ 10

ส่งมอบงานงวดที่ 9

ส่งมอบงานงวดที่ 8

ส่งมอบงานงวดที่ 7

ส่งมอบงานงวดที่ 6

ส่งมอบงานงวดที่ 5


ส่งมอบงานงวดที่ 4

ส่งมอบงานงวดที่ 3

ส่งมอบงานงวดที่ 2

ส่งมอบงานงวดที่ 1

ลงนามในสัญญาจ้าง

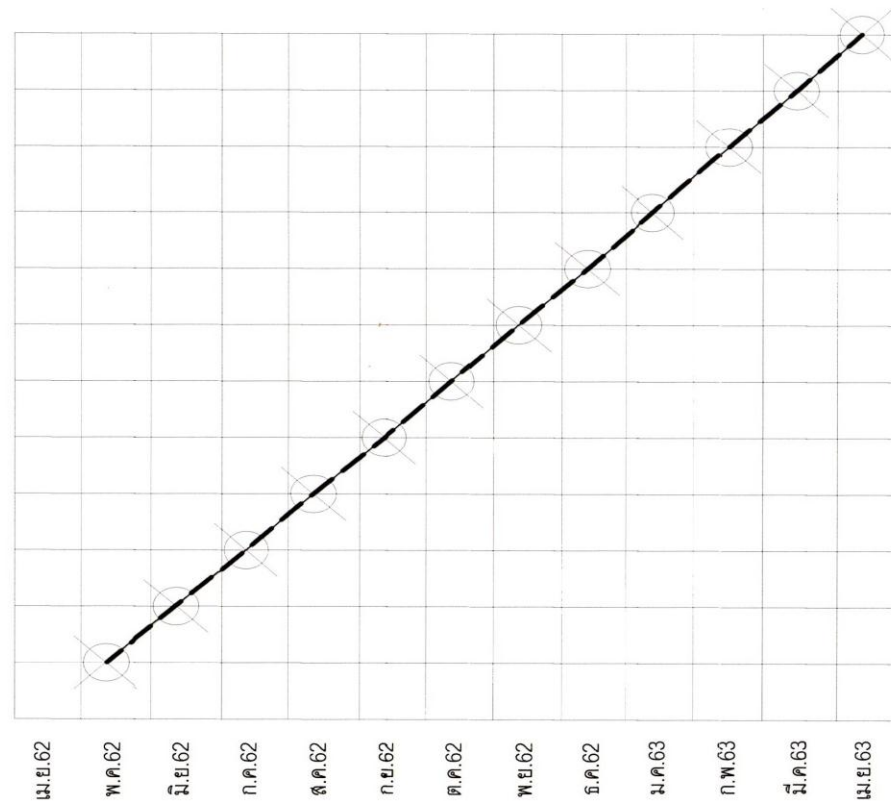

————— แผนงาน
----- ผลการดำเนินงาน

โครงการจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยประจำสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ปีงบประมาณ 2562

6-8-63

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน														
๒๒	โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอยศูนย์กำจัดขยะนันทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ กันเงินไว้ ๑๓๙,๖๘๗,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ														
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓)	เดือน														
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓			
	กิจกรรม A เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๕	๑๓,๙๖๘,๗๐๐									→							
	กิจกรรม b เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๖	๖,๙๘๔,๓๕๐										→						
	กิจกรรม c เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๗	๖,๙๘๔,๓๕๐										→						
	กิจกรรม d																	
	รวม	๒๓,๙๓๗,๔๐๐																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																		

ส่งมอบงานงวดที่ 11 (งวดสุดท้าย)

ส่งมอบงานงวดที่ 10

ส่งมอบงานงวดที่ 9

ส่งมอบงานงวดที่ 8

ส่งมอบงานงวดที่ 7

ส่งมอบงานงวดที่ 6

ส่งมอบงานงวดที่ 5


ส่งมอบงานงวดที่ 4

ส่งมอบงานงวดที่ 3

ส่งมอบงานงวดที่ 2

ส่งมอบงานงวดที่ 1

ลงนามในสัญญาจ้าง

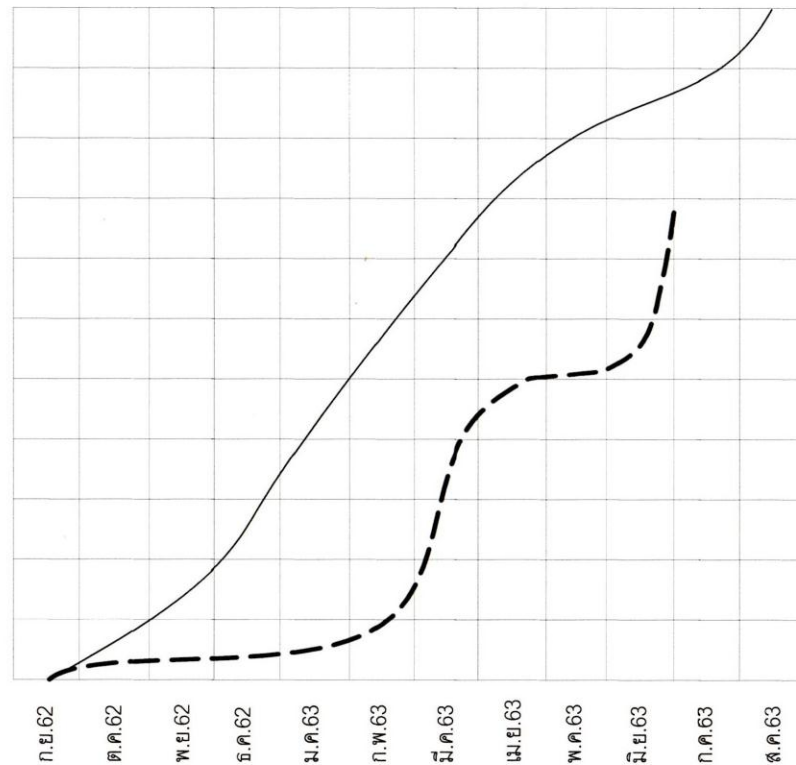

— แผนงาน
- - - ผลการดำเนินงาน

โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย ภายในศูนย์กำจัดขยะนนทบุรี
ปีงบประมาณ 2562

6-8-63

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๒๓	โครงการก่อสร้างป้องกันมลพิษขององค์การ- บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีภายในสถานที่กำจัดมูล ฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ กันเงินไว้ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มี.ย.๖๓)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม A																	
กิจกรรม b																	
กิจกรรม c																	
กิจกรรม d																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเซ็นสัญญา คาดว่าจะเซ็นสัญญาภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๒๔	โครงการจ้างเหมาจัดทำมูลฝอยติดเชื้อของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๒๕,๐๐๐,๐๐๐ กันเงินไว้ ๒๔,๙๔๐,๐๐๐	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
	กิจกรรม A เบิกจ่ายเงินงวดที่...๓	๓,๑๒๒,๕๐๐							→								
	กิจกรรม b เบิกจ่ายเงินงวดที่...๔ (งวดสุดท้าย)	๓,๑๒๒,๕๐๐								→							
	กิจกรรม c	๓,๑๒๒,๕๐๐															
	กิจกรรม d																
	รวม	๖,๒๔๕,๕๐๐															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๒๕	โครงการอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อม อาคารบริการภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อบจ.นบ. ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๕,๐๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓)	เดือน													
				ก.ย. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	มี.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	ม.ค. ๖๓	ธ.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ต.ค. ๖๒		
กิจกรรม A																	
กิจกรรม b																	
กิจกรรม c																	
กิจกรรม d																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๒๖	โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ ฝังกลบขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน- จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๓/๘,๓/๐๐,๐๐๐	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓)	เดือน												
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
กิจกรรม Aเบิกจ่ายแยกแต่ละราย รวม ๙ แปลง.....			๓/๘,๔๘๒,๑๕๐							→						
กิจกรรม b																
กิจกรรม c																
กิจกรรม d																
รวม			๓/๘,๔๘๒,๑๕๐													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๒๓/	โครงการบ่อปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Pond) ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรี ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๑๑,๕๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
	กิจกรรม A																
	กิจกรรม b																
	กิจกรรม c																
	กิจกรรม d																
	รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : อยู่ระหว่างการจัดทำประมาณการและจัดทำ TOR																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๒๘	โครงการอาคารอเนกประสงค์ในการบริหารจัดการ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๙,๘๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม A																	
กิจกรรม b																	
กิจกรรม c																	
กิจกรรม d																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : อยู่ระหว่างทบทวนงบประมาณและจัดทำ TOR																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๒๙	โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๕๐๐ KVA แบบมีเทอร์เลอรัลลากจูง	กองทรัพย์สินฯ	๓,๓๓/๓,๒๕๕	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ย.๖๓)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
	กิจกรรม A																
	กิจกรรม b																
	กิจกรรม c																
	กิจกรรม d																
	รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา.....																	
