

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

สารบัญ

หน้า

- ◎ ตารางแสดงสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ๑ – ๘
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒
- สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ๙ – ๑๐
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
- สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๑ – ๑๒
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑
- สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ ๑๓ – ๑๖
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
- สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๗ – ๒๐
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑
- สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ ๒๑ – ๒๘
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑..... ๒๙ – ๔๓
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
- สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒..... ๔๔ – ๖๗

ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) (จำนวน ๔๕ โครงการ รายละเอียดโครงการปรากฏตามเอกสาร หน้า ๙-๖๓)

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้ แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) จำนวน ๑ โครงการ						
๑) ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียมขนาด ๔,๐๐๐ ที่นั่ง ระยะที่ ๑	สำนักงานช่าง			√		
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๑ โครงการ						
๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬาและสะพาน คสล.(ระยะ ๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง		√			
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) จำนวน ๓ โครงการ						
๑) ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.สายบ้านไทรน้อย-คลองนาหมอน (นบ.๒๐๔๔) ตำบลคลองขวาง อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง		√			
๒) ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียมขนาด ๔,๐๐๐ ที่นั่ง (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง			√		
๓) จ้างที่ปรึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	กองทรัพย์ฯ		√			

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๓ โครงการ						
๑) ก่อสร้างรั้วรอบสนามกีฬา หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง		√			
๒) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งสำหรับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ของกองช่าง - รถยนต์ดับเพลิงถังน้ำในถังชนิดโฟม (๓,๕๐๐,๐๐๐) - เรือดับเพลิงกู้ภัย (๑๐,๐๐๐,๐๐๐)	สำนักงานช่าง			√		
๓) จัดออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แห่งใหม่ แห่งที่ ๓	สำนักงานช่าง		√			
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ จำนวน ๕ โครงการ						
๑) โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเต็มรักศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร- ส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ		√			
๒) โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร- ส่วนจังหวัดนนทบุรี (โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน)	กองการศึกษาฯ	√				

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๓) โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาพิทักษ์นันทเขต หมู่ที่ ๕ ตำบลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง		√			
๔) โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล (เดิม) ให้เป็นสนามหญ้าเทียม ตำบลบางกร่าง อำเภเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง		√			
๕) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบคลองลากค้อน (ตอนที่ ๑) ตำบลราษฎร์นิยม อำเภไทรน้อย เชื่อมต่อดำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานการช่าง		√			
• โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑๒ โครงการ						
๑) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมระบบสาธารณูปโภคโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย	กองการศึกษาฯ	√				
๒) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานการช่าง			√		
๓) โครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือพร้อมสะพานขึ้นลงบริเวณวัดไผ่ล้อม ตำบลเกาะเกร็ด อำเภปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานการช่าง					√

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๔) โครงการก่อสร้างถนนมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานเฉลิมศักดิ์-วัดโคกอน (นบ.๒๐๑๓) ตอนที่ ๓ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี - โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายวัดทางนาปรัง-วัดไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง		√	√		
๕) โครงการจ่ายเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง	สำนักงานคลัง				√	
๖) โครงการซ่อมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ พร้อมกำแพง คสล. ป้องกันการเคลื่อนตัวของคันทางสาย นบ.๓๐๔๘ บ้านคลอง เจ๊ก-บ้านสุเหร่าแดง ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง			√		
๗) โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร คสล. โหล่ทางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุง คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ พร้อมกำแพง คสล. ป้องกันการเคลื่อนตัวของคันทางถนน สายเลียบคลองตรง ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง		√			
๘) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคันกั้นน้ำพระอุดม (นบ.๒๐๒๑) ตอนที่ ๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง		√			

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๙) โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.สายบ้านไทรน้อย-บ้านคลองนาหมอน (นบ.๒๐๔๔) ตอนที่ ๓ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง		√			
๑๐) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดโปรดเกษ-ถนนหลวงสายชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง	√				
๑๑) โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์คลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง		√			
๑๒) โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บางพลับ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง			√		
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๒๐ โครงการ						
๑) โครงการก่อสร้างอาคารลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดแดง	กองการศึกษาฯ			√		
๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย นบ.๔๐๒๑ บ้านหนองนก-ทางเขน-บ้านเต็มรัก ตำบลบางคูวัด อำเภอบางคูวัด จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานการช่าง			√		
๓) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกษตรพัฒนา ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานการช่าง		√			

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๔) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองไต่ะใหม่ฝั่งตะวันตก ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานการช่าง			√		
๕) โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองลากค้อน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๕ ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย เชื่อมต่อดำบลชะหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานการช่าง			√		
๖) โครงการก่อสร้าง คสล.สายเลียบคลองสอง หมู่ที่ ๔ ตำบลทิววัฒนา อำเภอไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานการช่าง		√			
๗) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และราวเหล็กกันตกถนนสายเลียบคลองประปา มหาสวัสดิ์ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณสามอำเภ คือ อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง และอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานการช่าง			√		
๘) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ไต่ะน้อย ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง			√		
๙) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ถนนสายเลียบคลองประปา (กม.ที่ ๙+๐๓๐ ถึง กม.ที่ ๑๑+๒๙๕) ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง			√		
๑๐) โครงการก่อสร้างถนนสาย นบ ๓๐๘๖ บ้านบางไทร บ้านคลองตาซ็อน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง			√		

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๑๑) โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง			√		
๑๒) โครงการจ่ายเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง	สำนักงานการคลัง				√	
๑๓) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาสำรวจ จัดเก็บข้อมูลทางกายภาพของถนนสาธารณะ และจัดทำหมุดพิกัดควบคุมแนวเส้นทางถนนโครงการสายบังคับ เพื่อรองรับการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)	กองผังเมือง		√			
๑๔) โครงการขยายเขตบริการประปาในพื้นที่ที่มีประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง		√			
๑๕) โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัด น้ำชะขยะมูลฝอยศูนย์กำจัดขยะ นนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	√				
๑๖) โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ		√			
๑๗) โครงการก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ		√			

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๑๘) โครงการบ่อปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Pound) ภายในสถานที่กำจัด มูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ			√		
๑๙) โครงการอาคารอเนกประสงค์ในการบริหารจัดการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ			√		
๒๐) โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๕๐๐KVA แบบมีเทอร์โมลเลอร์ลากจูง	กองทรัพยากรฯ		√			
รวม		๔	๒๑	๑๓	๒	๑
รวมจำนวนทั้งสิ้น		๔๕				

สรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวประชุมไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓ ซึ่งมีจำนวน ๑ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๕๘) จำนวน ๑ โครงการ

PERT / CPM / S-CURV (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																																																																																																																					
				☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ	☐ ๔.ยกเลิกโครงการ																																																																																																																		
๑	ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาด ๔,๐๐๐ ที่นั่ง ระยะที่ ๑	สำนักการช่าง	๑๒๔,๔๕๒,๐๐๐.๐๐	เดือน <table border="1"> <thead> <tr> <th>กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ</th> <th>เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๓)</th> <th>๑๔:๒</th> <th>๑๔:๓</th> <th>๑๔:๔</th> <th>๑๔:๕</th> <th>๑๔:๖</th> <th>๑๔:๗</th> <th>๑๔:๘</th> <th>๑๔:๙</th> <th>๑๔:๑๐</th> <th>๑๔:๑๑</th> <th>๑๔:๑๒</th> <th>๑๔:๑</th> <th>๑๔:๒</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>กิจกรรม A.....ออกแบบ..ประมาณราคา.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>กิจกรรม b.....จัดจ้าง.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>กิจกรรม c.....ดำเนินการตามสัญญา.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>กิจกรรม d.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>กิจกรรม e.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๓)	๑๔:๒	๑๔:๓	๑๔:๔	๑๔:๕	๑๔:๖	๑๔:๗	๑๔:๘	๑๔:๙	๑๔:๑๐	๑๔:๑๑	๑๔:๑๒	๑๔:๑	๑๔:๒	กิจกรรม A.....ออกแบบ..ประมาณราคา.....															กิจกรรม b.....จัดจ้าง.....															กิจกรรม c.....ดำเนินการตามสัญญา.....															กิจกรรม d.....															กิจกรรม e.....															รวม														
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๓)	๑๔:๒	๑๔:๓	๑๔:๔	๑๔:๕	๑๔:๖	๑๔:๗	๑๔:๘	๑๔:๙	๑๔:๑๐	๑๔:๑๑	๑๔:๑๒	๑๔:๑	๑๔:๒																																																																																																											
กิจกรรม A.....ออกแบบ..ประมาณราคา.....																																																																																																																									
กิจกรรม b.....จัดจ้าง.....																																																																																																																									
กิจกรรม c.....ดำเนินการตามสัญญา.....																																																																																																																									
กิจกรรม d.....																																																																																																																									
กิจกรรม e.....																																																																																																																									
รวม																																																																																																																									
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล.....																																																																																																																									
ขั้นตอน / เหตุผล / ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง.....																																																																																																																									

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓ ซึ่งมีจำนวน ๑ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๕๙) จำนวน ๑ โครงการ
PERT/CPM/S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬา และสะพาน คสล. (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓. ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ													
				เดือน ก.ค.๕๖ค.ค.๕๖พ.ค.๕๖ธ.ค.๕๖ม.ค.๕๖ก.พ.๕๖มี.ค.๕๖เม.ย.๕๖พ.ค.๕๖มิ.ย.๕๖ก.ค.๕๖๑๐๐%													
				กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๓)													
				กิจกรรม A งานงวดที่ ๑. ๑,๘๙๒,๘๐๐.๐๐ ๑,๘๙๒,๘๐๐.๐๐ กิจกรรม B งานงวดที่ ๒. ๑,๐๒๙,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๒๙,๐๐๐.๐๐ กิจกรรม C งานงวดที่ ๓. ๒,๗๐๔,๘๐๐.๐๐ ๒,๗๐๔,๘๐๐.๐๐ กิจกรรม D งานงวดที่ ๔. ๗,๐๒๔,๔๐๐.๐๐ กิจกรรม E งานงวดที่ ๕. ๑,๑๖๙,๐๐๐.๐๐													
				รวม ๑๓,๘๒๐,๐๐๐.๐ ๕,๖๒๖,๖๐๐.๐๐													
				☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล													
				ขั้นตอน / เหตุผล / ผลกระทบ : ..สัญญาจ้างเลขที่ ๗๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้าย ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ แก้ไขงวดงาน													

สรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓ ซึ่งมีจำนวน ๓ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

PERT / CPM / S-CURV (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑	ก่อสร้างขยายผิวจราจร คลส.สาย คลองนาหมอน (นบ ๒๐๔๕) ตำบลคลองขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	กองช่าง	๑๑๑,๑๗๗,๓๓๕.๐๐ โอนงบประมาณเพิ่ม ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๑,๑๗๗,๓๓๕.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ
---	---	---------	---	--	---	---	---

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓)	เดือน																								๑๐๐%		
		๓๑.๙.๖๓	๓๑.๑๐.๖๓	๓๑.๑๑.๖๓	๓๑.๑๒.๖๓	๓๑.๑.๖๔	๓๑.๒.๖๔	๓๑.๓.๖๔	๓๑.๔.๖๔	๓๑.๕.๖๔	๓๑.๖.๖๔	๓๑.๗.๖๔	๓๑.๘.๖๔	๓๑.๙.๖๔	๓๑.๑๐.๖๔	๓๑.๑๑.๖๔	๓๑.๑๒.๖๔	๓๑.๑.๖๕	๓๑.๒.๖๕	๓๑.๓.๖๕	๓๑.๔.๖๕	๓๑.๕.๖๕	๓๑.๖.๖๕	๓๑.๗.๖๕	๓๑.๘.๖๕		๓๑.๙.๖๕	๓๑.๑๐.๖๕
กิจกรรม A.....งานงวดที่ ๑.....๑๑,๔๗๔,๑๐๐....	๑๑,๔๗๔,๑๐๐.๐๐																											๙๑.๐๐
กิจกรรม b.....งานงวดที่ ๒.....๑๑,๔๗๔,๑๐๐....	๑๑,๔๗๔,๑๐๐.๐๐																											๘๒.๕๐
กิจกรรม c.....งานงวดที่ ๓.....๑๑,๔๗๔,๑๐๐....	๑๑,๔๗๔,๑๐๐.๐๐																											๗๑.๐๐
กิจกรรม d.....งานงวดที่ ๔.....๑๑,๔๗๔,๑๐๐....	๑๑,๔๗๔,๑๐๐.๐๐																											๖๐.๕๐
กิจกรรม e.....งานงวดที่ ๕.....๑๔,๔๓๓,๖๐๐....																												๕๐.๐๐
กิจกรรม f.....งานงวดที่ ๖.....๑๒,๖๘๑,๙๐๐....																												๓๘.๐๐
กิจกรรม g.....งานงวดที่ ๗.....๑๒,๖๘๑,๙๐๐....																												๒๘.๕๐
กิจกรรม h.....งานงวดที่ ๘.....๑๓,๘๘๙,๗๐๐....																												๑๙.๐๐
กิจกรรม i.....งานงวดที่ ๙.....๑๐,๒๖๖,๓๐๐....																												๙.๕๐
กิจกรรม j.....งานงวดที่ ๑๐.....๑๐,๘๗๐,๒๐๐....																												๐.๐๐
รวม	๔๕,๘๙๖,๔๐๐.๐๐																											

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล

ขั้นตอน / เหตุผล / ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๑ เมษายน ๒๕๖๔.....

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๕๙) จำนวน ๒ โครงการ

PERT / CPM / S-CURV (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
๒	ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาด ๔,๐๐๐ ที่นั่ง (ระยะที่๒) หมู่ที่ ๙ ต.บางเลน อ.บางใหญ่	สำนักงานช่าง	๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ		☐ ๔.ยกเลิกโครงการ					
				เดือน											
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ต.ย.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ย.๖๓	ม.ย.๖๓	ก.พ.๖๔	มี.ย.๖๓	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ธ.ย.๖๔	ก.ย.๖๔
กิจกรรม A.....ออกแบบ..ประมาณราคา.....															
กิจกรรม b.....จัดจ้าง.....															
กิจกรรม c.....ดำเนินการตามสัญญา.....															
กิจกรรม d.....															
กิจกรรม e.....															
รวม															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล.....															
ขั้นตอน / เหตุผล / ผลกระทบ :อยู่ระหว่างจัดจ้าง.....															

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๓	จ้างที่ปรึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	กองทรัพยากรฯ	๒๕,๐๐๐,๐๐๐ กันเงิน ๑๓,๔๓๖,๒๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม A																	
กิจกรรม b																	
กิจกรรม c																	
กิจกรรม d																	
กิจกรรม e																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์เพิ่มเติม.....																	

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓ ซึ่งมีจำนวน ๓ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๓ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐) จำนวน ๓ โครงการ
PERT/CPM/S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
๑	โครงการก่อสร้างรั้วรอบสนามกีฬา หมู่ที่ ๔ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑๒,๔๓๔,๐๐๐.๐๐													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๓)	เดือน													
			๓๑.๘	๓๑.๙	๓๑.๑๐	๓๑.๑๑	๓๑.๑๒	๓๑.๑	๓๑.๒	๓๑.๓	๓๑.๔	๓๑.๕	๓๑.๖	๓๑.๗	๓๑.๘	
	กิจกรรม A สักรวจ															
	กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา															
	กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง															
	กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา															
	กิจกรรม e.....															
	รวม															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา.....																

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมชนบทบุรีให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน															
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ												
๒	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับการปฏิบัติงานในความ รับผิดชอบของกองช่าง ๑.รถยนต์ดับเพลิงถึงน้ำในถังชนิดโฟม ๗,๕๐๐,๐๐๐ ๒.เรือดักเพลิงกู้ภัย ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานการช่าง	๑๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐																
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๓)	เดือน															
				๑๔:๖:๒	๑๔:๗:๒	๑๔:๘:๒	๑๔:๙:๒	๑๔:๑๐:๒	๑๔:๑๑:๒	๑๔:๑๒:๒	๑๔:๑:๒	๑๔:๒:๒	๑๔:๓:๒	๑๔:๔:๒	๑๔:๕:๒				
กิจกรรม A สอบถามราคาผู้จัดจำหน่าย																			
กิจกรรม b จัดทำร่างขอบเขต (TOR)																			
กิจกรรม c จัดซื้อจัดจ้าง																			
กิจกรรม d																			
กิจกรรม e.....																			
รวม																			
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																			
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ซึ่งได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะแล้วเสร็จขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบและกำหนดราคากลาง และได้อนุมัติเงินเพื่อขยายเวลาเบิกจ่ายเงินจากผู้ว่าราชการจังหวัด																			
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นบ ๕๑๐๐๕/๒๐๓๔ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติ TOR																			

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ										
๓	จ้างออกแบบอาคารสำนักงาน อบจ.นนทบุรีแห่งใหม่ แห่งที่ ๓	สำนักการช่าง	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๓,๘๒๐,๐๐๐														
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓)	เดือน													
				ม.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓	ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	๑๐๐%		
กิจกรรม A งานงวดที่ ๑ (๓๘๒,๐๐๐)			๓๘๒,๐๐๐.๐๐												๗๐		
กิจกรรม b งานงวดที่ ๒ (๗๖๔,๐๐๐)			๗๖๔,๐๐๐.๐๐												๕๐		
กิจกรรม c งานงวดที่ ๓ (๗๖๔,๐๐๐)			๗๖๔,๐๐๐.๐๐												๓๐		
กิจกรรม d งานงวดที่ ๔ (๗๖๔,๐๐๐)															๑๐		
กิจกรรม e งานงวดที่ ๕ (๑,๑๔๖,๐๐๐)															๐		
รวม			๑,๙๔๐,๐๐๐.๐๐														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ.....อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาจ้าง ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓.....																	

สรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓ ซึ่งมีจำนวน ๕ โครงการ)


จากการติดตามไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๔ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๑	โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเต็มรัก ศึกษา ในสังกัด อบจ.นนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๑๑,๓๘๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง									→								
กิจกรรม b ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตรวจสอบราคากลาง										→							
กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง											→						
กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง												→					
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง เลขที่สัญญา ๖๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ก.ย.๖๓.....																	

โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเต็มรักศึกษาในสังกัด อบจ.นนทบุรี

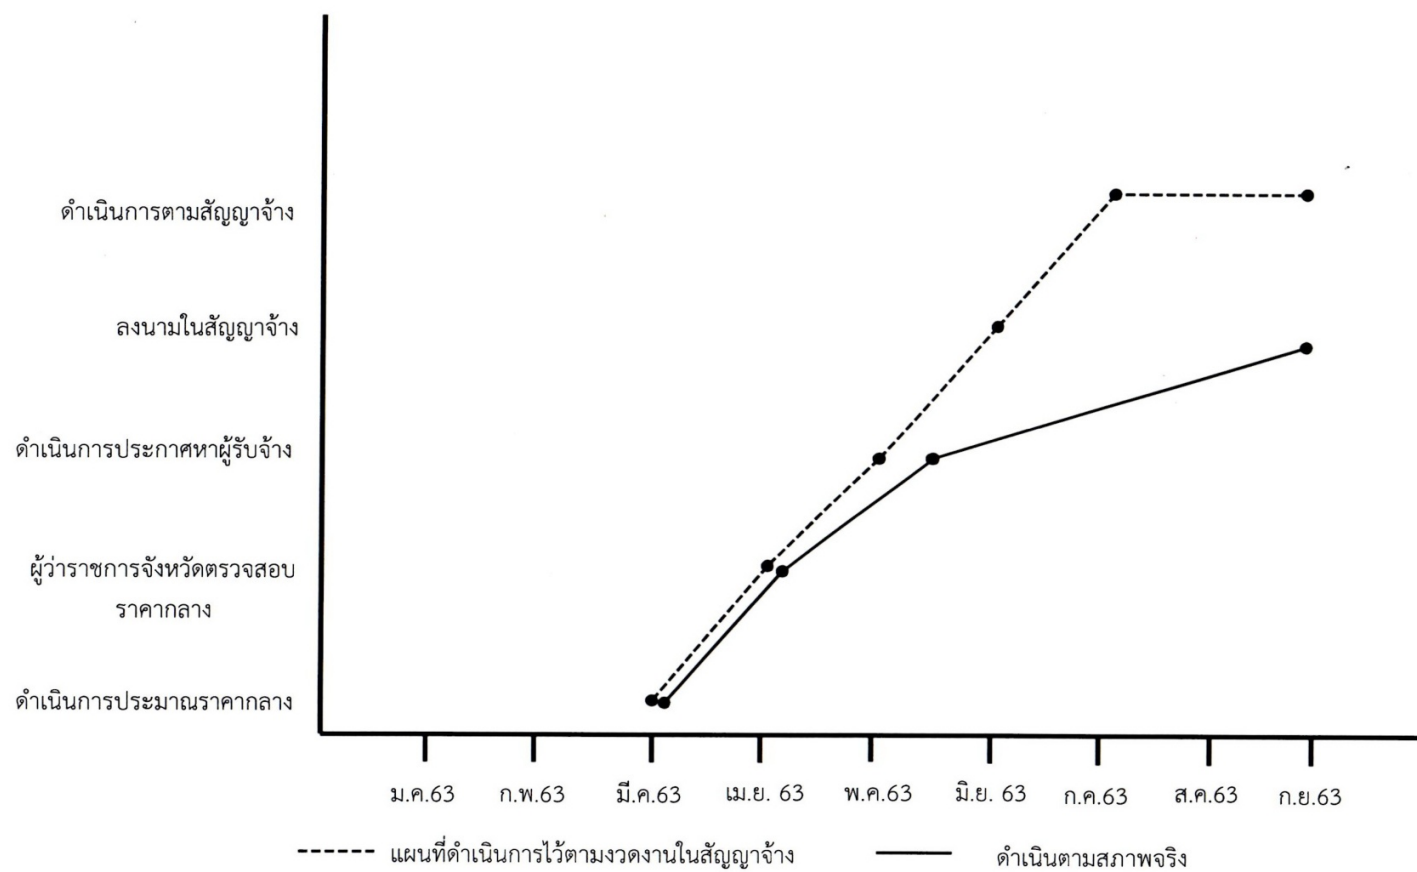


ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน										
๒	โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บริเวณโรงเรียนสังกัด อบจ.นนทบุรี (โรงเรียนสุเหล้าลากค้อน)	กองการศึกษาฯ	๒,๓๗๒,๖๐๐	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ										
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓)	เดือน											
			ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓
	กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง													
	กิจกรรม b ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตรวจสอบราคากลาง													
	กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง													
	กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง													
	กิจกรรม e ดำเนินการตามสัญญาจ้าง													
	รวม	๒,๕๕๕,๐๐๐												

☐ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๓๑/๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค.๖๓ วันสิ้นสุด ๒๙ พ.ค.๖๓ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว.....

โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนสังกัด อบจ.นนทบุรี (โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน)

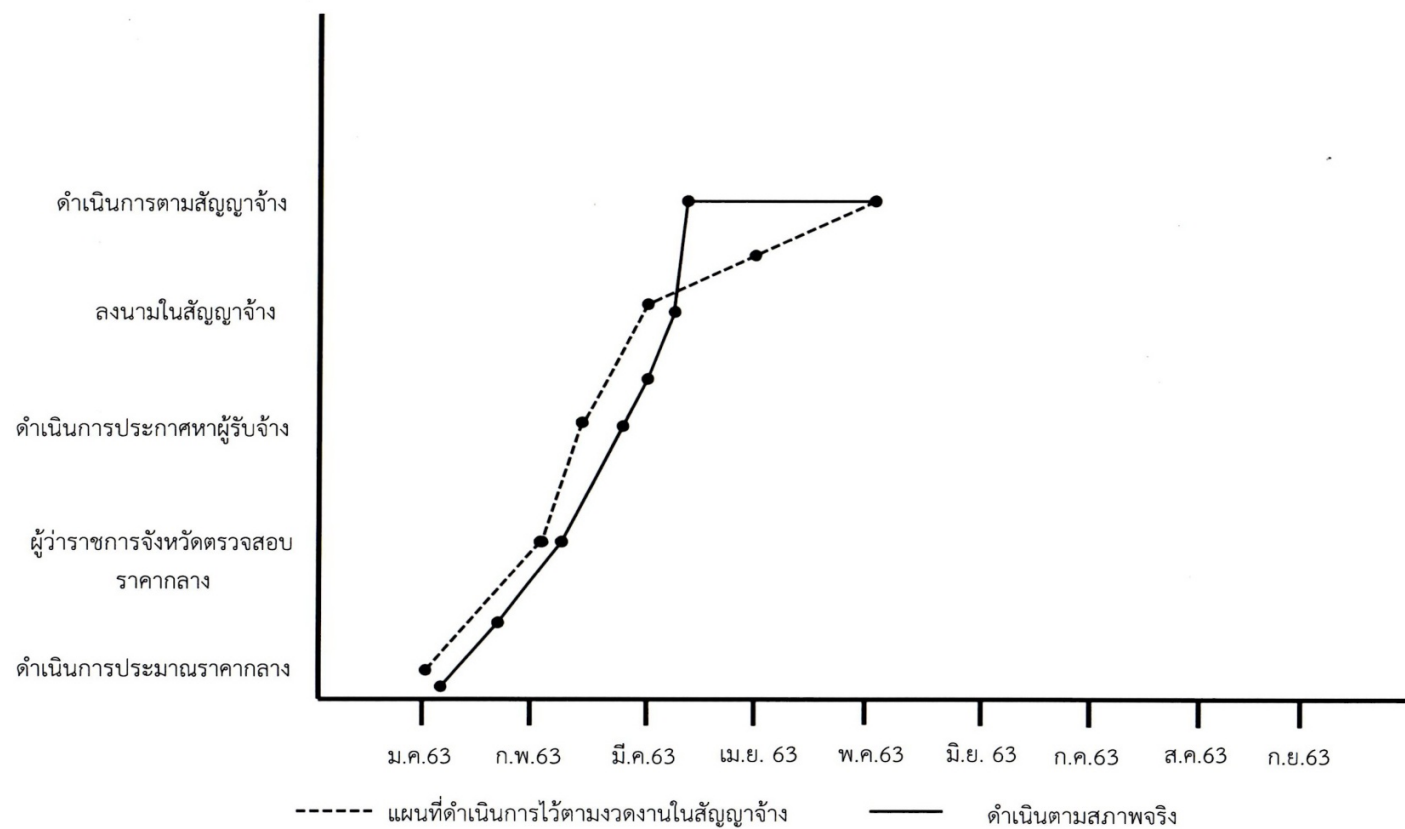

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑
(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐) จำนวน ๓ โครงการ
PERT/CPM/S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ										
๓	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พิทักษ์นทเขต หมู่ที่ ๕ ตำบลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักการช่าง	๙,๔๑๓,๐๐๐.๐๐														
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓)	เดือน													
				ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	พ.ค.๖๔			
	กิจกรรม A งานงวดที่ ๑	๓,๒๗๓,๘๕๐.๐๐															
	กิจกรรม b งานงวดที่ ๒	๓,๕๑๓,๔๐๐.๐๐															
	กิจกรรม c งานงวดที่ ๓	๑,๑๔๖,๗๕๐.๐๐															
	กิจกรรม d																
	กิจกรรม e																
รวม		๗,๙๔๕,๐๐๐.๐๐															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล..... ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๕๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔..... 																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ								
๕๖	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล (เดิม) สนามหญ้าเทียม ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตามรูปแบบรายละเอียดข้อกำหนด อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๔๐,๘๙๖,๐๐๐.๐๐												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๓)	เดือน												
			ม.ย.๖๓	ก.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	๑๐๐%		
กิจกรรม	งวดที่ ๑	๓,๒๕๕,๙๒๐											๙๕		
กิจกรรม	งวดที่ ๒	๘,๑๓๙,๘๐๐											๕๗		
กิจกรรม	งวดที่ ๓	๖,๕๑๑,๘๔๐											๔๔		
กิจกรรม	งวดที่ ๔	๕,๒๙๐,๘๗๐											๒๘		
กิจกรรม	งวดที่ ๕	๑๕,๔๖๕,๖๒๐											๘		
กิจกรรม	งวดที่ ๖	๒,๐๓๔,๙๕๐											๐		
รวม		๔๐,๖๙๙,๐๐๐													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล															
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๔๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔.....															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เลียบคลองลากค้อน (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๕ ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย เชื่อมต่อ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑๖,๒๓๔,๐๐๐.๐๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๑๒,๑๖๐,๐๐๐													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๓)		เดือน												
				๒๕.๖	๒๕.๗	๒๕.๘	๒๕.๙	๒๕.๑๐	๒๕.๑๑	๒๕.๑๒	๒๕.๑	๒๕.๒	๒๕.๓	๒๕.๔	๑๐๐%	
กิจกรรม A งวดที่ ๑ (๔,๘๖๔,๐๐๐)															๖๕	
กิจกรรม b งวดที่ ๒ (๓,๐๔๐,๐๐๐)															๔๐	
กิจกรรม c งวดที่ ๓ (๔,๒๕๖,๐๐๐)															๐	
กิจกรรม d.....																
กิจกรรม e.....																
รวม ๑๒,๑๖๐,๐๐๐																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓.....																

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓ ซึ่งมีจำนวน ๑๒ โครงการ)


จากการติดตามไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๙ โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ จำนวน ๑ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๑	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมระบบสาธารณูปโภคโรงเรียนนนทปรีวิทยาลัย	กองการศึกษาฯ	๘๑,๑๓๐,๐๐๐	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
	กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง																
	กิจกรรม b ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตรวจสอบราคากลาง																
	กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง																
	กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง																
	กิจกรรม e ดำเนินการตามสัญญาจ้าง																
	เบิกจ่ายงวดที่ ๑ - ๖		๒๖,๑๒๖,๖๙๙	←————→													
	เบิกจ่ายงวดที่ ๗ - ๑๒		๕๕,๕๘๖,๐๐๑						←————→								
	รวม		๓/๐, ๓/๑๒, ๓/๐๐														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๖๓/๖๒ ลงวันที่ ๕ ก.ค.๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๔ ก.ค.๖๓ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วแล้ว																	

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมระบบสาธารณูปโภคโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

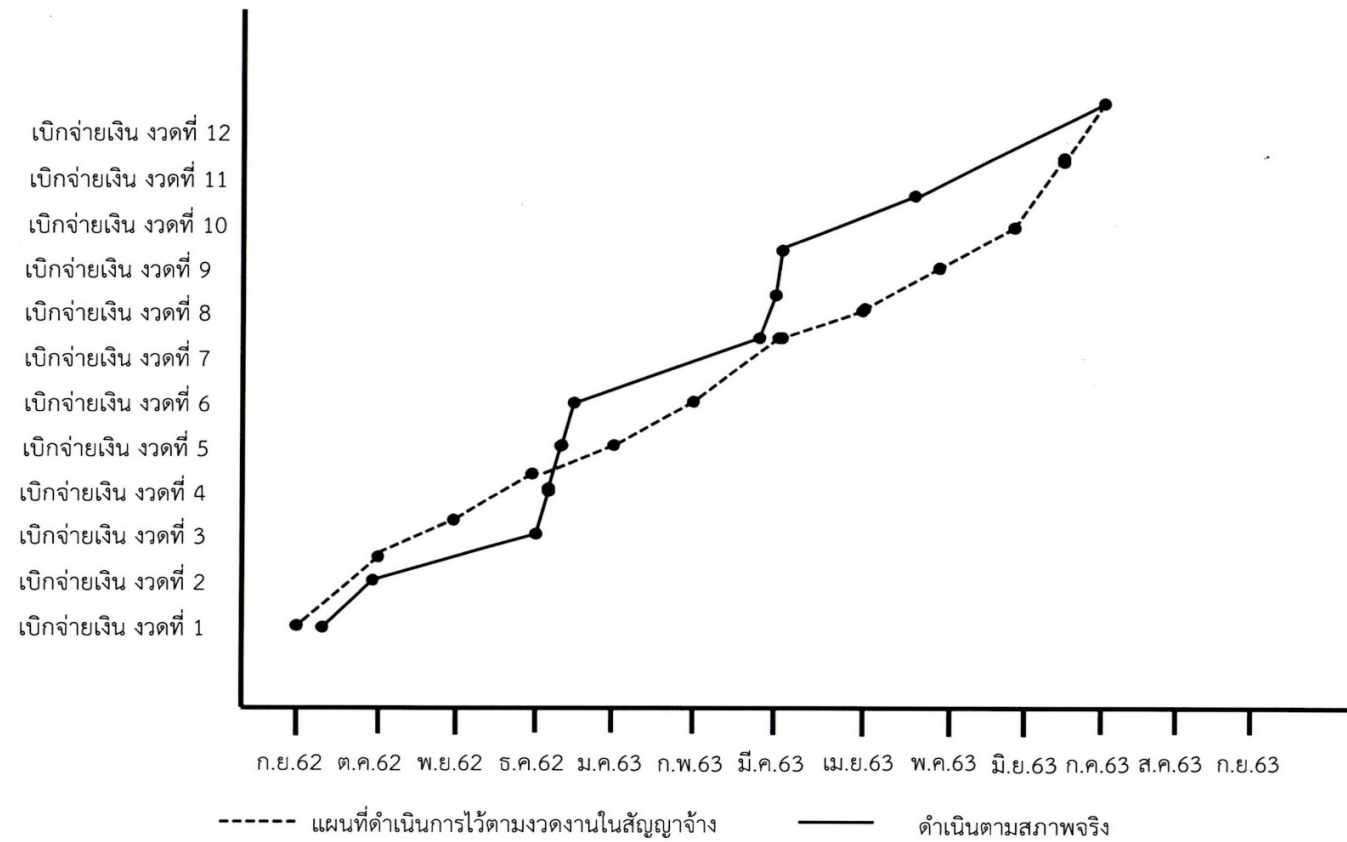

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๖๑) จำนวน ๑๐ โครงการ

PERT/CPM/S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
๒	โครงการการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง	๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓)	เดือน													
			ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔		
	กิจกรรม Aสำรวจ.....															
	กิจกรรม b ..ออกแบบ ประมาณราคา..															
	กิจกรรม cจัดจ้าง.....															
	กิจกรรม dดำเนินการตามสัญญา..															
	กิจกรรม e															
		รวม														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :รายการจ้างออกแบบ.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☒ ๔. ยกเลิกโครงการ										
๑๙	โครงการการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือ พร้อมสะพานขึ้นลงบริเวณวัดไผ่ล้อม ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๒,๔๗๕,๐๐๐.๐๐														
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๓)	เดือน													
				ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔		
	กิจกรรม A สำรวจ			-----●-----													
	กิจกรรม b ออกแบบประมาณราคา			-----●-----													
	กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																
	กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																
	กิจกรรม e																
		รวม															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :มีหน่วยงานอื่นก่อสร้างทับซ้อนพื้นที่ในตำแหน่งเดียวกัน.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ								
๕.	โครงการก่อสร้างถนนมาตรฐานทางหลวง ท้องถิ่น จำนวน ๓ โครงการ	สำนักการช่าง	๑๘,๘๗๒,๔๙๖.๐๐												
	๕.๑โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายสะพาน เฉลิมศักดิ์-วัดโคกนอ (นบ.๒๐๑๓) ตอนที่ ๓ ตำบลบางศรีทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี		๔,๓๓๔,๐๐๐.๐๐												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๓)												
				เดือน											
				พ.ย.๖๓	ธ.ย.๖๓	ก.พ.๖๔	มี.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	๑๐๐%	
	กิจกรรม A งวดที่ ๑	๑,๙๕๗,๗๖๗.๐๐	๑,๙๕๗,๗๖๗.๐๐											๕๓	
	กิจกรรม b งวดที่ ๒	๑,๗๓๖,๑๓๓.๐๐												๐	
	กิจกรรม c														
กิจกรรม d															
กิจกรรม e															
รวม	๓,๖๙๓,๙๐๐.๐๐	๑,๙๕๗,๗๖๗.๐๐													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล															
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการของการประปาฯดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ไม่สามารถ															
ก่อสร้างทางเชื่อมและไหลทางได้.....															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๔	๕.๒โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายวัดทองนาปรัง-วัดไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลบางศรีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานการช่าง	๔,๑๖๕,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ						
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๓)	เดือน												
				๑๔:๕๔	๑๔:๕๕	๑๔:๕๖	๑๔:๕๗	๑๔:๕๘	๑๔:๕๙	๑๕:๐๐	๑๕:๐๑	๑๕:๐๒	๑๕:๐๓	๑๕:๐๔	๑๕:๐๕	๑๕:๐๖
กิจกรรม A สักรว																
กิจกรรม b ออกแบบประมาณราคา																
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																
กิจกรรม e																
รวม			-													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ : รอลงนามในสัญญา.....																

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๕	โครงการจ่ายเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง	สำนักงานคลัง	๕๐๐,๐๐๐ โอนลด ๒๕๐,๐๐๐.- คงเหลือ ๒๕๐,๐๐๐.-	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓)	เดือน												
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
	กิจกรรม A															
	กิจกรรม b															
	กิจกรรม c															
	กิจกรรม d															
	รวม															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :โอนลด ๒๕๐,๐๐๐.- บาท ตามใบโอนครั้งที่ ๓๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ										
๖	โครงการซ่อมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์-คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ พร้อมกำแพง คสล. ป้องกันการเคลื่อนตัวของคันทางสาย นบ.๓๐๘๘ บ้านคลองเจ็ก - บ้านสุเหร่าแดง ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	สำนักการช่าง	๓๖,๑๔๐,๐๐๐.๐๐														
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓)	เดือน													
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.		
กิจกรรม A สักรวจออกแบบ																	
กิจกรรม b ประมาณราคา																	
กิจกรรม c จัดซื้อจัดจ้าง																	
กิจกรรม d																	
กิจกรรม e																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :ดำเนินการสำรวจออกแบบ.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
๕๖	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร คสล. ไหล่ทางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ พร้อมกำแพง คสล. ป้องกันการเคลื่อนตัวของคันทาง ถนนสายเลียบคลองตรง ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง	๒๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓)	เดือน												
				มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	๑๐๐%
กิจกรรม A งานงวดที่ ๑			๕,๑๙๑,๑๐๐.๐๐													๘๒
กิจกรรม b งานงวดที่ ๒			๗,๖๗๓,๘๐๐.๐๐													๕๗
กิจกรรม c งานงวดที่ ๓			๕,๖๔๒,๕๐๐.๐๐													๒๓
กิจกรรม d งานงวดที่ ๔			๔,๐๖๒,๖๐๐.๐๐													๐
กิจกรรม e																
รวม			๒๒,๕๗๐,๐๐๐.๐๐													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☒ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคันกันน้ำพระอุดม(นบ.๒๐๒๑) ตอนที่ ๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑๒,๐๖๐,๐๐๐.๐๐													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓)	เดือน												
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.พ.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	๑๐๐%	
	กิจกรรม A งานงวดที่ 1	๔,๐๒๗,๔๙๘.๙๔	๔,๐๒๗,๔๙๘.๙๔												๗๗	
	กิจกรรม b งานงวดที่ 2	๒,๘๖๓,๙๙๙.๒๔	๒,๘๖๓,๙๙๙.๒๔												๔๕	
	กิจกรรม c งานงวดที่ 3	๒,๐๕๘,๔๙๙.๘๖	๒,๐๕๘,๔๙๙.๘๖												๐	
	กิจกรรม d															
	กิจกรรม e															
รวม	๘,๙๔๙,๙๙๗.๖๔	๘,๙๔๙,๙๙๗.๖๔														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ดำเนินการแล้วเสร็จจ่ายเงินครบทุกงวด.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																										
๔๑	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. สายบ้านไทรน้อย-บ้านคลอง นาหมอน (นบ.๒๐๔๔) ตอนที่ ๓ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง	๔๙,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ																							
				กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๓)		เดือน																						
								ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	%๐๐๑		
				กิจกรรม A งานงวดที่ ๑	๕,๔๔๑,๗๐๐.๐๐																									๘๘.๐๐
				กิจกรรม b งานงวดที่ ๒	๕,๔๔๑,๗๐๐.๐๐																									๗๗.๕๐
				กิจกรรม c งานงวดที่ ๓	๑๑,๑๓๐,๗๕๐.๐๐																									๖๑.๕๐
				กิจกรรม d งานงวดที่ ๔	๘,๔๐๙,๙๐๐.๐๐																									๔๔.๕๐
				กิจกรรม e งานงวดที่ ๕	๗,๙๑๕,๒๐๐.๐๐																									๒๒.๐๐
				กิจกรรม f งานงวดที่ ๖	๕,๑๙๔,๓๕๐.๐๐																									๑๑.๐๐
				กิจกรรม g งานงวดที่ ๗	๕,๙๓๖,๔๐๐.๐๐																									-
รวม		๔๙,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	-																											
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๔๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔.....																														

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน										
				☒ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ							
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดโปรตเกษ-ถนนหลวงสายชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักการช่าง	๑๐,๘๐๒,๐๐๐.๐๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๗,๗๓๘,๐๐๐.๐๐											
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐มิ.ย.๖๓)	เดือน										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	๑๐๐%
	กิจกรรม A งวดที่ ๑	๒,๕๕๕,๘๖๑.๔๐	๒,๕๕๕,๘๖๑.๔๐											๖๒.๒
	กิจกรรม b งวดที่ ๒	๒,๒๕๗,๑๗๔.๖๐	๒,๒๕๗,๑๗๔.๖๐											๓๓.๐๓
	กิจกรรม c งวดที่ ๓	๒,๙๒๔,๙๖๔.๐๐	๒,๙๒๔,๙๖๔.๐๐											๐
	กิจกรรม d													
	กิจกรรม e													
	รวม	๗,๗๓๘,๐๐๐.๐๐	๗,๗๓๘,๐๐๐.๐๐											
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล														
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๔ เมษายน ๒๕๖๓ ดำเนินการแล้วเสร็จจ่ายเงินครบทุกงวด.....														

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ										
๑๑	โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ คลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑๔,๘๓๒,๐๐๐.๐๐														
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๓)	เดือน													
				พ.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	๑๐๐%	
	กิจกรรม A งานงวดที่ ๑	๔๓๐,๕๐๐.๐๐	๔๓๐,๕๐๐.๐๐													๗๒.๕	
	กิจกรรม b งานงวดที่ ๒	๓,๔๔๔,๐๐๐.๐๐														๕๕.๕	
	กิจกรรม c งานงวดที่ ๓	๒,๙๕๒,๐๐๐.๐๐														๓๑.๕	
	กิจกรรม d งานงวดที่ ๔	๒,๐๙๑,๐๐๐.๐๐														๓.๕	
	กิจกรรม e งานงวดที่ ๕	๓,๓๘๒,๕๐๐.๐๐														๐	
รวม		๑๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๐,๕๐๐.๐๐														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ								
๒๒.	โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ บางพลับ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง	๒๗,๑๒๓,๐๐๐.๐๐												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย ๖๓)	เดือน											
				ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ต.ค.๖๓	พ.ค.๖๓
กิจกรรม A สำรอง															
กิจกรรม b ออกแบบประมาณราคา															
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง															
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา															
กิจกรรม e															
รวม			-												
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล															
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :รอลงนามในสัญญา.....															

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓ มีจำนวน ๒๐ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๑๘ โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒) จำนวน ๒๐ โครงการ

PERT / CPM / S-CURVE(ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
๑	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดแดง	กองการศึกษาฯ	๘,๗๘๔,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ											
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓)	เดือน												
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓
	กิจกรรม A ดำเนินการประมาณราคากลาง			←											→
	กิจกรรม b อนุมัติราคากลาง														
	กิจกรรม c ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง														
	กิจกรรม d ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง														
	รวม														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง และ TOR ยังไม่มีการเบิกจ่าย.....															

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๖๒) จำนวน ๑๑ โครงการ

PERT / CPM / S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน															
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ												
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย นบ.๔๐๒๑ บ้านหนองนกทางเขน- บ้านเต็มรัก ต.บางคูรัด อ.บางคูรัด จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๗,๒๕๓,๐๐๐.๐๐																
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๓)	เดือน															
				ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓			
กิจกรรม A สำรวจ																			
กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา																			
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																			
กิจกรรม d																			
รวม																			
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																			

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ										
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เกษตรพัฒนา ต.คลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักการช่าง	๓๕,๐๓๒,๐๐๐.๐๐														
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓)	เดือน														
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	๑๐๐%		
กิจกรรม งานงวดที่ ๑ (๖,๘๑๗,๕๐๐)															๗๖		
กิจกรรม งานงวดที่ ๒ (๗,๓๒๒,๕๐๐)															๕๖		
กิจกรรม งานงวดที่ ๓ (๕,๐๕๐,๐๐๐)															๒๗		
กิจกรรม งานงวดที่ ๔ (๖,๐๖๐,๐๐๐)															๐		
รวม ๒๕,๒๕๐,๐๐๐																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๕ เมษายน ๒๕๖๔.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน								
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เลียบคลองโตะใหม่ฝั่งตะวันตก ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๓๑,๙๓๘,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ					
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓)	เดือน									
			๑๔:๒๕	๑๔:๒๖	๑๔:๒๗	๑๔:๒๘	๑๔:๒๙	๑๔:๓๐	๑๔:๓๑	๑๔:๓๒	๑๔:๓๓	๑๔:๓๔
กิจกรรม A สำรวจ												
กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา												
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง												
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา												
กิจกรรม e.....												
รวม												
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล												
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ระหว่างสรุปราคาและ ร่าง TOR.....												

ร.น.	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เลียบคลองลากค้อน (ตอน ๒) ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑๗,๙๕๘,๐๐๐.๐๐													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓)	เดือน ๑๔:๒๒๑๔:๒๗๑๔:๒๘๑๔:๒๙๑๔:๓๐๑๕:๐๑๑๕:๐๒๑๕:๐๓๑๕:๐๔๑๕:๐๕๑๕:๐๖๑๕:๐๗๑๕:๐๘๑๕:๐๙													
กิจกรรม A สักรวจ																
กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา																
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																
กิจกรรม e.....																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ระหว่างสรุปประมาณราคา/ร่าง TOR.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เลียบคลองสอง หมู่ที่ ๔ ต.ทิววัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๖,๘๓๓,๐๐๐.๐๐													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓)	เดือน												
				พ.ย. ๖๒	ธ.ย. ๖๒	ม.ย. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๒	ธ.ย. ๖๒	ม.ย. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๒	ธ.ย. ๖๒	๑๐๐%
กิจกรรม A งานงวดที่ ๑ (๒,๙๓๑,๗๔๐)			๒,๙๓๑,๗๔๐.๐๐													๔๓
กิจกรรม b งานงวดที่ ๒ (๓,๘๘๖,๒๖๐)			๓,๘๘๖,๒๖๐.๐๐													๐
กิจกรรม c																
กิจกรรม d																
กิจกรรม e																
รวม ๖,๘๑๘,๐๐๐																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๔๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ดำเนินการแล้วเสร็จจ่ายเงินครบทุกงวด.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๕๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และราวเหล็กกันตกถนนสายเลียบบคลอง ประปามหาสวัสดิ์ ครอบคลุมพื้นที่ บริเวณสามอำเภอ คือ อ.บางใหญ่ อ.บางบัวทอง และ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักการช่าง	๗,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ						
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓)	เดือน													
			๑๔:๕๔	๑๔:๕๗	๑๔:๕๘	๑๔:๕๙	๑๔:๕๐	๑๔:๕๑	๑๔:๕๒	๑๔:๕๓	๑๔:๕๔	๑๔:๕๕	๑๔:๕๖	๑๔:๕๗	๑๔:๕๘	
กิจกรรม A สำรวจ																
กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา																
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																
กิจกรรม d.....																
กิจกรรม e.....																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน(TOR).....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๘	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ได้ะนุ้ย ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๒๕,๘๗๕,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ						
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๓)	เดือน													
			ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.พ.๖๔	
กิจกรรม A สักรวจ																
กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา																
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																
กิจกรรม e.....																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ระหว่างประมาณราคา.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน															
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ												
๕	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ลาดยาง (โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING) ถนนสายเลียบริม คลองประปา (กม.ที่ ๙+๐๓๐ ถึง กม. ๑๑+๒๙๕) ต.บางคูวัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี	สำนักการช่าง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐																
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓)	เดือน																
			ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ก.พ.๖๕				
กิจกรรม A สำรวจ																			
กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา																			
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																			
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																			
กิจกรรม e.....																			
รวม																			
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																			
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ระหว่างสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา.....																			

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ										
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนสาย นบ.๓๐๘๖ บ้านบางไทร-บ้านคลองตาช้อน ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐														
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓)	เดือน													
				๑๔:๖๕	๑๔:๗	๑๔:๖๖	๑๔:๗๖	๑๔:๗๖	๑๔:๗๖	๑๔:๗๖	๑๔:๗๖	๑๔:๗๖	๑๔:๗๖	๑๔:๗๖	๑๔:๗๖		
	กิจกรรม A สักรวจ																
	กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา																
	กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																
	กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																
	กิจกรรม e.....																
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ระหว่างสำรวจ ออกแบบ..... 																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ										
	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ต.ทิววัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๕,๒๕๘,๐๐๐.๐๐														
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓)	เดือน														
			ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔		
	กิจกรรม A สักรวจ																
	กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา																
	กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																
	กิจกรรม d.....																
	กิจกรรม e.....																
	รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง.....																	

ติดตามผลางปี ๒๕๖๐ เงินเหลือจ่าย (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) / กองช่าง/งานธนวัฒน์
สำรวจข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน
๑๒	โครงการจ่ายเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง	สำนักการคลัง	๑,๐๐๐,๐๐๐ (โอนลด ๕๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐)	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓)	เดือน
				ต.ค. ๖๒
				พ.ย. ๖๒
				ธ.ค. ๖๒
				ม.ค. ๖๓
				ก.พ. ๖๓
				มี.ค. ๖๓
				เม.ย. ๖๓
				พ.ค. ๖๓
				มิ.ย. ๖๓
				ก.ค. ๖๓
				ส.ค. ๖๓
				ก.ย. ๖๓
กิจกรรม A				
กิจกรรม b				
กิจกรรม c				
กิจกรรม d				
รวม				

☐ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :โอนลด ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตามใบโอนครั้งที่ ๓๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒.....

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
				☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ											
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๓)	เดือน											
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓
๑	โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพของถนนสาธารณะ และจัดทำหมุดพิกัดควบคุมแนวเส้นทางถนนโครงการสายบังคับ เพื่อรองรับการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)	กองผังเมือง	๑๔,๐๐๐,๐๐๐												
	กิจกรรม A ส่งมอบงานงวดที่ ๑ รายงานขั้นต้น (Inception Report) วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ มติที่ประชุมเห็นชอบในรายงานขั้นต้น และเห็นชอบให้เบิกจ่ายค่าจ้างในงวดที่ ๑		๑,๑๔๗,๘๙๖	๒๕ ต.ค. ๖๒ -	๓๑ ต.ค. ๖๒										
	กิจกรรม b ส่งมอบงานงวดที่ ๒ รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มติที่ประชุมเห็นชอบในรายงานความก้าวหน้า และเห็นชอบให้เบิกจ่ายค่าจ้างในงวดที่ ๒		๒,๒๙๕,๗๙๒				๒๔ ม.ค. ๖๓ -	๖ ก.พ. ๖๓							
	กิจกรรม c ส่งมอบงานงวดที่ ๓ รายงานฉบับกลาง (Interim Report) วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ มติที่ประชุมไม่เห็นชอบรายงานฉบับกลาง ให้ไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน		๓,๔๔๓,๖๘๘							๒๒ พ.ค. ๖๓ -	๕ มิ.ย. ๖๓				
	กิจกรรม d ส่งมอบงานงวดที่ ๓ รายงานฉบับกลาง (Interim Report) ฉบับแก้ไขแล้ว วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มติที่ประชุมเห็นชอบในรายงานฉบับกลาง และเห็นชอบให้เบิกจ่ายค่าจ้างในงวดที่ ๓										๒๙ มิ.ย. ๖๓ -	๑ ก.ค. ๖๓			
	กิจกรรม e ส่งมอบงานงวดที่ ๔ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ มติที่ประชุมเห็นชอบในร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ และเห็นชอบให้เบิกจ่ายค่าจ้างในงานงวดที่ ๔		-											๒๑ ก.ย. ๖๓ -	๒๘ ก.ย. ๖๓
	กิจกรรม f ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ ๕ รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ซึ่งจะมีการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ และกำหนดส่งรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ตามสัญญาในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓		-												
	รวม		๖,๘๘๗,๓๗๖												

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :
 ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๑๔	โครงการขยายเขตบริการประปาในพื้นที่ที่มีประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓)	เดือน												
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	
กิจกรรม A ดำเนินการวางท่อประปา จำนวน ๕๙ เส้นทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๙ แห่ง ได้ดำเนินการ วางท่อประปาแล้วเสร็จ จำนวน ๔๑ เส้นทาง คาดว่าจะแล้ว เสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓			๒๒,๖๙๐,๒๕๖.๕๖													
กิจกรรม b																
กิจกรรม c																
กิจกรรม d																
รวม			๒๒,๖๙๐,๒๕๖.๕๖													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๑๕	โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอยศูนย์กำจัดขยะนันทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ กันเงินไว้ ๑๓๙,๖๔๓,๐๐๐	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
				กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓)	เดือน										
	ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒			ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
	กิจกรรม A เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๔	๑๓,๙๖๔,๓/๐๐										➡				
	กิจกรรม b เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๙	๑๓,๙๖๔,๓/๐๐										➡				
	กิจกรรม c เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๐	๖,๙๔๔,๓๕๐										➡				
	กิจกรรม d เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑๑ (งวดสุดท้าย)	๖,๙๔๔,๓๕๐											➡			
		รวม	๔๑,๙๐๖,๑๐๐													

☐ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :
ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :

ส่งมอบงานงวดที่ 11 (งวดสุดท้าย)

ส่งมอบงานงวดที่ 10

ส่งมอบงานงวดที่ 9

ส่งมอบงานงวดที่ 8

ส่งมอบงานงวดที่ 7

ส่งมอบงานงวดที่ 6

ส่งมอบงานงวดที่ 5


ส่งมอบงานงวดที่ 4

ส่งมอบงานงวดที่ 3

ส่งมอบงานงวดที่ 2

ส่งมอบงานงวดที่ 1

ลงนามในสัญญาจ้าง

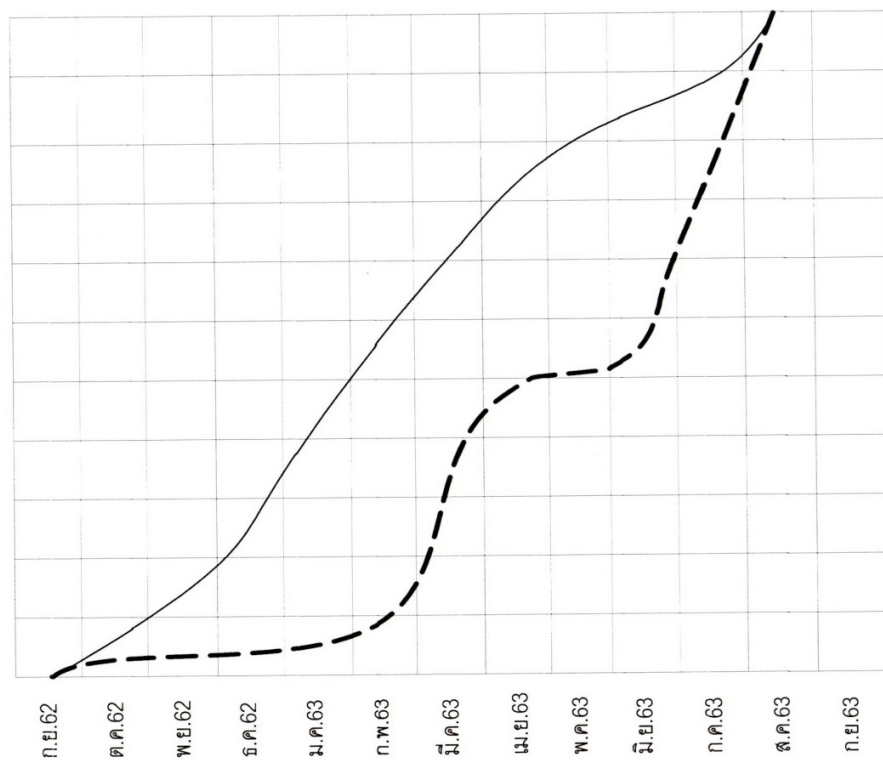

— แผนงาน

- - - ผลการดำเนินงาน

โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย ภายในศูนย์กำจัดขยะนนทบุรี

ปีงบประมาณ 2562

9-10-63 (แล้วเสร็จ)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน
๑๖	โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ กันเงินไว้ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓)	เดือน
				ก.ย. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ก.ค. ๖๓ มี.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ เม.ย. ๖๓ มิ.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ ม.ค. ๖๓ ธ.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ต.ค. ๖๒
กิจกรรม A				
กิจกรรม b				
กิจกรรม c				
กิจกรรม d				
รวม				
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : ก่อหนี้ผูกพันแล้วกันเงินไปเบิกจ่ายในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๔๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท)				

ส่งมอบงานงวดที่ 8(งวดสุดท้าย)

ส่งมอบงานงวดที่ 7

ส่งมอบงานงวดที่ 6

ส่งมอบงานงวดที่ 5


ส่งมอบงานงวดที่ 4

ส่งมอบงานงวดที่ 3

ส่งมอบงานงวดที่ 2

ส่งมอบงานงวดที่ 1

ลงนามในสัญญาจ้าง

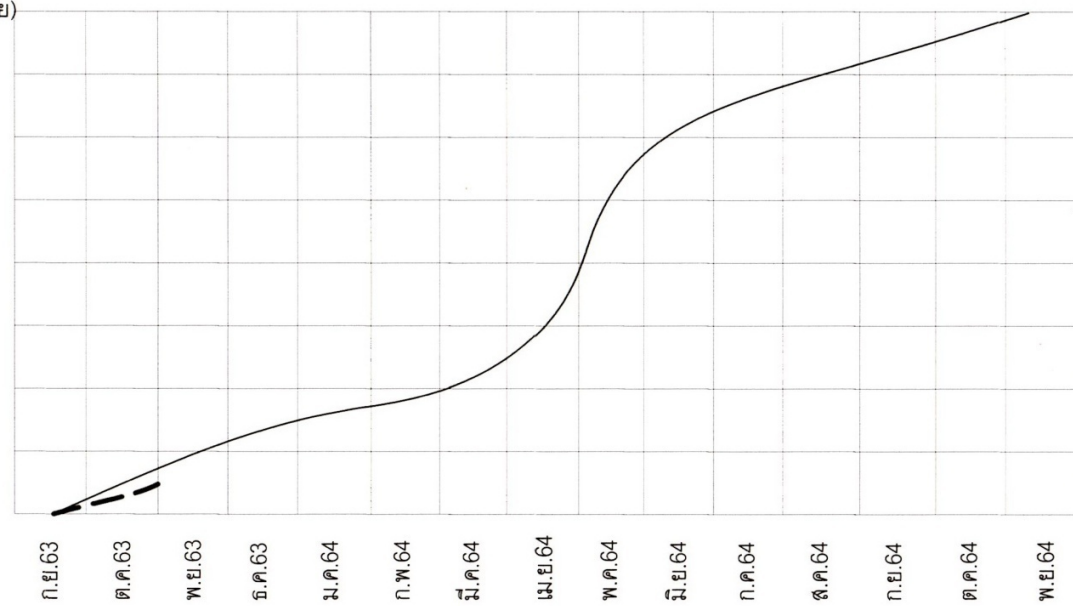

— แผนงาน

- - - ผลการดำเนินงาน

โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ปีงบประมาณ 2562

9-10-63

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๑๓	โครงการอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อม อาคารบริการภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อบจ.นบ. ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๕,๐๐๐,๐๐๐ กันไว้ ๕,๐๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
	กิจกรรม A																
	กิจกรรม b																
	กิจกรรม c																
	กิจกรรม d																
	รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : ก่อหนี้ผูกพันแล้วกันเงินไปเบิกจ่ายในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๔,๓๙๔,๐๐๐.- บาท)																	


ส่งมอบงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)

ส่งมอบงานงวดที่ 3

ส่งมอบงานงวดที่ 2

ส่งมอบงานงวดที่ 1

ลงนามในสัญญาจ้าง

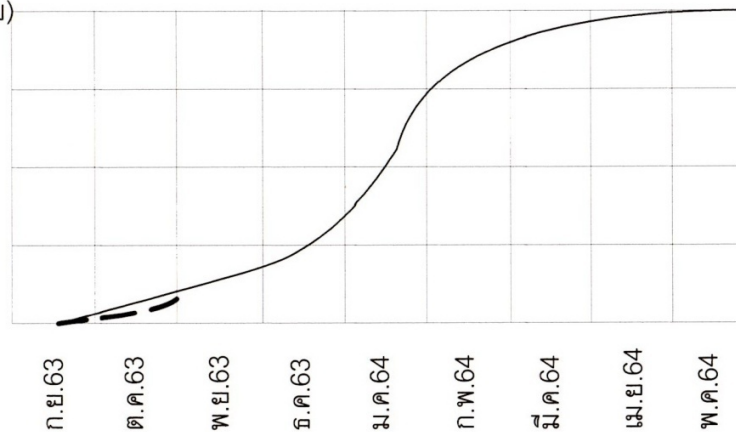

————— แผนงาน

----- ผลการดำเนินงาน

โครงการก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการ
ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ปีงบประมาณ 2562

9-10-63

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๑๘	โครงการบ่อปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Pond) ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรี ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๑๑,๕๐๐,๐๐๐ กันไว้ ๑๑,๕๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม A																	
กิจกรรม b																	
กิจกรรม c																	
กิจกรรม d																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : ยังไม่มีการก่อกำหนดเงินต่อในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๑๙	โครงการอาคารอเนกประสงค์ในการบริหารจัดการ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๙,๘๐๐,๐๐๐ กันไว้ ๙,๘๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม A																	
กิจกรรม b																	
กิจกรรม c																	
กิจกรรม d																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : ยังไม่มีการก่อหนี้เงินต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.๖๖๔																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๒๐	โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๕๐๐ KVA แบบมีเทอร์ลเลอร์ลากจูง	กองทรัพยากรฯ	๓,๓๓/๓,๒๕๕ กันไว้ ๓,๓๓/๓,๒๕๕	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ก.ย.๖๓)	เดือน													
				ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
กิจกรรม A																	
กิจกรรม b																	
กิจกรรม c																	
กิจกรรม d																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :ก่อนนี้ผูกพันแล้วกันเงินไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๓,๓๔๘,๑๘๐).....																	
