

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

สารบัญ

หน้า

- ◎ ตารางแสดงสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ ๑ – ๙
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒
 - สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ๑๐ – ๑๑
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑
 - สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ ๑๒ – ๑๔
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 - สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๕ – ๑๘
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑
 - สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ ๑๙ – ๒๒
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 - สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑..... ๒๓ – ๒๗
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 - สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒..... ๒๘ – ๔๒
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 - สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓..... ๔๓ – ๖๗

ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๓
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) (จำนวน ๔๘ โครงการ รายละเอียดโครงการปรากฏตามเอกสาร หน้า ๑๐-๖๗)

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) จำนวน ๑ โครงการ						
๑) ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียมขนาด ๔,๐๐๐ ที่นั่ง ระยะที่ ๑	สำนักช่าง		√			
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) จำนวน ๒ โครงการ						
๑) ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียมขนาด ๔,๐๐๐ ที่นั่ง (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๒) จ้างที่ปรึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	กองทรัพยากรฯ		√			
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๒ โครงการ						
๑) ก่อสร้างรั้วรอบสนามกีฬา หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๒) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งสำหรับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ของสำนักช่าง - รถยนต์ดับเพลิงถังน้ำในถังชนิดโฟม (๓,๕๐๐,๐๐๐) - เรือดับเพลิงกู้ภัย (๑๐,๐๐๐,๐๐๐)	สำนักช่าง			√		√

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ จำนวน ๓ โครงการ						
๑) โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาพิทักษ์นทเขต หมู่ที่ ๕ ตำบลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๒) โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล (เดิม) ให้เป็นสนามหญ้าเทียม ตำบลบางกร่าง อำเภเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๓) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองลากค้อน (ตอนที่ ๑) ตำบลราษฎร์นิยม อำเภไทรน้อย เชื่อมต่อดำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง		√			
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๔ โครงการ						
๑) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง			√		
๒) โครงการก่อสร้างถนนมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น - โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายวัดทางนาปรัง-วัดไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง		√			

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๔) โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.สายบ้านไทรน้อย-บ้านคลองนาหมอน (นบ.๒๐๔๔) ตอนที่ ๓ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๕) โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บางพลับ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง		√			
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๔ โครงการ						
๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย นบ.๔๐๒๑ บ้านหนองนกยางเขน-บ้านเต็มรัก ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง			√		
๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกษตรพัฒนา ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	√				
๓) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองโตะใหม่ฝั่งตะวันตก ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง			√		
๔) โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองลากค้อน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๕ ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย เชื่อมต่อ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง			√		

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๕) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และราวเหล็กกันตกถนนสายเลียบคลองประปามหาสวัสดิ์ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณสามอำเภอ คือ อ.บางใหญ่ อ.บางบัวทอง และ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง			√		
๖) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ไต่หุ่ย ตำบลขุนศรี อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง			√		
๗) โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนสายบ้านคลองเจ๊ก-บ้านสุเหว่าแดง พร้อมกำแพงกันดิน คสล. ตำบลละหาร เขื่อน ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง ช่วง กม.ที่ ๐+๙๐๐ ถึง กม.ที่ ๑+๖๙๕ จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๘) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง(โดยวิธี PAVEMENT IN -PLACE RECYCLING) ถนนสายเลียบคลองประปา(กม.ที่ ๙+๐๓๐ ถึง กม.ที่ ๑๑+๒๙๕) ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี	สำนักช่าง			√		
๙) โครงการก่อสร้างถนนสาย นบ ๓๐๘๖ บ้านบางไทร บ้านคลองตาซื่อน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง			√		
๑๐) โครงการขยายเขตบริการประปาในพื้นที่ที่มีประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง		√			

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๑๑) โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	√				
๑๒) โครงการก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการภายในสถานที่ กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	√				
๑๓) โครงการบ่อปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Pound) ภายในสถานที่กำจัด มูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ		√			
๑๔) โครงการอาคารเอนกประสงค์ในการบริหารจัดการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ		√			
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒๒ โครงการ						
๑) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนชอและอีศึกษาในสังกัด อบจ.นนทบุรี	กองการศึกษาฯ		√			
๒) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบฝึกทักษะพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อ การคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบสำหรับสถานศึกษาในสังกัด อบจ.นนทบุรี	กองการศึกษาฯ	√				

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๓) โครงการก่อสร้างถนนผิว คสล.พร้อมกำแพงกันดิน ถนนสายแยก ทล. ๓๔๕ ประตูน้ำคลองบางบัวทอง (ช่วง กม.ที่ ๑+๔๑๕ ๕๗/ กม.ที่ ๒ +๖๓๐) ตำบลละหาร ตำบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง			√		
๔) โครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือบริเวณหน้าวัดคลองพระอุดม หมู่ที่ ๕ ตำบล คลองพระอุดม อำเภอบางเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง			√		
๕) โครงการจัดซื้อที่ดินบริเวณข้างอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรี ตำบล บางศรีเมือง อำเภอบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๓ ไร่ ๓ งาน (ตามบัญชี แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ ลว. ๒ มิ.ย.๖๓ และครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ลว. ๑๘ ก.ย.๖๓)	สำนักช่าง	√				
๖) โครงการขยายเขตบริการประปาในพื้นที่ที่มีประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง		√			
๓) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบคลองหลุมสี่ ปรับปรุงคุณภาพด้วย น้ำยางธรรมชาติ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๘) โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณช่องคู่ขนานของถนนราชพฤกษ์ ด้านหน้าทางเข้าโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอบางเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง			√		

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๙) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ระยะที่ ๒ ขนาดความสูงไม่เกิน ๑๕ ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายงานก่อสร้างข้อกำหนดของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง			√		
๑๐) โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง			√		
๑๑) โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ระยะที่ ๒ จากเดิมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๐ ตารางเมตร ขนาดหรือพื้นที่เพิ่มขึ้น ๙๕๐ ตารางเมตร รวมขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๐ ตารางเมตร ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง			√		
๑๒) โครงการจ้างออกแบบอุทยานการเรียนรู้จังหวัดนนทบุรี หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง			√		
๑๓) โครงการจ้างออกแบบอาคารจอดรถยนต์บริเวณสนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง			√		

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๑๔) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬา(ระยะที่ ๓) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ขนาด ๒ ช่องจราจรผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมระบบระบายน้ำและทางเท้าตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๑๕) โครงการก่อสร้างบ่อฝังเก็บจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ		√			
๑๖) โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังดักไขมันและถังบำบัดน้ำเสียโรงเรียนในสังกัด อบจ.นนทบุรี	กองทรัพยากรฯ			√		
๑๗) โครงการปรับปรุงพื้นที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับเป็นลานออกกำลังกาย สวนพักผ่อน สถานที่ทำกิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าอิฐ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ		√			
๑๘) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี วัดสามง่าม	กองการศึกษาฯ		√			

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๑๙) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อตู้เย็นขนาด ๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้	สำนักช่าง	√				
๒๐) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี แบบ Smart TV	สำนักช่าง	√				
๒๑) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ดังนี้ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง ๒. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง ๓. เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง ๔. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๒ ชุด ๕. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์ฯ มาจากโรงงาน (OEM) จำนวน ๒ ชุด	สำนักช่าง	√				
๒๒) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๑๕ รายการฯ ละ ๔ ชุด	สำนักช่าง			√		
รวม		๘	๒๑	๑๙	-	-
รวมจำนวนทั้งสิ้น		๔๘				

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

(เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวประชุมไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔ ซึ่งมีจำนวน ๑ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๕๘) จำนวน ๑ โครงการ PERT / CPM / S-CURV (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อ.บ.น.นทบุรี)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																													
๑	ก่อสร้างอาคารโรงเรียนเซนต์ ขนาด ๔,๐๐๐ ที่นั่ง ระยะที่ ๑	สำนักช่าง	๒๙๔,๔๕๒,๐๐๐.๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ							☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ							☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ							☐ ๔.ยกเลิกโครงการ								
			ก่อนนี้ผูกพันร่วมกับ ระยะที่ ๒. ๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐																														
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔)	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔	ต.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	ก.ย.๖๕	ต.ค.๖๕	พ.ย.๖๕	ธ.ค.๖๕	ม.ค.๖๖	ก.พ.๖๖	มี.ค.๖๖	๑๐๐%	
	กิจกรรม A	งวดที่ ๑	๑๑,๗๖๐,๐๐๐																														๙๗
	กิจกรรม B	งวดที่ ๒	๑๒,๙๓๖,๐๐๐																														๙๕
	กิจกรรม C	งวดที่ ๓	๑๒,๓๔๘,๐๐๐																														๙๒
	กิจกรรม D	งวดที่ ๔	๑๑,๗๖๐,๐๐๐																														๙๐
	กิจกรรม E	งวดที่ ๕	๑๔,๔๐๖,๐๐๐																														๘๗
	กิจกรรม F	งวดที่ ๖	๑๔,๔๐๖,๐๐๐																														๘๒
	กิจกรรม G	งวดที่ ๗	๑๔,๔๐๖,๐๐๐																														๗๙
	กิจกรรม H	งวดที่ ๘	๑๓,๒๓๐,๐๐๐																														๗๖
	กิจกรรม I	งวดที่ ๙	๑๔,๑๑๒,๐๐๐																														๗๒
	กิจกรรม J	งวดที่ ๑๐	๑๒,๐๕๔,๐๐๐																														๖๗
	กิจกรรม K	งวดที่ ๑๑	๑๒,๓๔๘,๐๐๐																														๖๕
	กิจกรรม L	งวดที่ ๑๒	๑๒,๖๔๒,๐๐๐																														๖๒
	กิจกรรม M	งวดที่ ๑๓	๑๔,๔๐๖,๐๐๐																														๕๘
	กิจกรรม N	งวดที่ ๑๔	๑๒,๐๕๔,๐๐๐																														๕๓
	กิจกรรม O	งวดที่ ๑๕	๘,๕๒๖,๐๐๐																														๔๐
	กิจกรรม P	งวดที่ ๑๖	๖,๑๗๔,๐๐๐																														๔๖
	กิจกรรม Q	งวดที่ ๑๗	๑๒,๙๓๖,๐๐๐																														๔๑
	กิจกรรม R	งวดที่ ๑๘	๑๒,๖๔๒,๐๐๐																														๓๖
	กิจกรรม S	งวดที่ ๑๙	๘,๘๒๐,๐๐๐																														๓๑
	กิจกรรม T	งวดที่ ๒๐	๑๐,๒๙๐,๐๐๐																														๒๖
	กิจกรรม U	งวดที่ ๒๑	๑๒,๓๔๘,๐๐๐																														๒๒
	กิจกรรม V	งวดที่ ๒๒	๙,๗๐๒,๐๐๐																														๑๗
	กิจกรรม W	งวดที่ ๒๓	๖,๗๖๒,๐๐๐																														๑๓
	กิจกรรม X	งวดที่ ๒๔	๘,๕๒๖,๐๐๐																														๘
	กิจกรรม Y	งวดที่ ๒๕	๕,๒๙๒,๐๐๐																														๔
	กิจกรรม Z	งวดที่ ๒๖	๙,๑๑๔,๐๐๐																														๐
			๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐																														
			๑๑,๗๖๐,๐๐๐																														
☐	ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE ได้เหตุผล.....																																
ขั้นตอน / เหตุผล / ผลกระทบ : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ 25/2564 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 5 มีนาคม 2566																																	

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล.....

ขั้นตอน / เหตุผล / ผลกระทบ : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ 25/2564 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 5 มีนาคม 2566

สรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔ ซึ่งมีจำนวน ๒ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๕๙) จำนวน ๑ โครงการ PERT / CPM / S-CURV (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ(ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																
๑	ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ ๔,๐๐๐ ที่นั่ง (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๙ ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐ ก่อนนี้ผูกพันร่วมกับ ระยะที่ ๑. ๒๙๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ																
				กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ																
			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔)	ธ.ค.๖๓	ม.ก.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔	ต.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ก.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	๑๐๐%
กิจกรรม A	งวดที่ ๑	๑๑,๗๖๐,๐๐๐	๑๑,๗๖๐,๐๐๐																	97
กิจกรรม B	งวดที่ ๒	๑๒,๙๓๖,๐๐๐																		95
กิจกรรม C	งวดที่ ๓	๑๒,๓๘๘,๐๐๐																		92
กิจกรรม D	งวดที่ ๔	๑๑,๗๖๐,๐๐๐																		90
กิจกรรม E	งวดที่ ๕	๑๔,๔๐๖,๐๐๐																		87
กิจกรรม F	งวดที่ ๖	๑๔,๔๐๖,๐๐๐																		82
กิจกรรม G	งวดที่ ๗	๑๔,๔๐๖,๐๐๐																		79
กิจกรรม H	งวดที่ ๘	๑๓,๒๓๐,๐๐๐																		76
กิจกรรม I	งวดที่ ๙	๑๔,๑๑๒,๐๐๐																		72
กิจกรรม J	งวดที่ ๑๐	๑๒,๐๕๔,๐๐๐																		67
กิจกรรม K	งวดที่ ๑๑	๑๒,๓๕๘,๐๐๐																		55
กิจกรรม L	งวดที่ ๑๒	๑๒,๖๔๒,๐๐๐																		52
กิจกรรม M	งวดที่ ๑๓	๑๔,๔๐๖,๐๐๐																		50
กิจกรรม N	งวดที่ ๑๔	๑๒,๐๕๔,๐๐๐																		53
กิจกรรม O	งวดที่ ๑๕	๘,๕๒๖,๐๐๐																		49
กิจกรรม P	งวดที่ ๑๖	๖,๑๗๔,๐๐๐																		43
กิจกรรม Q	งวดที่ ๑๗	๑๒,๙๓๖,๐๐๐																		41
กิจกรรม R	งวดที่ ๑๘	๑๒,๖๔๒,๐๐๐																		36
กิจกรรม S	งวดที่ ๑๙	๘,๘๒๐,๐๐๐																		31
กิจกรรม T	งวดที่ ๒๐	๑๐,๒๙๐,๐๐๐																		26
กิจกรรม U	งวดที่ ๒๑	๑๒,๓๕๘,๐๐๐																		22
กิจกรรม V	งวดที่ ๒๒	๙,๗๐๒,๐๐๐																		17
กิจกรรม W	งวดที่ ๒๓	๖,๗๖๒,๐๐๐																		13
กิจกรรม X	งวดที่ ๒๔	๘,๕๒๖,๐๐๐																		8.4
กิจกรรม Y	งวดที่ ๒๕	๕,๒๙๒,๐๐๐																		4
กิจกรรม Z	งวดที่ ๒๖	๙,๑๑๔,๐๐๐																		0
	รวม	๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐	๑๑,๗๖๐,๐๐๐																	

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล.....

ขั้นตอน / เหตุผล / ผลกระทบ : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ 25/2564 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 5 มีนาคม 2566

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๒	จ้างที่ปรึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบ รวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	กองทรัพยากรฯ	๒๕,๐๐๐,๐๐๐ กันเงิน ๑๓,๔๓๖,๒๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔)	เดือน													
				ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔		
	กิจกรรม A																
	กิจกรรม b																
	กิจกรรม c																
	กิจกรรม d																
	กิจกรรม e																
	รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานตามสัญญาจ้าง กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป ๕,๒๔๑,๕๐๐																	

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔ ซึ่งมีจำนวน ๒ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐) จำนวน ๒ โครงการ
PERT/CPM/S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นันทบุรี)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนันทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																	
๑	โครงการก่อสร้างรั้วรอบสนามกีฬา หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักงาน	๑๒,๔๓๙,๐๐๐.๐๐ ก่อนหักผูกพันแล้ว ๑๑,๕๕๕,๕๕๕.๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ											
				กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔)		เดือน													
								ม.ค.- ๖๔	พ.ย.- ๖๔	ธ.ค.- ๖๔	ม.ค.- ๖๕	ก.พ.- ๖๕	มี.ค.- ๖๕	เม.ย.- ๖๕	พ.ค.- ๖๕	มิ.ย.- ๖๕	ก.ค.- ๖๕	ส.ค.- ๖๕	ก.ย.- ๖๕		
								กิจกรรม A งวดที่ ๑	๑,๙๖๔,๔๔๔.๓๕												
กิจกรรม b งวดที่ ๒	๔,๒๗๕,๕๕๕.๓๕																๘๑%				
กิจกรรม c งวดที่ ๓	๓,๑๑๙,๙๙๙.๘๕																๕%				
กิจกรรม d งวดที่ ๔	๒,๑๙๕,๕๕๕.๔๕																๑๑%				
รวม	๑๑,๕๕๕,๕๕๕.๐๐																				
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																					
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๖/๒๕๖๓ ลว.๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงสุด ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ มีการแก้ไขแบบแปลน																					
ทับซ้อนกับโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน แห่งใหม่ (แห่งที่ 3) สำนักงาน กกท. และราษฎรบริเวณด้านข้างขอให้ปรับแก้ไขแบบแปลน																					

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมบนทปรีให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๒	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่งสำหรับการปฏิบัติงานในความ รับผิดชอบของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ ๒.๑ รถยนต์ดับเพลิงถังน้ำในถัง ชนิดฉีดโฟม จำนวน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท	สำนักช่าง	๑๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☐ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☒ ๔. ยกเลิกโครงการ						
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔)	เดือน												
				เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔
กิจกรรม A สอบถามราคาผู้จำหน่าย																
กิจกรรม A แต่งตั้งคณะกรรมการฯ																
กิจกรรม C จัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะฯ																
กิจกรรม D ดำเนินการจัดซื้อ																
กิจกรรม E ลงทะเบียนทรัพย์สิน																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ผวงไม่อนุมัติให้ขยายเวลากันเงิน.....																

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมนพบุรีให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๒ (ต่อ)	๒.๒ เรือดับเพลิงกู้ภัย จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	สำนักงานช่าง	๑๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ							
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔)	เดือน													
				มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม		
	กิจกรรม A สอบถามราคาผู้จัดจำหน่าย																
	กิจกรรม A แต่งตั้งคณะกรรมการฯ																
	กิจกรรม C จัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะฯ																
	กิจกรรม D ดำเนินการจัดซื้อ																
	กิจกรรม E ลงทะเบียนทรัพย์สิน																
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สืบเนื่องจากที่ได้มีการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา e-bidding คือ บริษัท จิมิค ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 9,890,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)																	
ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของบริษัท มาซัน จำกัด (มหาชน) ให้กลับไปดำเนินการพิจารณาผลการเสนอราคาของผู้ยื่นการเสนอราคา																	
ให้ถูกต้องนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดซื้อ.....																	

สรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔ ซึ่งมีจำนวน ๓ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๓ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑
(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐) จำนวน ๓ โครงการ
PERT/CPM/S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																	
๑	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องสว่างพื้ที่ทัศนชนเขต หมู่ที่ 5ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	๙,๔๑๓,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ														
				กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔)		เดือน													
								ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	ก.ย.๖๕	๑๐๐%				
				กิจกรรม A งานงวดที่ ๑	๓,๒๗๓,๘๕๐.๐๐	๓,๒๗๓,๘๕๐.๐๐														๘๕%	
				กิจกรรม B งานงวดที่ ๒	๓,๕๑๓,๔๐๐.๐๐	๓,๕๑๓,๔๐๐.๐๐														๔๑%	
				กิจกรรม C งานงวดที่ ๓	๑,๑๙๗,๗๕๐.๐๐															๐%	
				กิจกรรม D																	
				กิจกรรม E																	
รวม	๗,๙๘๕,๐๐๐.๐๐	๖,๗๘๗,๒๕๐.๐๐																			
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล.....																					
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๕๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างรอการไฟฟ้าติดตั้งหน่วยวัด																					

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)																	
๒	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล (เดิม) สนามหญ้าเทียม ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ตามรูปแบบรายละเอียดข้อกำหนด ของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๔๐,๘๙๖,๐๐๐.๐๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๔๐,๖๙๙,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ										
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๔)		เดือน																
				ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓	ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔	ต.ค.๖๔	100%
กิจกรรม A งานงวดที่ ๑	๓,๒๕๕,๙๒๐.๐๐	๓,๒๕๕,๙๒๐.๐๐																		๙๕
กิจกรรม B งานงวดที่ ๒	๘,๑๓๙,๘๐๐.๐๐	๘,๑๓๙,๘๐๐.๐๐																		๕๗
กิจกรรม C งานงวดที่ ๓	๖,๕๑๑,๘๔๐.๐๐	๖,๕๑๑,๘๔๐.๐๐																		๔๕
กิจกรรม D งานงวดที่ ๔	๕,๒๙๐,๘๗๐.๐๐	๕,๒๙๐,๘๗๐.๐๐																		๒๘
กิจกรรม E งานงวดที่ ๕	๑๕,๔๖๕,๖๒๐.๐๐	๑๕,๔๖๕,๖๒๐.๐๐																		๖
กิจกรรม F งานงวดที่ ๖	๒,๐๓๔,๙๕๐.๐๐																			๐
รวม	๔๐,๖๙๙,๐๐๐.๐๐	๓๘,๖๖๔,๐๕๐.๐๐																		

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล

ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ : สัญญาจ้างเลขที่ ๔๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ ปรับแก้แบบแปลนเนื่องจากจังหวัดประสงค์ใช้พื้นที่ทับซ้อนกับโครงการ.....

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๑ ซึ่งมีจำนวน ๔ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๑ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๔ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๖๑) จำนวน ๕ โครงการ
PERT/CPM/S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																	
๑	โครงการการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ														
								กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔)	เดือน											
										มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	
										☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล											
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :ดำเนินการก่อสร้างกับโครงการโอนเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ที่เหลือจ่าย) จำนวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท																					
อยู่ระหว่างจัดทำร่างแบบรายละเอียดการก่อสร้างและจัดทำราคากลาง																					

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๒ (ต่อ)	๒.๒ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายวัดทองนาบั้ง-วัดไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลบางศรีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	๔,๑๖๕,๐๐๐.๐๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๓,๔๑๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ						
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔)	เดือน												
			ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ธ.ค.๖๔	ก.พ.๖๔		
	กิจกรรม A งวดที่ 1	๒,๔๒๑,๑๐๐.๐๐														
	กิจกรรม b งวดที่ 2	๙๘๘,๙๐๐.๐๐														
	กิจกรรม c															
	กิจกรรม d															
กิจกรรม e																
รวม	๓,๔๑๐,๐๐๐.๐๐															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หยุดงานเนื่องจาก																
ปัญหาอุปสรรคเรื่องผิวจราจรเดิมชำรุดจากการถนดินชนดินทำให้ผิวจราจรเกิดชำรุด และรอให้ทำการซ่อมแซมคืนสภาพผิวจราจร คสล.เดิมเสร็จก่อน จึงจะดำเนินการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือได้.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																		
๔	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. สายบ้านไทรน้อย-บ้านคลอง นาหมอน (นบ.๒๐๔๔) ตอนที่ ๓ ตำบลคลองขวาง อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	๖๒,๙๓๐,๐๐๐.๐๐ ก่อนหักเงินแล้วจำนวน ๔๙,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ				☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ				☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ				☐ ๔. ยกเลิกโครงการ						
				กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔)	เดือน															
							ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔	ต.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	รวม			
				กิจกรรม A งานงวดที่ ๑	๕,๔๔๑,๗๐๐.๐๐																๕๔.๐๐	
				กิจกรรม b งานงวดที่ ๒	๕,๔๔๑,๗๐๐.๐๐																๗๗.๕๐	
				กิจกรรม c งานงวดที่ ๓	๑๑,๑๓๐,๗๕๐.๐๐																๖๑.๕๐	
				กิจกรรม d งานงวดที่ ๔	๘,๔๐๙,๙๐๐.๐๐																๔๔.๕๐	
				กิจกรรม e งานงวดที่ ๕	๗,๙๑๕,๒๐๐.๐๐																๒๒.๐๐	
				กิจกรรม f งานงวดที่ ๖	๕,๑๙๔,๓๕๐.๐๐																๑๑.๐๐	
				กิจกรรม g งานงวดที่ ๗	๕,๙๓๖,๔๐๐.๐๐																-	
รวม	๔๙,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	-																				

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล
 ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เนื่องจากมีแนวท่อประปาขนาด ๐.๓๐ เมตร
 บางส่วนอยู่ในแนวก่อสร้างกำแพงกันดิน , แนวท่อประปาใต้ดินขนาด ๑.๐๐ เมตร อยู่ในแนวก่อสร้างบ่อระบายน้ำของโครงการ

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																	
๕	โครงการก่อสร้างอาคารกีฬา อเนกประสงค์บางพลับ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๒๗,๑๒๓,๐๐๐.๐๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๒๒,๑๘๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ																	
				กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔)	เดือน															
						ม.ค. ๖๕	ก.พ. ๖๕	มี.ค. ๖๕	เม.ย. ๖๕	พ.ค. ๖๕	มิ.ย. ๖๕	ก.ค. ๖๕	ส.ค. ๖๕	ก.ย. ๖๕	ต.ย. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	๑๐๐%			
				กิจกรรม A งานงวดที่ ๑	๑,๒๑๙,๙๐๐.๐๐															๘๕.๕	
				กิจกรรม b งานงวดที่ ๒	๕,๑๐๑,๔๐๐.๐๐															๗๑.๐	
				กิจกรรม c งานงวดที่ ๓	๖,๔๓๒,๒๐๐.๐๐															๕๗.๕	
				กิจกรรม d งานงวดที่ ๔	๒,๙๙๔,๓๐๐.๐๐															๒๘.๕	
				กิจกรรม e งานงวดที่ ๕	๒,๙๙๔,๓๐๐.๐๐															๙	
กิจกรรม f งานงวดที่ ๖	๓,๔๓๗,๙๐๐.๐๐															๐					
รวม	๒๒,๑๘๐,๐๐๐.๐๐																				

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล

ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และได้ขออนุมัติ.....

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔ มีจำนวน ๑๔ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๑๑ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๖๒) จำนวน ๙ โครงการ


PERT / CPM / S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สาย นบ.๔๐๒๑ บ้านหนองนกยางเขน- บ้านเต็มรัก ต.บางคูวัด อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๗,๒๕๓,๐๐๐.๐๐													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒)	เดือน												
				เม.ย.๖๒	เม.ธ.๖๒	พ.ย.๖๒	พ.ธ.๖๒	พ.ค.๖๒	พ.ค.๖๒	พ.ค.๖๒	พ.ค.๖๒	พ.ค.๖๒	พ.ค.๖๒	พ.ค.๖๒	พ.ค.๖๒	
	กิจกรรม A สักรวจ															
	กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา															
	กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง															
	กิจกรรม d															
	รวม															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																
				☒ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ												☐ ๔. ยกเลิกโครงการ		
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เกษตรพัฒนา ต.คลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๓๕,๐๓๒,๐๐๐.๐๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๒๕,๒๕๐,๐๐๐.๐๐																	
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔)	เดือน																	
			เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	๑๐๐%	
กิจกรรม งานงวดที่ ๑	๖,๘๑๗,๕๐๐.๐๐	๖,๘๑๗,๕๐๐.๐๐																	๗๖	
กิจกรรม งานงวดที่ ๒	๗,๓๒๒,๕๐๐.๐๐	๗,๒๘๖,๓๙๕.๐๐																	๕๖	
กิจกรรม งานงวดที่ ๓	๕,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๒๐,๑๐๐.๐๐																	๒๗	
กิจกรรม งานงวดที่ ๔	๖,๐๖๐,๐๐๐.๐๐	๕,๙๙๖,๕๐๕.๐๐																	๐	
รวม	๒๕,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๑๒๐,๕๐๐.๐๐																		
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																				
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินครบทุกงวดแล้ว ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๕ เมษายน ๒๕๖๔																				
และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔																				

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)																																
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เลียบคลองโตะใหม่ฝั่งตะวันตก ต.บางคูวัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๓๑,๙๓๘,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ																												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔)	เดือน																																
			ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓	ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔									
กิจกรรม A สำรวจ																																			
กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา																																			
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																																			
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																																			
กิจกรรม e.....																																			
รวม																																			
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																																			
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ยกเลิกประกาศประกวดราคา (ไม่มีผู้ผ่านการเสนอราคา)																																			

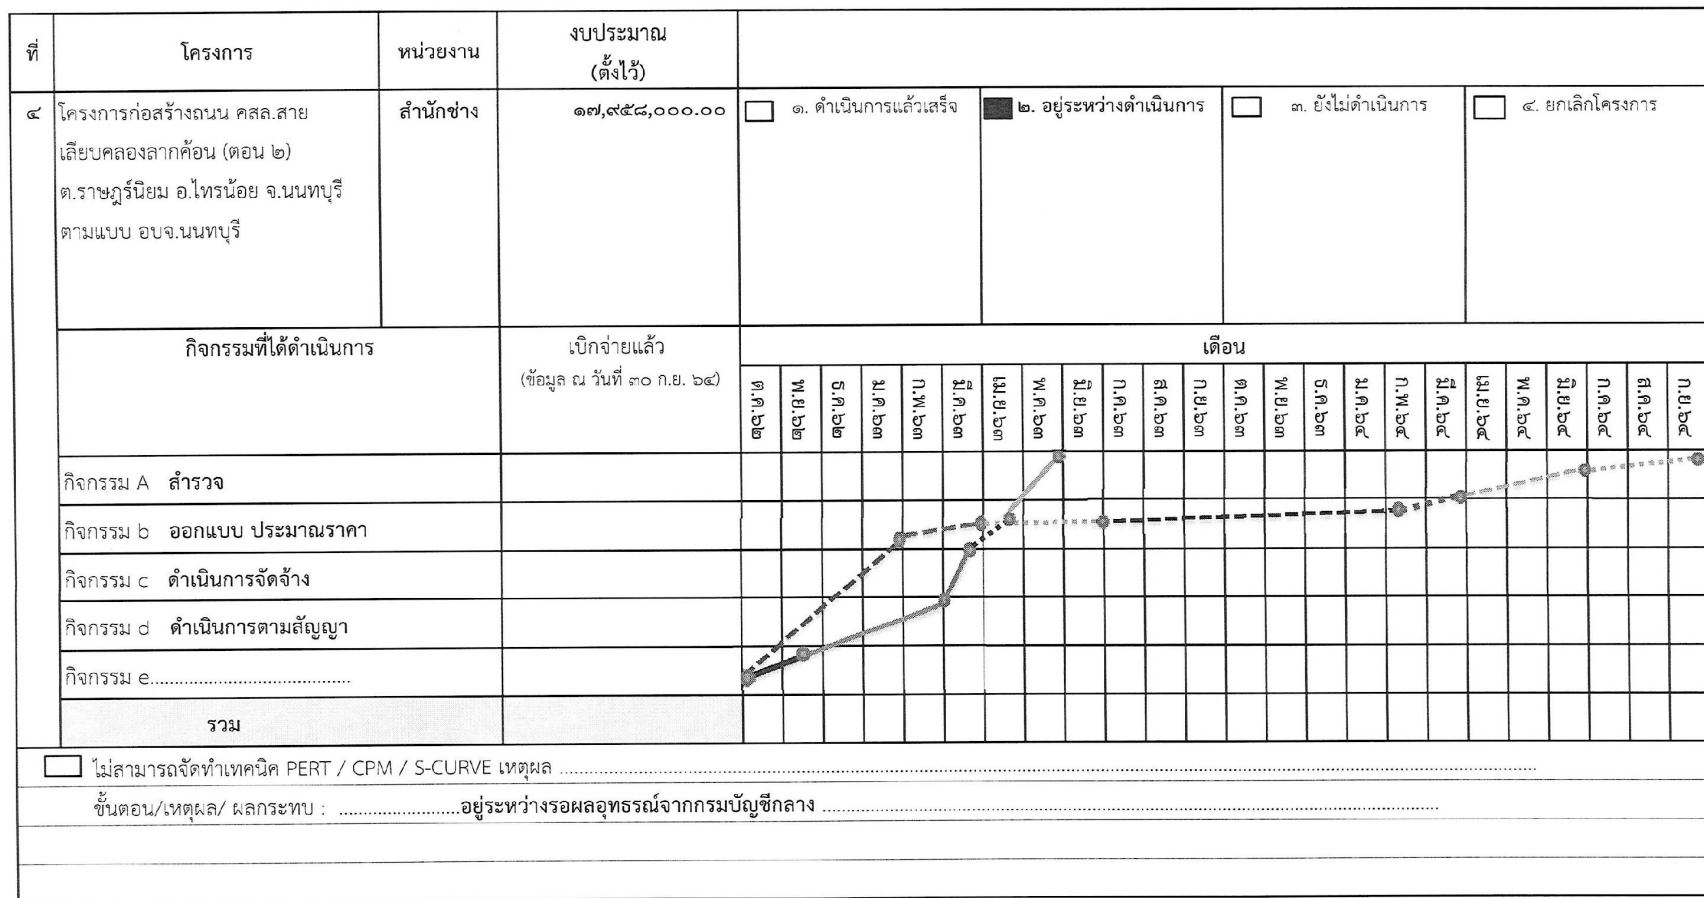

รหัส	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน															
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และราวเหล็กกันตกถนนสาย เลียบคลองประปามหาสวัสดิ์ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณสามอำเภอ คือ อ.บางใหญ่ อ.บางบัวทอง และ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๗,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ				☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ				☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ				☐ ๔. ยกเลิกโครงการ			
				กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔)		เดือน											
								๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๓	๒๕๗๔	
				กิจกรรม A สำรวจ															
				กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา															
				กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง															
				กิจกรรม d.....															
				กิจกรรม e.....															
รวม																			
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																			
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างการพิจารณาผลของคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง.....																			

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)																												
๖	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โต๊ะน้อย ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๒๕,๙๗๕,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ							☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ							☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ							☐ ๔. ยกเลิกโครงการ						
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕)	เดือน ต.ค.๖๔พ.ย.๖๔ธ.ค.๖๔ม.ค.๖๕ก.พ.๖๕มี.ค.๖๕เม.ย.๖๕พ.ค.๖๕มิ.ย.๖๕ก.ค.๖๕ส.ค.๖๕ก.ย.๖๕ต.ย.๖๕พ.ย.๖๕ธ.ค.๖๕ม.ค.๖๖ก.พ.๖๖มี.ค.๖๖เม.ย.๖๖พ.ค.๖๖มิ.ย.๖๖ก.ค.๖๖ส.ค.๖๖ก.ย.๖๖ต.ย.๖๖พ.ย.๖๖ธ.ค.๖๖ม.ค.๖๗ก.พ.๖๗มี.ค.๖๗เม.ย.๖๗พ.ค.๖๗มิ.ย.๖๗ก.ค.๖๗ส.ค.๖๗ก.ย.๖๗																												
กิจกรรม A สํารวจ																															
กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา																															
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																															
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																															
กิจกรรม e.....																															
รวม																															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																															
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาจ้าง																															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
๗	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติถนนสายบ้าน คลองเจ๊ก-บ้านสุเหร่าแดง พร้อม กำแพงกันดิน คสล. ต่อบลัสนหาร เชื่อมตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง ช่วงกม.ที่ ๐+๕๐๐ ถึง กม.ที่ ๑+๖๕๕) จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔)	เดือน													
			ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔		
กิจกรรม A งานงวดที่ ๑	๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐															
กิจกรรม B งานงวดที่ ๒	๒,๒๔๐,๐๐๐.๐๐															
กิจกรรม C งานงวดที่ ๓	๒,๙๖๐,๐๐๐.๐๐															
รวม	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน														
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ											
๘	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ลาดยาง (โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING) ถนนสาย เลียบคลองประปา (กม.ที่ ๙+๐๓๐ ถึง กม.๑๑+๒๙๕) ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐															
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔)	เดือน															
			๒๕.๙.๕๐	๒๕.๙.๕๑	๒๕.๙.๕๒	๒๕.๑๐.๕๑	๒๕.๑๐.๕๒	๒๕.๑๑.๕๑	๒๕.๑๑.๕๒	๒๕.๑๒.๕๑	๒๕.๑๒.๕๒	๒๕.๑.๕๑	๒๕.๑.๕๒	๒๕.๒.๕๑	๒๕.๒.๕๒			
กิจกรรม A สั้ววาง																		
กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา																		
กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																		
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																		
กิจกรรม e.....																		
รวม																		
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																		
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างการพิจารณาผลของคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง.....																		

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ										
๙	โครงการก่อสร้างถนนสาย นบ.๓๐๘๖บ้านบางไทร- บ้านคลองตาช้อนต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐														
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔)	เดือน														
			๒๕.๖.๔	๒๕.๗.๔	๒๕.๘.๔	๒๕.๙.๔	๒๕.๑๐.๔	๒๕.๑๑.๔	๒๕.๑๒.๔	๒๕.๑.๕	๒๕.๒.๕	๒๕.๓.๕	๒๕.๔.๕	๒๕.๕.๕	๒๕.๖.๕		
	กิจกรรม A สั้วร่ว																
	กิจกรรม b ออกแบบ ประมาณราคา																
	กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																
	กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																
	กิจกรรม e.....																
	รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างจัดจ้างฯ																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
๑๐	โครงการขยายเขตบริการประปาในพื้นที่ที่มีประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ											
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔)	เดือน											
				ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔
กิจกรรม A ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีเส้นทางการวางท่อประปา จำนวน ๕๑ เส้นทาง ยาวประมาณ ๔๖.๕ กิโลเมตร ขณะนี้ได้ดำเนินการวางท่อประปาแล้วเสร็จ จำนวน ๕๐ เส้นทาง และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ เส้นทาง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔			๒๒,๖๙๐,๒๕๖.๕๖												
กิจกรรม b															
กิจกรรม c															
กิจกรรม d															
รวม			๒๒,๖๙๐,๒๕๖.๕๖												
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :															

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๑๑	โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอยขององค์การ- บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีภายในสถานที่กำจัดมูล ฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ กันเงินไว้ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔)	เดือน												
				ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔	
กิจกรรม A เบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๓,๔ และ ๕			๓๒,๓๔๓,๕๐๐											→		
กิจกรรม b เบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๖,๗ และ ๘ (งวดสุดท้าย)			๑๒,๖๑๖,๐๕๐												→	
กิจกรรม c																
กิจกรรม d																
รวม			๔๔,๙๖๓,๕๕๐													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน										
๑๒	โครงการอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อม อาคารบริการภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อบจ.นบ. ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๕,๐๐๐,๐๐๐ กันไว้ ๕,๐๐๐,๐๐๐	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ										
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๕)	เดือน											
			ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๕	ก.พ. ๖๕	มี.ค. ๖๕	เม.ย. ๖๕	พ.ค. ๖๕	มิ.ย. ๖๕	ก.ค. ๖๕	ส.ค. ๖๕	ก.ย. ๖๕
	กิจกรรม Aเบิกเงินค่าจ้างงวดที่ ๓.....	๔๓/๓,๘๐๐										→		
	กิจกรรม bเบิกเงินค่าจ้างงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย).....												→	
	กิจกรรม c													
	กิจกรรม d													
	รวม	๑,๗๕๕,๖๐๐												
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :														

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๑๓	โครงการบ่อปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Pond) ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรี ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๑๑,๕๐๐,๐๐๐ กันไว้ ๑๑,๕๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔)	เดือน													
				ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔		
กิจกรรม A																	
กิจกรรม b																	
กิจกรรม c																	
กิจกรรม d																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : อยู่ในขั้นตอนการบริหารสัญญา กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป ๙,๙๖๐,๐๐๐ บาท																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๑๔	โครงการอาคารอเนกประสงค์ในการบริหารจัดการ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๙,๘๐๐,๐๐๐ กันไว้ ๙,๘๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔)	เดือน													
				ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔		
	กิจกรรม A																
	กิจกรรม b																
	กิจกรรม c																
	กิจกรรม d																
	รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : อยู่ในขั้นตอนการบริหารสัญญา กั้นเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป ๙,๒๙๙.๐๐๐ บาท																	

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔ มีจำนวน ๒๒ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๑๗ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓)

PERT / CPM / S-CURVE(ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข


ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนขอและฮศึกษาในสังกัด อบจ.นนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๓/,๓/๓๓/,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔)	เดือน
				ต.ค. ๖๓ พ.ย. ๖๓ ธ.ค. ๖๓ ม.ค. ๖๔ ก.พ. ๖๔ มี.ค. ๖๔ เม.ย. ๖๔ พ.ค. ๖๔ มิ.ย. ๖๔ ก.ค. ๖๔ ส.ค. ๖๔ ก.ย. ๖๔
กิจกรรม Aดำเนินการประมาณราคากลาง.....				
กิจกรรม bอนุมัติราคากลาง.....				
กิจกรรม cดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง.....				
กิจกรรม dดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง.....				
รวม				
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๑/๒๕๖๔ ลงนามเมื่อเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔.....				

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนขอและฮศึกษาในสังกัด อบจ.นนทบุรี

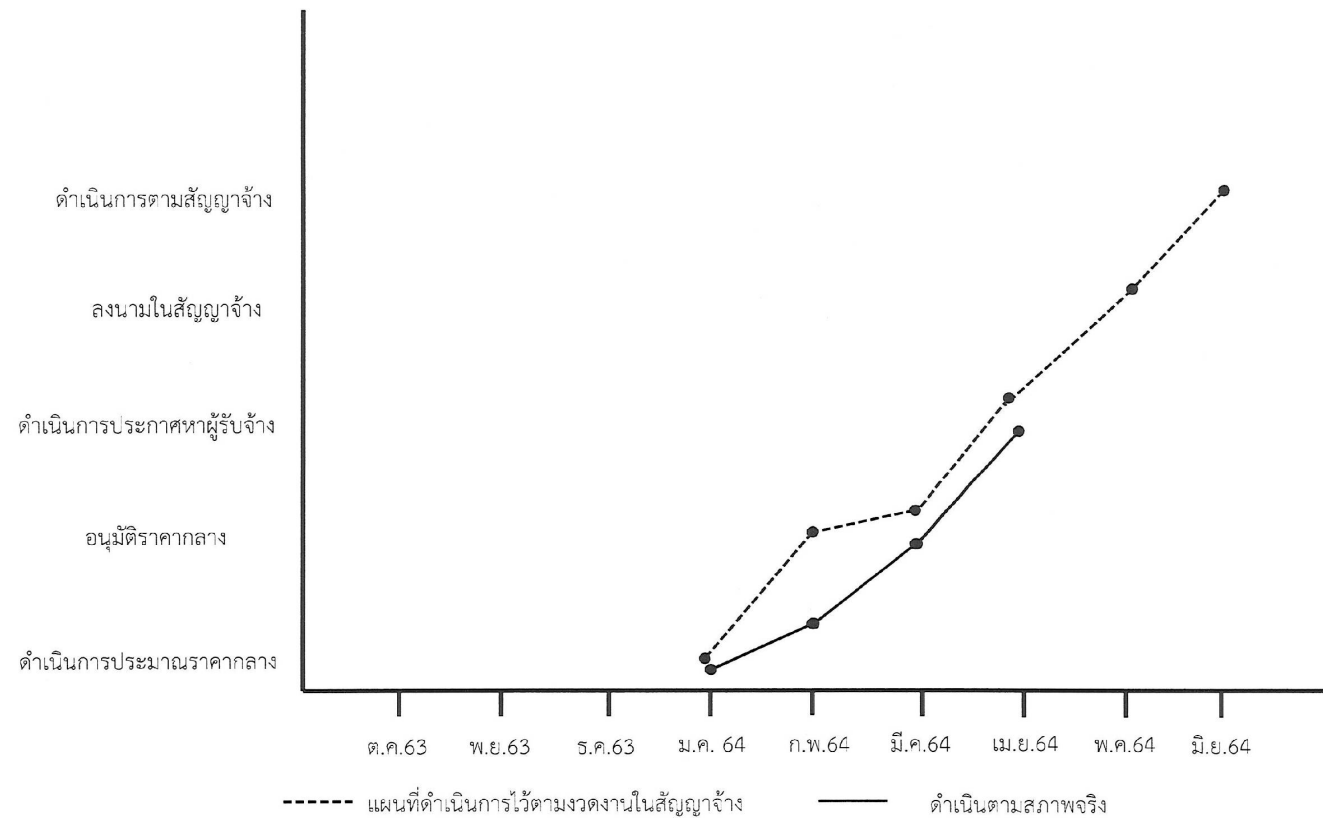

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๒	โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบฝึกทักษะ พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อการคิดแก้ปัญหาอย่าง เป็นระบบสำหรับสถานศึกษาในสังกัด อบจ.นนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๓,๔๔๔,๙๐๐	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔)	เดือน													
ต.ค. ๖๓			พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔			
	กิจกรรม Aดำเนินการประมาณราคากลาง.....															
	กิจกรรม bอนุมัติราคากลาง.....															
	กิจกรรม cดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง.....															
	กิจกรรม dดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง..... เบิกจ่ายงวดที่ ๑ เบิกจ่ายงวดที่ ๒ เบิกจ่ายงวดที่ ๓ เบิกจ่ายงวดที่ ๔	๑,๒๐๕,๓๑๕ ๑,๒๐๕,๓๑๕ ๘๖๑,๒๒๕ ๑๓๑,๒๔๕		↔		↔				↔			↔			
	รวม	๓,๔๔๔,๙๐๐														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :เบิกจ่ายงบประมาณตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เบิกจ่ายงวดที่ ๓																

โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบฝึกทักษะพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อคิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
สำหรับสถานศึกษาในสังกัด อบจ.นนทบุรี

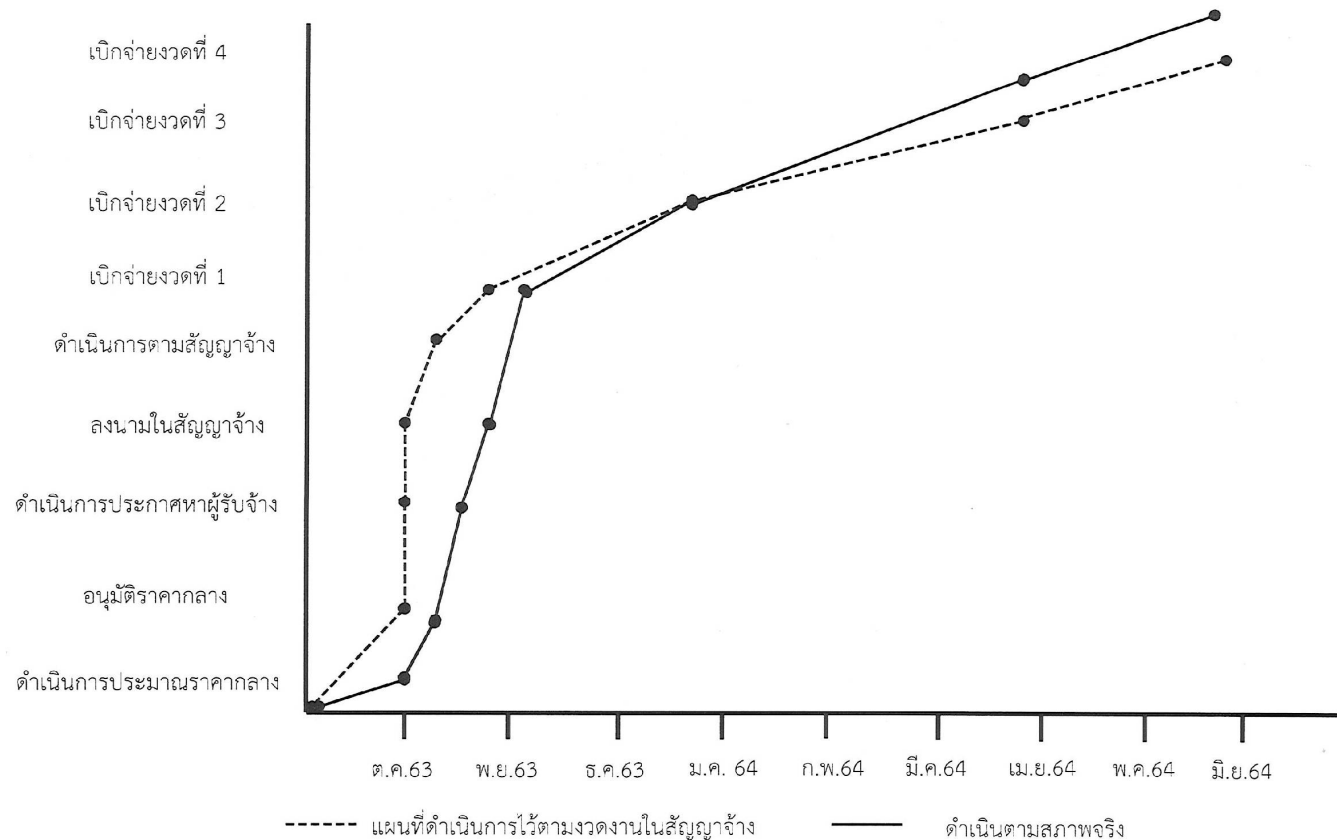

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๓	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. พร้อมกำแพงกันดิน ถนนสายแยก ทล.๓๔๕ ประตูน้ำคลองบางบัวทอง (ช่วง กม.ที่ ๑+๔๑๕ ถึง กม.ที่ ๒+๖๓๐) ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๑๕.๐๐ เมตร ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ				☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ				☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ				☐ ๔. ยกเลิกโครงการ
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔)	เดือน													
			ต.๑-๑๒	พ.ย.๖๓	ธ.๑-๑๒	ม.๑-๑๒	ก.พ.๖๔	มี.๑-๑๒	เม.๑-๑๒	พ.๑-๑๒	มิ.ย.๖๔	ก.๑-๑๒	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔		
กิจกรรม A แต่งตั้งคณะกรรมการฯ																
กิจกรรม B ออกแบบ ประมาณราคา																
กิจกรรม C ดำเนินการจัดจ้าง																
กิจกรรม D ดำเนินการตามสัญญา																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :พื้นที่ดำเนินโครงการทับซ้อนกับกรมชลประทาน , อยู่ระหว่างหารือจังหวัดนนทบุรี การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณฯ																

ร.	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																	
ค.				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ได้ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ														
ค.	โครงการก่อสร้างโปะทำเทียมเรือบริเวณหน้าวัดปากคลองพระอุดม หมู่ที่ ๕ ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ก่อสร้างโปะเหล็กขึ้น-ลงเรือขนาด ๔.๐๐x๘.๐๐x๑.๒๐ เมตร ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๑,๔๐๗,๐๐๐.๐๐																		
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔)	เดือน																	
				พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔					
	กิจกรรม A แต่งตั้งคณะกรรมการ , กำหนดราคากลาง																				
	กิจกรรม b ตรวจสอบแบบแปลน , ขออนุญาตก่อสร้าง,																				
	จัดทำราคากลาง																				
	กิจกรรม c ดำเนินการจัดจ้าง																				
	กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา																				
รวม																					
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างขออนุญาตก่อสร้างกับกรมเจ้าท่า , จัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง 																					

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๕	โครงการจัดซื้อที่ดินบริเวณข้างอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี เนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๓ ไร่ ๓ งาน ตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ ลว.๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ และ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ลว.๑๘ กันยายน ๒๕๖๓	สำนักช่าง	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ โอนลด ๘๕,๐๒๑,๐๐๐ คงเหลือ ๑๑๔,๙๗๙,๐๐๐	☒ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☐ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ						
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔)	เดือน													
			๒๕:๒	๒๕:๓	๒๕:๔	๒๕:๕	๒๕:๖	๒๕:๗	๒๕:๘	๒๕:๙	๒๕:๑๐	๒๕:๑๑	๒๕:๑๒	๒๕:๑		
กิจกรรม A สัญญจะซื้อขายเลขที่ ๑๔/๒๕๖๔		๙๙,๒๒๙,๐๐๐.๐๐														
ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔																
กิจกรรม B สัญญจะซื้อขายเลขที่ ๑๕/๒๕๖๔		๑๕,๗๔๙,๙๒๐.๐๐														
ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔																
รวม		๑๑๔,๙๗๘,๙๒๐.๐๐														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินครบทุกงวดแล้ว วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผู้ขายได้ส่งมอบโฉนดที่ดินและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ																
ได้ตรวจรับไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๖	โครงการขยายเขตบริการประปาในพื้นที่ที่มีประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง	๒๕,๐๐๐,๐๐๐ (โอนลด ๓,๖๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๑๓,๔๐๐,๐๐๐)	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔)	เดือน												
				ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔	
กิจกรรม A ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีเส้นทางการวางท่อประปา จำนวน ๓๓ เส้นทาง ยาวประมาณ ๓๕.๙ กิโลเมตร ขณะนี้ได้ดำเนินการวางท่อประปาแล้วเสร็จ จำนวน ๓๒ เส้นทาง และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ เส้นทาง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔			๑๕,๐๔๐,๘๐๓.๘๕													
กิจกรรม b																
กิจกรรม c																
รวม			๑๕,๐๔๐,๘๐๓.๘๕													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน														
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ											
๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย เลียบคลองหลุมลิ้ปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๒๘,๓๗๓,๐๐๐ ก่อนนี้ผู้กันแล้ว จำนวน ๒๓,๕๔๐,๐๐๐															
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔)	เดือน															
			๒๕:๒๕	๒๕:๒๖	๒๕:๒๗	๒๕:๒๘	๒๕:๒๙	๒๕:๓๐	๒๕:๓๑	๒๕:๓๒	๒๕:๓๓	๒๕:๓๔	๒๕:๓๕	๒๕:๓๖	๒๕:๓๗	๒๕:๓๘	๒๕:๓๙	๑๐๐%
กิจกรรม A งวดที่ ๑	๔,๒๓๗,๒๐๐																๕๙	
กิจกรรม b งวดที่ ๒	๔,๒๓๗,๒๐๐																๓๖	
กิจกรรม c งวดที่ ๓	๕,๔๑๔,๒๐๐																๑๘	
กิจกรรม d งวดที่ ๓	๙,๖๕๑,๔๐๐																๐	
รวม	๒๓,๕๔๐,๐๐๐																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																		
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ปรับแก้ไขแบบแปลน																		
แนวเวนคืนที่ดินโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวง , หยุดงานเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)																		

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน															
๕	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณช่องทางคู่ขนานของถนน ราชพฤกษ์ ด้านหน้าทางเข้าโรงเรียน นนทบุรีวิทยาลัย ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	๒,๗๐๐,๐๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔)	เดือน																
			พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔				
กิจกรรม A แต่งตั้งคณะกรรมการฯ																			
กิจกรรม B ออกแบบ ประมาณราคา																			
กิจกรรม C ดำเนินการจัดจ้าง																			
กิจกรรม D ดำเนินการตามสัญญา																			
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																			
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :รออนุมัติแบบจากกรมทางหลวงชนบท																			

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ								
๗	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ระยะที่ ๒ ขนาดความสูงไม่เกิน ๑๕ ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้างข้อกำหนดของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔)	เดือน											
				ม.ค. ๖๕	ก.พ. ๖๕	มี.ค. ๖๕	เม.ย. ๖๕	พ.ค. ๖๕	มิ.ย. ๖๕	ก.ค. ๖๕	ส.ค. ๖๕	ก.ย. ๖๕	ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕
กิจกรรม A : แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางและ คณะกรรมการร่างแบบรูปรายการงานก่อสร้าง															
กิจกรรม B : ตรวจสอบแบบแปลน ประมาณราคาค่า ก่อสร้าง และจัดทำราคากลาง															
กิจกรรม C : จัดจ้าง															
กิจกรรม D : ดำเนินการตามสัญญาจ้าง															
รวม															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล															
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ดำเนินการร่วมกับระยะที่ ๑ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท															
อยู่ระหว่างจัดทำร่างแบบรูปรายการงานก่อสร้างและจัดทำราคากลาง															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
๑๐	โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักงาน	๑๓,๐๐๐,๐๐๐													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔)	เดือน													
			ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔		
	กิจกรรม A : แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางและ คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างคุมงานก่อสร้าง															
	กิจกรรม B : จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างคุมงานฯ															
	กิจกรรม C : จัดจ้าง															
	กิจกรรม D : ดำเนินการตามสัญญาจ้าง															
	รวม															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบของคณะกรรมการฯ																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ								
๑๑.	โครงการก่อสร้างอาคารกีฬา อเนกประสงค์บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ระยะที่ ๒ จากเดิมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๐ ตารางเมตร ขนาดหรือพื้นที่ เพิ่มขึ้น ๙๕๐ ตารางเมตร รวมขนาด พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๐ ตารางเมตร ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๖,๙๑๒,๐๐๐												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔)	เดือน												
			เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ต.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ก.พ.๖๕	เม.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ต.ค.๖๕
กิจกรรม A : แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางและ คณะกรรมการร่างแบบปรียการงานก่อสร้าง															
กิจกรรม B : ตรวจสอบแบบแปลน ประมาณราคาค่า ก่อสร้าง และจัดทำราคากลาง															
กิจกรรม C : จัดจ้าง															
กิจกรรม D : ดำเนินการตามสัญญาจ้าง															
รวม															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล															
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :รอกการดำเนินการก่อสร้างระยะที่ ๑ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดจ้าง															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
๑๒	โครงการจ้างออกแบบอุทยานการเรียนรู้จังหวัดนนทบุรี หมู่ที่ ๔ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พื้นที่อาคาร ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๙,๓๔๒,๐๐๐													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔)	เดือน												
				ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔	
กิจกรรม A : แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางและคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบ																
กิจกรรม B : จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบ																
กิจกรรม C : จัดจ้าง																
กิจกรรม D : ดำเนินการตามสัญญาจ้าง																
รวม			-													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
๑๓๑	โครงการจ้างออกแบบอาคารจอดรถยนต์บริเวณสนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พื้นที่อาคาร ไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๑๐,๖๗๖,๐๐๐													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔)	เดือน												
				ต.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	ก.ย.๖๕	
กิจกรรม A : แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางและคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบ																
กิจกรรม B : จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบ																
กิจกรรม C : จัดจ้าง																
กิจกรรม D : ดำเนินการตามสัญญาจ้าง																
รวม			-													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาจ้าง.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬา(ระยะที่ ๓) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ขนาด ๒ ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมระบบระบายน้ำและทางเท้า ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๘,๗๗๙,๐๐๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๗,๘๗๐,๐๐๐.๐๐													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔)	เดือน												
				ก.ค.๖๔	ต.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	๑๐๐%			
กิจกรรม A : งานงวดที่ ๑. (๒,๓๒๑,๖๕๐.๐๐)													๗๒.๕			
กิจกรรม B : งานงวดที่ ๒. (๓,๓๘๔,๑๐๐.๐๐)													๒๙.๕			
กิจกรรม C : งานงวดที่ ๓. (๒,๑๖๔,๒๕๐.๐๐)													๐			
รวม ๗,๘๗๐,๐๐๐.๐๐																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๔๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕.....																

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓)

PERT / CPM / S-CURVE(ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เสริมสร้าง และพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๑๕	โครงการก่อสร้างบ่อฝังเก็บจากเตาเผามูลฝอย ติดเชื่อมภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๙,๓๙๕,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔)	เดือน													
				ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔		
	กิจกรรม A																
	กิจกรรม b																
	กิจกรรม c																
	กิจกรรม d																
	รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ในขั้นตอนการบริหารสัญญา กั้นเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป ๖,๖๙๙,๐๐๐ บาท.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๑๖	โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังดักไขมันและถังบำบัดน้ำเสียโรงเรียนในสังกัด อบจ.นนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๘,๐๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔)	เดือน													
				ก.ย. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ค. ๖๔	มี.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	มี.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ต.ค. ๖๓		
กิจกรรม A																	
กิจกรรม b																	
กิจกรรม c																	
กิจกรรม d																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (รอบที่ ๒ อยู่ระหว่างการอัปเดตราคา).....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๑๓	โครงการปรับปรุงพื้นที่ดินขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับเป็น ลานออกกำลังกาย สวนพักผ่อน สถานที่ทำกิจกรรม นันทนาการ ฯลฯ หมู่ที่ ๓/ ตำบลท่าอิฐ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๒๕,๒๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔)	เดือน													
				ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔		
กิจกรรม Aเบิกเงินค่าจ้างงวดที่ ๑.....			๓,๓๐๐,๐๐๐										→				
กิจกรรม bเบิกเงินค่าจ้างงวดที่ ๒.....			๓,๓๐๐,๐๐๐											→			
กิจกรรม cเบิกเงินค่าจ้างงวดที่ ๓.....			๕,๕๐๐,๐๐๐												→		
กิจกรรม d																	
รวม			๑๖,๕๐๐,๐๐๐														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ในขั้นตอนการบริหารสัญญา กั้นเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไปจำนวนเงิน ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท.....																	

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน										
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดนนทบุรี วัดสามง่าม	กองการศึกษาฯ	๓,๑๖๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ										
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔)	เดือน											
			ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔
	กิจกรรม Aดำเนินการประมาณราคากลาง.....		←	→										
	กิจกรรม bอนุมัติราคากลาง.....					←	→							
	กิจกรรม cดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง.....							←	→					
	กิจกรรม dดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง.....									←	→			
	รวม													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :เข้าพื้นที่ดำเนินการตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๕๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔.....														

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																
๑๙	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อตู้เย็นขนาด ๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้ ๙,๔๐๐	สำนักช่าง	๙,๔๐๐	☒ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔)	เดือน																
				พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔			
กิจกรรม A แต่งตั้งคณะกรรมการฯ																				
กิจกรรม B จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะฯ																				
กิจกรรม C ดำเนินการจัดซื้อ																				
กิจกรรม D ดำเนินการตามสัญญา																				
รวม																				
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																				
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว.....																				

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☒ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
๒๐.	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี แบบ Smart TV จำนวน ๒ เครื่อง	สำนักช่าง	๒๘,๐๐๐													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๕)	เดือน												
				พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕
กิจกรรม A แต่งตั้งคณะกรรมการฯ																
กิจกรรม B จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะฯ																
กิจกรรม C ดำเนินการจัดซื้อ																
กิจกรรม D ดำเนินการตามสัญญา																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๒๒.	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	สำนักช่าง	๗๙,๖๐๐	☒ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ				☐ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ				☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ				☐ ๔. ยกเลิกโครงการ
	จำนวน ๕ รายการ															
	๑๔.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน			๓๔,๐๐๐												
	สำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง															
	๑๔.๒ เครื่องพิมพ์ Multifunction			๙,๐๐๐												
	เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน															
	จำนวน ๑ เครื่อง															
	๑๔.๓ เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA		๕,๐๐๐													
	จำนวน ๒ เครื่อง															
	๑๔.๔ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน		๒๔,๐๐๐													
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน																
จำนวน ๒ ชุด																
๑๔.๕ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ		๗,๖๐๐														
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ มาจาก																
โรงงาน(OEM) จำนวน ๒ ชุด																
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๔)	เดือน												
				ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔	
กิจกรรม A แต่งตั้งคณะกรรมการฯ																
กิจกรรม B จัดทำรายละเอียดคุณสมบัติฯ																
กิจกรรม C ดำเนินการจัดซื้อ																
กิจกรรม D ดำเนินการตามสัญญา																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว.....																

๙	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ								
๕๗:	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๑๕ รายการๆละ ๔ ชุด	สำนักงาน	๔,๕๕๑,๒๐๐												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔)	เดือน												
			พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	
กิจกรรม A แต่งตั้งคณะกรรมการฯ															
กิจกรรม B จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะฯ															
กิจกรรม C ดำเนินการจัดซื้อ															
กิจกรรม D ดำเนินการตามสัญญา															
รวม															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล															
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาซื้อขาย.....															

