

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

สารบัญ

หน้า

- ◎ ตารางแสดงสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ ๑ – ๑๐
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒
- สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ๑๑ – ๑๒
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑
- สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ ๑๓ – ๑๕
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
- สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ – ๑๘
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑
- สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ ๑๙ – ๒๒
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑..... ๒๓ – ๒๘
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
- สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒..... ๒๙ – ๔๒
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
- สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓..... ๔๓ – ๖๑
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
- สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔..... ๖๒ – ๙๗

ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) (จำนวน ๗๑ โครงการ รายละเอียดโครงการปรากฏตามเอกสาร หน้า ๑๑-๙๗)

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) จำนวน ๑ โครงการ						
๑) ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียขนาด ๔,๐๐๐ ที่นั่ง ระยะที่ ๑	สำนักช่าง		√			
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) จำนวน ๒ โครงการ						
๑) ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียขนาด ๔,๐๐๐ ที่นั่ง (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๒) จ้างที่ปรึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	กองทรัพยากรฯ		√			
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๒ โครงการ						
๑) ก่อสร้างรั้วรอบสนามกีฬา หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๒) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งสำหรับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของสำนักช่าง - เรือดับเพลิงกู้ภัย	สำนักช่าง		√			

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ จำนวน ๓ โครงการ						
๑) โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาพิทักษ์นันทเขต หมู่ที่ ๕ ตำบลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	✓				
๒) โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล (เดิม) ให้เป็นสนามหญ้าเทียม ตำบลบางกร่าง อำเภเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	✓				
๓) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบคลองลากค้อน (ตอนที่ ๑) ตำบลราษฎร์นิยม อำเภไทรน้อย เชื่อมต่อดำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง		✓			
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๕ โครงการ						
๑) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง			✓		
๒) โครงการก่อสร้างถนนมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น - โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายวัดทางนาปรัง-วัดไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง		✓			
๓) โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.สายบ้านไทรน้อย-บ้านคลองนาหมอน (นบ.๒๐๔๔) ตอนที่ ๓ ตำบลคลองขวาง อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง		✓			
๔) โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บางพลับ ตำบลบางพลับ อำเภปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง		✓			
๕) โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง		✓			

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ โครงการ						
๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย นบ.๔๐๒๑ บ้านหนองนกยางเขน-บ้านเต็มรัก ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองโตะใหม่ฝั่งตะวันตก ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๓) โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองลากค้อน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๕ ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย เชื่อมต่อ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๔) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และราวเหล็กกันตกถนนสายเลียบคลองประปามหาสวัสดิ์ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ ๓ อำเภอ คือ อ.บางใหญ่ อ.บางบัวทอง และ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๕) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ไต่ำน้อย ตำบลขุนศรี อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๖) โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนสายบ้านคลองเจ็ก-บ้านสุเหراءแดง พร้อมกำแพงกันดิน คสล. ตำบลละหาร เชื่อม ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง ช่วง กม.ที่ ๐+๙๐๐ ถึง กม.ที่ ๑+๖๙๕ จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง		√			

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๗) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง(โดยวิธี PAVEMENT IN -PLACE RECYCLING) ถนนสายเลียบบคลองประปา(กม.ที่ ๙+๐๓๐ ถึง กม.ที่ ๑๑+๒๙๕) ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๘) โครงการก่อสร้างถนนสาย นบ ๓๐๘๖ บ้านบางไทร บ้านคลองตาซ้อ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๙) โครงการขยายเขตบริการประปาในพื้นที่ที่มีประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง		√			
๑๐) โครงการบ่อปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Pound) ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ		√			
๑๑) โครงการอาคารอเนกประสงค์ในการบริหารจัดการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ		√			
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑๗ โครงการ						
๑) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนขอและฮักศึกษาในสังกัด อบจ.นนทบุรี	กองการศึกษาฯ		√			
๒) โครงการก่อสร้างถนนผิว คสล.พร้อมกำแพงกันดิน ถนนสายแยก ทล. ๓๔๕ ประตูนํ้า คลองบางบัวทอง(ช่วง กม.ที่๑+๔๑๕ ถึง กม.ที่ ๒ +๖๓๐) ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง				√	

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๓) โครงการก่อสร้างโปะท่าเทียบเรือบริเวณหน้าวัดคลองพระอุดม หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง			√		
๔) โครงการขยายเขตบริการประปาในพื้นที่ที่มีประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง		√			
๕) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบบคลองหลุมลิ ปรับปรุงคุณภาพด้วยน้ำยางธรรมชาติ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๖) โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณช่อคูขนานของถนนราชพฤกษ์ ด้านหน้าทางเข้าโรงเรียนนนทรีวิทยาลัย ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง				√	
๗) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ระยะที่ ๒ ขนาดความสูงไม่เกิน ๑๕ ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายงานก่อสร้าง ข้อกำหนดของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง			√		
๘) โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง			√		
๙) โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ระยะที่ ๒ จากเดิมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๐ ตารางเมตร ขนาดหรือพื้นที่เพิ่มขึ้น ๙๕๐ ตารางเมตร รวมขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๐ ตารางเมตร ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง				√	

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนแล้ว	ยังไม่ได้ก่อน		
๑๐) โครงการจ้างออกแบบอุทยานการเรียนรู้จังหวัดนนทบุรี หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง			√		
๑๑) โครงการจ้างออกแบบอาคารจอดรถยนต์บริเวณสนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๑๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬา (ระยะที่ ๓) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ขนาด ๒ ช่องจราจรผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมระบบระบายน้ำ และทางเท้าตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๑๓) โครงการก่อสร้างบ่อฝังเฝ้าจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อภายในสถานที่กำจัดมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ		√			
๑๔) โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังดักไขมันและถังบำบัดน้ำเสียโรงเรียน ในสังกัด อบจ.นนทบุรี	กองทรัพยากรฯ				√	
๑๕) โครงการปรับปรุงพื้นที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ สำหรับเป็นลานออกกำลังกาย สวนพักผ่อน สถานที่ทำกิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	√				
๑๖) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรีวัดสามง่าม	กองการศึกษาฯ	√				
๑๗) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๑๕ รายการฯละ ๔ ชุด	สำนักช่าง	√				

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๓๐ โครงการ						
๑) โครงการต่อเติมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ					✓
๒) โครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศเพื่อมาสอนวิชาภาษาจีนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ		✓			
๓) โครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศเพื่อมาสอนวิชาภาษาอังกฤษและกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร-ส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ		✓			
๔) โครงการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการเรียนรู้การสอนระดับชั้นประถมศึกษา	กองการศึกษาฯ			✓		
๕) โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์พัฒนาศักยภาพปฐมวัยส่งเสริมการเล่นเป็นกลุ่ม	กองการศึกษาฯ		✓			
๖) โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและสังเกตอาการของกลุ่มผู้สัมผัสโรคติดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙ ((Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙))	กองสาธารณสุข		✓			
๗) โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และจัดหาสถานที่สำหรับควบคุมและสังเกตอาการ	กองสาธารณสุข		✓			
๘) โครงการการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ประเภทถนนและอาคาร ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง		✓			
๙) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเครื่องจักรกล ขนาด ๑๒ ล้อ แบบท้ายลาดพร้อมวินช์ติดตั้งเครน ขนาด ๑๕ ตัน-เมตร สำหรับยกเครื่องจักรกลพร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาสทำงานในที่สูง	สำนักช่าง			✓		

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๑๐) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒-๓ ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เชื่อมต่อเทศบาลตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๓๘๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง			√		
๑๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองขุนมหาไถย-วัดสิงห์ทอง (นบ.๒๐๓๘) เชื่อมถนนราชพฤกษ์-อ้อมเกร็ด ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๙๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ตามแบบของ อบจ. นนทบุรี	สำนักช่าง			√		
๑๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบคลองลือคแอน หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลทิววัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ตามแบบของ อบจ. นนทบุรี	สำนักช่าง			√		
๑๓) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลาดยางโดยวิธี Pavement Recycling ถนนเลียบบคลองประปามหาสวัสดิ์ ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง ๒,๔๖๐ เมตร (กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๔+๓๘๐) ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง				√	
๑๔) โครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อบำบัด ถนนวัดสัก-วัดโคกอน ตำบลบางขุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง ๗๖๐ เมตร ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๑๕) โครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อบำบัดพร้อมขยายไหล่ทางลาดยาง ถนนสายวัดสะพานสูง-วัดเตย หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง ๑,๗๐๐ เมตร ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง			√		
๑๖) โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรณนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)	กองผังเมือง		√			

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนแล้ว	ยังไม่ได้ก่อน		
๑๗) โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพของถนนสาธารณะเพื่อรองรับการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)	กองผังเมือง		√			
๑๘) โครงการจ้างเหมาการจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ		√			
๑๙) โครงการจ้างเหมาดำเนินการเดินระบบกำจัดมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล	กองทรัพยากรฯ		√			
๒๐) โครงการจ้างเหมาเดินระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (เตาเผาฯ เพิ่มประสิทธิภาพ ๙.๖ ตัน/วัน)	กองทรัพยากรฯ		√			
๒๑) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	กองทรัพยากรฯ		√			
๒๒) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย	กองทรัพยากรฯ		√			
๒๓) โครงการก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการ (ระยะที่ ๒) ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ		√			
๒๔) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ (ระยะ ๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ		√			
๒๕) โครงการปรับปรุงอาคารชั่งน้ำหนัก และเครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ		√			
๒๖) โครงการจ้างเหมาเดินระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอยภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ		√			

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๒๗) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่บ่อฝังกลบมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี หมู่ ๒,๘ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ตามแบบรูปรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ			√		
๒๘) โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำชะขยะภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ		√			
๒๙) โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ		√			
๓๐) โครงการขยายเขตบริการประปาในพื้นที่ที่มีประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง		√			
รวม		๕	๔๘	๑๒	๕	๑
รวมจำนวนทั้งสิ้น		๗๑				

สรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวประชุมไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔ ซึ่งมีจำนวน ๑ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๕ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

๑

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๕๘) จำนวน ๑ โครงการ PERT / CPM / S-CURV (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อศจ.นนทบุรี)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ							๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ							๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ							๔.ยกเลิกโครงการ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
๑	ก่อสร้างอาคารโรงแยกแยะ ขนาด ๔,๐๐๐ ที่นั่ง ระยะที่ ๑	สำนักช่าง	๒๙๔,๔๕๒,๐๐๐ ก่อนนี้ผูกพันรวมกับ ระยะที่ ๒ ๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐	☐	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔	๑๕	๑๖	๑๗	๑๘	๑๙	๒๐	๒๑	๒๒	๒๓	๒๔	๒๕	๒๖	๑๐๐%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

สรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(เพิ่มเติมฉบับที่ 1)

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ 4/2564 ซึ่งมีจำนวน 2 โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ 1/2565 พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๕๙) จำนวน ๑ โครงการ PERT / CPM / S-CURV (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อ.บ.จ.นนทบุรี)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ(ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน	
				๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑	ก่อสร้างอาคารโรงเรียนเฉลิม ขนาดความจุ ๔,๐๐๐ ที่นั่ง (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๙ ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐ ก่อนนี้ผูกพันร่วมกับ ระยะที่ ๑ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐	☐	☒
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๔)		
	กิจกรรม A งวดที่ ๑	๑๑,๗๖๐,๐๐๐	๑๑,๗๖๐,๐๐๐		
	กิจกรรม B งวดที่ ๒	๑๒,๙๓๖,๐๐๐	๑๒,๙๓๖,๐๐๐		
	กิจกรรม C งวดที่ ๓	๑๒,๓๔๔,๐๐๐	๑๒,๓๔๔,๐๐๐		
	กิจกรรม D งวดที่ ๔	๑๑,๗๖๐,๐๐๐			
	กิจกรรม E งวดที่ ๕	๑๔,๔๐๖,๐๐๐			
	กิจกรรม F งวดที่ ๖	๑๔,๔๐๖,๐๐๐			
	กิจกรรม G งวดที่ ๗	๑๔,๔๐๖,๐๐๐			
	กิจกรรม H งวดที่ ๘	๑๓,๒๓๐,๐๐๐			
	กิจกรรม I งวดที่ ๙	๑๔,๑๑๒,๐๐๐			
	กิจกรรม J งวดที่ ๑๐	๑๒,๐๔๔,๐๐๐			
	กิจกรรม K งวดที่ ๑๑	๑๒,๓๔๔,๐๐๐			
	กิจกรรม L งวดที่ ๑๒	๑๒,๖๔๒,๐๐๐			
	กิจกรรม M งวดที่ ๑๓	๑๔,๔๐๖,๐๐๐			
	กิจกรรม N งวดที่ ๑๔	๑๒,๐๔๔,๐๐๐			
	กิจกรรม O งวดที่ ๑๕	๘,๕๒๖,๐๐๐			
	กิจกรรม P งวดที่ ๑๖	๖,๑๗๔,๐๐๐			
	กิจกรรม Q งวดที่ ๑๗	๑๒,๙๓๖,๐๐๐			
	กิจกรรม R งวดที่ ๑๘	๑๒,๖๔๒,๐๐๐			
	กิจกรรม S งวดที่ ๑๙	๘,๘๒๐,๐๐๐			
	กิจกรรม T งวดที่ ๒๐	๑๐,๒๓๐,๐๐๐			
	กิจกรรม U งวดที่ ๒๑	๑๒,๓๔๔,๐๐๐			
	กิจกรรม V งวดที่ ๒๒	๙,๗๐๒,๐๐๐			
	กิจกรรม W งวดที่ ๒๓	๖,๗๖๖,๐๐๐			
	กิจกรรม X งวดที่ ๒๔	๘,๕๒๖,๐๐๐			
	กิจกรรม Y งวดที่ ๒๕	๘,๒๙๒,๐๐๐			
	กิจกรรม Z งวดที่ ๒๖	๙,๑๑๔,๐๐๐			
	รวม	๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐	๓๗,๐๔๔,๐๐๐		

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล.....

ขั้นตอน / เหตุผล / ผลกระทบ : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ 25/2564 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 5 มีนาคม 2566

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
2	จ้างที่ปรึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	กองทรัพยากรฯ	25,000,000 กันเงิน 17,476,200	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.64)	เดือน												
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	
	กิจกรรม A															
	กิจกรรม b															
	กิจกรรม c															
	กิจกรรม d															
	กิจกรรม e															
	รวม															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานตามสัญญาจ้าง กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป 5,241,500.- บาท																

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ 4/2564 ซึ่งมีจำนวน 2 โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ 1/2565 พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 2 โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐) จำนวน ๒ โครงการ

PERT/CPM/S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																	
๑	โครงการก่อสร้างรื้อรอบสนามกีฬาหมู่ที่ ๓ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	๑๒,๔๓๙,๐๐๐.๐๐ ก่อนหักผูกพันแล้ว ๑๑,๕๕๕,๕๕๕.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ														
				กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๔)		เดือน													

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล

ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๖/๒๕๖๓ ลว.๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ มีการแก้ไขแบบแปลน

ทับซ้อนกับโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน แห่งใหม่ (แห่งที่ 3) สำนักงาน กกท. และราษฎรบริเวณด้านข้างขอให้ปรับแก้ไขแบบแปลน

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมชนบทให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

ร.ร.	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน															
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ												
๒	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่งสำหรับการปฏิบัติงานใน ความรับผิดชอบของกองช่าง - เรือดับเพลิงกู้ภัย ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักช่าง	๑๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐																
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๕)	เดือน																
			พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕		
	กิจกรรม A สอบถามราคาผู้จัดจำหน่าย																		
	กิจกรรม A แต่งตั้งคณะกรรมการฯ																		
	กิจกรรม C จัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะฯ																		
	กิจกรรม D ดำเนินการจัดซื้อ																		
	กิจกรรม E ดำเนินการตามสัญญา																		
	กิจกรรม F ลงทะเบียนทรัพย์สิน																		
	รวม																		

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล

ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เริ่มสัญญาวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕

อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา ในขั้นตอนการสร้างเรือ.....

สรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ 4/2564 ซึ่งมีจำนวน 3 โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ 1/2564 พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 1 โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

๑
สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑
(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐) จำนวน ๓ โครงการ
PERT/CPM/S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน															
๑	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องสว่างพิทักษ์นนทเขต หมู่ที่ ๕ ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง	๓,๕๑๓,๐๐๐	☒ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ															
				กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๔)	เดือน												
							ธ.ค.๖๔	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	
				กิจกรรม A งานงวดที่ ๑	๓,๒๗๓,๘๕๐	๓,๒๗๓,๘๕๐													
				กิจกรรม B งานงวดที่ ๒	๓,๕๑๓,๔๐๐	๓,๕๑๓,๔๐๐													
				กิจกรรม C งานงวดที่ ๓	๑,๑๙๗,๗๕๐	๑,๑๙๗,๗๕๐													
				กิจกรรม D															
กิจกรรม E																			
	รวม	๗,๙๘๕,๐๐๐	๗,๙๘๕,๐๐๐																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล..... ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ : ดำเนินการเบิกจ่ายครบทุกงวดแล้ว.....																			

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๒	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล (เดิม) สนามหญ้าเทียม ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ตามรูปแบบรายละเอียดข้อกำหนด ของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๔๐,๘๙๖,๐๐๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๔๐,๖๙๙,๐๐๐	☒ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๔)	เดือน												
				พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕
กิจกรรม A งานงวดที่ ๑	๓,๒๕๕,๙๒๐	๓,๒๕๕,๙๒๐														
กิจกรรม B งานงวดที่ ๒	๘,๑๓๙,๘๐๐	๘,๑๓๙,๘๐๐														
กิจกรรม C งานงวดที่ ๓	๖,๕๑๑,๘๔๐	๖,๕๑๑,๘๔๐														
กิจกรรม D งานงวดที่ ๔	๕,๒๙๐,๘๗๐	๕,๒๙๐,๘๗๐														
กิจกรรม E งานงวดที่ ๕	๑๕,๔๖๕,๖๒๐	๑๕,๔๖๕,๖๒๐														
กิจกรรม F งานงวดที่ ๖	๒,๐๓๔,๙๕๐	๒,๐๓๔,๙๕๐														
รวม	๔๐,๖๙๙,๐๐๐	๔๐,๖๙๙,๐๐๐														

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล

ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบดำเนินการเบิกจ่ายครบทุกงวดแล้ว

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)										
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เลี่ยงคลองลากค้อน (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๕ ต.ราชบุรีนิคม อ.ไทรน้อย เชื่อมต่อ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงาน	๑๖,๒๓๔,๐๐๐ ก่อนหักเงินแล้ว ๑๒,๑๖๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ						
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๔)	เดือน										
			ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	พ.ย.๖๕	ธ.ค.๖๕	๑๐๐%
กิจกรรม A งานงวดที่ ๑	๔,๘๖๔,๐๐๐												๖.๕%
กิจกรรม B งานงวดที่ ๒	๓,๐๔๐,๐๐๐												๔๐%
กิจกรรม C งานงวดที่ ๓	๔,๒๕๖,๐๐๐												๐%
กิจกรรม D													
กิจกรรม E													
รวม		๑๒,๑๖๐,๐๐๐											
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ สัญญาจ้างเลขที่ ๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ รอประสานแนวท่อก๊าซธรรมชาติ และรอการรื้อถอนอาคาร ของราษฎรที่ปลูกสร้างในพื้นที่ของกรมชลประทานซึ่งอยู่ในแนวก่อสร้าง													

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ 4/2564 ซึ่งมีจำนวน 5 โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ 1/2565 พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 5 โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 (กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๖๑) จำนวน ๔ โครงการ
 PERT/CPM/S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข


ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
๑	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พื้นที่ ๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ								
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๑)	เดือน											
				๒๕๖๑/๑	๒๕๖๑/๒	๒๕๖๑/๓	๒๕๖๑/๔	๒๕๖๑/๕	๒๕๖๑/๖	๒๕๖๑/๗	๒๕๖๑/๘	๒๕๖๑/๙	๒๕๖๑/๑๐	๒๕๖๑/๑๑	๒๕๖๑/๑๒
กิจกรรม A แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางและคณะกรรมการ															
จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง															
กิจกรรม b ตรวจสอบออกแบบแปลน ประมาณราคาก่อสร้าง															
และจัดทำราคากลาง															
กิจกรรม c จัดจ้าง															
กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา															
รวม															

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล

ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :ดำเนินการก่อสร้างกับโครงการโอนเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ที่เหลือจ่าย) จำนวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและจัดทำราคากลาง.....

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๒	๒.๒ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายวัดหนองนาปรัง-วัดไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	๔,๒๖๕,๐๐๐.๐๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๓,๕๑๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ							
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๔)	เดือน													
				ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔	ต.ย.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	รวม	๑๐๐%
กิจกรรม A งบประมาณที่ ๑ ๒,๕๒๑,๑๐๐																	๙๐%
กิจกรรม b งบประมาณที่ ๒ ๙๔๔,๙๐๐																	๘๐%
กิจกรรม c																	
กิจกรรม d																	
กิจกรรม e																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หยุดงานเนื่องจาก																	
ปัญหาอุปสรรคเรื่องผิวจราจรเดิมชำรุดจากรถยนต์ชนดินทำให้ผิวจราจรเกิดชำรุด และรอให้ทำการซ่อมแซมคืนสภาพผิวจราจร คสล.เดิมเสร็จก่อน จึงจะดำเนินการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือได้.....																	

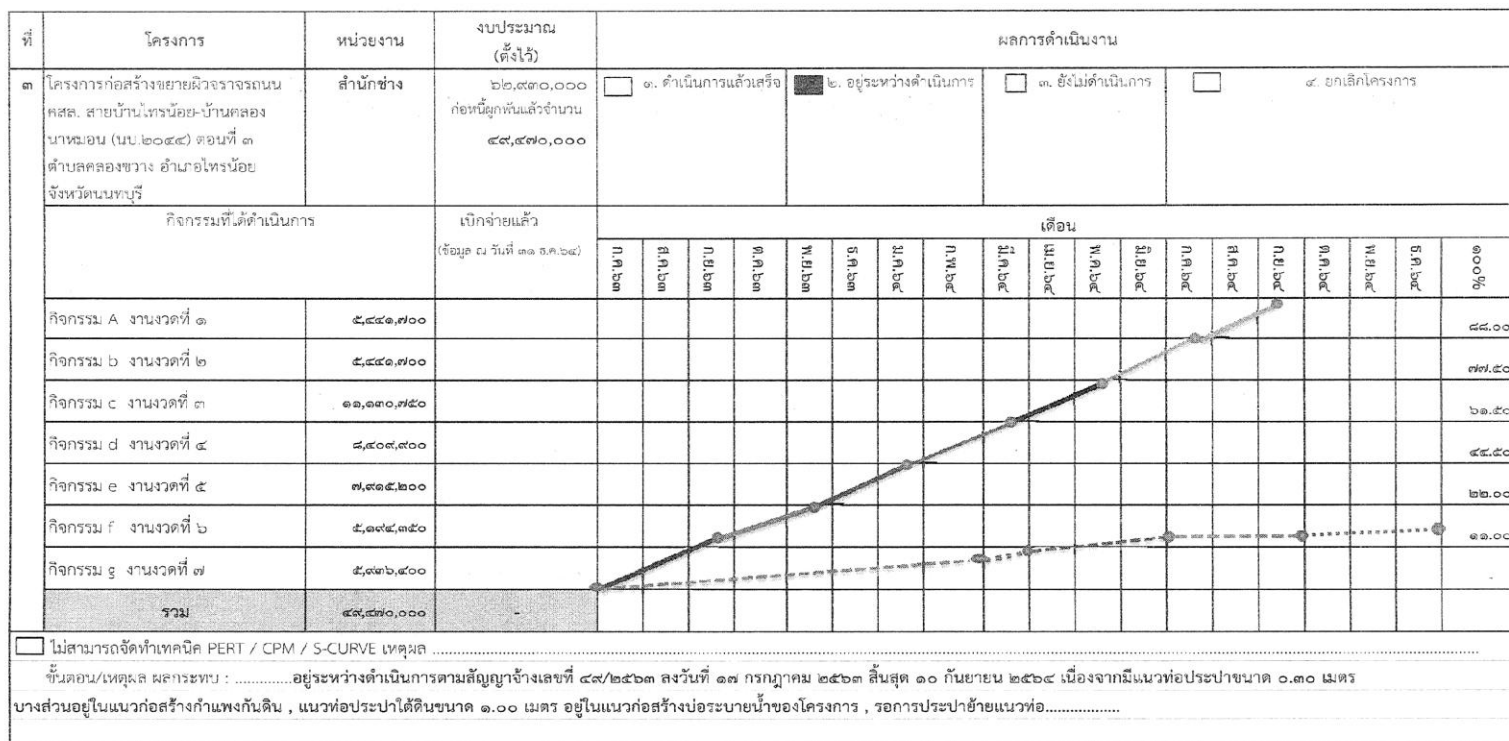

ร.ร.	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																				
ค	โครงการก่อสร้างอาคารกีฬา อเนกประสงค์บางพลี ต.บางพลี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๒๗,๑๒๓,๐๐๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๒๒,๑๘๐,๐๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓. ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ																				
				กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๔)	เดือน																		
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ย.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	๓๐๐%	
				กิจกรรม A งานงวดที่ ๑	๑,๒๑๙,๙๐๐	๑,๒๑๙,๙๐๐																		๘๔.๕๐%
				กิจกรรม b งานงวดที่ ๒	๕,๑๐๑,๔๐๐	๕,๑๐๑,๔๐๐																		๗๑%
				กิจกรรม c งานงวดที่ ๓	๖,๔๓๒,๒๐๐	๖,๔๓๒,๒๐๐																		๕๓.๕๐%
				กิจกรรม d งานงวดที่ ๔	๒,๙๙๔,๓๐๐																			๒๘.๕๐%
				กิจกรรม e งานงวดที่ ๕	๒,๙๙๔,๓๐๐																			๕%
กิจกรรม f งานงวดที่ ๖	๓,๔๓๗,๙๐๐																			๐%				
รวม		๒๒,๑๘๐,๐๐๐	๑๒,๗๕๓,๕๐๐																					
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																								
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔																								
และได้ขออนุมัติ.....																								

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓. ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ													
๕	โครงการก่อสร้างอาคารกีฬา อเนกประสงค์บ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๐ ตารางเมตร ตามแบบของอบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๒๗,๓๘๗,๐๐๐														
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๕)	เดือน													
				ค.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	๓๐.๐%
กิจกรรม A งานงวดที่ ๑ วงเงิน ๑,๙๐๖,๒๙๕																	๘๙.๕๐%
กิจกรรม B งานงวดที่ ๒ วงเงิน ๕,๑๕๔,๒๑๐																	๗๕.๕๐%
กิจกรรม C งานงวดที่ ๓ วงเงิน ๓,๓๖๔,๐๕๐																	๖๔%
กิจกรรม D งานงวดที่ ๔ วงเงิน ๓,๙๒๔,๒๗๕																	๔๖.๕๐%
กิจกรรม E งานงวดที่ ๕ วงเงิน ๒,๕๗๙,๑๐๕																	๓๑.๕๐%
กิจกรรม F งานงวดที่ ๖ วงเงิน ๓,๑๓๙,๗๘๐																	๕.๕๐%
กิจกรรม G งานงวดที่ ๗ วงเงิน ๒,๓๕๔,๘๓๕																	๐%
รวม ๒๒,๔๒๗,๐๐๐																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๒๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เริ่มสัญญาวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕																	

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ 4/2564 มีจำนวน 11 โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ 1/2565 พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 11 โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)															
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เลี่ยงคลองโตะใหม่ฝั่งตะวันตก ต.บางคูวัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๓๑,๕๘๐,๐๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓. ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ														
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๔)	เดือน ต.ค.๖๔ พ.ย.๖๔ ธ.ค.๖๔ ม.ค.๖๕ ก.พ.๖๕ มี.ค.๖๕ เม.ย.๖๕ พ.ค.๖๕ มิ.ย.๖๕ ก.ค.๖๕ ส.ค.๖๕ ก.ย.๖๕ ๑๐๐%															
กิจกรรม A งานงวดที่ ๑ วงเงิน ๖,๗๘๙,๗๐๐																๗๔.๕๐%		
กิจกรรม b งานงวดที่ ๒ วงเงิน ๖,๗๘๙,๗๐๐																๖๐%		
กิจกรรม c งานงวดที่ ๓ วงเงิน ๕,๓๖๘,๖๐๐																๔๓%		
กิจกรรม d งานงวดที่ ๔ วงเงิน ๔,๕๓๙,๑๐๐																๒๑.๕๐%		
กิจกรรม e งานงวดที่ ๖ วงเงิน ๘,๐๕๒,๙๐๐																๐%		
รวม ๓๑,๕๘๐,๐๐๐																		
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																		
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๓๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕																		

รหัส	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)														
๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สาย เลียบคลองลากค้อน (ตอน ๒) ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงาน	๑๗,๙๕๔,๐๐๐ ก่อนผูกพันแล้ว	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๓ ธ.ค.๖๔)	เดือน ค.ย.๖๔ พ.ย.๖๔ ธ.ค.๖๔ ม.ค.๖๕ ก.พ.๖๕ มี.ค.๖๕ เม.ย.๖๕ พ.ค.๖๕ มิ.ย.๖๕ ก.ค.๖๕ ธ.ค.๖๕ ๑๐๐%														
กิจกรรม A งานงวดที่ ๑ วงเงิน ๔,๑๖๙,๘๘๐																	
กิจกรรม b งานงวดที่ ๒ วงเงิน ๔,๓๒๔,๓๒๐																	
กิจกรรม c งานงวดที่ ๓ วงเงิน ๓,๘๖๑,๐๐๐																	
กิจกรรม d งานงวดที่ ๔ วงเงิน ๓,๐๘๘,๘๐๐																	
กิจกรรม e.....																	
รวม ๑๕,๔๔๔,๐๐๐																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เริ่มต้นวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน														
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และราวเหล็กกันตกถนนสาย เลียบคลองประปามหาสวัสดิ์ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณสามอำเภอ คือ อ.บางใหญ่ อ.บางบัวทอง และ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๗,๖๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ ให้ผู้รับจ้างรออนุมัติเข้าพื้นที่จากการประสานครหลวง														
				กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๔)	เดือน												
						ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	พ.ย.๖๕	ธ.ค.๖๕		๑๐๐%	
				กิจกรรม A งานงวดที่ ๑ ๑,๒๑๒,๐๐๐														๕๔.๙๙%
				กิจกรรม b งานงวดที่ ๒ ๑,๖๘๖,๐๐๐														๒๒.๙๖%
				กิจกรรม c งานงวดที่ ๓ ๒,๓๗๑,๗๑๐ งวดสุดท้าย														๐%
กิจกรรม d.....																		
วงเงินตามสัญญาจ้าง ๕,๒๖๙,๗๑๐																		
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๒๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เริ่มสัญญาวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาวินน์																		

๖

ร.ร.	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน			
๖	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติถนนสายบ้าน คลองเจ๊ก-บ้านสุเหร่าแดง พร้อม กำแพงกันดิน คสล. ตีابلสะท้อน เชื่อมตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง	สำนักช่าง	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ

[illegible]

๑

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ขก. เลิกโครงการ									
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๕)	เดือน												
				๑๔.๑	๑๔.๒	๑๔.๓	๑๔.๔	๑๔.๕	๑๔.๖	๑๔.๗	๑๔.๘	๑๔.๙	๑๕.๑	๑๕.๒	๑๕.๓	๑๐๐%
๑	โครงการก่อสร้างถนนสาย นบ.๓๐๘๖บ้านบางไทร- บ้านคลองตาช้อนต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐													
	กิจกรรม A งานงวดที่ ๑	วงเงิน ๓,๖๐๕,๐๐๐														๖๔.๔๘%
	กิจกรรม b งานงวดที่ ๒	วงเงิน ๓,๖๐๕,๐๐๐														๓๒.๔๙%
	กิจกรรม c งานงวดที่ ๓	วงเงิน ๓,๘๘๕,๐๐๐														๐%
	กิจกรรม d															
	วงเงินตามสัญญาจ้าง ๑๑,๐๙๕,๐๐๐															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๓๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เริ่มสัญญาวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕.....																
ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้าเวิร์ดเวล พลัส.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
10	โครงการขยายเขตบริการประปาในพื้นที่ที่มีประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง	25,000,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ											
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.64)	เดือน											
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65
	กิจกรรม A ในปีงบประมาณ 2562 มีเส้นทางการวางท่อประปาจำนวน 51 เส้นทาง ยาวประมาณ 46.5 กิโลเมตร ขณะนี้ได้ดำเนินการวางท่อประปาแล้วเสร็จ จำนวน 51 เส้นทาง เมื่อเดือนธันวาคม 2564		22,690,256.56												
	กิจกรรม b														
	กิจกรรม c														
	กิจกรรม d														
	รวม		22,690,256.56												
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :															

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน
-----	---------	----------	-----------------------	----------------

11	โครงการบ่อปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Pond) ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	11,500,000 กันไว้ 11,500,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.64)	เดือน												
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	
กิจกรรม Aเบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ 1.....			1,992,000		→											
กิจกรรม b																
กิจกรรม c																
กิจกรรม d																
รวม			1,992,000													


☐ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

.....

ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : สัญญาก่อสร้างเลขที่ 44/2564 ลว. 7 ก.ค.64 วงเงิน 9,960,000 บาท ครบกำหนด 4 มี.ค.65 อยู่ในขั้นตอนบริหารสัญญา

ส่งมอบงานงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย)

ส่งมอบงานงวดที่ 4




[illegible]

กิจกรรม b													
.....													
.....													
กิจกรรม c													
.....													
.....													
กิจกรรม d													
.....													
รวม													

☐ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

.....


ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : สัญญาเลขที่ 43/2564 ลว. 29 มิ.ย.64 วงเงิน 9,299,000 บาท ครบกำหนด 26 มี.ค.65 อยู่ในขั้นตอนการบริหารสัญญา



ส่งมอบงานงวดที่ 2

ส่งมอบงานงวดที่ 1

ลงนามในสัญญาจ้าง

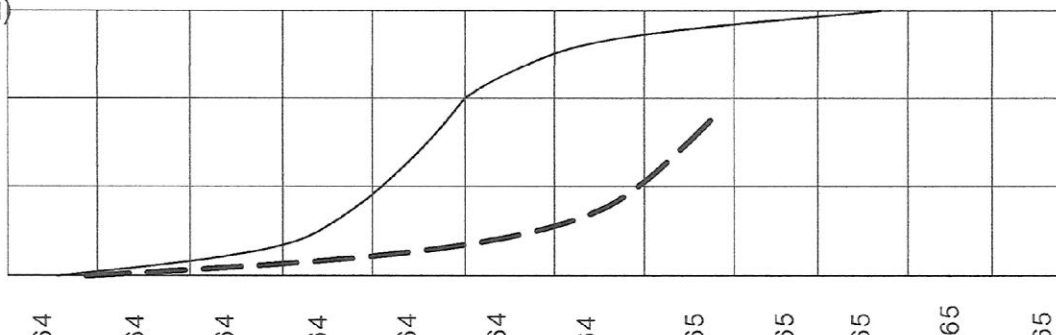

แผนงาน

— — — — ผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ 4/2564 มีจำนวน 17 โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ 1/2565 พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 10 โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2563)

PERT / CPM / S-CURVE(ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนา อบจ.นนทบุรี)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
1	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนซอและย์ศึกษาในสังกัด อบจ.นนทบุรี	กองการศึกษาฯ	7,737,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.64)	เดือน												
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	
กิจกรรม Aดำเนินการประมาณราคากลาง.....																
กิจกรรม bอนุมัติราคากลาง.....																
กิจกรรม cดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง.....																
กิจกรรม dดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง.....				←————→												
รวม																

☐ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

.....

ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 31/2564 ลงนามเมื่อเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564.....

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน			
๒	โครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือบริเวณหน้าวัดปากคลองพระอุดม พื้นที่ ๕๐ ๐๐๐ ตารางวา ๐.๕ ไร่	สำนักช่าง	๑,๔๒๗,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
4	โครงการขยายเขตบริการประปาในพื้นที่ที่มีประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง	25,000,000 (โอนลด 7,600,000 คงเหลือ 17,400,000)	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ											
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.64)	เดือน											
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 55	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65
	กิจกรรม A ในปีงบประมาณ 2563 มีเส้นทางการวางท่อประปา จำนวน 33 เส้นทาง ยาวประมาณ 35.9 กิโลเมตร ขณะนี้ได้ดำเนินการ		15,040,807.85												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☒ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ										
๙	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณช่องทางคู่ขนานของถนนราชพฤกษ์ ด้านหน้าทางเข้าโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	๒,๗๐๐,๐๐๐														
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๕)	เดือน													
				มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม		
กิจกรรม A																	
กิจกรรม B																	
กิจกรรม C																	
กิจกรรม D																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :รอกการอนุมัติแบบร่างจากกรมทางหลวงชนบท																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน			
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ
๖	โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักงาน	๑๓,๐๐๐,๐๐๐				
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว	เดือน			

[illegible]

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

๑๐

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน						
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬา(ระยะที่ ๓) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ขนาด ๒ ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า๑๕๐ เมตร หมา ๐.๒๐ เมตร พร้อมระบบระบายน้ำและทางเท้า ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๘,๗๓๙,๐๐๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๗,๘๗๐,๐๐๐							
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๔)	เดือน						
				จ.ธ.บ	จ.ช.บ	จ.ก.บ	จ.ช.บ	จ.ช.บ	จ.ค.บ	๑๐๐%

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2563)

PERT / CPM / S-CURVE(ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เสริมสร้าง และพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

[illegible]

กิจกรรม d														
.....														
รวม														

☐ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

.....


ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ในขั้นตอนการบริหารสัญญา กั้นเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป 6,699,000 บาท.....

-56-

ส่งมอบงานงวดที่ 2(งวดสุดท้าย)

ส่งมอบงานงวดที่ 1

ลงนามในสัญญาจ้าง

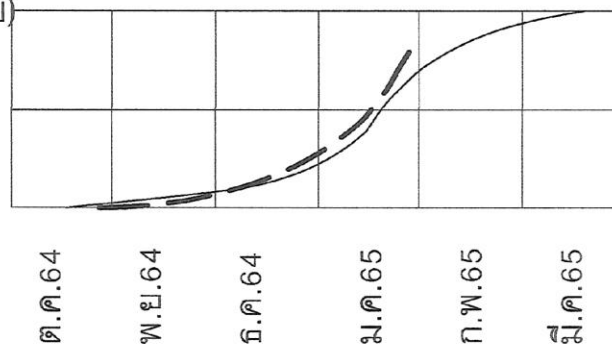

————— แผนงาน
 - - - - - ผลการดำเนินงาน

โครงการก่อสร้างบ่อฝังเฝ้าจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ
 ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 ปีงบประมาณ 2563

24-1-65

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
14	โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังดักไขมันและถังบำบัดน้ำเสียโรงเรียนในสังกัด อบจ.นนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	8,000,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.64)	เดือน												
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	
กิจกรรม A																
กิจกรรม b																
กิจกรรม c																
กิจกรรม d																
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : (อยู่ระหว่างการอัปเดตราคา).....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
15	โครงการปรับปรุงพื้นที่ดินขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับเป็น ลานออกกำลังกาย สวนพักผ่อน สถานที่ทำกิจกรรม นันทนาการ ฯลฯ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าอิฐ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	25,200,000	☒ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.64)	เดือน												
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	
กิจกรรม Aเบิกเงินค่าจ้างงวดที่ 1.....			3,300,000													
กิจกรรม bเบิกเงินค่าจ้างงวดที่ 2.....			7,700,000													
กิจกรรม cเบิกเงินค่าจ้างงวดที่ 3.....			5,500,000													
กิจกรรม dเบิกเงินค่าจ้างงวดที่ 4.....			5,500,000	→												
รวม			22,000,000													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
16	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ปฏิบัติการ ประจำจังหวัดนนทบุรี วัดสามง่าม	กองการศึกษา	3,160,000	☒ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ											
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.64)	เดือน											
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65
กิจกรรม Aดำเนินการประมาณราคากลาง.....															
กิจกรรม bอนุมัติราคา กลาง.....															
กิจกรรม cดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง.....															
กิจกรรม dดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง..... เบิกจ่าย งวดที่ 1 (งวดเดียว).....			1,975,000												
รวม			1,975,000												

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

 ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :เข้าพื้นที่ดำเนินการตามสัญญาจ้าง เลขที่ 40/2564 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 สิ้นสุด วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว.....

-61-

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จากการติดตามไตรมาสที่ 1/2565 จำนวน 30 โครงการ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 28 โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ
- ยกเลิก จำนวน 1 โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

-62-

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2564) จำนวน 4 โครงการ

PERT / CPM / S-CURVE(ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนา อบจ.นนทบุรี)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการต่อเติมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	100,000 โอนเพิ่ม 1,400,000 คงเหลือ 1,500,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ 4.ยกเลิกโครงการ
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว	เดือน

	(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.64)	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65
กิจกรรม Aดำเนินการประมาณราคา กลาง.....													
กิจกรรม bอนุมัติราคากลาง													
กิจกรรม cดำเนินการประกาศหาผู้ รับจ้าง.....													
กิจกรรม dดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง.....													
รวม													

☐ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

.....

.....

ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการดังกล่าวตามรูปแบบวิธีการงบประมาณ ตั้งไว้ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปรับรูปแบบวิธีการงบประมาณมาตั้งจ่ายไว้ในหมวดค่าใช้สอย ดังนั้น รายการนี้ที่ได้กันเงินไว้ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระบบ E-las จึงไม่สามารถนำมาใช้จัดซื้อจัดจ้างได้

[illegible]

[illegible]

กิจกรรม dดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง.....													
รวม													

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

.....

.....

ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามสัญญา

จ้าง.....

[illegible]

	กิจกรรม c														
	กิจกรรม d														
	รวม	4,326,643.53													

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :
.....
.....
ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :
1. เช่าตู้คอนเทนเนอร์สำหรับหน่วยรักษาความปลอดภัย ณ รพ สนามวัดโบสถ์ดอนพรหม
2. เตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดตั้ง รพ.สนามจังหวัดนนทบุรี ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

๑

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																		
๑	โครงการการศึกษาแผนแม่บท การพัฒนาบบบริหารจัดการ สินทรัพย์ประเภทถนน และอาคารในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี	สำนักช่าง	๑,๐๐๐,๐๐๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ																		
				กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๕)	เดือน															
				พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕				
				กิจกรรม A งวดที่ ๑ ๒๗๕,๑๖๗.๕๐	๒๗๕,๑๖๗.๕๐																	
				กิจกรรม B งวดที่ ๒ ๒๗๕,๑๖๗.๕๐																		
				กิจกรรม C งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ๓๖๖,๔๖๐																		
รวม		๒๗๕,๑๖๗.๕๐																				
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕..... 																						

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๒	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก เครื่องจักรกล ขนาด ๑๒ ล้อ แบบลาดท้ายพร้อมวินช์ ติดตั้งเครน ขนาด ๑๕ ตัน-เมตร สำหรับยกเครื่องจักรกล พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส ทำงานในที่สูง	สำนักช่าง	๙,๘๖๐,๐๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๔)	เดือน													
				ธ.ค. ๖๔	พ.ค. ๖๕	มิ.ย. ๖๕	ก.ค. ๖๕	ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ต.ค. ๖๖
กิจกรรม A ดำเนินการแล้วเสร็จ																	
กิจกรรม B ปูพื้นรถ																	
กิจกรรม C ประกอบเครน																	
กิจกรรม D ประกอบโครงสร้างรถ																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																	

ร.ร.	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒-๓ ต.ราชบุรีนิคม อ.โพธารนย์ จ.นนทบุรี เชื่อมต่อ เทศบาลตำบลสามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๓๘๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ตามแบบของ อบจ. นนทบุรี	สำนักงาน	๑๓,๘๘๙,๐๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๕)	เดือน													
				ต.ค.๖๕	พ.ย.๖๕	ธ.ค.๖๕	ม.ค.๖๖	ก.พ.๖๖	มี.ค.๖๖	เม.ย.๖๖	พ.ค.๖๖	มิ.ย.๖๖	ก.ค.๖๖	ธ.ค.๖๖	ก.ม.๖๖		
กิจกรรม A แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง																	
กิจกรรม B ตรวจสอบแบบแปลน, จัดทำราคากลาง																	
กิจกรรม C ดำเนินการจัดจ้าง																	
กิจกรรม D ดำเนินการตามสัญญา																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :																	

ร.ร.	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๑	โครงการก่อสร้างถนน คล. สายคลองขุมมหาไทย-วัดสิงห์ทอง (นบ.๒๐๗๘) เชื่อมถนนราชพฤกษ์-อ้อมเกร็ด ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๔๕ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร ตามแบบของ อบจ. นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑๘,๐๓๖,๐๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๔)	เดือน													
				๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๓	๒๕๗๔	๒๕๗๕	๒๕๗๖	๒๕๗๗
กิจกรรม A แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง																	
กิจกรรม B ตรวจสอบแบบแปลน, จัดทำราคากลาง																	
กิจกรรม C ดำเนินการจัดจ้าง																	
กิจกรรม D ดำเนินการตามสัญญา																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างการจัดจ้าง.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ													
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองต็อกแอน หมู่ที่ ๕,๖ ต.ทิววัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร ตามแบบของ อบจ. นนทบุรี	สำนักช่าง	๓๖,๘๘๒,๐๐๐														
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๔)	เดือน													
				ต.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ก.พ.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ก.ค.๖๕	ก.ค.๖๕	ก.ค.๖๕	
กิจกรรม A แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง																	
กิจกรรม B ตรวจสอบแบบแปลน,ขออนุญาต ก่อสร้าง,จัดทำราคากลาง																	
กิจกรรม C ดำเนินการจัดจ้าง																	
กิจกรรม D ดำเนินการตามสัญญา																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ : 																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๖	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง ถนนลาดยางโดยวิธี Pavement Recycling ถนนเลียบบคลอง ประปาเทศบาลสต. ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ระยะทาง ๒,๔๖๐ เมตร (กม.ที่๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๔-๓๘๐) ตามแบบของ อบจ. นนทบุรี	สำนักช่าง	๓๐,๙๐๐,๐๐๐	☐ ๓. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ๓. ยังไม่ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๔)	เดือน													
				ต.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	
กิจกรรม A																	
กิจกรรม B																	
กิจกรรม C																	
กิจกรรม D																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ : 																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ และบ่อกัก ถนบวัดสัก-วัดโคกนอ ต.บางขุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ระยะทาง ๗๖๐ เมตร ตามแบบอบจ นนทบุรี	สำนักช่าง	๖,๖๘๑,๐๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ																
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๕)	เดือน																
				ธ.ค.๖๕	ต.ค.๖๕	พ.ย.๖๕	ธ.ค.๖๕	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ก.ค.๖๕	ก.ค.๖๕	ก.ค.๖๕			
กิจกรรม A งานงวดที่ ๑ วงเงิน ๒,๕๑๐,๙๖๑.๔๔			๒,๕๑๐,๙๖๑.๔๔														๑๐๐%			
กิจกรรม B งานงวดที่ ๒ วงเงิน ๓,๙๖๖,๔๔๒.๑๖																	๕๐%			
กิจกรรม C																	๐%			
กิจกรรม D																				
รวม ๖,๒๗๗,๔๐๓.๖๐			๒,๕๑๐,๙๖๑.๔๔																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																				
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๔๗/๒๕๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เริ่มสัญญาวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕.....																				

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																	
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักพร้อมขยายไหล่ทาง ลาดยาง ถนนสายวัดสะพานสูง- วัดเคย หมู่ที่ ๓ ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ระยะทาง ๑,๓๐๐ เมตร ตามแบบ อบจ นนทบุรี	สำนักช่าง	๑๖,๘๕๖,๐๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ๓. ยังไม่ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ																	
				กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๔)	เดือน														
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ย.	พ.ย.	ธ.ค.				
				กิจกรรม A																	
				กิจกรรม B																	
				กิจกรรม C																	
				กิจกรรม D																	
รวม																					
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูล, ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อออกแบบ..... 																					

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2564) จำนวน 2 โครงการ

PERT / CPM / S-CURVE(ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
15	โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อให้บริการตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรณนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)	กองผังเมือง	300,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ											
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.64)	เดือน											
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65
กิจกรรม A ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 29/2564 เมื่อวันที่ 18 มี.ค.64 ขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามสัญญาจ้าง งานงวดที่ 2 ซึ่ง ครบกำหนด ในวันที่ 13 พ.ย.64			1,039,500												
กิจกรรม b ดำเนินการตามสัญญา ตามสัญญาจ้างเลขที่ 28/2564 เมื่อวันที่ 18 มี.ค.64 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาจ้าง งานงวดที่ 3 ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 18 มี.ค.65			1,039,500												
รวม			2,079,000												

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

.....

.....

ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :

.....

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน
-----	---------	----------	-----------------------	----------------

16	โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพของถนนสาธารณะเพื่อรองรับการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)	กองผังเมือง	5,000,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.64)	เดือน												
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	
กิจกรรม A บริษัท เซอร์เวย์ซิสเทม จำกัด ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ 51/2564 เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64																
กิจกรรม b บริษัท เซอร์เวย์ซิสเทม จำกัด ส่งมอบงานงวดที่ 1เมื่อวันที่ 27 ต.ค.64			585,000	↔												
กิจกรรม c ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 2 ซึ่งกำหนดส่งงานงวดที่ 2 ในวันที่ 26 ม.ค.65					↔											
กิจกรรม d																
รวม			585,000													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
17	โครงการจ้างเหมาการจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	28,000,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ											
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.64)	เดือน											
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65
กิจกรรม Aเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 5.....			2,634,686.30	→											
กิจกรรม bเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 6.....			2,626,769.50		→										
กิจกรรม cเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 7.....			2,311,458.20			→									
กิจกรรม d															
รวม			7,572,814												
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
18	โครงการจ้างเหมาดำเนินการเดินระบบกำจัดมูลฝอย แบบถูกลักสุขาภิบาล	กองทรัพยากรฯ	115,000,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.64)	เดือน												
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	
กิจกรรม Aเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 6.....			10,320,397.76													
กิจกรรม bเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 7.....			20,233,056.26													
กิจกรรม c																
กิจกรรม d																
รวม			20,554,056.26													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ในระหว่างบริหารสัญญา จ้าง.....																

ส่งมอบงานงวดที่ 12 (งวดสุดท้าย)

ส่งมอบงานงวดที่ 11

ส่งมอบงานงวดที่ 10

ส่งมอบงานงวดที่ 9

ส่งมอบงานงวดที่ 8

ส่งมอบงานงวดที่ 7

ส่งมอบงานงวดที่ 6


ส่งมอบงานงวดที่ 5

ส่งมอบงานงวดที่ 4

ส่งมอบงานงวดที่ 3

ส่งมอบงานงวดที่ 2

ส่งมอบงานงวดที่ 1

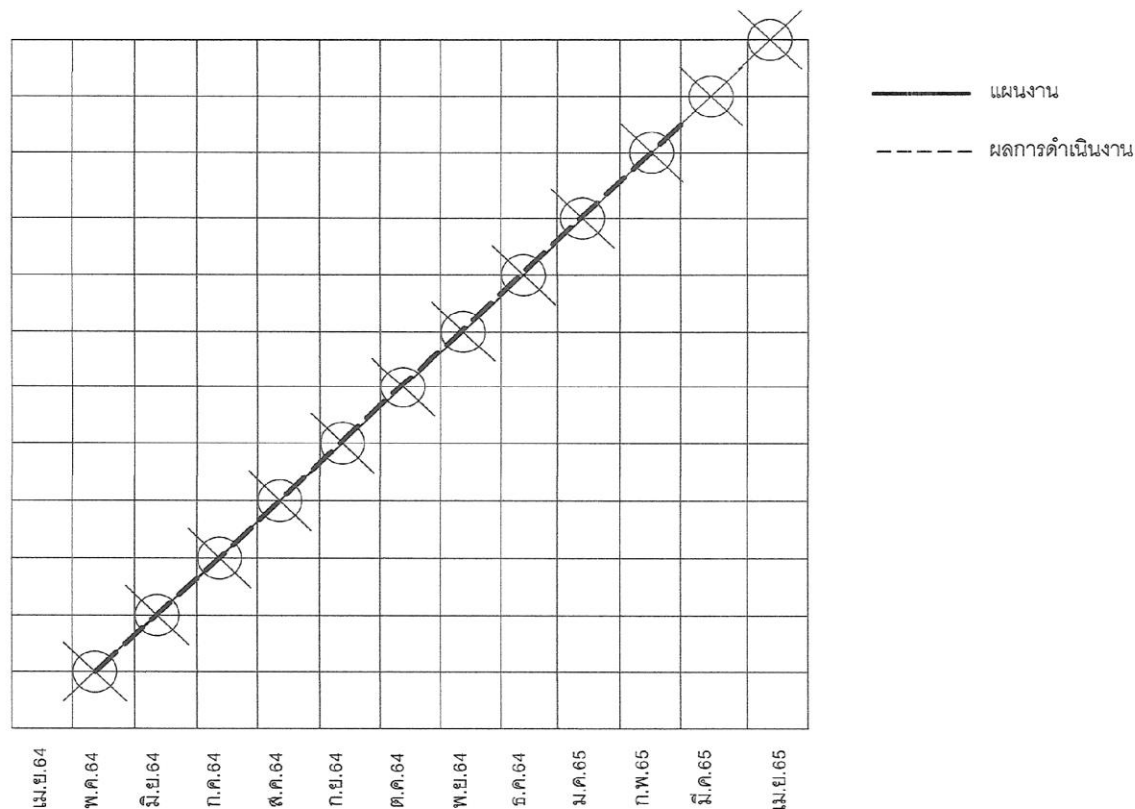

โครงการจ้างเหมาดำเนินการเดินระบบกำจัดมูลฝอยแบบถูกลักสุขาภิบาล

ปีงบประมาณ 2564

24-1-65

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
19	โครงการจ้างเหมาเดินระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (เตาเผาฯ เพิ่มประสิทธิภาพ ๙.๖ ตัน/วัน)	กองทรัพยากรฯ	36,500,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.64)	เดือน												
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65		
	กิจกรรม Aเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 5.....		3,563,750	→												
	กิจกรรม bเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 6.....		1,951,755.38		→											
	กิจกรรม cเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 7.....		3,318,625			→										
	กิจกรรม d															
รวม		8,704,130.38														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างบริหารสัญญาจ้าง.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน
-----	---------	----------	-----------------------	----------------

20	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	กองทรัพยากรฯ	2,400,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.64)	เดือน												
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65		
	กิจกรรม A															
	กิจกรรม b															
	กิจกรรม c															
	กิจกรรม d															
รวม																

☐ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :
.....
ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :สัญญาเลขที่ 10/2565 ลว. 26 พ.ย.64 วงเงิน 2,485,000 บาท ครบกำหนด 24 ก.พ.65 อยู่ในขั้นตอนการบริหารสัญญา.....

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน
-----	---------	----------	-----------------------	----------------

21	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย	กองทรัพยากรฯ	7,200,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.64)	เดือน												
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65		
	กิจกรรม A															
	กิจกรรม b															
	กิจกรรม c															
	กิจกรรม d															
รวม																

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :
.....
ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างการบริหาร
สัญญา.....

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน
-----	---------	----------	-----------------------	----------------

22	โครงการก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อม อาคารบริการ (ระยะที่ ๒) ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	4,000,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.64)	เดือน												
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65		
	กิจกรรม A															
	กิจกรรม b															
	กิจกรรม c															
	กิจกรรม d															
รวม																


☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

 ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างการบริหาร
 สัญญา.....

ส่งมอบงานงวดที่ 2(งวดสุดท้าย)

ส่งมอบงานงวดที่ 1

ลงนามในสัญญาจ้าง

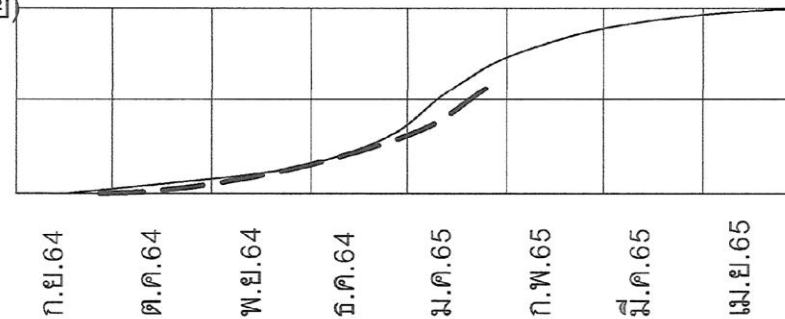

— แผนงาน

- - - ผลการดำเนินงาน

โครงการก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการ(ระยะที่ 2)
ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ปีงบประมาณ 2564

24-1-65

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
23	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะ มูลฝอยติดเชื้อ (ระยะ ๒) องค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	33,500,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.64)	เดือน												
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	
	กิจกรรม A															
	กิจกรรม b															
	กิจกรรม c															
	กิจกรรม d															
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างบริหาร สัญญา.....																

[illegible]

☐ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

.....

.....


ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างการบริหาร

สัญญา.....

ส่งมอบงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)

ส่งมอบงานงวดที่ 1

ลงนามในสัญญาจ้าง

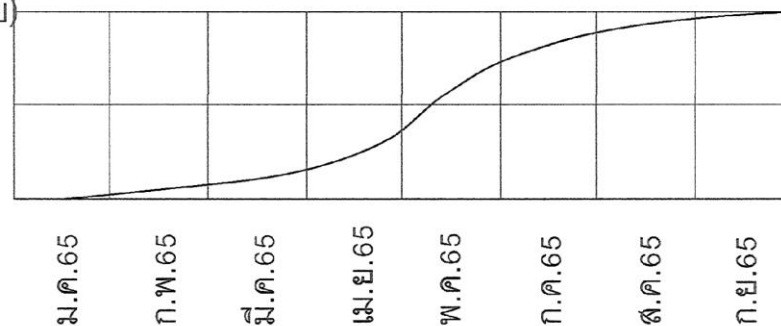

— แผนงาน

- - - ผลการดำเนินงาน

โครงการปรับปรุงอาคารขังน้ำหนักรและเครื่องขังน้ำหนักรสำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2564

24-1-65

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
25	โครงการจ้างเหมาเดินระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอยภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากร	45,000,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ											
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.64)	เดือน											
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65
กิจกรรม Aเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 8.....			3,257,878.24	→											
กิจกรรม bเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 9.....			3,844,449.36		→										
กิจกรรม cเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 10.....			3,850,861.68			→									
กิจกรรม d															
รวม			10,953,189.28												

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :

ส่งมอบงานงวดที่ 12 (งวดสุดท้าย)

ส่งมอบงานงวดที่ 11

ส่งมอบงานงวดที่ 10

ส่งมอบงานงวดที่ 9

ส่งมอบงานงวดที่ 8

ส่งมอบงานงวดที่ 7

ส่งมอบงานงวดที่ 6


ส่งมอบงานงวดที่ 5

ส่งมอบงานงวดที่ 4

ส่งมอบงานงวดที่ 3

ส่งมอบงานงวดที่ 2

ส่งมอบงานงวดที่ 1

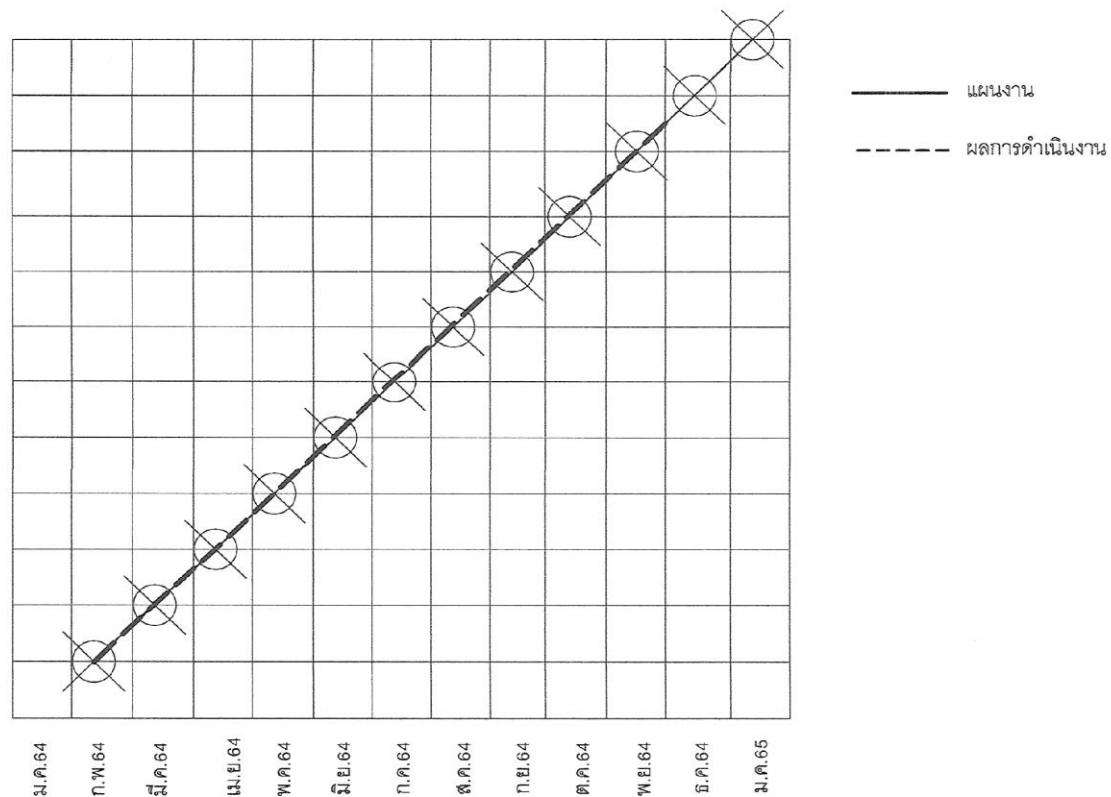

โครงการจ้างเหมาเดินระบบน้ำชะขยะขยะมูลฝอย ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอย
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2564

24-1-65

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
26	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมพื้นที่ บ่อฝังกลบมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี หมู่ ๒,๘ ตำบลคลองขวาง อำเภอโศก น้อย จังหวัดนนทบุรี ตามแบบรูปรายละเอียด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	14,648,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ													
				กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.64)	เดือน											
						ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65
				กิจกรรม A													
																	
																	
				กิจกรรม b													
.....																	
.....																	
กิจกรรม c																	
.....																	
.....																	
กิจกรรม d																	
.....																	
.....																	
	รวม																

☐ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :
.....
ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบ
แปลน.....

[illegible]

☐ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

.....


.....

ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างการบริหาร

สัญญา.....

ส่งมอบงานงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)

ลงนามในสัญญาจ้าง

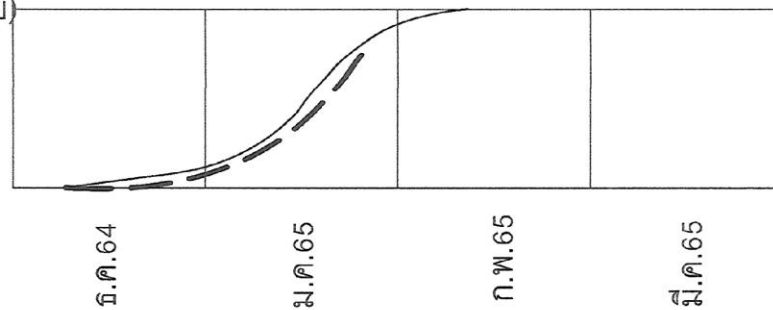

— แผนงาน

- - - ผลการดำเนินงาน

โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำขยะภายในสถานที่กำจัดมูลฝอย
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2564

24-1-65

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
28	โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	500,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ													
				กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.64)	เดือน											
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64			ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65			
	กิจกรรม A																
																	
																	
	กิจกรรม b																
																	
.....																	
กิจกรรม c																	
.....																	
.....																	
กิจกรรม d																	
.....																	
.....																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างการบริหาร สัญญา.....																	

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการงบประมาณอุดหนุนตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2564) จำนวน 1 โครงการ

PERT / CPM / S-CURVE(ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นทบุรี)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
1	โครงการขยายเขตบริการประปาในพื้นที่ที่มีประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง	15,000,000 โอนลด 4,780,000 คงเหลือ 10,220,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.64)	เดือน												
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	
กิจกรรม A ดำเนินการลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจโครงการขยายเขตบริการประปาฯ ในงบประมาณประจำปี 2564 ร่วมกับการประปานครหลวง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 11 แห่ง เมื่อวันที่ 29 มี.ค.64 มีเส้นทางการวางท่อประปาทั้งหมด จำนวน 52 เส้นทาง ยาวประมาณ 26.6 กิโลเมตร ขณะนี้ได้ดำเนินการวางท่อประปาแล้วเสร็จ จำนวน 33 เส้นทาง และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 9 เส้นทาง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน เม.ย.65			10,218,218.05	←												
รวม			10,218,218.05													

☐ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

.....

 ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
