

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

สารบัญ

หน้า

- ◎ ตารางแสดงสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ ๑ – ๑๐
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒
- สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ๑๑ – ๑๒
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑
- สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ ๑๓ – ๑๕
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
- สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖ – ๑๘
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑
- สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ ๑๙ – ๒๐
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑..... ๒๑ – ๒๖
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
- สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒..... ๒๗ – ๔๐
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
- สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓..... ๔๑ – ๕๕
- ◎ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
- สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔..... ๕๖ – ๘๗

ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) (จำนวน ๖๕ โครงการ รายละเอียดโครงการปรากฏตามเอกสาร หน้า ๑๑-๖๗)

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) จำนวน ๑ โครงการ						
๑) ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียมขนาด ๔,๐๐๐ ที่นั่ง ระยะที่ ๑	สำนักช่าง		√			
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) จำนวน ๒ โครงการ						
๑) ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียมขนาด ๔,๐๐๐ ที่นั่ง (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๒) จ้างที่ปรึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	กองทรัพยากรฯ		√			
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๒ โครงการ						
๑) ก่อสร้างรั้วรอบสนามกีฬา หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๒) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งสำหรับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของสำนักช่าง - เรือดับเพลิงกู้ภัย	สำนักช่าง	√				

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ จำนวน ๑ โครงการ						
๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบคลองลากค้อน (ตอนที่ ๑) ตำบลราษฎร์นิยม อำเภไทรน้อย เชื่อมต่อดำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง		√			
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๕ โครงการ						
๑) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง			√		
๒) โครงการก่อสร้างถนนมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น - โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายวัดทางนาปรัง-วัดไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๓) โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.สายบ้านไทรน้อย-บ้านคลองนาหมอน (นบ.๒๐๔๔) ตอนที่ ๓ ตำบลคลองขวาง อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๔) โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บางพลับ ตำบลบางพลับ อำเภปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๕) โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง		√			

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ โครงการ						
๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย นบ.๔๐๒๑ บ้านหนองนกยางเขน-บ้านเต็มรัก ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบบคลองโตะใหม่ฝั่งตะวันตก ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๓) โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองลากค้อน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๕ ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย เชื่อมต่อ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๔) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และราวเหล็กกันตกถนนสายเลียบบคลองประปามหาสวัสดิ์ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ ๓ อำเภอ คือ อ.บางใหญ่ อ.บางบัวทอง และ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๕) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ไ้ตะนุ้ย ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๖) โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนสายบ้านคลองเจ็ก-บ้านสุเหراءแดง พร้อมกำแพงกันดิน คสล. ตำบลละหาร เชื่อม ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง ช่วง กม.ที่ ๐+๙๐๐ ถึง กม.ที่ ๑+๖๙๕ จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง		√			

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๗) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง(โดยวิธี PAVEMENT IN -PLACE RECYCLING) ถนนสายเลียบบคลองประปา(กม.ที่ ๙+๐๓๐ ถึง กม.ที่ ๑๑+๒๙๕) ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๘) โครงการก่อสร้างถนนสาย นบ ๓๐๘๖ บ้านบางไทร บ้านคลองตาซ้อน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๙) โครงการขยายเขตบริการประปาในพื้นที่ที่มีประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง	√				
๑๐) โครงการบ่อปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Pound) ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ		√			
๑๑) โครงการอาคารเอนกประสงค์ในการบริหารจัดการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ		√			
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑๔ โครงการ						
๑) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนขอและศึกษาในสังกัด อบจ.นนทบุรี	กองการศึกษาฯ		√			
๒) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.พร้อมกำแพงกันดิน ถนนสายแยก ทล. ๓๔๕ ประตูนํ้าคลองบางบัวทอง(ช่วง กม.ที่๑+๔๑๕ ถึง กม.ที่ ๒ +๖๓๐) ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง				√	

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๓) โครงการก่อสร้างโปะท่าเทียบเรือบริเวณหน้าวัดคลองพระอุดม หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง			√		
๔) โครงการขยายเขตบริการประปาในพื้นที่ที่มีประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง	√				
๕) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบบคลองหลุมลิ ปรับปรุงคุณภาพด้วยน้ำยางธรรมชาติ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๖) โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณช่อขุนานของถนนราชพฤกษ์ ด้านหน้าทางเข้าโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง			√		
๗) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ระยะที่ ๒ ขนาดความสูงไม่เกิน ๑๕ ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายงานก่อสร้าง ข้อกำหนดของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง			√		
๘) โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง			√		
๙) โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ระยะที่ ๒ จากเดิมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๐ ตารางเมตร ขนาดหรือพื้นที่เพิ่มขึ้น ๙๕๐ ตารางเมตร รวมขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๐ ตารางเมตร ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง				√	

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๑๐) โครงการจ้างออกแบบอุทยานการเรียนรู้จังหวัดนนทบุรี หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง			√		
๑๑) โครงการจ้างออกแบบอาคารจอดรถยนต์บริเวณสนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๑๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬา (ระยะที่ ๓) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ขนาด ๒ ช่องจราจรผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมระบบระบายน้ำ และทางเท้าตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๑๓) โครงการก่อสร้างบ่อฝังเถ้าจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อภายในสถานที่กำจัดมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	√				
๑๔) โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังดักไขมันและถังบำบัดน้ำเสียโรงเรียน ในสังกัด อบจ.นนทบุรี	กองทรัพยากรฯ			√		

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
● โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๒๙ โครงการ						
๑) โครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศเพื่อมาสอนวิชาภาษาจีนในสถานศึกษาสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ		✓			
๒) โครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศเพื่อมาสอนวิชาภาษาอังกฤษและกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร - ส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ		✓			
๓) โครงการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการเรียนรู้การสอนระดับชั้นประถมศึกษา	กองการศึกษาฯ	✓				
๔) โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์พัฒนาศักยภาพปฐมวัยส่งเสริมการเล่นเป็นกลุ่ม	กองการศึกษาฯ	✓				
๕) โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและสังเกตอาการของกลุ่มผู้สัมผัสโรคติดเชื้อ ไวรัส โควิด ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙ ((Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙))	กองสาธารณสุข		✓			
๖) โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และจัดหาสถานที่สำหรับควบคุมและสังเกตอาการ	กองสาธารณสุข		✓			
๗) โครงการการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ประเภทถนน และอาคาร ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง		✓			
๘) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเครื่องจักรกล ขนาด ๑๒ ล้อ แบบท้ายลาดพร้อมวินช์ ติดตั้งเครน ขนาด ๑๕ ตัน-เมตร สำหรับยกเครื่องจักรกลพร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส ทำงานในที่สูง	สำนักช่าง	✓				

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๙) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒-๓ ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เชื่อมต่อเทศบาลตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๓๘๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง			√		
๑๐) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองขุนมหาไถย-วัดสิงห์ทอง (นบ.๒๐๓๘) เชื่อมถนนราชพฤกษ์-อ้อมเกร็ด ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๙๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ตามแบบของ อบจ. นนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๑๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบคลองลือคแอน หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลทิววัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ตามแบบของ อบจ. นนทบุรี	สำนักช่าง			√		
๑๒) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลาดยางโดยวิธี Pavement Recycling ถนนเลียบบคลองประปามหาสวัสดิ์ ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง ๒,๔๖๐ เมตร (กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๔+๓๘๐) ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๑๓) โครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนวัดสัก-วัดโค่นอน ตำบลบางขุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง ๗๖๐ เมตร ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง		√			
๑๔) โครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อพักพร้อมขยายไหล่ทางลาดยาง ถนนสายวัดสะพานสูง-วัดเตย หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง ๑,๗๐๐ เมตร ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง			√		
๑๕) โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองร่วนนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)	กองผังเมือง		√			

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนแล้ว	ยังไม่ได้ก่อน		
๑๖) โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพของถนนสาธารณะเพื่อรองรับการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)	กองผังเมือง		√			
๑๗) โครงการจ้างเหมาการจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ		√			
๑๘) โครงการจ้างเหมาดำเนินการเดินระบบกำจัดมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล	กองทรัพยากรฯ		√			
๑๙) โครงการจ้างเหมาเดินระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (เตาเผาฯ เพิ่มประสิทธิภาพ ๙.๖ ตัน/วัน)	กองทรัพยากรฯ		√			
๒๐) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	กองทรัพยากรฯ	√				
๒๑) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย	กองทรัพยากรฯ		√			
๒๒) โครงการก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการ (ระยะที่ ๒) ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	√				
๒๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ (ระยะ ๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ		√			
๒๔) โครงการปรับปรุงอาคารชั่งน้ำหนัก และเครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ		√			
๒๕) โครงการจ้างเหมาเดินระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอยภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ		√			

โครงการ	หน่วยงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
			ก่อนนี้แล้ว	ยังไม่ได้ก่อนนี้		
๒๖) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่บ่อฝังกลบมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี หมู่ ๒,๘ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ตามแบบรูปรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ			√		
๒๗) โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำชะขยะภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	√				
๒๘) โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ		√			
๒๙) โครงการขยายเขตบริการประปาในพื้นที่ที่มีประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง		√			
รวม		๑๐	๔๒	๑๑	๒	-
รวมจำนวนทั้งสิ้น		๖๕				

สรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวประชุมไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๕ ซึ่งมีจำนวน ๑ โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕ พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๕๘) จำนวน ๑ โครงการ PERT / CPM / S-CURV (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																																	
				☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ	☐ ๔.ยกเลิกโครงการ																														
๑	ก่อสร้างอาคารโรงพิมพ์เนเซียม ขนาด ๔,๐๐๐ ที่นั่ง ระยะที่ ๑	สำนักช่าง	๒๙๔,๔๕๒,๐๐๐ ก่อนนี้ผูกพันร่วมกับ ระยะที่ ๒ ๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐																																		
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๕)	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	ก.ย.๖๕	ต.ค.๖๕	พ.ย.๖๕	ธ.ค.๖๕	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	ก.ย.๖๕	ต.ค.๖๕	พ.ย.๖๕	ธ.ค.๖๕	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	๑๐๐%					
	กิจกรรม A	งวดที่ ๑	๑๑,๗๖๐,๐๐๐	๑๑,๗๖๐,๐๐๐																												97					
	กิจกรรม B	งวดที่ ๒	๑๒,๙๓๖,๐๐๐	๑๒,๙๓๖,๐๐๐																												95					
	กิจกรรม C	งวดที่ ๓	๑๒,๓๔๘,๐๐๐	๑๒,๓๔๘,๐๐๐																												92					
	กิจกรรม D	งวดที่ ๔	๑๑,๗๖๐,๐๐๐																													90					
	กิจกรรม E	งวดที่ ๕	๑๔,๔๐๖,๐๐๐																													87					
	กิจกรรม F	งวดที่ ๖	๑๔,๔๐๖,๐๐๐																													82					
	กิจกรรม G	งวดที่ ๗	๑๔,๔๐๖,๐๐๐																													79					
	กิจกรรม H	งวดที่ ๘	๑๓,๒๓๐,๐๐๐																													76					
	กิจกรรม I	งวดที่ ๙	๑๔,๑๑๒,๐๐๐																													72					
	กิจกรรม J	งวดที่ ๑๐	๑๒,๐๕๔,๐๐๐																													67					
	กิจกรรม K	งวดที่ ๑๑	๑๒,๓๔๘,๐๐๐																													65					
	กิจกรรม L	งวดที่ ๑๒	๑๒,๖๔๒,๐๐๐																													62					
	กิจกรรม M	งวดที่ ๑๓	๑๔,๔๐๖,๐๐๐																													58					
	กิจกรรม N	งวดที่ ๑๔	๑๒,๐๕๔,๐๐๐																													53					
	กิจกรรม O	งวดที่ ๑๕	๘,๕๒๖,๐๐๐																													49					
	กิจกรรม P	งวดที่ ๑๖	๖,๑๗๔,๐๐๐																													45					
	กิจกรรม Q	งวดที่ ๑๗	๑๒,๙๓๖,๐๐๐																													41					
	กิจกรรม R	งวดที่ ๑๘	๑๒,๖๔๒,๐๐๐																													36					
	กิจกรรม S	งวดที่ ๑๙	๘,๘๒๐,๐๐๐																													31					
	กิจกรรม T	งวดที่ ๒๐	๑๐,๒๙๐,๐๐๐																													26					
	กิจกรรม U	งวดที่ ๒๑	๑๒,๓๔๘,๐๐๐																													22					
	กิจกรรม V	งวดที่ ๒๒	๙,๗๐๒,๐๐๐																													17					
	กิจกรรม W	งวดที่ ๒๓	๖,๗๖๒,๐๐๐																													13					
	กิจกรรม X	งวดที่ ๒๔	๘,๕๒๖,๐๐๐																													8.4					
	กิจกรรม Y	งวดที่ ๒๕	๕,๒๙๒,๐๐๐																													4					
	กิจกรรม Z	งวดที่ ๒๖	๙,๑๑๔,๐๐๐																													0					
			๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐	๓๗,๐๕๔,๐๐๐																																	
☐	ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล.....																																				
ขั้นตอน / เหตุผล / ผลกระทบ : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ 25/2564 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 5 มีนาคม 2566																																					

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล.....

ขั้นตอน / เหตุผล / ผลกระทบ : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ 25/2564 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 5 มีนาคม 2566

สรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(เพิ่มเติมฉบับที่ 1)

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ 1/2565 ซึ่งมีจำนวน 2 โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ 2/2565 พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สรุปลงผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๕๙) จำนวน ๑ โครงการ PERT / CPM / S-CURV (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นันทบุรี)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนันทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ(ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน															
๑	ก่อสร้างอาคารโรงเรียนเขมรขนาดความจุ ๔,๐๐๐ ที่นั่ง (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๙ ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นันทบุรี	สำนักช่าง	๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐ ก่อนนี้ผูกพันร่วมกับ ระยะที่ ๑ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ				☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ				☐ ๔.ยกเลิกโครงการ						
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๕)	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	ก.ย.๖๕	ต.ค.๖๕	พ.ย.๖๕	ธ.ค.๖๕	ม.ค.๖๖	ก.พ.๖๖	มี.ค.๖๖
	กิจกรรม A	งวดที่ ๑	๑๑,๗๖๐,๐๐๐	๑๑,๗๖๐,๐๐๐															๑๐๐%
	กิจกรรม B	งวดที่ ๒	๑๒,๙๓๖,๐๐๐	๑๒,๙๓๖,๐๐๐															๙๗
	กิจกรรม C	งวดที่ ๓	๑๒,๓๔๘,๐๐๐	๑๒,๓๔๘,๐๐๐															๙๕
	กิจกรรม D	งวดที่ ๔	๑๑,๗๖๐,๐๐๐																๙๒
	กิจกรรม E	งวดที่ ๕	๑๔,๔๐๖,๐๐๐																๙๐
	กิจกรรม F	งวดที่ ๖	๑๔,๔๐๖,๐๐๐																๘๗
	กิจกรรม G	งวดที่ ๗	๑๔,๔๐๖,๐๐๐																๘๒
	กิจกรรม H	งวดที่ ๘	๑๓,๒๓๐,๐๐๐																๗๙
	กิจกรรม I	งวดที่ ๙	๑๔,๑๑๒,๐๐๐																๗๖
	กิจกรรม J	งวดที่ ๑๐	๑๒,๐๕๔,๐๐๐																๗๒
	กิจกรรม K	งวดที่ ๑๑	๑๒,๓๔๘,๐๐๐																๖๗
	กิจกรรม L	งวดที่ ๑๒	๑๒,๖๔๒,๐๐๐																๖๕
	กิจกรรม M	งวดที่ ๑๓	๑๔,๔๐๖,๐๐๐																๖๒
	กิจกรรม N	งวดที่ ๑๔	๑๒,๐๕๔,๐๐๐																๕๘
	กิจกรรม O	งวดที่ ๑๕	๘,๕๒๖,๐๐๐																๕๕
	กิจกรรม P	งวดที่ ๑๖	๖,๑๗๔,๐๐๐																๔๙
	กิจกรรม Q	งวดที่ ๑๗	๑๒,๙๓๖,๐๐๐																๔๕
	กิจกรรม R	งวดที่ ๑๘	๑๒,๖๔๒,๐๐๐																๔๑
	กิจกรรม S	งวดที่ ๑๙	๘,๘๒๐,๐๐๐																๓๖
	กิจกรรม T	งวดที่ ๒๐	๑๐,๒๙๐,๐๐๐																๓๑
	กิจกรรม U	งวดที่ ๒๑	๑๒,๓๔๘,๐๐๐																๒๖
	กิจกรรม V	งวดที่ ๒๒	๙,๗๐๒,๐๐๐																๒๒
	กิจกรรม W	งวดที่ ๒๓	๖,๗๖๒,๐๐๐																๑๗
	กิจกรรม X	งวดที่ ๒๔	๘,๕๒๖,๐๐๐																๑๓
	กิจกรรม Y	งวดที่ ๒๕	๕,๒๙๒,๐๐๐																๑๐
	กิจกรรม Z	งวดที่ ๒๖	๙,๑๑๔,๐๐๐																๐
	รวม		๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐	๓๗,๐๕๔,๐๐๐															

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล.....

ขั้นตอน / เหตุผล / ผลกระทบ : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ 25/2564 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 5 มีนาคม 2566

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
2	จ้างที่ปรึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	กองทรัพยากรฯ	25,000,000 กันเงิน 17,476,200	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.65)	เดือน												
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	
	กิจกรรม A															
	กิจกรรม b															
	กิจกรรม c															
	กิจกรรม d															
	กิจกรรม e															
	รวม															

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

.....

ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานตามสัญญาจ้าง.....

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ 1/2565 ซึ่งมีจำนวน 2 โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ 2/2565 พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 2 โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐) จำนวน ๒ โครงการ
PERT/CPM/S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																			
๑	โครงการก่อสร้างรั้วรอบสนามกีฬาหมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	๑๒,๕๓๙,๐๐๐.๐๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๑๑,๕๕๕,๕๕๕.๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔.ยกเลิกโครงการ																
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๕)	เดือน																			
				ต.ค.-๖๓	พ.ย.-๖๓	ธ.ค.-๖๓	ม.ค.-๖๔	ก.พ.-๖๔	มี.ค.-๖๔	เม.ย.-๖๔	พ.ค.-๖๔	มิ.ย.-๖๔	ก.ค.-๖๔	ส.ค.-๖๔	ก.ย.-๖๔	ต.ย.-๖๔	พ.ย.-๖๔	ธ.ค.-๖๔	ม.ค.-๖๕	ก.พ.-๖๕	มี.ค.-๖๕	๑๐๐%	
	กิจกรรม A งวดที่ ๑	๑,๙๖๔,๔๔๔.๓๕																					๘๑%
	กิจกรรม b งวดที่ ๒	๔,๒๗๕,๕๕๕.๓๕																					๕๔%
	กิจกรรม c งวดที่ ๓	๓,๑๑๙,๙๙๙.๘๕																					๑๗%
กิจกรรม d งวดที่ ๔	๒,๑๙๕,๕๕๕.๔๕																					๐%	
รวม		๑๑,๕๕๕,๕๕๕.๐๐																					
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																							
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๖/๒๕๖๓ ลว.๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ มีการแก้ไขแบบแปลน																							
ทับซ้อนกับโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน แห่งใหม่ (แห่งที่ 3) สำนักงาน กกท. และราษฎรบริเวณด้านข้างขอให้ปรับแก้ไขแบบแปลน																							

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมบนพื้นฐานให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๒	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่งสำหรับการปฏิบัติงานใน ความรับผิดชอบของกองช่าง - เรือดับเพลิงกู้ภัย ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักช่าง	๑๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ										
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๕)	เดือน														
			๒๕.๒.๕๖	๒๕.๓.๕๖	๒๕.๔.๕๖	๒๕.๕.๕๖	๒๕.๖.๕๖	๒๕.๗.๕๖	๒๕.๘.๕๖	๒๕.๙.๕๖	๒๕.๑๐.๕๖	๒๕.๑๑.๕๖	๒๕.๑๒.๕๖	๒๕.๑.๕๗	๒๕.๒.๕๗	๒๕.๓.๕๗	๒๕.๔.๕๗
กิจกรรม A สอบถามราคาผู้จัดจำหน่าย																	
กิจกรรม A แต่งตั้งคณะกรรมการ																	
กิจกรรม C จัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะ																	
กิจกรรม D ดำเนินการจัดซื้อ																	
กิจกรรม E ดำเนินการตามสัญญา																	
กิจกรรม F ลงทะเบียนทรัพย์สิน																	
รวม																	

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล

ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เริ่มสัญญาวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕

อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่าย และลงทะเบียนทรัพย์สิน.....

สรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ 1/2565 ซึ่งมีจำนวน 1 โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ 2/2565 พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 1 โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

-20-

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ 1/2565 ซึ่งมีจำนวน 5 โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ 2/2565 พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 5 โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๖๑) จำนวน ๔ โครงการ

PERT/CPM/S-CURVE (ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ								
๑	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๕)	เดือน												
			ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ย.๖๕	ธ.ค.๖๕	ก.พ.๖๖	มี.ค.๖๖	เม.ย.๖๖	พ.ค.๖๖	พ.ย.๖๖	ธ.ค.๖๖
	กิจกรรม A แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางและคณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง														
	กิจกรรม b ตรวจสอบออกแบบแปลน ประมาณราคาค่าก่อสร้างและจัดทำราคากลาง														
	กิจกรรม c จัดจ้าง														
	กิจกรรม d ดำเนินการตามสัญญา														
	รวม														

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล

ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :ดำเนินการก่อสร้างกับโครงการโอนเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ที่เหลือจ่าย) จำนวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

อยู่ระหว่างจัดจ้าง.....

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน														
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ								
๒	๒.๒ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายวัดทองนาปรัง-วัดไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	สำนักงาน	๔,๑๖๕,๐๐๐.๐๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๓,๔๑๐,๐๐๐.๐๐															
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๕)	เดือน														
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ย.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ต.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	๑๐๐%
กิจกรรม A งานงานที่ ๑ ๒,๔๒๑,๑๐๐																		๙๐%
กิจกรรม b งานงานที่ ๒ ๙๔๔,๙๐๐																		๘๐%
กิจกรรม c																		
กิจกรรม d																		
กิจกรรม e																		
รวม																		
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																		
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการแนบท้ายสัญญาจ้าง รอคิวรับงานงวดสุดท้าย.....																		

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																											
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ							☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ							☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ							☐ ๔. ยกเลิกโครงการ						
๓	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. สายบ้านไทรน้อย-บ้านคลอง นาหมอน (นบ.๒๐๔๔) ตอนที่ ๓ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	๖๒,๙๓๐,๐๐๐ ก่อนหักเงินแล้วจำนวน ๔๙,๔๗๐,๐๐๐																												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๕)	เดือน																												
			ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ย.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ย.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ย.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ย.๖๕	มิ.ย.๖๕	๑๐๐%
กิจกรรม A งานงวดที่ ๑	๕,๔๔๑,๗๐๐																														๔๔%
กิจกรรม b งานงวดที่ ๒	๕,๔๔๑,๗๐๐																														๗๗.๕%
กิจกรรม c งานงวดที่ ๓	๑๑,๑๓๐,๗๕๐																														๖๕.๕%
กิจกรรม d งานงวดที่ ๔	๘,๔๐๙,๙๐๐																														๔๔.๕%
กิจกรรม e งานงวดที่ ๕	๗,๙๑๕,๒๐๐																														๒๒%
กิจกรรม f งานงวดที่ ๖	๕,๑๙๔,๓๕๐																														๑๑%
กิจกรรม g งานงวดที่ ๗	๕,๙๓๖,๔๐๐																														๐%
รวม		๔๙,๔๗๐,๐๐๐	-																												
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																															
ขั้นตอน/เหตุผล ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เนื่องจากมีแนวท่อประปาขนาด ๐.๓๐ เมตร																															
บางส่วนอยู่ในแนวก่อสร้างกำแพงกันดิน , แนวท่อประปาใต้ดินขนาด ๑.๐๐ เมตร อยู่ในแนวก่อสร้างบ่อระบายน้ำของโครงการ , รอกการประปาย้ายแนวท่อ.....																															

-25-

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓. ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ												
๕	โครงการก่อสร้างอาคารกีฬา อเนกประสงค์บ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๐ ตารางเมตร ตามแบบของอบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๒๗,๓๘๗,๐๐๐													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๕)	เดือน												
				ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	ก.ย.๖๕	ต.ค.๖๕	๑๐๐%		
กิจกรรม A งานงวดที่ ๑ วงเงิน ๑,๙๐๖,๒๙๕														๘๓.๕%		
กิจกรรม B งานงวดที่ ๒ วงเงิน ๔,๑๕๔,๒๑๐														๗๕.๕%		
กิจกรรม C งานงวดที่ ๓ วงเงิน ๓,๓๖๔,๐๕๐														๖๔%		
กิจกรรม D งานงวดที่ ๔ วงเงิน ๓,๙๒๔,๒๗๕														๔๖.๕%		
กิจกรรม E งานงวดที่ ๕ วงเงิน ๒,๕๗๙,๑๐๕														๓๑.๕%		
กิจกรรม F งานงวดที่ ๖ วงเงิน ๓,๑๓๙,๗๘๐														๕.๕%		
กิจกรรม G งานงวดที่ ๗ วงเงิน ๒,๓๕๔,๘๓๕														๐%		
รวม ๒๒,๔๒๗,๐๐๐																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เริ่มสัญญาวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕.....																

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ 1/2565 มีจำนวน 11 โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ 2/2565 พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 10 โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

(กรณีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๖๒) จำนวน ๘ โครงการ

PERT / CPM / S-CURVE (ตามติดคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน															
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ											☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย นบ.๔๐๒๑ บ้านหนองนกยางเขน- บ้านเต็มรัก ต.บางคูรัด อ.บางคูรัด จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๗,๒๕๓,๐๐๐																
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๕)	เดือน																
			ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ย.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ก.ค.๖๕	ก.ค.๖๕	ก.ค.๖๕	ก.ค.๖๕	ก.ค.๖๕	ก.ค.๖๕			
	กิจกรรม A งานงวดที่ ๑ (๑,๙๔๔,๐๐๐)																๑๐๐%		
	กิจกรรม b งานงวดที่ ๒ (๒,๑๖๐,๐๐๐)																๕๗%		
	กิจกรรม c งานงวดที่ ๓ งานสุดท้าย (๓,๐๙๖,๐๐๐)																๒๗%		
	วงเงินตามสัญญาจ้าง (๗,๒๐๐,๐๐๐)																๐%		
	รวม																		
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																			
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๓๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เริ่มสัญญาวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕																			
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพรกิจวัฒนา.....อยู่ระหว่างดำเนินการ																			

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)															
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เสียบคลองโตะใหม่ฝั่งตะวันตก ต.บางคูวัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๓๑,๕๘๐,๐๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓. ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ														
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๕)	เดือน															
			ต.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	ก.ย.๖๕	๑๐๐%			
กิจกรรม A งานงวดที่ ๑ วงเงิน ๖,๗๘๙,๗๐๐															๗๔.๕๐%			
กิจกรรม b งานงวดที่ ๒ วงเงิน ๖,๗๘๙,๗๐๐															๖๐%			
กิจกรรม c งานงวดที่ ๓ วงเงิน ๕,๓๖๘,๖๐๐															๔๓%			
กิจกรรม d งานงวดที่ ๔ วงเงิน ๔,๕๗๙,๑๐๐															๒๑.๕๐%			
กิจกรรม e งานงวดที่ ๖ วงเงิน ๘,๐๕๒,๙๐๐															๐%			
รวม ๓๑,๕๘๐,๐๐๐																		
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																		
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๓๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕																		

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)													
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เลียบคลองลากค้อน (ตอน ๒) ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๑๗,๙๕๘,๐๐๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๕)	เดือน													
			ต.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	๑๐๐%		
กิจกรรม A งานงวดที่ ๑ วงเงิน ๔,๑๖๙,๘๘๐														๘๐%		
กิจกรรม b งานงวดที่ ๒ วงเงิน ๔,๓๒๔,๓๒๐														๕๕%		
กิจกรรม c งานงวดที่ ๓ วงเงิน ๓,๘๖๑,๐๐๐														๒๗%		
กิจกรรม d งานงวดที่ ๔ วงเงิน ๓,๐๘๘,๘๐๐														๐%		
กิจกรรม e.....																
รวม ๑๕,๔๔๔,๐๐๐																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๓๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เริ่มต้นวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และราวเหล็กกันตกถนนสาย เลียบคลองประปามหาสวัสดิ์ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณสามอำเภอ คือ อ.บางใหญ่ อ.บางบัวทอง และ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักงาน	๗,๖๐๐,๐๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๕)	เดือน													
				๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๓	๒๕๗๔	๑๐๐%
กิจกรรม A งานงวดที่ ๑ ๑,๒๑๒,๐๐๐																	๕๔.๙๙%
กิจกรรม b งานงวดที่ ๒ ๑,๖๘๖,๐๐๐																	๒๒.๙๖%
กิจกรรม c งานงวดที่ ๓ ๒,๓๗๑,๗๑๐ งวดสุดท้าย																	๐%
กิจกรรม d.....																	
วงเงินตามสัญญาจ้าง ๕,๒๖๙,๗๑๐																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๒๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เริ่มสัญญาวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕.....																	
ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาวัฒน์.....บริษัทหยุดงานเนื่องจากให้การประปานครหลวงตรวจสอบแนวท่อประปาใต้ดิน																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)													
๕	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โต๊ะนุ้ย ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๒๕,๙๗๕,๐๐๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๒๐,๖๐๐,๐๐๐	☒ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓. ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๕)	เดือน ต.ค.๖๔ พ.ย.๖๔ ธ.ค.๖๔ ม.ค.๖๕ ก.พ.๖๕ มี.ค.๖๕ เม.ย.๖๕ พ.ค.๖๕ มิ.ย.๖๕ ก.ค.๖๕ ส.ค.๖๕ ๑๐๐%													
กิจกรรม A งานจ้างที่ ๑ วงเงิน ๒,๐๖๐,๐๐๐		๒,๐๖๐,๐๐๐.๐๐														
กิจกรรม b งานจ้างที่ ๒ วงเงิน ๑๓,๓๙๐,๐๐๐		๑๓,๓๙๐,๐๐๐.๐๐														
กิจกรรม c งานจ้างที่ ๓ วงเงิน ๕,๑๕๑,๐๐๐		๕,๑๕๑,๐๐๐.๐๐														
กิจกรรม d																
กิจกรรม e																
รวม ๒๐,๖๐๐,๐๐๐		๒๐,๖๐๐,๐๐๐.๐๐														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๒๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เริ่มวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ									
๖	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติถนนสายบ้าน คลองเจ็ก-บ้านสุเหร่าแดง พร้อม กำแพงกันดิน คสล. กำแพงระบาย เชื่อมตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง ช่วงกม.ที่ ๐+๕๐๐ ถึง กม.ที่ ๑+๖๕๕) จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๕)	เดือน												
				๒๕.๕.๕๕	๒๕.๖.๕๕	๒๕.๗.๕๕	๒๕.๘.๕๕	๒๕.๙.๕๕	๒๕.๑๐.๕๕	๒๕.๑๑.๕๕	๒๕.๑๒.๕๕	๒๕.๑.๕๖	๒๕.๒.๕๖	๒๕.๓.๕๖	๒๕.๔.๕๖	๑๐๐%
กิจกรรม A งานงวดที่ ๑			๒,๘๐๐,๐๐๐													๖๓%
กิจกรรม B งานงวดที่ ๒			๒,๒๔๐,๐๐๐													๓๕%
กิจกรรม C งานงวดที่ ๓			๒,๙๖๐,๐๐๐													๐%
กิจกรรม D																
วงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๘,๐๐๐,๐๐๐													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๕๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เริ่มสัญญาวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕																
ผู้รับจ้าง บริษัท เอกปรานต์ จำกัด.....ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ													
๖	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลาดยางโดยวิธี Pavement Recycling ถนนเลียบริดจ์ ประปาหลวงวิสัย ต.บางคูวัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ระยะทาง ๒,๔๖๐ เมตร (กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๔+๓๘๐) ตามแบบของ อบจ. นนทบุรี	สำนักช่าง	๑๐,๙๐๐,๐๐๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๕,๘๘๐,๐๐๐.๐๐														
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๕)	เดือน													
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ย.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ต.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
กิจกรรม A งานงวดที่ ๑ (๑,๗๐๕,๐๐๐)																	
กิจกรรม B งานงวดที่ ๒ (๑,๗๖๔,๐๐๐)																	
กิจกรรม C งานงวดที่ ๓ (๒,๔๑๑,๐๐๐)																	
กิจกรรม D																	
รวม ๕,๘๘๐,๐๐๐.๐๐																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เริ่มสัญญาวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน															
๘	โครงการก่อสร้างถนนสาย นบ.๓๐๘๖บ้านบางไทร- บ้านคลองตาช้อนต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ				☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ				☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ				☐ ๔. ยกเลิกโครงการ			
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๕)	เดือน															
				ต.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	ก.ย.๖๕	๑๐๐%			
กิจกรรม A งานงวดที่ ๑ วงเงิน ๓,๖๐๕,๐๐๐																๖๔.๙๘%			
กิจกรรม b งานงวดที่ ๒ วงเงิน ๓,๖๐๕,๐๐๐																๓๒.๔๙%			
กิจกรรม c งานงวดที่ ๓ วงเงิน ๓,๘๘๕,๐๐๐																๐%			
กิจกรรม d																			
วงเงินตามสัญญาจ้าง ๑๑,๐๙๕,๐๐๐																			
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																			
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๓๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เริ่มสัญญาวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕.....																			
ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้าเวิร์ดเวล พลัส.....ปรับปรุงแก้ไขแบบแปลน เนื่องจากมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงตัวระดับก่อสร้างในแบบแปลนเกิดความคลาดเคลื่อน																			

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
10	โครงการขยายเขตบริการประปาในพื้นที่ที่มีประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง	25,000,000	☒ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ											
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.65)	เดือน												
			ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	
	กิจกรรม A ในปีงบประมาณ 2562 มีเส้นทางการวางท่อประปาจำนวน 51 เส้นทาง ยาวประมาณ 46.5 กิโลเมตร ขณะนี้ได้ดำเนินการวางท่อประปาแล้วเสร็จ จำนวน 51 เส้นทาง เมื่อเดือนธันวาคม 2564	22,690,256.56													
	กิจกรรม b														
	กิจกรรม c														
	กิจกรรม d														
	รวม	22,690,256.56													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :															

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน
-----	---------	----------	-----------------------	----------------

11	โครงการบ่อปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Pond) ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	11,500,000 กันไว้ 11,500,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.65)	เดือน												
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	
กิจกรรม Aเบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ 1.....			1,992,000		→											
กิจกรรม bเบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ 2.....			2,490,000				→									
กิจกรรม c																
กิจกรรม d																
รวม			4,482,000													

☐ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

 ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : อยู่ในขั้นตอนบริหารสัญญา มีการแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง ขยายสัญญาเป็นวันที่ 9 มิถุนายน 2565

ส่งมอบงานงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย)


ส่งมอบงานงวดที่ 4

ส่งมอบงานงวดที่ 3

ส่งมอบงานงวดที่ 2

ส่งมอบงานงวดที่ 1

ลงนามในสัญญาจ้าง

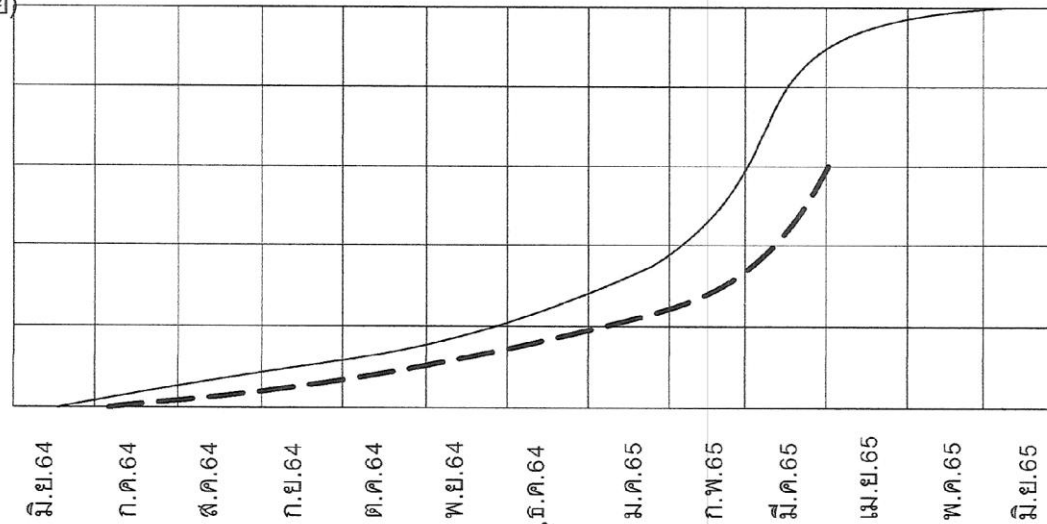

————— แผนงาน

- - - - - ผลการดำเนินงาน

โครงการก่อสร้างบ่อปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Pond)
ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ปีงบประมาณ 2562
สัญญาจ้างเลขที่ 44/2544 ลท.7 ก.ค.64 (เริ่ม 8 ก.ค.64-9 มิ.ย.65)

5-4-65

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
1 2	โครงการอาคารอเนกประสงค์ในการบริหารจัดการกำจัด มูลฝอยติดเชื้อภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	9,800,000 กันไว้ 9,800,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิก โครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.65)	เดือน												
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	
กิจกรรม Aเบิกค่าจ้างงวดที่ 1.....			2,789,700													
กิจกรรม b																
กิจกรรม c																
กิจกรรม d																
รวม			2,789,700													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : อยู่ในขั้นตอนการบริหารสัญญา																

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ 1/2565 มีจำนวน 17 โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ 2/2565 พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 10 โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

-41-

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2563)

PERT / CPM / S-CURVE(ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนา อบจ.นทบุรี)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

[illegible]

กิจกรรม b	อนุมัติราคากลาง.....													
กิจกรรม c	ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง.....													
กิจกรรม d	ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง.....													
	รวม													

☐ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 37/2564 ลงนามเมื่อเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564.....

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☒ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ										
๑	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. พร้อมกำแพงกันดิน ถนนสายแยก ทล.๓๔๕ ประตูนํ้าคลองบางบัวทอง (ช่วง กม.ที่ ๑+๔๑๕ ถึง กม.ที่ ๒+๖๓๐) ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๑๕.๐๐ เมตร ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐														
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๕)	เดือน													
				มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม		
กิจกรรม A																	
กิจกรรม B																	
กิจกรรม C																	
กิจกรรม D																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างรอผลจากการหารือจังหวัดเพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงต่อสภาฯ แก้ไขเป็นโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยก ทล.๓๔๕-ประตูน้ำคลองบางบัวทอง																	
(ตอนที่ ๓) ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร พร้อมกำแพงกันดิน วางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน														
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ											
๒	โครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือบริเวณหน้าวัดปากคลองพระอุดม หมู่ที่ ๕ ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ก่อสร้างโป๊ะเหล็กขึ้น-ลงเรือขนาด ๔.๐๐x๘.๐๐x๑.๒๐ เมตร ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑,๔๒๗,๐๐๐.๐๐															
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๕)	เดือน														
				ต.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	ก.ย.๖๕			
กิจกรรม A จัดทำราคากลาง/ร่างแบบบูรณาการ																		
กิจกรรม b ดำเนินการจัดจ้าง																		
กิจกรรม c ดำเนินการตามสัญญา																		
กิจกรรม d																		
รวม																		
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																		
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างครั้งที่ ๒.....																		

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
4	โครงการขยายเขตบริการประปาในพื้นที่ที่มีประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง	25,000,000 (โอนลด 7,600,000 คงเหลือ 17,400,000)	☒ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ											
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.65)	เดือน											
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 55	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65
	กิจกรรม A ในปีงบประมาณ 2563 มีเส้นทางการวางท่อประปา จำนวน 33 เส้นทาง ยาวประมาณ 35.9 กิโลเมตร ขณะนี้ได้ดำเนินการวางท่อประปาแล้วเสร็จ จำนวน 33 เส้นทาง เมื่อเดือนเมษายน 2565		15,040,807.85	←————→											
	กิจกรรม b														
	กิจกรรม c														
	รวม		15,040,807.85												
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																							
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ																				
๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย เลียบคลองหลุมลิปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๒๘,๓๗๓,๐๐๐ ก่อนนี้ผู้กันแล้ว จำนวน ๒๓,๕๔๐,๐๐๐																								
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๕)	เดือน																								
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	๑๐๐%
กิจกรรม A งวดที่ ๑	๔,๒๓๗,๒๐๐																									๕๙%	
กิจกรรม b งวดที่ ๒	๔,๒๓๗,๒๐๐																									๓๖%	
กิจกรรม c งวดที่ ๓	๕,๔๑๔,๒๐๐																									๑๘%	
กิจกรรม d งวดที่ ๓	๙,๖๕๑,๔๐๐																									๐%	
รวม		๒๓,๕๔๐,๐๐๐																									
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																											
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ปรับแก้ไขแบบแปลน																											
แนวเวนคืนที่ดินโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวง , หยุดงานเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)																											

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
๔	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณช่องทางคู่ขนานของถนนราชพฤกษ์ ด้านหน้าทางเข้าโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	๒,๗๐๐,๐๐๐	☐ ๓. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ได้ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ								
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๕)	เดือน											
				พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	
กิจกรรม A															
กิจกรรม B															
กิจกรรม C															
กิจกรรม D															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล															
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :ได้ดำเนินการจัดทำรูปแบบไฟเขียว-ไฟแดง (ความปลอดภัยทางจราจร) และส่งให้กรมทางหลวงชนบทตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อดำเนินการอนุญาตต่อไป....															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน															
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ												
๕	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ระยะที่ ๒ ขนาดความสูงไม่เกิน ๓๕ ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้างข้อกำหนดของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงาน	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐																
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๕)	เดือน															
				ม.ค. ๖๕	ก.พ. ๖๕	มี.ค. ๖๕	เม.ย. ๖๕	พ.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	มิ.ย. ๖๕	ก.ค. ๖๕	ก.ย. ๖๕	ต.ค. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๕	ก.พ. ๖๕	มี.ค. ๖๕		
กิจกรรม A แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางและ คณะกรรมการร่างแบบรูปรายการงานก่อสร้าง																			
กิจกรรม B ตรวจสอบแบบแปลน ประมาณราคาค่า ก่อสร้าง และจัดทำราคากลาง																			
กิจกรรม C จัดจ้าง																			
กิจกรรม D ดำเนินการตามสัญญาจ้าง																			
รวม																			
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																			
ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :ดำเนินการร่วมกับระยะที่ ๑ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท																			
อยู่ระหว่างจัดจ้าง																			

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน																
๖	โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ															
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๕)	เดือน																	
			ต.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	ก.ย.๖๕	ต.ย.๖๕	พ.ย.๖๕	ธ.ค.๖๕	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕
กิจกรรม A แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางและคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างคุมงานก่อสร้าง																				
กิจกรรม B จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างคุมงานฯ																				
กิจกรรม C จัดจ้าง																				
กิจกรรม D ดำเนินการตามสัญญาจ้าง																				
รวม																				
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT/CPM/S-CURVE เหตุผล.....																				
ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ:.....อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบของคณะกรรมการฯ.....																				

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
๗	โครงการก่อสร้างอาคารกีฬา อเนกประสงค์บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ระยะที่ ๒ จากเดิมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๐ ตารางเมตร ขนาดหรือพื้นที่ เพิ่มขึ้น ๔๕๐ ตารางเมตร รวมขนาด พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๐ ตารางเมตร ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๖,๔๑๒,๐๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	☒ ๓. ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔. ยกเลิกโครงการ								
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔)	เดือน												
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ย.	พ.ย.	ธ.ค.	
กิจกรรม A															
กิจกรรม B															
กิจกรรม C															
กิจกรรม D															
รวม															
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล															
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :รอกการดำเนินการก่อสร้างระยะที่ ๑ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง															

ร.น.	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน															
๘.	โครงการจ้างออกแบบอุทยานการเรียนรู้ จังหวัดนนทบุรี หมู่ที่ ๔ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พื้นที่อาคาร ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ อบจ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๙,๓๔๒,๐๐๐.๐๐	☐ ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ	☒ ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการ	☐ ๓.ยังไม่ดำเนินการ	☐ ๔.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๓ มี.ค.๖๕)	เดือน																
			๒๕๖๔.๒	๒๕๖๔.๓	๒๕๖๔.๔	๒๕๖๔.๕	๒๕๖๔.๖	๒๕๖๔.๗	๒๕๖๔.๘	๒๕๖๔.๙	๒๕๖๕.๑	๒๕๖๕.๒	๒๕๖๕.๓	๒๕๖๕.๔	๒๕๖๕.๕	๒๕๖๕.๖	๒๕๖๕.๗	๒๕๖๕.๘	๒๕๖๕.๙
กิจกรรม A : แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางและคณะกรรมการร่าง ขอบเขตของงานจ้างออกแบบ																			
กิจกรรม B : จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบ																			
กิจกรรม C : จัดจ้าง																			
กิจกรรม D : ดำเนินการตามสัญญาจ้าง																			
รวม																			
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล..... ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ.....อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง.....																			

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ							
๕	โครงการจ้างออกแบบอาคารจอดรถยนต์บริเวณสนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี หมู่ที่ ๕ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พื้นที่อาคาร ไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๑๐,๖๗๖,๐๐๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๗,๔๙๐,๐๐๐														
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๔)	เดือน													
				๒๕:๒๕	๒๕:๒๕	๒๕:๒๕	๒๕:๒๕	๒๕:๒๕	๒๕:๒๕	๒๕:๒๕	๒๕:๒๕	๒๕:๒๕	๒๕:๒๕	๒๕:๒๕	๒๕:๒๕	๒๕:๒๕	๒๕:๒๕
	กิจกรรม A งานงวดที่ ๑ วงเงิน ๗๔๙,๐๐๐		๗๔๙,๐๐๐.๐๐														๗๐%
	กิจกรรม B งานงวดที่ ๒ วงเงิน ๑,๔๙๘,๐๐๐		๑,๔๙๘,๐๐๐.๐๐														๕๐%
	กิจกรรม C งานงวดที่ ๓ วงเงิน ๑,๔๙๘,๐๐๐																๓๐%
	กิจกรรม D งานงวดที่ ๔ วงเงิน ๑,๔๙๘,๐๐๐																๑๐%
	กิจกรรม E งานงวดที่ ๕ วงเงิน ๒,๒๔๗,๐๐๐																๐%
	รวม ๗,๔๙๐,๐๐๐		๒,๒๔๗,๐๐๐.๐๐														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาจ้างวันที่ ๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เริ่มสัญญาวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน								
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬา(ระยะที่ ๓) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ขนาด ๒ ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร พร้อมระบบระบายน้ำและทางเท้า ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๘,๓๗๙,๐๐๐ ก่อนหักผูกพันแล้ว ๗,๘๗๐,๐๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ		☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ		☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ		☐ ๔. ยกเลิกโครงการ		
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๔)	เดือน								
				ม.ค./๖๔	ก.พ./๖๔	มี.ค./๖๔	เม.ย./๖๔	พ.ค./๖๔	มิ.ย./๖๔	ก.ค./๖๔	ส.ค./๖๔	๑๐๐%
กิจกรรม A : งานงวดที่ ๑. (๒,๓๒๑,๖๕๐.๐๐)												๗๒.๕๐%
กิจกรรม B : งานงวดที่ ๒. (๓,๓๘๔,๑๐๐.๐๐)												๒๙.๕๐%
กิจกรรม C : งานงวดที่ ๓. (๒,๑๖๔,๒๕๐.๐๐)												๐%
รวม ๗,๘๗๐,๐๐๐.๐๐												
ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล												
☐ ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๔๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕.....												
หยุดงานเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙).....												

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2563)

PERT / CPM / S-CURVE(ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เสริมสร้าง และพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
13	โครงการก่อสร้างบ่อฝังเฝ้าจากเตาเผามูลฝอย ติดเชื้อภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทร น้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	9,395,000	☒ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.65)	เดือน												
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	
	กิจกรรม A ...เบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ 1 และ 2 (งวดสุดท้าย)...															
	กิจกรรม b															
	กิจกรรม c															
	กิจกรรม d															
รวม																

☐ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
14	โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังดักไขมันและถังบำบัดน้ำเสียโรงเรียนในสังกัด อบจ.นนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	8,000,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.65)	เดือน												
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	
กิจกรรม A																
กิจกรรม b																
กิจกรรม c																
กิจกรรม d																
รวม																

☐ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

.....

ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ : อยู่ระหว่างการอัปเดตราคา.....

สรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในคราวการประชุมไตรมาสที่ 1/2565 ซึ่งมีจำนวน 29 โครงการ)

จากการติดตามไตรมาสที่ 2/2565 พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 29 โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

-56-

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2564) จำนวน 4 โครงการ

PERT / CPM / S-CURVE(ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนา อบจ.นนทบุรี)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน
-----	---------	----------	-----------------------	----------------

1	โครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศเพื่อมาสอนวิชาภาษาจีนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	37,701,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.65)	เดือน												
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	
กิจกรรม Aดำเนินการประมาณราคากลาง.....				↔												
กิจกรรม bอนุมัติราคากลาง.....				↔												
กิจกรรม cดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง.....				↔												
กิจกรรม dดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง.....				↔	→											
ดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ 1			4,189,000				↔									
ดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ 2			4,189,000					↔								
ดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ 3			4,189,000						↔							
รวม			12,567,000						↔							
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ 26/2565 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เบิกจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 9 งวด สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2565.....																

-57-

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน
2	โครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศเพื่อมาสอนวิชาภาษาอังกฤษและกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	104,607,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว	เดือน

	(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.65)	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65
กิจกรรม A ...ดำเนินการประมาณราคากลาง.....		↔											
กิจกรรม b ...อนุมัติราคากลาง		↔											
กิจกรรม c ...ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง.....		↔											
กิจกรรม d ...ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง.....		↔											
ดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ 1	11,623,000				↔								
ดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ 2	11,623,000					↔							
ดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ 3	11,623,000						↔						
รวม	34,869,000						↔						

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :
.....
.....

ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ 27/2565 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 9 งวด สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2565.....

-58-

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
3	โครงการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการเรียนรู้ การสอนระดับชั้นประถมศึกษา	กองการศึกษาฯ	2,250,000	☒ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ											
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.65)	เดือน											
ต.ค. 64				พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	

กิจกรรม e ดำเนินการตามสัญญาจ้างพร้อมเบิกจ่าย	4,790,280													
รวม	4,790,280													

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :
.....
.....

ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :ดำเนินงานตามสัญญาจ้างเลขที่ 5/2564 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เรียบร้อยแล้ว.....

-60-

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2564) จำนวน 2 โครงการ

PERT / CPM / S-CURVE(ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนา อบจ.นนทบุรี)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

[illegible]

.....														
กิจกรรม c														
.....														
กิจกรรม d														
.....														
รวม	4,326,643.53													

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

.....

.....

ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :

1. เข้าผู้คอนเทนเนอร์สำหรับหน่วยรักษาความปลอดภัย ณ รพ สนามวัดโบสถ์ดอนพรหม

2. เตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดตั้ง รพ.สนามจังหวัดนนทบุรี ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

๑

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน															
๑	โครงการการศึกษาแผนแม่บท การพัฒนากระบวนการจัดการ สินทรัพย์ประเภทถนน และอาคารในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี	สำนักช่าง	๑,๐๐๐,๐๐๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๙๔๗,๒๒๕.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ															
				กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๕)		เดือน											
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ย.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ธ.	ธ.ค.		
				กิจกรรม A งวดที่ ๑ ๒๗๕,๑๖๗.๕๐	๒๗๕,๑๖๗.๕๐														
				กิจกรรม B งวดที่ ๒ ๒๗๕,๑๖๗.๕๐	๒๗๕,๑๖๗.๕๐														
				กิจกรรม C งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ๓๙๖,๘๖๐															
รวม		๕๕๐,๓๓๕.๐๐																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																			
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕.....																			

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☒ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ												
๒	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก เครื่องจักรกล ขนาด ๑๒ ล้อ แบบลาตท่ายพร้อมวินช์ ติดตั้งเครน ขนาด ๑๕ ตัน-เมตร สำหรับยกเครื่องจักรกล พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส ทำงานในที่สูง	สำนักช่าง	๙,๘๖๐,๐๐๐													
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๕)	เดือน												
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ย.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ต.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	
	กิจกรรม A ดำเนินการแล้วเสร็จ															
	กิจกรรม B ปูพื้นรถ															
	กิจกรรม C ประกอบเครน															
	กิจกรรม D ประกอบโครงสร้างรถ															
	รวม		๙,๘๖๐,๐๐๐.๐๐													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :เบิกจ่ายครบทุกงวดแล้ว.....																

-65-

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน															
๔	โครงการก่อสร้างถนน คล.ส. สายคลองขุนมหาไทย-วัด สิงห์ทอง (นน.๒๐๓๘) เชื่อม ถนนราชพฤกษ์-อ้อมเกร็ด ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๙๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ตามแบบของ อบจ. นนทบุรี	สำนักช่าง	๑๘,๐๓๖,๐๐๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑๔,๗๗๕,๐๐๐.๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ															
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๕)	เดือน															
				ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มี.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	ก.ย.๖๕	ต.ค.๖๕	พ.ย.๖๕	ธ.ค.๖๕	๑๐๐%				
กิจกรรม A งานงวดที่ ๑ (๕,๑๔๑,๗๐๐)															๗๕.๖๐%				
กิจกรรม B งานงวดที่ ๒ (๖,๐๒๘,๒๐๐)															๓๔.๘๐%				
กิจกรรม C งานงวดที่ ๓ (๓,๖๐๕,๐๐๐)															๐%				
กิจกรรม D																			
รวม ๑๔,๗๗๕,๐๐๐.๐๐																			
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																			
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๔๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕.....																			

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน											
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ											
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองลือคแอน หมู่ที่ ๕,๖ ต.ทิววัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ตามแบบของ อบจ. นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๓๖,๘๘๒,๐๐๐												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๔)	เดือน												
			ต.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	ก.ย.๖๕	
	กิจกรรม A แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง														
	กิจกรรม B ตรวจสอบแบบแปลน,ขออนุญาต ก่อสร้าง,จัดทำราคากลาง														
	กิจกรรม C ดำเนินการจัดจ้าง														
	กิจกรรม D ดำเนินการตามสัญญา														
	รวม														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล															
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
				☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ												
๖	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง ถนนลาดยางโดยวิธี Pavement Recycling ถนนเลียบบคลอง ประปามหาสวัสดิ์ ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ระยะทาง ๒,๔๖๐ เมตร (กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๔+๓๘๐) ตามแบบของ อบจ. นนทบุรี	สำนักช่าง	๑๐,๕๐๐,๐๐๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๕,๘๘๐,๐๐๐.๐๐													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๕)	เดือน												
				ต.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	ก.ย.๖๕	
กิจกรรม A งานงวดที่ ๑ (๑,๗๐๕,๐๐๐)																
กิจกรรม B งานงวดที่ ๒ (๑,๗๖๔,๐๐๐)																
กิจกรรม C งานงวดที่ ๓ (๒,๔๑๑,๐๐๐)																
กิจกรรม D																
รวม ๕,๘๘๐,๐๐๐.๐๐																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เริ่มสัญญาวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ และบ่อบำบัด ถนนวัดสัก-วัดโคกนอ ต.บางขันนอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ระยะทาง ๗๖๐ เมตร ตามแบบบอจ นนทบุรี	สำนักช่าง	๖,๖๘๑,๐๐๐ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๖,๒๗๗,๔๐๓.๖๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ๓. ยังไม่ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๕)	เดือน												
				ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	ต.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	เม.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ค.๖๕	ก.ค.๖๕	ก.ค.๖๕	ก.ค.๖๕	ก.ค.๖๕	
กิจกรรม A งานงวดที่ ๑ วงเงิน ๒,๕๑๐,๙๖๑.๔๔			๒,๕๑๐,๙๖๑.๔๔													
กิจกรรม B งานงวดที่ ๒ วงเงิน ๓,๗๖๖,๔๔๒.๑๖																
กิจกรรม C																
กิจกรรม D																
รวม ๖,๒๗๗,๔๐๓.๖๐			๒,๕๑๐,๙๖๑.๔๔													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :สัญญาจ้างเลขที่ ๔๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เริ่มสัญญาวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕.....																
การประสานครหลวงเข้าดำเนินการย้ายแนวท่อประปา																

ร.ร.	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักพร้อมขยายไหล่ทาง ลาดยาง ถนนสายวัดสะพานสูง- วัดเตย หมู่ที่ ๓ ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ระยะทาง ๑,๗๐๐ เมตร ตามแบบ อบจ. นนทบุรี	สำนักงาน	๑๖,๘๕๖,๐๐๐	☐ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ๓. ยังไม่ดำเนินการ ☐ ๔. ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๕)	เดือน														
			ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	พ.ค.๖๕		
กิจกรรม A																	
กิจกรรม B																	
กิจกรรม C																	
กิจกรรม D																	
รวม																	
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล																	
ขั้นตอน/เหตุผล/ ผลกระทบ :อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูล, ติดปัญหาบ้านเรือนประชาชนกีดขวางแนวท่อระบายน้ำ อยู่หน้าบ่อค.คลองพระอุดมและวัดสะพานสูง เจริญกับประชาชนที่กีดขวางให้ออกจากแนวเขตก่อสร้าง.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
15	โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)	กองผังเมือง	300,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.65)	เดือน												
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	
	กิจกรรม A บริษัท จีไอเอส จำกัด ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างตามสัญญาเลขที่ 29/2564 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564		-													
	กิจกรรม b บริษัท จีไอเอส จำกัด ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564		1,039,500		↔											
	กิจกรรม c บริษัท จีไอเอส จำกัด ส่งมอบงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564		1,039,500						↔							
	กิจกรรม d บริษัท จีไอเอส จำกัด ส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565		891,000						↔							
	กิจกรรม e ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง งานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 และอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่าย		-													
	รวม		2,970,000													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน
-----	---------	----------	-----------------------	----------------

16	โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพของถนนสาธารณะเพื่อรองรับการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)	กองผังเมือง	3,900,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ											
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.65)	เดือน											
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65
	กิจกรรม A บริษัท เซอร์เวย์ซิสเทม จำกัด ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ 51/2564 เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64	-													
	กิจกรรม b บริษัท เซอร์เวย์ซิสเทม จำกัด ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ต.ค.64	585,000	↔												
	กิจกรรม c ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 2 ซึ่งกำหนดส่งงานงวดที่ 2 ในวันที่ 26 ม.ค.65	-		↔											
	กิจกรรม d บริษัท เซอร์เวย์ซิสเทม จำกัด ส่งมอบงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 26 ม.ค.64	1,365,000		↔											
	กิจกรรม e ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง งานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 9 ก.พ.65	-					↔								
กิจกรรม f ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 3 กำหนดส่งมอบงานงวดที่ 3 ในวันที่ 26 พ.ค.65	-					↔									
รวม		1,950,000													

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

 ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2564) จำนวน 12 โครงการ

PERT / CPM / S-CURVE(ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
-----	---------	----------	----------	----------------

			(ตั้งไว้)													
17	โครงการจ้างเหมาการจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	28,000,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.65)	เดือน												
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	
กิจกรรม Aเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 5.....			2,634,686.30	→												
กิจกรรม bเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 6.....			2,626,769.50		→											
กิจกรรม cเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 7.....			2,311,458.20			→										
กิจกรรม dเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 8.....			2,318,261.70				→									
กิจกรรม eเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 9.....			2,240,207.00					→								
รวม			12,131,382.70													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างบริหาร สัญญา.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน
18	โครงการจ้างเหมาดำเนินการเดินระบบกำจัดมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล	กองทรัพยากรฯ	115,000,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ

	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.65)	เดือน											
			ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65
	กิจกรรม Aเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 6.....	10,320,397.76	→											
	กิจกรรม bเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 7.....	20,233,056.26		→										
	กิจกรรม cเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 8.....	8,574,478.14				→								
	กิจกรรม dเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 9.....	9,056,478.18				→								
	กิจกรรม eเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 10.....	9,737,538.72					→							
	กิจกรรม fเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 11.....	9,813,916.32					→							
	รวม	20,554,056.26												

☐ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

 ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ในระหว่างบริหารสัญญา
 จ้าง.....

ส่งมอบงานงวดที่ 12 (งวดสุดท้าย)

ส่งมอบงานงวดที่ 11

ส่งมอบงานงวดที่ 10

ส่งมอบงานงวดที่ 9

ส่งมอบงานงวดที่ 8

ส่งมอบงานงวดที่ 7

ส่งมอบงานงวดที่ 6


ส่งมอบงานงวดที่ 5

ส่งมอบงานงวดที่ 4

ส่งมอบงานงวดที่ 3

ส่งมอบงานงวดที่ 2

ส่งมอบงานงวดที่ 1

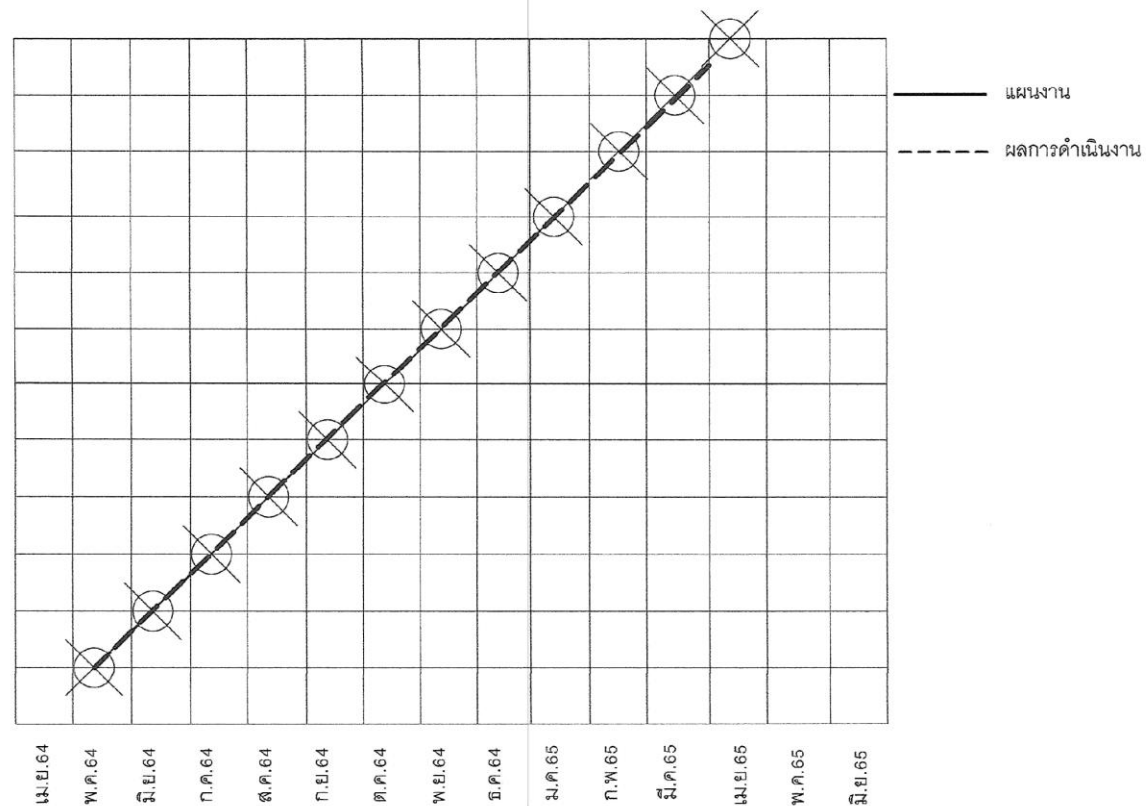

โครงการจ้างเหมาดำเนินการเดินระบบกำจัดมูลฝอยแบบถุกหลักสุขาภิบาล

ปีงบประมาณ 2564

สัญญาจ้างเลขที่ 32/2544 ลท.8 เม.ย.64 (เริ่ม 9 เม.ย.64-8 เม.ย.65)

5-4-65

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
19	โครงการจ้างเหมาเดินระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (เตาเผาฯ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ๙.๖ ตัน/วัน)	กองทรัพยากรฯ	36,500,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ												
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.65)	เดือน												
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	
กิจกรรม Aเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 5.....			3,563,750	→												
กิจกรรม bเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 6.....			1,951,755.38		→											
กิจกรรม cเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 7.....			3,186,625			→										
กิจกรรม dเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 8.....			3,165,785				→									
กิจกรรม eเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 9.....			3,151,500						→							
รวม			15,021,380.38													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จ้าง.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
20	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	กองทรัพยากรฯ	2,400,000	☒ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.65)	เดือน												
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65		
	กิจกรรม A		2,485,000													
																
	กิจกรรม b															
																
	กิจกรรม c															
																
	กิจกรรม d															
																
	รวม		2,485,000													
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
21	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัด ท้าย	กองทรัพยากรฯ	7,200,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.65)	เดือน												
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65		
	กิจกรรม A															
	กิจกรรม b															
	กิจกรรม c															
	กิจกรรม d															
รวม																
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา.....																

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
-----	---------	----------	----------	----------------

			(ตั้งไว้)												
22	โครงการก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อม อาคารบริการ (ระยะที่ ๒) ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอ ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	4,000,000	☒ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ											
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.65)	เดือน											
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	
กิจกรรม A ...เบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย).....			3,100,000												
กิจกรรม b															
กิจกรรม c															
กิจกรรม d															
รวม			3,100,000												

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

 ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา.....

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน
-----	---------	----------	-----------------------	----------------

23	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัด ขยะมูลฝอยติดเชื้อ (ระยะ ๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	33,500,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.65)	เดือน												
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	
	กิจกรรม A															
	กิจกรรม b															
	กิจกรรม c															
	กิจกรรม d															
รวม																

☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :


 ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ในระหว่างขั้นการพิจารณาของสำนักงบประมาณ

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน												
24	โครงการปรับปรุงอาคารซังน้ำหนัก และเครื่องซังน้ำหนักสำหรับรถบรรทุก ขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	1,000,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ												
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.65)	เดือน												
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	
	กิจกรรม A															
																
	กิจกรรม b															
.....																
.....																
กิจกรรม c																
.....																
.....																
กิจกรรม d																
.....																
.....																
รวม																
☐ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างการบริหาร สัญญา.....																

ส่งมอบงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)

ส่งมอบงานงวดที่ 1

ลงนามในสัญญาจ้าง

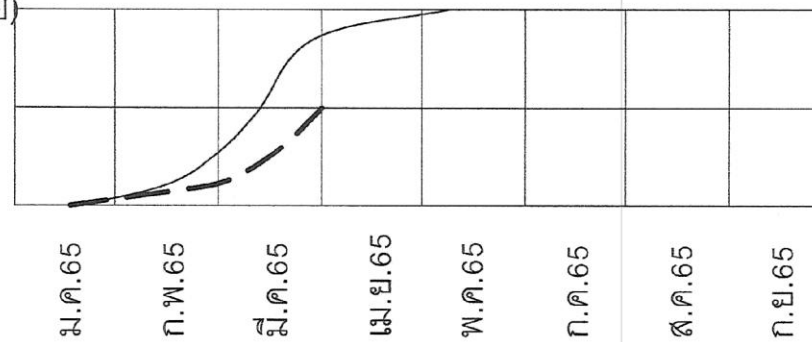

————— แผนงาน

- - - - - ผลการดำเนินงาน

โครงการปรับปรุงอาคารขังน้ำหนักรและเครื่องขังน้ำหนักรสำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2564

สัญญาจ้างเลขที่ 39/2564 ลท.10 ม.ค.65 (เริ่ม 11 ม.ค.65-10 พ.ค.65)

5-4-65

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน													
25	โครงการจ้างเหมาเดินระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอยภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอกำแพงไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	45,000,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ													
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ			เบิกจ่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.65)	เดือน													
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		
กิจกรรม Aเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 8.....			3,257,878.24	→													
กิจกรรม bเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 9.....			3,844,449.36		→												
กิจกรรม cเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 10.....			3,850,861.68			→											
กิจกรรม d																	
รวม			10,953,189.28														
☐ ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล : ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา																	

[illegible]

กิจกรรม d														
.....														
.....														
รวม	585,000													

☐ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

.....

.....

ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :

.....

.....

กิจกรรม b														
.....														
.....														
กิจกรรม c														
.....														
.....														
กิจกรรม d														
.....														
.....														
รวม														

☐ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

.....

ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :อยู่ระหว่างการบริหาร

สัญญา.....

-86-

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการเงินอุดหนุนตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(กรณี โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2564) จำนวน 1 โครงการ

PERT / CPM / S-CURVE(ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นนทบุรี)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ตั้งไว้)	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการขยายเขตบริการประปาในพื้นที่ที่มีประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง	15,000,000 โอนลด 4,780,000 คงเหลือ 10,220,000	☐ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ 3.ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ 4.ยกเลิกโครงการ
	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว	เดือน

		(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.65)	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65
กิจกรรม A	ดำเนินการลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจโครงการขยายเขตบริการประปาฯ ในงบประมาณประจำปี 2564 ร่วมกับการประสานครหลวง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 11 แห่ง เมื่อวันที่ 29 มี.ค.64 มีเส้นทางการวางท่อประปาทั้งหมด จำนวน 52 เส้นทาง ยาวประมาณ 26.6 กิโลเมตร ขณะนี้ได้ดำเนินการวางท่อประปาแล้วเสร็จ จำนวน 36 เส้นทาง และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 6 เส้นทาง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน ก.ค.65	10,218,218.05												
	รวม	10,218,218.05												

☐ไม่สามารถจัดทำเทคนิค PERT / CPM / S-CURVE เหตุผล :

ขั้นตอน/เหตุผล/ผลกระทบ :
