



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง

โทร. 032 - 697286 ต่อ 203

ที่ ปช. 53103 / 1316

วันที่ 19 ธันวาคม 2565

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลร่อนทอง ประจำปีงบประมาณ 2566

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลร่อนทอง

1.เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลร่อนทอง ได้อนุมัติงบประมาณที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบ e-LAAS โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นั้น

2.ข้อเท็จจริง

กองช่าง ขอส่งรายงานผลการดำเนินโครงการในไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565) ที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลร่อนทอง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

3.ข้อกฎหมาย

3.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขจนถึงปัจจุบัน

3.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

3.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543

4.ข้อพิจารณา

4.1 เห็นควรพิจารณา ตามข้อ 2 และรายละเอียดแนบท้าย เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบ ต่อไป

4.2 เห็นควรแจ้งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวรณันท์ บุศราวิช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น

คำสั่ง

(นางรัชนิวรรณ พรหมเล็ก)

ปลัดเทศบาลตำบลร่อนทอง

(นายปรีดา วิชาสวัชรโยธิน)

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนทอง

รายงานการดำเนินโครงการ (ปีงบประมาณ 2566)

1.ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบ้านช่างโอ - ซอยทุ่งเกตุ ณ ชุมชนบนดอน ตำบลร่อนทอง

ประเภทกิจกรรม : งานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

งบประมาณ 268,000 บาท

งบตามเทศบัญญัติ 268,000 บาท

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

1.ผู้ประสานงานโครงการ :

นายวรกันต์ บุศราวิช โทรศัพท์ 032 - 697286 ต่อ 7

2.รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล : เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมของประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการเดินทาง

เป้าหมายเชิงผลผลิต : ระยะทาง 650 เมตร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือพื้นที่ลงลูกรัง ไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลร่อนทองกำหนด

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ : เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคม ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

ผลที่คาดว่าจะเกิด : ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ : เทศบาลมีถนน สำหรับคมนาคม ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ : ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลร่อนทอง และพื้นที่ใกล้เคียง

3.ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่เริ่มต้น : 21 พฤศจิกายน 2565

วันที่สิ้นสุด : 19 ธันวาคม 2565

4.การเบิกจ่ายงบประมาณ :

งบประมาณที่ตั้งไว้ 268,000.-บาท เบิกจ่าย 268,000.-บาท คงเหลือ - บาท

5.สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการดำเนินงาน : -

6.ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

-ประเด็นโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อย

แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์แนวทางการพัฒนา

การขนส่งทางถนน พัฒนาโครงข่ายถนน เพื่อรองรับปริมาณความต้องการเดินทาง และขนส่งสินค้าพื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และเชื่อมต่อระบบขนส่งรูปแบบอื่น และบำรุงรักษาโครงข่ายถนน ที่มีในปัจจุบันให้มีคุณภาพ สามารถทำหน้าที่เป็นระบบเสริมเพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง และการขนส่งไปยังโครงข่ายการขนส่งรูปแบบ อื่นๆโดยให้ความสำคัญกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงจุดอันตรายเพื่อเพิ่มความปลอดภัย และลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

7.พิกัด ที่ตั้งโครงการ

เส้นรุ้ง(ละติจูด)

เส้นแวง(ลองจิจูด)

8.สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ


**โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยบ้านช่างโอ-ขอยทุ่งเกตุ
ณ ชุมชนบนดอน ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สัญญาจ้าง 3/2566 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565**

☒ ก่อนดำเนินการ ☐ ขณะดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบ้านช่างโอ-ซอยทุ่งเกตุ
ณ ชุมชนบนดอน ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สัญญาจ้าง 3/2566 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

☐ ก่อนดำเนินการ ☒ ขณะดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

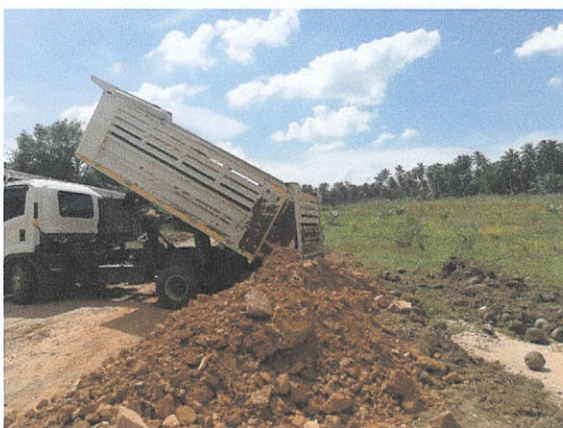

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบ้านช่างโอ-ซอยทุ่งเกตุ
ณ ชุมชนบนดอน ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สัญญาจ้าง 3/2566 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

☐ ก่อนดำเนินการ ☒ ขณะดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยบ้านช่างโอ-ขอยทุ่งเกตุ
ณ ชุมชนบนดอน ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สัญญาจ้าง 3/2566 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

☐ ก่อนดำเนินการ ☒ ขณะดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ



☐ ก่อนดำเนินการ ☒ ขณะดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

