

สรุปการใช้จ่ายเงินลงทุน ปี 2562

ณ 30 มิถุนายน 2562

(ล้านบาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ	งบประมาณ ปี 2562	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2562	มกราคม - มิถุนายน 2562				%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน	มิถุนายน 2562			
			เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2562		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
				วงเงิน	%				วงเงิน	%	
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	61,545.071	14,718.265	4,500.482	5,902.969	131.2	1,402.487	40.1	1,394.481	1,920.279	137.7	525.798
- รายปี	18,467.791	6,351.923	1,945.692	2,418.409	124.3	472.717	38.1	528.539	672.976	127.3	144.437
- ระยะยาว	43,077.280	8,366.342	2,554.790	3,484.560	136.4	929.770	41.6	865.942	1,247.303	144.0	381.361
งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ	64,001.841	19,996.095	7,999.656	6,597.068	82.5	(1,402.588)	33.0	1,213.139	1,558.485	128.5	345.346
รวมทั้งสิ้น	125,546.912	34,714.360	12,500.138	12,500.037	100.0	(0.101)	36.0	2,607.620	3,478.764	133.4	871.144

หมายเหตุ

- มติ ครม. 25 ก.ย. 2561 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2562 วงเงิน 118,542.470 ล้านบาท และ 34,714.360 ล้านบาท ตามลำดับ
- มติ ครม. เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 อนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.) และ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 อนุมัติดำเนินโครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คณญ.), โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.)
- การเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ สศช.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2562 ทำให้วงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นจาก 118,542.470 ล้านบาท เป็น 125,546.912 ล้านบาท โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายไม่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการดำเนินงาน


เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินลงทุนรายไตรมาส ตามเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ปี 2562

(ล้านบาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ	ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)				ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.)			
	เป้าหมาย ไตรมาส 1	จ่ายจริง		สูง(ต่ำ) กว่า เป้าหมาย ไตรมาส 1	เป้าหมาย ไตรมาส 2	จ่ายจริง		สูง(ต่ำ) กว่า เป้าหมาย ไตรมาส 2
		วงเงิน	%			วงเงิน	%	
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	1,683.726	2,348.231	139.5	664.505	2,816.756	3,554.738	126.2	737.982
- รายปี	811.593	1,128.936	139.1	317.343	1,134.099	1,289.473	113.7	155.374
- ระยะยาว	872.133	1,219.295	139.8	347.162	1,682.657	2,265.265	134.6	582.608
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	3,831.670	3,167.165	82.7	(664.505)	4,167.986	3,429.903	82.3	(738.083)
รวมทั้งสิ้น	5,515.396	5,515.396	100.0	-	6,984.742	6,984.641	100.0	(0.101)

ล้านบาท

เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงิน ปี 2561-2562

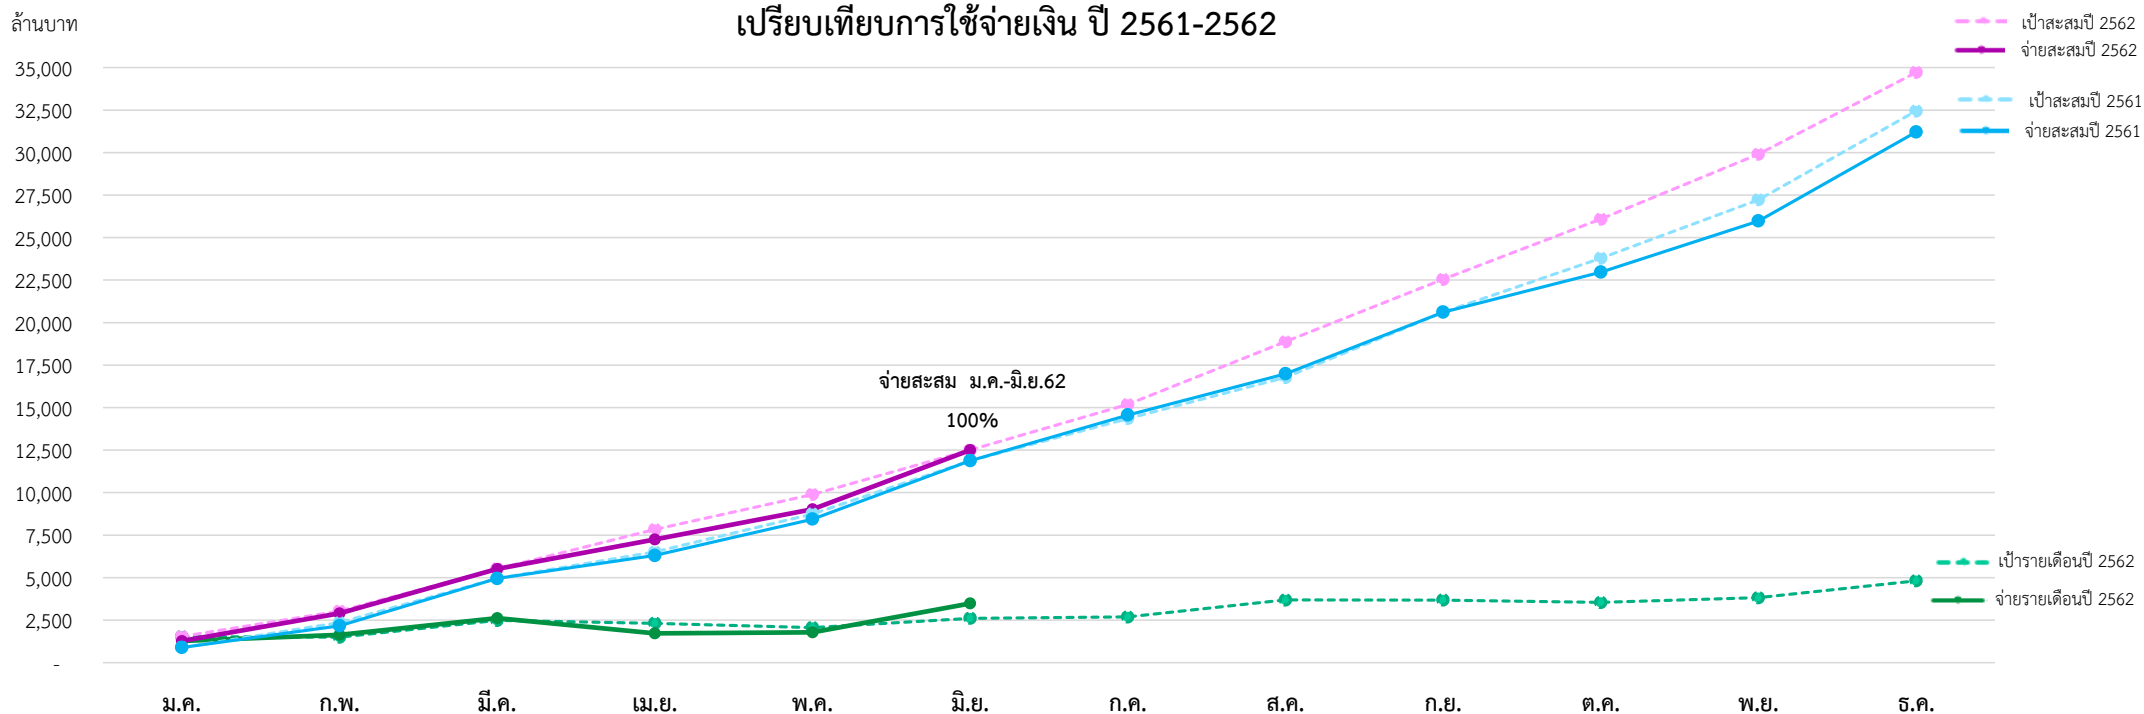

(ล้านบาท)

ปี		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ม.ค.-มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.
ปี 2561	- เป้าหมายการเบิกจ่าย	887	1,464	2,597	1,556	2,245	3,125	11,874	2,480	2,420	3,839	3,177	3,433	5,223	32,446
	- จ่ายจริง	889	1,277	2,782	1,352	2,137	3,437	11,874	2,688	2,427	3,624	2,355	3,008	5,233	31,209
	% จ่าย : เป้าหมายรายเดือน	100.2	87.2	107.1	86.9	95.2	110.0	100.0	108.4	100.3	94.4	74.1	87.6	100.2	96.2
ปี 2562	- เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,538	1,497	2,480	2,316	2,061	2,608	12,500	2,687	3,684	3,676	3,540	3,817	4,810	34,714
	- จ่ายจริง	1,273	1,630	2,612	1,725	1,781	3,479	12,500							12,500
	สูง / (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	(265)	133	132	(591)	(280)	871	-							22,214
	% จ่าย : เป้าหมายรายเดือน	82.7	108.9	105.3	74.5	86.4	133.4	100.0	-	-	-	-	-	-	36.0
	- เป้าหมายสะสม	1,538	3,035	5,515	7,831	9,892	12,500								
	- จ่ายจริงสะสม	1,273	2,903	5,515	7,240	9,021	12,500								
	% จ่าย : เป้าหมายสะสม	82.7	95.7	100.0	92.5	91.2	100.0								
	% จ่ายสะสม:เป้าหมายรวม	3.7	8.4	15.9	20.9	26.0	36.0								

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2562

ณ 30 มิถุนายน 2562

(ล้านบาท)											
แผนงาน/งาน/โครงการ	งบประมาณ ปี 2562	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2562	มกราคม - มิถุนายน 2562				%จ่ายจริงเทียบ กับเป้าหมาย 12 เดือน	มิถุนายน 2562			
			เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
				วงเงิน	%				วงเงิน	%	
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ											
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	18,467.791	6,351.923	1,945.692	2,418.409	124.3	472.717	38.1	528.539	672.976	127.3	144.437
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	43,077.280	8,366.342	2,554.790	3,484.560	136.4	929.770	41.6	865.942	1,247.303	144.0	381.361
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	61,545.071	14,718.265	4,500.482	5,902.969	131.2	1,402.487	40.1	1,394.481	1,920.279	137.7	525.798
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ											
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 1 (คพส.6.1)	15.290	3.167	3.167	2.773	87.6	(0.394)	87.6	-	-	-	-
2. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 2 (คพส.6.2)	5.000	4.593	4.593	4.593	100.0	-	100.0	-	4.593	-	4.593
3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.1 (คพส.8.1)	775.182	200.000	91.582	149.227	162.9	57.645	74.6	0.069	77.617	112,488.4	77.548
4. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.2 (คพส.8.2)	116.890	59.377	55.471	26.573	47.9	(28.898)	44.8	0.020	1.369	6,845.0	1.349
5. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 2 (คพฟ.2)	0.383	0.383	0.383	0.383	100.0	-	100.0	-	0.383	-	0.383
6. ก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 เควี(วงจรที่ 3)ไปยังเกาะสมุย (คกม.)	221.291	55.000	15.000	-	-	(15.000)	-	-	-	-	-
7. ก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ (เกาะมะพร้าว,นาคาใหญ่,พระทอง) (คคก.1)	35.619	12.615	12.615	0.669	5.3	(11.946)	5.3	8.629	0.669	7.8	(7.960)
8. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 (คพส.9.1)	1,072.380	480.000	247.308	366.712	148.3	119.404	76.4	43.739	92.215	210.8	48.476
9. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 (คพส.9.2)	1,479.323	350.000	184.290	241.629	131.1	57.339	69.0	41.185	34.217	83.1	(6.968)
10. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส.9.3)	2,910.096	1,400.000	752.920	753.120	100.0	0.200	53.8	30.436	133.196	437.6	102.760
11. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 (คพส.9.4)	1,318.901	317.400	65.655	122.837	187.1	57.182	38.7	3.463	53.229	1,537.1	49.766
12. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (คพฟ.3)	3,800.640	900.000	365.787	820.840	224.4	455.053	91.2	61.000	61.625	101.0	0.625
13. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.)	90.036	8.877	3.460	14.112	407.9	10.652	159.0	2.810	14.112	502.2	11.302
14. เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (คปศ.)	3,453.991	657.334	133.948	100.611	75.1	(33.337)	16.6	0.243	27.287	11,229.2	27.044
15. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (คอฟ.)	947.209	387.000	118.251	9.432	8.0	(108.819)	2.4	1.692	2.278	134.6	0.586
16. ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกลของ กฟภ. (คฟภ.)	120.304	3.988	3.988	32.729	820.7	28.741	820.7	0.131	32.729	24,984.0	32.598
17. พัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของ กฟภ. ที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน (คนล.)	802.956	4.675	0.661	0.703	106.4	0.042	15.0	-	0.001	-	0.001
18. ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คขก.2)	734.008	400.000	172.409	172.361	100.0	(0.048)	43.1	48.000	46.050	95.9	(1.950)
19. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	1,385.070	400.000	72.730	49.606	68.2	(23.124)	12.4	19.730	16.853	85.4	(2.877)
20. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	30,673.545	12,500.000	5,189.653	2,928.571	56.4	(2,261.082)	23.4	873.000	831.235	95.2	(41.765)
21. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)	227.604	115.086	73.593	29.713	40.4	(43.880)	25.8	2.510	20.250	806.8	17.740
22. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	4,801.902	710.000	133.078	283.098	212.7	150.020	39.9	4.000	26.193	654.8	22.193
23. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	1,864.637	350.000	90.476	123.885	136.9	33.409	35.4	30.776	38.911	126.4	8.135
24. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2)	2,988.584	500.000	208.638	359.347	172.2	150.709	71.9	41.706	43.459	104.2	1.753
25. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)	2,130.000	154.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.)	1,810.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คคป.)	221.000	22.600	-	3.544	-	3.544	-	-	0.014	-	0.014
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	64,001.841	19,996.095	7,999.656	6,597.068	82.5	(1,402.588)	33.0	1,213.139	1,558.485	128.5	345.346
รวมทั้งสิ้น	125,546.912	34,714.360	12,500.138	12,500.037	100.0	(0.101)	36.0	2,607.620	3,478.764	133.4	871.144

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2562

ณ 30 มิถุนายน 2562

(ล้านบาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2562	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2562	มกราคม - มิถุนายน 2562				%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน	มิถุนายน 2562				
				เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	
					วงเงิน	%				วงเงิน	%		
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ													
งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี													
1. หมวดสิ่งก่อสร้าง													
1.1 งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ	ผรฟ. กรฟ. , ผจท.	2,210.048	852.168	161.170	288.599	179.1	127.429	33.9	110.552	124.217	112.4	13.665	
1.2 งานเสริมประสิทธิภาพงานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง	ผบป. กบป./ ผจท.	37.780	19.230	3.510	-	-	(3.510)	-	3.510	-	-	(3.510)	
1.3 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อยและระบบจำหน่ายแรงต่ำ	ผบก.1 กจค.1(บก1)	138.049	89.550	15.820	8.135	51.4	(7.685)	9.1	-	0.020	#DIV/0!	0.020	
1.4 งานจัดหาอุปกรณ์สื่อสาร Cellular Router สำหรับ FRTU-SCB เพื่อทดแทนของเดิมในพื้นที่ คจพ.2	ผคฟ. ศสฟ.	1.405	1.405	1.405	0.065	4.6	(1.340)	4.6	1.405	0.065	4.6	(1.340)	
1.5 งานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์สั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 24 แห่ง	รผก.(ป) ศสฟ. (รท.สฟ.) 12 เขตดำเนินการ	46.046	10.826	10.826	10.703	98.9	(0.123)	98.9	9.490	9.192	96.9	(0.298)	
1.6 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควีได้โณสายส่งสถานีไฟฟ้านครราชสีมา 5 (ชั่วคราว) - สถานีไฟฟ้าห้วยทะเล จ. นครราชสีมา	ผวบ.(ธ3)	46.508	19.133	3.000	4.094	136.5	1.094	21.4	0.500	0.364	72.8	(0.136)	
1.7 งานก่อสร้าง Loop Line สายส่ง 115 เควี และเพิ่มเบย์ 115 เควีที่สถานีไฟฟ้ากลาง 2 เพื่อรองรับการจ่ายไฟของสนามบินนานาชาติภูเก็ต	ผชก.(กบ) กจค.2 (คพ.)	32.072	30.109	30.109	29.194	97.0	(0.915)	97.0	-	23.863	-	23.863	
1.8 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้	ผวร. กกค.	71.118	20.000	12.280	9.580	78.0	(2.700)	47.9	3.060	1.294	42.3	(1.766)	
1.9 งานก่อสร้างอาคารสื่อสารและสารสนเทศ กฟน.1	ผบป. กรส.(น.1)	85.539	66.105	7.344	0.734	10.0	(6.610)	1.1	2.203	-	-	(2.203)	
1.10 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราวคลองหนึ่ง และสถานีไฟฟ้าชั่วคราวท่ามะกา2	ผบป.(ก.1), ผวบ.(ก.3)	65.888	39.799	5.595	13.474	240.8	7.879	33.9	-	1.836	-	1.836	
1.11 งานขยายเขตการให้บริการไฟฟ้าในพื้นที่เกาะฮัง จ.กระบี่	ผวบ.(ต.2)	23.052	1.482	1.482	2.616	176.5	1.134	176.5	-	1.134	-	1.134	
1.12 งานก่อสร้างย้ายแนวสายส่งระบบ 115 เควี Incoming Line จำนวน 2 วงจรภายในพื้นที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต3 (กฟผ.)	ผชก.(กบ)	141.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.13 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงขนอม (กฟผ.) – สถานีไฟฟ้าขนอม (Switching 115 kV GIS) จ.นครศรีธรรมราช	ผคฟ. กจค.1 (คพ.)	269.370	40.000	20.000	-	-	(20.000)	-	-	-	-	-	
1.14 งานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้า	ผบก.1 ผจท. กวผ.	2,423.582	747.298	177.838	345.455	194.3	167.617	46.2	16.638	77.075	463.2	60.437	
1.15 งานจัดหาสายเคเบิลใยแก้วนำแสงประเภท Optical fiber Overhead Ground Wire (OPGW) สำหรับใช้งานตรวจซ่อม	ผสค. กบช.	8.534	8.534	2.486	-	-	(2.486)	-	-	-	-	-	
1.16 งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสำนักงาน กฟผ. (Solar PV Rooftop)	ผสอ. กสฟ.	3.393	2.393	2.393	-	-	(2.393)	-	-	-	-	-	
1.17 งานพัฒนาระบบโทรศัพท์ของ กฟผ.	ผสค. กบอ.	62.010	32.708	16.075	16.258	101.1	0.183	49.7	16.075	16.102	100.2	0.027	
1.18 งานก่อสร้างอาคารคลังพัสดุ กฟฟ.รังสิต	กฟฟ.รังสิต กฟท.1, กกค.(ก.1)	22.267	22.267	5.233	-	-	(5.233)	-	3.006	-	-	(3.006)	
1.19 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว โพธิ์แจ้ง, โคกกรวด2 และ นครราชสีมา7	ผบป.(ธ.3), ผวบ.(ก.3)	28.601	19.190	11.968	14.175	118.4	2.207	73.9	1.100	1.653	150.3	0.553	
1.20 งานก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี และ งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วง Cut & Turn (สถานีไฟฟ้าแรงสูงลำปาง 1(กฟผ.) - สถานีไฟฟ้าห้างฉัตร)- สถานีไฟฟ้าลำปาง 3	ผกร. กกฟ.1	163.970	163.970	-	14.492	-	14.492	8.8	-	13.355	-	13.355	
1.21 งานก่อสร้างระบบจำหน่าย 33 เควี ได้โณสายส่งช่วงแยกอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี - สฟ.ถลาง2 จ.ภูเก็ต	ผวบ.(ต.2)	30.078	30.078	11.952	6.663	55.7	(5.289)	22.2	4.049	1.831	45.2	(2.218)	
1.22 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 เควี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในการจ่ายไฟให้กับสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จ.เชียงใหม่	ผวบ.(น.1)	2.245	0.452	-	1.041	-	1.041	230.3	-	0.862	-	0.862	
1.23 งานปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงสามแยกเขื่อนแม่ปาย - สี่แยก อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่	ผวบ.(น.1)	33.807	32.321	6.378	5.436	85.2	(0.942)	16.8	4.300	0.947	22.0	(3.353)	

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2562

ณ 30 มิถุนายน 2562

(ล้านบาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2562	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2562	มกราคม - มิถุนายน 2562				%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน	มิถุนายน 2562			
				เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
					วงเงิน	%				วงเงิน	%	
1.24 งานเสริมความมั่นคงการจ่ายไฟฟ้าบริเวณสถานีไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	ผวบ.(น.1)	39.592	36.746	5.734	4.880	85.1	(0.854)	13.3	3.257	(0.696)	(21.4)	(3.953)
1.25 งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน การไฟฟ้าย่อย แบบ Knockdown (ระยะที่ 2)	ผวธ.(ก3)	16.842	13.621	13.621	12.057	88.5	(1.564)	88.5	1.635	-	-	(1.635)
1.26 งานจัดหารีโคสเซอร์เพื่อติดตั้งในไลน์แยกแทนฟิวส์พื้นที่ กฟต.2	ผวธ.(ก4) กบว.(ก4)	55.912	44.824	6.382	0.799	12.5	(5.583)	1.8	1.414	0.148	10.5	(1.266)
1.27 งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสำนักงานในพื้นที่การไฟฟ้าทั้ง 12 เขต	ผสอ. กสพ.	143.760	54.530	6.059	-	-	(6.059)	-	-	-	-	-
1.28 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเบรกเกอร์ระบบ 22 เควี ในสถานีไฟฟ้าเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดไม่คุ้มค่าซ่อมในพื้นที่ กฟภ.2	กบข.(ก.2) รผก.(ก3)	87.808	87.808	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.29 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราวบางเลน 2, ท่าม่วง 2, พนงปรือ และสทิงพระ	ผวบ.(ก.3), ผวบ.(ค.3)	110.050	17.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.30 งานจ้างปรับปรุงระบบป้องกัน Arc Protection สำหรับ Indoor Switchgear	รผก.(ป) ผบร. กอร.	94.399	37.759	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสิ่งก่อสร้าง		6,495.315	2,541.573	538.660	788.450	146.4	249.790	34.4	182.194	273.262	150.0	91.068
2. หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์												
2.1 งานจัดหามอเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย (ติดตั้งใหม่และชำรุด)	ผจท. , กมต. กพร.	2,259.819	1,100.274	164.905	255.167	154.7	90.262	23.2	63.003	77.606	123.2	14.603
2.2 งานจัดหาหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย	ผจท.	335.255	294.207	-	17.717	-	17.717	6.0	-	0.012	-	0.012
2.3 งานจัดซื้อรถยนต์ให้ กฟฟ. ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา	รผก.(วศ)	65.425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 งานจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังทดแทนชำรุดไม่คุ้มค่าซ่อม และที่มีอายุการใช้งานสูงเสี่ยงต่อการระเบิดชำรุด	ผบป. กบป./ผจท.	124.648	124.648	124.648	83.408	66.9	(41.240)	66.9	124.648	83.408	66.9	(41.240)
2.5 งานจัดหาหม้อแปลง AVR ทดแทนชำรุดไม่คุ้มค่าซ่อม และที่มีอายุการใช้งานสูงเสี่ยงต่อการระเบิดชำรุด	ผบป. กบป./ผจท.	25.880	25.880	25.880	25.880	100.0	-	100.0	25.880	25.880	100.0	-
2.6 งานจัดหามอเตอร์สำหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่และอุปกรณ์ประกอบ	ผบป. กพร. /ผจท.	121.343	116.678	32.893	7.169	21.8	(25.724)	6.1	32.893	3.237	9.8	(29.656)
2.7 งานจัดหาหม้อแปลง AVR ทดแทนที่เสื่อมสภาพเนื่องจากอายุการใช้งานสูงเสี่ยงต่อการระเบิดชำรุด (ปี 2561)	ผบป. กบป. / ผจท.	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8 งานปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโมบายล์ (ปี 2561)	ผบผ. กคบ.	7.500	7.500	5.000	-	-	(5.000)	-	2.500	-	-	(2.500)
2.9 งานเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (ปี 2561)	ผบป. กบป. /ผจท.	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10 งานจัดหามอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสับเปลี่ยนทดแทน มิเตอร์แบบจานในพื้นที่ กฟอ.สายบุรี, กฟส. และ กฟย. ในสังกัด	ผบป. กมต.	94.773	80.522	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11 งานเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังระบบ 115-22 เควีที่สถานีไฟฟ้าบ้านดุง2 จ.อุดรธานี	ผกส. กกส.	5.081	3.080	0.040	1.597	3,992.5	1.557	51.9	-	0.002	-	0.002
2.12 งานติดตั้งอุปกรณ์สำหรับรองรับการจ่ายไฟจากเครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้าภายในบริเวณพื้นที่คลังพัสดุ กฟอ.เบตง ผ่านระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (SCADA)	ผวธ.(ก4) กบว.(ก4)	9.748	7.663	7.663	0.185	2.4	(7.478)	2.4	5.531	0.185	3.3	(5.346)
2.13 งานจัดหา Digital Power Meter เพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบมิเตอร์ภายในสถานีไฟฟ้า	ผบป. กมต.	97.206	63.589	29.748	7.110	23.9	(22.638)	11.2	14.874	7.065	47.5	(7.809)
2.14 งานจัดหาเครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้าโมบายล์ ขนาด 500 กว. ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 20 ปี	ผบผ. กคบ. ผจท.	64.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15 งานจัดหาหม้อแปลง AVR ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานสูงมีความเสี่ยงต่อการชำรุด	ผบป. กบป.	158.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเครื่องจักรอุปกรณ์		3,549.398	1,824.041	390.777	398.233	101.9	7.456	21.8	269.329	197.395	73.3	(71.934)

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2562
ณ 30 มิถุนายน 2562

(ล้านบาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2562	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2562	มกราคม - มิถุนายน 2562				%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน	มิถุนายน 2562			
				เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
					วงเงิน	%				วงเงิน	%	
3. หมวดเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก												
3.1 งานจ้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ของอาคาร 3 กฟภ. สำนักงานใหญ่	ผสอ. กสพ.	18.221	18.221	18.221	18.221	100.0	-	100.0	-	18.221	-	18.221
3.2 งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตามแผนปรับปรุง IT Security ของ SCADA	คสพ.	16.850	13.850	13.850	1.112	8.0	(12.738)	8.0	-	1.112	#DIV/0!	1.112
3.3 งานดำเนินการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัย และบริหารจัดการอาคารสำหรับสถานีไฟฟ้าแบบ Unmanned Substation	คสพ.	329.981	323.303	61.289	19.560	31.9	(41.729)	6.1	1.850	19.560	1,057.3	17.710
3.4 งานจัดซื้อเครื่อง Oil Regeneration (ปี 2561)	ผมป. กมป.	27.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5 งานติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงานอาคารสำนักงาน กฟภ.	ผสอ. กสพ.	11.845	11.845	10.660	2.938	27.6	(7.722)	24.8	2.368	0.568	24.0	(1.800)
3.6 งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบป้องกันอัคคีภัยให้กับอาคาร LED สำนักงานใหญ่	ผสค. กบอ.	111.726	27.932	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7 งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (IP CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ให้สำนักงานใหญ่ และ กคท.3	ผสค. กบอ.	117.121	64.416	11.712	9.214	78.7	(2.498)	-	11.712	9.214	78.7	(2.498)
3.8 งานรื้อถอน และจัดหาพร้อมติดตั้งระบบ Video Wall ของศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า สำนักงานใหญ่	ผคพ. คสพ.	22.172	22.172	13.303	-	-	(13.303)	-	11.086	-	-	(11.086)
3.9 งานพัฒนา Mobile Application รองรับงานบริการและการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า สำหรับพนักงาน กฟภ.	ผพท. กพล.	5.300	0.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเครื่องใช้สำนักงาน/เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก		660.216	482.039	129.035	51.045	246.2	(77.990)	10.6	27.016	48.675	180.2	21.659
4. หมวดวิจัยและพัฒนา												
4.1 งานส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์/ส่งเสริม วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากล	ผวพ. กวน.	72.361	54.270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดวิจัยและพัฒนา		72.361	54.270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. หมวดลงทุนอื่นๆ												
5.1 เพิ่มทุนให้บริษัท ทีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	รผก.(ธ)	2,106.000	450.000	450.000	450.000	100.0	-	100.0	-	-	-	-
รวมหมวดลงทุนอื่นๆ		2,106.000	450.000	450.000	450.000	100.0	-	100.0	-	-	-	-
6. หมวดสำรองราคา	ผงป. กปง.	86.410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	ผงป. กปง.	5,498.091	1,000.000	437.220	730.681	167.1	293.461	73.1	50.000	153.644	307.3	103.644
รวมงบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี		18,467.791	6,351.923	1,945.692	2,418.409	124.3	472.717	38.1	528.539	672.976	127.3	144.437
งบลงทุนที่ว่าเป็นแผนระยะยาว												
8. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 2												
8.1 งานจัดหาที่ดินและปรับปรุงที่ดิน	รผก.(วศ) ผยธ.	12.360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2 งานจัดหาสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ	รผก.(วศ) ผยธ.	73.443	60.018	36.374	31.916	87.7	(4.458)	53.2	11.937	16.926	141.8	4.989
8.3 งานจัดหายานพาหนะ	รผก.(วศ) ผจท.	23.980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4 งานจัดหาครุภัณฑ์เครื่องมือ-เครื่องใช้	รผก.(วศ) ผจท. กฟข.	87.662	20.000	-	18.750	-	18.750	93.8	-	0.138	-	0.138
8.5 สำรองค่าปรับราคา		58.632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 2		256.077	80.018	36.374	50.666	139.3	14.292	63.3	11.937	17.064	143.0	5.127
9. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 3												
9.1 งานจัดหาที่ดินและปรับปรุงที่ดิน	รผก.(วศ) ผยธ.	68.067	-	-	0.490	-	0.490	-	-	0.490	-	0.490
9.2 งานจัดหาสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ	รผก.(วศ) ผยธ.	907.488	275.995	130.020	128.164	98.6	(1.856)	46.4	77.078	18.909	24.5	(58.169)
9.3 งานจัดหายานพาหนะ	รผก.(วศ) ผจท.	1,685.177	130.477	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4 งานจัดหาครุภัณฑ์เครื่องมือ-เครื่องใช้	รผก.(วศ) กฟข.	348.461	25.803	-	4.882	-	4.882	18.9	-	3.362	-	3.362
9.5 สำรองค่าปรับราคา		157.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 3		3,166.473	432.275	130.020	133.536	102.7	3.516	30.9	77.078	22.761	29.5	(54.317)

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2562

ณ 30 มิถุนายน 2562

(ล้านบาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2562	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2562	มกราคม - มิถุนายน 2562				%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน	มิถุนายน 2562			
				เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
					วงเงิน	%				วงเงิน	%	
10. แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 3	ผสท. ผวส. ผพท.	8,429.948	794.371	52.720	534.260	1,013.4	481.540	67.3	36.880	523.037	1,418.2	486.157
11. งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินสำหรับเมืองใหญ่	ผคท. กจค.2(คท)	163.813	13.800	-	13.879	-	13.879	100.6	-	13.815	-	13.815
12. งานจัดตั้งศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 2	ผพบ. ศผฟ.	111.012	30.232	13.403	1.357	10.1	(12.046)	4.5	2.287	0.002	0.1	(2.285)
13. แผนงานจัดหามิเตอร์สับเปลี่ยนตามวาระ	ผจท. กจน. กมต.	108.475	57.855	39.567	-	-	(39.567)	-	27.500	-	-	(27.500)
14. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ	ผสอ. กสท.	7.134	0.900	0.900	-	-	(0.900)	-	-	-	-	-
15. แผนงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ ในสถานีไฟฟ้า	ผบร. กบส.	85.761	41.700	36.900	29.085	78.8	(7.815)	69.7	-	21.135	#DIV/0!	21.135
16. แผนงานจัดการทรัพยากรสินระบบจำหน่ายไฟฟ้า	ผบร. กบร.	434.491	131.961	131.961	131.961	100.0	-	100.0	16.600	49.800	300.0	33.200
17. แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3	ผวร. กมร.	1,193.881	156.565	71.346	71.346	100.0	-	45.6	71.346	71.346	100.0	-
18. แผนงานปรับปรุงระบบป้องกันภายในสถานีไฟฟ้าของ กฟภ.	ผบร. กอร.	21.047	9.300	9.300	9.656	103.8	0.356	103.8	-	9.656	-	9.656
19. แผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนสำหรับการบริหารจัดการ ทรัพยากรสินระบบสายส่ง 115 kV	ผบร. กบร.	6.530	1.243	1.243	1.243	100.0	-	100.0	1.243	-	-	(1.243)
20. แผนงานปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร ส่วนที่ 1 (กฟภ.1)	ผสค. กอบ.	162.605	81.303	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. แผนงานเข้ายานพาหนะ ปี 2558-2563	รผก.(อ) / กนก.	282.179	157.860	86.019	87.311	101.5	1.292	55.3	14.084	14.303	101.6	0.219
22. แผนงานจัดซื้อมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ โครงการ AMR ระยะที่ 1 และระยะที่ 2	ผมป. กพร.	59.247	39.807	0.967	0.267	27.6	(0.700)	0.7	0.967	-	-	(0.967)
23. แผนงานปรับปรุงโรงไฟฟ้าดีเซล	ผบผ. กคบ.	51.863	35.802	22.145	17.466	78.9	(4.679)	48.8	6.639	4.468	67.3	(2.171)
24. แผนงานติดตั้ง Power Transformer Monitoring System	ผมป. กมป.	256.750	100.250	20.050	-	-	(20.050)	-	20.050	-	-	(20.050)
25. แผนงานจัดหาสายเคเบิลใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์สำรองคลังพัสดุ สำหรับงานตรวจสอบและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสงพร้อมค่าดำเนินการ	ผสค. กบข.	88.041	43.948	0.853	2.710	317.7	1.857	6.2	0.240	1.498	624.2	1.258
26. แผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่อสารและสายเคเบิลใยแก้วนำแสง รองรับสถานีไฟฟ้าที่มีแผนสร้างเสร็จในปี 2559 และสำนักงานการไฟฟ้า ที่ยังไม่มีระบบสื่อสาร	ผสค. กอบ.	94.614	38.736	29.052	17.017	58.6	(12.035)	43.9	9.684	5.185	53.5	(4.499)
27. แผนงานจัดหาและติดตั้งคอนสื่อบสาร	ผวส. กบท. 12 เขตดำเนินการ	25.046	16.391	-	5.035	-	5.035	30.7	-	3.909	-	3.909
28. แผนงานการรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface ทดแทนในเขตพื้นที่ คจฟ.1	ผคท. กอค.	143.934	74.309	8.378	1.780	21.2	(6.598)	2.4	0.244	1.142	468.0	0.898
29. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วย คอมพิวเตอร์ CSCS ระยะที่ 2	ผคท. กอค.	225.305	23.400	22.400	21.980	98.1	(0.420)	93.9	0.200	21.980	10,990.0	21.780
30. แผนงานเข้ายานพาหนะ ปี 2559 - 2564	รผก.(อ) กนก.	365.805	61.325	30.131	29.985	99.5	(0.146)	48.9	5.095	5.077	99.6	(0.018)
31. แผนงานปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่เทียน และโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ยะ ของ กฟภ.	ผบผ. กคบ.	14.728	6.398	6.198	3.343	53.9	(2.855)	52.3	3.360	2.248	66.9	(1.112)
32. แผนการจัดเช่าระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก ของ กฟภ. ระยะที่ 1	ผพท. กสส.	952.507	631.761	339.603	339.603	100.0	-	53.8	57.423	57.423	100.0	-
33. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ CSCS ระยะที่ 3	ผคท. กอค.	485.376	222.600	32.600	32.134	98.6	(0.466)	14.4	0.600	0.018	3.0	(0.582)
34. แผนงานจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (FRTU) เพื่อทดแทนของที่ ชำรุดตามโครงการ คจฟ.2	ผคท. กอค.	35.260	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. แผนงานรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์และระบบสื่อสารสำหรับ FRTU ตามแผนจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ของ กสทช.	ผคท. ศสฟ.	1,065.162	108.234	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. แผนงานพัฒนาและก่อสร้างศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery Center) ของ กฟภ.	ผสท. กอส.	388.200	64.917	-	-	-	-	-	-	-	-	-

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2562

ณ 30 มิถุนายน 2562

(ล้านบาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2562	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2562	มกราคม - มิถุนายน 2562				%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน	มิถุนายน 2562			
				เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
					วงเงิน	%				วงเงิน	%	
37. แผนงานปรับปรุงพัฒนาและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า	ผบร. กบส.	392.168	143.542	55.964	28.012	50.1	(27.952)	19.5	51.250	28.012	54.7	(23.238)
38. แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า	ผบร. กบส.	151.321	66.221	12.407	3.500	28.2	(8.907)	5.3	8.907	-	-	(8.907)
39. แผนงานปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ปาย และโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่เทย ของ กฟภ.	ผบผ. กคบ.	40.879	33.345	33.145	19.182	57.9	(13.963)	57.5	14.600	12.505	85.7	(2.095)
40. แผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนสำหรับการจัดการทรัพย์สินระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า	ผบร. กบร.	1,451.447	174.460	96.345	132.250	137.3	35.905	75.8	18.376	-	-	(18.376)
41. แผนงานเข้ายานพาหนะ ปี 2560 - 2565	รผก.(อ) กนก.	538.424	73.379	36.053	39.586	109.8	3.533	53.9	6.096	6.693	109.8	0.597
42. แผนงานจัดหามิเตอร์สับเปลี่ยนตามวาระ ระยะที่ 2	ผบป. กมต.	1,470.032	418.792	72.000	103.619	143.9	31.619	24.7	18.000	7.226	40.1	(10.774)
43. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4												
43.1 งานที่ดิน	รผก.(วศ) รผก.(ภ1-ภ4) ผยธ.	434.404	-	-	23.140	-	23.140	-	-	-	-	-
43.2 งานสิ่งก่อสร้าง	รผก.(วศ) รผก.(ภ1-ภ4) ผยธ. ผกร.	2,707.546	373.199	61.073	140.685	230.4	79.612	37.7	28.963	34.290	118.4	5.327
43.3 งานยานพาหนะ	รผก.(วศ) ผจท.	2,944.077	54.211	-	38.510	-	38.510	71.0	-	-	-	-
43.4 งานเครื่องมือ-เครื่องใช้	รผก.(วศ) ผจท. เขต	486.663	-	-	54.768	-	54.768	-	-	13.609	-	13.609
43.5 สำรองค่าปรับราคา		118.588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4		6,691.278	427.410	61.073	257.103	421.0	196.030	60.2	28.963	47.899	165.4	18.936
44. แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารโกลด์ฟาย ทาวเวอร์ (ปี 2560-2562)	ผยธ. กจก.	104.187	90.587	29.000	84.344	290.8	55.344	93.1	8.000	10.987	137.3	2.987
45. แผนงานจัดซื้อพร้อมติดตั้ง IP Access Network (MPLS Router) ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้	ผสค. กอบ.	479.848	417.824	240.379	290.950	121.0	50.571	69.6	188.529	55.441	29.4	(133.088)
46. แผนงานการบริหารจัดการด้านระบบรักษาความปลอดภัยของคลังพัสดุ	ผพต. 12 เขตดำเนินการ	330.314	162.969	89.329	67.652	75.7	(21.677)	41.5	1.573	13.680	869.7	12.107
47.แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	ผคท.	219.281	76.005	36.000	45.908	127.5	9.908	60.4	10.000	13.287	132.9	3.287
48. แผนงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง	ผบร. กบร.	3,184.021	449.272	51.500	515.262	1,000.5	463.762	114.7	17.000	73.639	433.2	56.639
49. แผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และสั่งการแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง	รผก.(ป) ศสพ. (รท.สพ.) 12 เขตดำเนินการ	499.438	350.425	327.587	161.191	49.2	(166.396)	46.0	36.222	82.909	228.9	46.687
50. แผนงานเข้าเครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้าบนพื้นที่การไฟฟ้าสาขาย่อยเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี	ผบผ. กคบ. กบช.(ต.2)	61.812	19.042	9.092	9.092	100.0	-	47.7	1.573	1.573	100.0	-
51. แผนงานเข้ายานพาหนะ ปี 2561 - 2566	รผก.(อ) กนก.	577.527	66.070	31.425	35.890	114.2	4.465	54.3	5.658	5.581	98.6	(0.077)
52. แผนงานก่อสร้างศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 3	ผพบ. ศผพ.	558.077	228.256	66.616	40.955	61.5	(25.661)	17.9	11.650	7.493	64.3	(4.157)
53. แผนงาน Renovate อุปกรณ์สถานีไฟฟ้าเสื่อมสภาพ	ผบร. กบส. 12 เขตดำเนินการ	534.910	187.615	27.500	4.640	16.9	(22.860)	2.5	27.500	4.640	16.9	(22.860)
54. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและระบบป้องกันสถานี่ไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC61850 เพื่อรองรับงานเปลี่ยนทดแทน Switchgear ระบบ 22 KV	ผคท. กอค.	115.964	17.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55. แผนงานขยายโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง	ผสค. กอบ.	254.800	127.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56. แผนงานปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุ ส่วนที่ 2 (พื้นที่ กฟภ.2 และ กฟภ.3)	ผสค. กอบ.	509.660	254.830	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57. แผนงานขยายโครงข่าย IP Network	ผสค. กอบ.	108.000	54.000	10.800	-	-	(10.800)	-	-	-	-	-
58. แผนงานจัดหาระบบสื่อสารแบบหลอมรวม	ผสค. กอบ.	272.744	93.432	46.861	46.238	98.7	(0.623)	49.5	46.169	0.064	0.1	(46.105)

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2562

ณ 30 มิถุนายน 2562

(ล้านบาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2562	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2562	มกราคม - มิถุนายน 2562				%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน	มิถุนายน 2562			
				เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
					วงเงิน	%				วงเงิน	%	
59. แผนงานปรับปรุงระบบป้องกันให้รองรับเทคโนโลยีในอนาคต	ผบร.กพร.กฟภ.2 กบข.(ก.2)	281.536	158.122	50.843	34.633	68.1	(16.210)	21.9	-	15.705	-	15.705
60. แผนงานขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านในโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ผวบ.(น.1)	108.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61. แผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ.	ผบร. กพร.	1,041.128	380.253	-	22.031	-	22.031	5.8	-	10.919	-	10.919
62. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ กฟภ.	ผสท.	1,081.686	199.961	43.928	-	-	(43.928)	-	0.490	-	-	(0.490)
63. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคม ของ กฟภ.	ผสศ.	813.877	102.071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการผ่านโทรศัพท์ Smart Phone โดย Application : PEA Smart Plus Version 2.0	ผฟท.	25.780	8.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65. แผนงานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร 1 และก่อสร้างทางเชื่อมอาคารสำนักงานใหญ่ กฟภ. เพื่อขอรับการประเมินและการรับรองตามมาตรฐาน LEED	ผยธ. กจก.	547.924	3.324	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66. แผนงานพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ระยะที่ 1	ผวร. กผอ.	390.000	39.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67. แผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน	ผคท.	740.000	8.500	-	1.589	-	1.589	18.7	-	1.567	-	1.567
68. แผนงานเข้ายานพาหนะปี 2562-2567	กนก.รผก.(อ)	690.541	44.184	4.813	5.313	110.4	0.500	12.0	1.929	1.616	83.8	(0.313)
69. แผนงานขยายผลระบบบริหารพัสดุคงคลังโดยใช้เทคโนโลยี RFID และ Barcode เพื่อพัฒนาคงคลังพัสดุให้เป็นแบบ Modern Warehouse	ผพด.รผก.(อ)	129.412	12.940	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแผนงานระยะยาว		43,077.280	8,366.342	2,554.790	3,484.560	136.4	929.770	41.6	865.942	1,247.303	144.0	381.361
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ		61,545.071	14,718.265	4,500.482	5,902.969	131.2	1,402.487	40.1	1,394.481	1,920.279	137.7	525.798

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2562

ณ 30 มิถุนายน 2562

(ล้านบาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2562	เป้าหมายเบิกจ่าย ปี 2562	มกราคม - มิถุนายน 2562				%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน	มิถุนายน 2562			
				เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
					วงเงิน	%				วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ												
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 1	อฝ.บก. 1	15.290	3.167	3.167	2.773	87.6	(0.394)	87.6	-	-	-	-
2. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 2	อฝ.บก. 2	5.000	4.593	4.593	4.593	-	-	100.0	-	4.593	-	4.593
3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.1	อฝ.บก. 2	775.182	200.000	91.582	149.227	162.9	57.645	74.6	0.069	77.617	112,488.4	77.548
4. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.2	อฝ.บก. 1	116.890	59.377	55.471	26.573	47.9	(28.898)	44.8	0.020	1.369	6,845.0	1.349
5. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 2	อฝ.บก. 2	0.383	0.383	0.383	0.383	100.0	-	100.0	-	0.383	-	0.383
6. ก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 เควี(วงจรที่ 3)ไปยังเกาะสมุย	ผชก.(กบ)	221.291	55.000	15.000	-	-	(15.000)	-	-	-	-	-
7. ก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ (เกาะมะพร้าว,นาคาใหญ่,พระทอง)	ผชก.(กบ)	35.619	12.615	12.615	0.669	5.3	(11.946)	5.3	8.629	0.669	7.8	(7.960)
8. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	อฝ.บก. 1	1,072.380	480.000	247.308	366.712	148.3	119.404	76.4	43.739	92.215	210.8	48.476
9. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	อฝ.บก. 2	1,479.323	350.000	184.290	241.629	131.1	57.339	69.0	41.185	34.217	83.1	(6.968)
10. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	ผชก.(กบ)	2,910.096	1,400.000	752.920	753.120	100.0	0.200	53.8	30.436	133.196	437.6	102.760
11. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	อฝ.คพ.	1,318.901	317.400	65.655	122.837	187.1	57.182	38.7	3.463	53.229	1,537.1	49.766
12. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3	อฝ.บก.2	3,800.640	900.000	365.787	820.840	224.4	455.053	91.2	61.000	61.625	101.0	0.625
13. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่	รผก.(ว) กคก.	90.036	8.877	3.460	14.112	407.9	10.652	159.0	2.810	14.112	502.2	11.302
14. เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ - รผก.(ป) - รผก.(ทส)	รผก.(ป) ผคพ. ผสท., ผสค., กอส., กอบ., กบข.	2,855.264 598.727	511.655 145.679	43.468 90.480	30.463 70.148	70.1 77.5	(13.005) (20.332)	6.0 48.2	0.243 -	22.021 5.266	9,062.1 -	21.778 5.266
รวม		3,453.991	657.334	133.948	100.611	75.1	(33.337)	16.6	0.243	27.287	11,229.2	27.044
15. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี	รผก.(ว)	947.209	387.000	118.251	9.432	8.0	(108.819)	2.4	1.692	2.278	134.6	0.586
16. ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกลของ กฟภ.	รผก.(ว) กคก.	120.304	3.988	3.988	32.729	820.7	28.741	820.7	0.131	32.729	24,984.0	32.598
17. พัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของ กฟภ. ที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำ ของกรมชลประทาน	อฝ.คพ.	802.956	4.675	0.661	0.703	106.4	0.042	15.0	-	0.001	-	0.001
18. ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2	รผก.(ว) กคก.	734.008	400.000	172.409	172.361	100.0	(0.048)	43.1	48.000	46.050	95.9	(1.950)
19. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	อฝ.บก. 1	1,385.070	400.000	72.730	49.606	68.2	(23.124)	12.4	19.730	16.853	85.4	(2.877)
20. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	รผก.(กบ)	30,673.545	12,500.000	5,189.653	2,928.571	56.4	(2,261.082)	23.4	873.000	831.235	95.2	(41.765)
21. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)	อฝ.วร.	227.604	115.086	73.593	29.713	40.4	(43.880)	25.8	2.510	20.250	806.8	17.740
22. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	ผชก.(กบ)	4,801.902	710.000	133.078	283.098	212.7	150.020	39.9	4.000	26.193	654.8	22.193
23. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	อฝ.บก.1	1,864.637	350.000	90.476	123.885	136.9	33.409	35.4	30.776	38.911	126.4	8.135
24. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2)	รผก.(ว) กคก.	2,988.584	500.000	208.638	359.347	172.2	150.709	71.9	41.706	43.459	104.2	1.753
25. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยัง เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)	ผชก.(กบ) กจค.1(คพ)	2,130.000	154.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.)	รผก.(ป) กพร.	1,810.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คคป.)	ผคพ. กจค.2(คพ)	221.000	22.600	-	3.544	-	3.544	15.7	-	0.014	-	0.014
รวมงานโครงการ		64,001.841	19,996.095	7,999.656	6,597.068	82.5	(1,402.588)	33.0	1,213.139	1,558.485	128.5	345.346
รวมทั้งสิ้น		125,546.912	34,714.360	12,500.138	12,500.037	100.0	(0.101)	36.0	2,607.620	3,478.764	133.4	871.144
