



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักงานการเงินและทรัพย์สิน

ที่ ทส ๑๑๐๔/ ๕๕๕

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

เรียน	☒ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน	☒ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
	☒ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย	☒ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
	☒ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ	☒ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา
	☒ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ	☒ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา
	☒ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล	☒ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี
	☒ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์	☒ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น
	☒ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	☒ ผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
	☒ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ	☒ ผู้จัดการโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่
	☒ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	

ตามที่ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย อนุมัติให้สำนักงานการเงินและทรัพย์สิน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบ สำหรับการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานในการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำนักงานการเงินและทรัพย์สิน จึงขอรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบตามระเบียบการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เพื่อให้คณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณฯ รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานตามระเบียบวาระการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ในท พอ. สทพ
เพื่อโปรดพิจารณา ลงนามลงนามใน พ.ร.บ. ๒๐๖๖
ไว้เป็นหลักฐานขอรับทราบ
(นางนันทวัน ค่ายมั่น)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน

(นางพิมาวรรณ อนนท์)
ผู้อำนวยการสำนักงานการเงินและทรัพย์สิน
คณะทำงานและเลขานุการ

ทราบ/แจ้ง หน.ฝึกอบรม และ หน.วางแผน ทราบ
และใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงาน

(นางสาวนันทนิญ กุลเจริญ)

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักการเงินและทรัพย์สิน ฝ่ายงบประมาณ

ที่ ทส ๑๑๐๔.๓/ ๖๖

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2565

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน

ตามที่ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย อนุมัติให้สำนักการเงินและทรัพย์สิน ปรับเปลี่ยน รูปแบบการประชุมเป็นรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบ สำหรับการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานในการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำนักการเงินและทรัพย์สิน จึงขอรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบตามระเบียบการประชุม คณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เพื่อให้คณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณฯ รับทราบความคืบหน้า ในการดำเนินงานตามระเบียบวาระการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอโปรดลงนามในหนังสือตามที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวนริศรา แก้วทิพย์รัตน์)

เจ้าหน้าที่งบประมาณ

- นส. ๒๖๐ ร๖ ๗๐.๐๗๖

๒๕/๒/๖๕



การประชุม

คณะกรรมการด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของ
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

การประชุมเป็นรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานพร้อม
ภาพประกอบ

ระเบียบวาระการประชุม
คณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ (สำนักกฎหมาย/สำนักการเงินและทรัพย์สิน)
๓.๒ ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่
(สวนสัตว์แห่งใหม่)
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนเดือนมกราคม ๒๕๖๕
๔.๓ รายงานผลการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ (สวนสัตว์เชียงใหม่)
๔.๔ รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

เอกสารประกอบการประชุม
คณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานกรรมการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๔/๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานผลการดำเนินงานฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

สำนักการเงินและทรัพย์สิน ได้ส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบตามระเบียบการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ให้คณะทำงานฯ เพื่อรับทราบ ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๔/๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยสำนัก สถาบัน สวนสัตว์ และโครงการ ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว และ รายงานผลการดำเนินงาน กลับให้สำนักการเงินและทรัพย์สิน ทาง e-mail และทาง line เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีรายการที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ วงเงินทั้งสิ้น ๗๔.๒๒๑๖ ล้านบาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวถูกพับไปแล้ว	มติที่ประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีสัญญาซื้อขายสัตว์ และงานก่อสร้างปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒ ดำเนินการเก็บรวบรวมเอกสาร กระบวนของงาน และรายละเอียดที่สำคัญของงานทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากรณีมีปัญหาในอนาคต	
ส่วนกลาง ๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ สัญญาที่ ๒๔/๒๕๖๑ วงเงินตามสัญญา ๑๒.๔๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๐๔๐ ล้านบาท คงเหลือ ๘.๓๙๐ ล้านบาท ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ สัญญาที่ ๒๘/๒๕๖๒ วงเงินตามสัญญา ๑๓.๖๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๙๖๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑๑.๗๓๐ ล้านบาท	๑. สำนักการเงินและทรัพย์สิน ดำเนินการทำหนังสือแจ้งบริษัทฯ ให้เร่งรัดดำเนินการตามสัญญา ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๕๔๓ และ ทส ๑๑๐๑/๕๔๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ของสัญญาที่ ๒๔/๒๕๖๑ และสัญญาที่ ๒๘/๒๕๖๒ ๒. บริษัทฯ ตอบกลับมาให้องค์การสวนสัตว์ฯ มอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นผู้นำสัตว์เข้าเนื่องจากเป็นสัตว์ตาม CITES ตามหนังสือเลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๓. สำนักการเงินและทรัพย์สิน ได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องนำเสนอสำนักกฎหมายเพื่อพิจารณา ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๔/๓๓๙๕ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๔. สำนักกฎหมายอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณา ๕. สำนักการเงินและทรัพย์สิน อยู่ระหว่างการติดตามความคืบหน้าในการพิจารณาของสำนักกฎหมาย ๖. สำนักกฎหมายได้จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้บริษัทฯ เพื่อดำเนินการด้านเอกสารการนำเข้าสัตว์จากต่างประเทศต่อกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามที่ร้องขอแล้ว และให้ สงท.แจ้งคณะกรรมการตรวจรับสัตว์ ปี ๒๕๖๒ พิจารณาเสนอความเห็นตามองค์ประกอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปเสนอ ผอ.อสส.ทราบและสั่งการต่อไป ตามเอกสารที่ ทส ๑๑๐๖/๙๑๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ๗. สำนักการเงินและทรัพย์สินมีหนังสือแจ้งคณะกรรมการตรวจรับ ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๔/๕๑๔๙ ลว.๒๗ ก.ย.๒๕๖๔ พิจารณาเสนอความเห็นตามองค์ประกอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปเสนอ ผอ.อสส ๘. คณะกรรมการตรวจรับเสนอความเห็นต่อ ผอ.อสส. ว่าบริษัทฯ เข้าหลักเกณฑ์ผู้ขายส่งมอบสัตว์ล่าช้าเห็นควรให้มีหนังสือแจ้งสิทธิการปรับและเร่งรัดการส่งสัตว์ให้ผู้ขายทราบ โดย ผอ.อสส.ให้ทางคณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตามหนังสือที่ ทส.๑๑๐๗/๑๗๐๗ ลงวันที่ ๖ ต.ค.๒๕๖๔	๑. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีสัญญาซื้อขายสัตว์ปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อความชัดเจนในการดำเนินงาน ๒. มอบให้สำนักกฎหมายเข้ามาดูรายละเอียดและให้สรุปประเด็นปัญหาและการดำเนินงานให้ชัดเจน แล้วนำเข้าคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อพิจารณา

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	๙. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย มีหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๑๔๓๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ไปยังกรมปศุสัตว์ เพื่อสอบถามการยกเลิกประกาศโรคปากเท้าเปื่อยจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE ในพื้นที่สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในการนำออกจากประเทศต้นทางเพื่อนำกลับมาส่งยังประเทศปลายทาง (ประเทศไทย) ว่าขณะนี้ สามารถดำเนินการได้แล้วหรือไม่ ตามที่บริษัท คาสชิบา (ประเทศไทย) จำกัด ได้อ้างถึงประกาศดังกล่าวเพื่อเป็นการยืนยันจากกรมปศุสัตว์ ๑๐. ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ ๐๖๒๑/๑๖๕ ลว.๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ แจ้งมายังองค์การสวนสัตว์ว่า ปัจจุบันยังมีประกาศชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์กบคู่หรือซากสัตว์กบคู่จากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นเมื่อ ๒๓ ธ.ค.๖๔ ซึ่งมีผลบังคับเป็นเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หากมีการระบาดและยังไม่ได้รับรองสถานะการปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยจากองค์การสุขภาพโลก OIE จะมีการประกาศชะลอการนำเข้าต่อไป	
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ๑. ปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์สัตว์ให้เป็นศูนย์พัฒนาเพื่อการวิจัยและอนุรักษ์สัตว์ป่าระดับมาตรฐานภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว - วงเงิน ๒.๔๘๔ ล้านบาท - เบิกจ่ายแล้ว ๑.๓๕๑ ล้านบาท - คงเหลือ ๑.๑๓๓ ล้านบาท โดยกิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ ๖๘๙	๑. สวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีหนังสือแจ้งบริษัท เพื่อขอบอกเลิกสัญญาจ้างตามหนังสือที่ ทส ๑๑๑๒/๑๑๙๖ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๒. บริษัทฯ ขออุทธรณ์ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างฯ ตามหนังสือที่ ๕๓/๒๕๖๒.๒๐๒๑๐๔.๐๑ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ โดยผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ฯ พิจารณาให้ยืนยันการบอกเลิกสัญญา ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๕๙๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๓. สำนักการเงินและทรัพย์สิน ได้แจ้งให้บริษัทฯ รับทราบแต่หนังสือตีกลับ จึงได้จัดส่งอีกครั้งในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ตอบรับและทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ๔. สำนักการเงินและทรัพย์สิน ได้ส่งสำเนาหนังสือและเอกสารต่าง ๆ ให้สำนักกฎหมาย และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เพื่อรับทราบการดำเนินการดังกล่าวด้วยแล้ว ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๔/๓๒๗๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๕. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์สัตว์ฯ โดยใช้จากเงินประกันสัญญาของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ ๖. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว นำส่งเอกสารประกอบการแจ้งเป็นผู้ทำงานของกิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ ๖๘๙ มายังองค์การสวนสัตว์ ฯ เพื่อจัดส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาเป็นผู้ทำงาน ตามหนังสือเลขที่ ทส ๑๑๑๒/๘๙๙ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔	๑. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไปควรเช็คประวัติบริษัท ผู้รับจ้างและสถานะของบริษัท ๒. กรณีได้รับรับจ้างมาแล้ว คณะกรรมการควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานควรดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่แบ่งตามสัญญา ๓. หากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา ควรเชิญผู้รับจ้างมาร่วมประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกัน และควรมีรายงานการประชุมเพื่อให้รับรู้ทั้ง ๒ ฝ่าย ๔. หากยังดำเนินการล่าช้า สวนสัตว์ต้องดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยออกหนังสือเป็นหลักฐาน ทุกครั้ง

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	๗. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นำส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงการคลัง แจ้งให้ กิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ ๖๘๙ เป็นผู้ทำงานตามหนังสือเลขที่ ทส ๑๑๐๑/๑๐๗๖ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ๘. ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลัง ยังไม่มีหนังสือตอบกลับแจ้งให้เป็นผู้ทำงาน	
๒. ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆภายใต้โครงการความร่วมมือการเพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆร่วมกับภาชีเพื่อรองรับและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร - วงเงิน ๑๘.๘๙๒ ล้านบาท - เบิกจ่ายแล้ว ๔.๗๒๓ ล้านบาท - คงเหลือ ๑๔.๑๖๙ ล้านบาท โดยกิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ ๖๘๙	๑. สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนำส่งรายงานการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์ฯ ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๑๒/๔๕๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒. บริษัทฯ ทำหนังสือขออุทธรณ์การบอกเลิกสัญญา และขอสงวนสิทธิ์หลักประกันสัญญา ตามหนังสือเลขที่ ๓๘/๒๕๖๒.๒๐๒๑๔.๐๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๓. สำนักการเงินและทรัพย์สิน มีหนังสือที่ ทส ๑๑๐๔/๓๑๔๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้สำนักกฎหมายพิจารณาการขออุทธรณ์การบอกเลิกสัญญาและขอสงวนสิทธิ์หลักประกันสัญญา ๔. สำนักกฎหมายพิจารณา ให้ยืนยันการริบหลักประกันสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆ โดยองค์การสวนสัตว์ฯ ได้แจ้งให้บริษัทฯ รับทราบการยืนยันการริบหลักประกันตามหนังสือองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ที่ ทส ๑๑๐๑/๗๗๒ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๕. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้รับหลักประกันสัญญาตาม ระเบียบฯ ซึ่งทางธนาคารกรุงไทย ได้นำส่งเงินหลักประกันสัญญาให้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเรียบร้อยแล้ว ๖. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว นำส่งเอกสารประกอบการแจ้งเป็นผู้ทำงานของ กิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ ๖๘๙ มายังองค์การสวนสัตว์ ฯ เพื่อจัดส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาเป็นผู้ทำงาน ตามหนังสือเลขที่ ๑๑๑๒/๘๙๗ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๗. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นำส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงการคลัง แจ้งให้ กิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ ๖๘๙ เป็นผู้ทำงานตามหนังสือเลขที่ ทส ๑๑๐๑/๑๐๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ๘. ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลัง ยังไม่มีหนังสือตอบกลับแจ้งให้เป็นผู้ทำงาน	๑. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไปควรเช็คประวัติบริษัทผู้รับจ้างและสถานะของบริษัท ๒. กรณีได้รับรับจ้างมาแล้ว คณะกรรมการควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานควรดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่แบ่งตามสัญญา ๓. หากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา ควรเชิญผู้รับจ้างมาร่วมประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกันและควรมีรายงานการประชุมเพื่อให้รับรู้ทั้ง ๒ ฝ่าย ๔. หากยังดำเนินการล่าช้า สวนสัตว์ต้องดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยออกหนังสือเป็นหลักฐานทุกครั้ง

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
สวนสัตว์สงขลา ๑. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณน้ำตกสวนตุล ภายในสวนสัตว์สงขลา - วงเงิน ๓๘.๐๐๐๐ ล้านบาท - โดยบริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด	๑. องค์การสวนสัตว์ฯ ทำหนังสือแจ้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์และบอกเลิกสัญญา ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๑๓ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ๒. บริษัทฯ ได้ขอคัดค้านการบอกเลิกสัญญา ตามหนังสือเลขที่ CHR ๒๕๖๓/๐๑๐๒๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ๓. องค์การสวนสัตว์ฯ ได้ให้บริษัทชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๑๑๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๔. บริษัทฯ ทำหนังสือชี้แจงกลับบองค์การฯ ตามหนังสือเลขที่ CHR ๒๕๖๔/๐๒๐๕๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๕. องค์การสวนสัตว์ฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงได้ทำหนังสือแจ้งกระทรวงการคลัง ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด เป็นผู้ทำงาน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากการกระทรวงการคลัง ๖. บริษัทฯ กรุงไทย จำกัด ชำระเงินตามสัญญาค้ำประกันของ บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด ฐานะลูกหนี้ร่วมให้สวนสัตว์สงขลาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คจำนวน ๑,๙๔๐,๐๐๐ บาท ๗. องค์การสวนสัตว์ฯ มีหนังสือที่ ทส ๑๐๑๑/๑๕๐๘ ลว. ๒๘ ธ.ค.๒๕๖๔ สอบถามผลการพิจารณา ให้บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด เป็นผู้ทำงานซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลังยังไม่มีหนังสือตอบกลับแจ้งให้เป็นผู้ทำงาน	๑. ควรมีการสำรวจสภาพพื้นที่ภายในสวนสัตว์ ก่อนการออกแบบและเสนอของบประมาณ ๒. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไปควรเช็คประวัติบริษัทผู้รับจ้างและสถานะของบริษัท ๓. กรณีได้รับรับจ้างมาแล้ว คณะกรรมการควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานควรดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่แบ่งตามสัญญา ๔. หากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา ควรเชิญผู้รับจ้างมาร่วมประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกันและควรมีรายงานการประชุมเพื่อให้รับรู้ทั้ง ๒ ฝ่าย ๕. หากยังดำเนินการล่าช้า สวนสัตว์ต้องดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยออกหนังสือเป็นหลักฐานทุกครั้ง

๓.๒ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ มีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๑. ปรับปรุงอาคารสำนักงานสนาม งบประมาณ ๑.๒๐ ล้านบาท	ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว	
๒. ก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ และตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบพร้อมก่อสร้างเรือนเพาะขยายพันธุ์ งบประมาณ ๕.๘๕ ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว	
๓. ก่อสร้างถนนชั่วคราวแล้วรอบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ งบประมาณ ๘.๖๖ ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว	
๔. ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดปทุมธานี ในการสร้างสะพานบริเวณทางเข้าพื้นที่สวนสัตว์แห่งใหม่	อยู่ระหว่างดำเนินการได้ร้อยละ ๙๖ คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	
๕. ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๖.๘๒๕๑ ลบ. จำนวน ๖ งวดงาน - งบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๖.๐๐๐๐ ลบ. - งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๐.๘๒๕๑ ลบ.	๑. เบิกจ่ายงวดที่ ๑-๓ แล้ว จำนวน ๔๔.๐๔๗๕ ลบ. โดยใช้จาก งบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๖.๐๐๐๐ ลบ. งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๘.๐๔๗๕ ลบ. ๒. งานงวดที่ ๔ อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน จากคณะกรรมการ	เร่งรัดให้คณะกรรมการทุกชุดตรวจสอบ และสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ จังหวัดปทุมธานี

๑. ปรับปรุงอาคารสำนักงานสนาม งบประมาณ ๑.๒๐ ล้านบาท (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)



๒. ก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ และตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบพร้อมก่อสร้างเรือนเพาะขยายพันธุ์ งบประมาณ ๕.๘๕ ล้านบาท (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)



๓. งานก่อสร้างถนนชั่วคราวและรั้วรอบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

การดำเนินการ

บริษัท คัพเวอร์เทค จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ก่อสร้างถนนชั่วคราวและรั้วรอบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ เรียบร้อยแล้ว งานรั้วชั่วคราวระยะ ๓,๕๐๐ เมตร วงเงินรวมทั้งสิ้น ๘,๖๖๐,๐๐๐ บาท

ด้านทิศเหนือ



ด้านทิศใต้



ด้านทิศตะวันออก



ด้านทิศตะวันตก



๔. งานที่ได้รับการสนับสนุนจาก จ.ปทุมธานี

- งานก่อสร้างสะพานทางข้าม ดำเนินการได้ร้อยละ ๙๖



ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่องเดิม

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๘๐๖.๓๑๓๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

- ๑. งบอุดหนุน จำนวน ๔๙๑.๖๗๐๓ ล้านบาท
- ๒. งบลงทุน จำนวน ๓๑๔.๖๔๒๗ ล้านบาท

การดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ได้เบิกจ่ายงบอุดหนุนรัฐบาล ได้ครบทุกรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับงบลงทุน เบิกจ่ายจำนวน ๑๔๘.๔๑๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๑๗ และได้กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑๖๖.๒๓๐๕ ล้านบาท ประกอบด้วย

- ๑. ครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือรายการค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ จำนวน ๕.๑๐๖๐ ล้านบาท
- ๒. สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ ประกอบด้วย
 - ๒.๑ ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ จำนวน ๑๐๒.๗๗๗๖ ล้านบาท
 - ๒.๒ ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมี ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ จำนวน ๑๑.๔๑๒๕ ล้านบาท
 - ๒.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์และอัตลักษณ์บริเวณส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน ๙.๓๑๕๖ ล้านบาท
 - ๒.๔ ปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center) ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน ๖.๒๕๐๐ ล้านบาท
 - ๒.๕ ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัสและส่วนแสดงจะเข้ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน ๑๗.๓๖๘๘ ล้านบาท
 - ๒.๖ ก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวิน ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน ๓.๖๕๐๐ ล้านบาท
 - ๒.๗ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน ๑๐.๓๕๐๐ ล้านบาท

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)


ข้อเสนอเพื่อทราบ

เพื่อโปรดทราบ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 2564

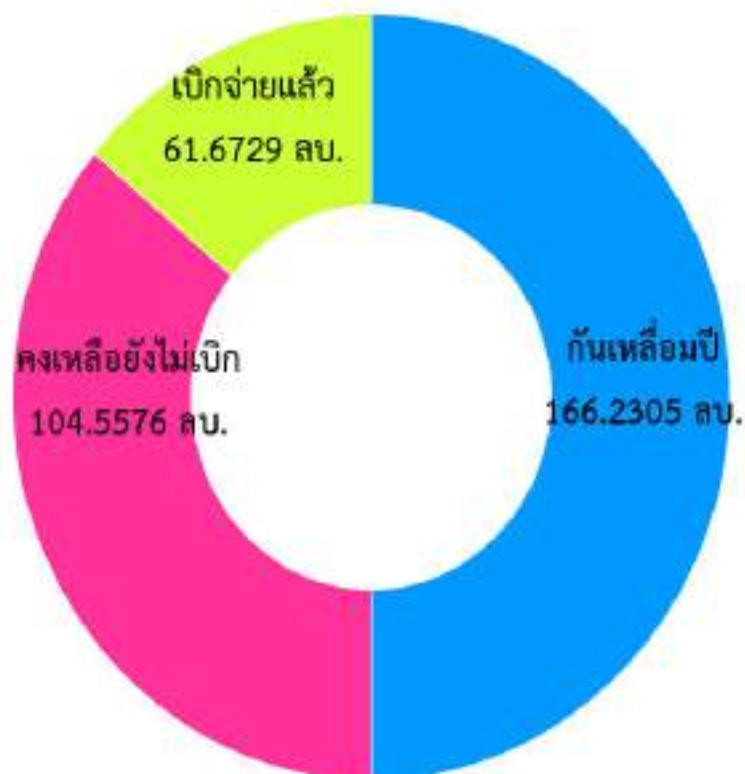

ข้อมูล ณ 23 ก.พ.65

ส่วนกลาง 1. ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ สัญญาสิ้นสุด 24 พ.ค. 2565 มี 6 งวดงาน
เบิกจ่ายแล้ว 1-3 งวดงาน จำนวน 8.0475 ลบ.
กันเหลื่อมปีงวดที่ 4-6 เป็นเงินจำนวน 102.7776 ลบ.

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ สัญญาสิ้นสุด 16 ธ.ค.2564 กันเหลื่อมปี จำนวน 5.1060 ลบ.
เบิกจ่ายถึงเดือน ม.ค.2565 จำนวน 3.326 ลบ คงเหลือ 1.7800 ลบ.

สวนสัตว์อุบลราชธานี

1. ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปแตมัสและส่วนแสดงจระเข้ สัญญาสิ้นสุด 23 ธ.ค.64 จำนวน 5 งวด
เบิกจ่ายแล้ว 1-2 งวดงาน กันเหลื่อมปีงวดที่ 3-5 เป็นเงินจำนวน 17.3688 ลบ.
ในปี 2565 เบิกจ่ายงวดที่ 3-4 จำนวน 13.8950 ลบ. งวดงานที่ 5 สิ้นท้าย จำนวน 3.4738 ลบ.
ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 23 ก.พ.2565

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

เลขที่สัญญาจ้าง	๑๑/๒๕๖๔ วงเงิน ๑๔๖,๘๒๕,๑๐๐ บาท งบปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๐,๘๒๕,๑๐๐ บาท
ระยะเวลาดำเนินการ	๕๔๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ผู้รับจ้าง	บริษัท ดีไซน์+วิเวลลอป จำกัด

การดำเนินงาน

๑. งานงวดที่ ๑ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีการเบิกจ่ายแล้วเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๗,๓๔๑,๒๐๐ บาท

๑.๑ แบบแนวความคิดหลัก (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A ๑ จำนวน ๓ ชุด
๑.๒ แบบแนวความคิดหลัก (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A ๑ จำนวน ๑๐ ชุด
๑.๓ แบบแนวความคิดหลัก (ปิดบนกระดาษแข็ง)	ขนาด A ๑ จำนวน ๑ ชุด
๑.๔ แบบแนวความคิดหลัก (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A ๓ จำนวน ๓ ชุด
๑.๕ แบบแนวความคิดหลัก (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A ๓ จำนวน ๑๐ ชุด
๑.๖ รายงานเบื้องต้น (Inception Report) (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A ๓ จำนวน ๓ ชุด
๑.๗ รายงานเบื้องต้น (Inception Report) (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A๓ จำนวน ๑๐ ชุด

๒. งานงวดที่ ๒ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีการเบิกจ่ายแล้วเมื่อกันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๑๔,๖๘๒,๕๑๐ บาท

๒.๑ แบบร่างขั้นต้น (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A๓	จำนวน ๓ ชุด
๒.๒ แบบร่างขั้นต้น (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A๓	จำนวน ๑๐ ชุด

๓. งานงวดที่ ๓ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีการเบิกจ่ายแล้วเมื่อกันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๒๒,๐๒๓,๗๖๕ บาท



๓.๑ แบบร่างขั้นพัฒนา (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A๓	จำนวน ๓ ชุด
๓.๒ แบบร่างขั้นพัฒนา (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A๓	จำนวน ๑๐ ชุด
๓.๓ รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A๔	จำนวน ๕ ชุด
๓.๔ เอกสารแบบรูปรายการและการประมาณราคาเพื่อยื่นของบประมาณ (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A๔	จำนวน ๑ ชุด
๓.๕ เอกสารแบบรูปรายการและการประมาณราคาเพื่อยื่นของบประมาณ (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A๔	จำนวน ๔ ชุด



๔. งานงวดที่ ๔ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานจากคณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน ๔๔,๐๔๗,๕๓๐ บาท ประกอบด้วย

๔.๑ แบบรายละเอียดรายการก่อสร้าง

๔.๒ รายละเอียดประกอบแบบ บัญชีงานก่อสร้าง ราคากลาง ครอบคลุมรวมทุกสาขา



ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจากมีคณะกรรมการ ที่กำกับดูแลหลายชุด และมีความเห็นที่แตกต่างกัน จึงต้องใช้ระยะเวลา ในการสรุปแนวความคิด

แนวทางแก้ไข

เร่งรัดให้คณะกรรมการทุกชุดตรวจสอบและสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปแตมัสและส่วนจัดแสดงจระเข้ สวนสัตว์อุบลราชธานี

เลขที่สัญญาจ้าง	๑๖/๒๕๖๔ วงเงินก่อสร้าง ๓๔,๗๓๗,๗๐๐ บาท
ระยะเวลาดำเนินการ	เริ่มทำงานวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕ งวด
ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนเทค เอสโซซิเอท
<u>การดำเนินงาน</u>	
	งวดที่ ๑ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	งวดที่ ๒ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	งวดที่ ๓ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	งวดที่ ๔ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	งวดที่ ๕ (สุดท้าย) กำหนดส่งมอบงานในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีการขอขยายเวลา สิ้นสุดวันที่ ๒๒ ม.ค.๒๕๖๕ อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายไปยังส่วนกลาง

ผลการดำเนินงานงวดงานที่ ๕ ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายไปยังส่วนกลาง

- งานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ โคมไฟ สายภายในเข้าอาคารในตัวอาคาร	๑๐๐%
- งานตกแต่ง งานทาสีทุกส่วนอาคารภายนอก	๑๐๐%
- งานศาลาพักผ่อน ๒ หลัง	๑๐๐%
- งานเคลียร์พื้นที่	๑๐๐%
- งานอื่นๆ ครบ	๑๐๐%





ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ทางหุ้นส่วนจำกัด กรีนเทค เอสโซซิเอท ขอสงวนสิทธิ์หรือลดค่าปรับงานก่อสร้างฯ ตามหนังสือเลขที่ กค. (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เนื่องจากนำเข้าอุปกรณ์ Automatic Fine Screen รุ่น BS๔H-๑.๐ สำหรับระบบน้ำดี และ BS๓H-๕.๐ สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย จากประเทศญี่ปุ่น ด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

แนวทางแก้ไขปัญหา

คณะกรรมการควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปแตมัสและส่วนจัดแสดงจระเข้ ได้มีมติพิจารณาให้สงวนสิทธิ์หรือลดค่าปรับ โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละศูนย์ โดยกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นับจากสิ้นสุดสัญญา โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถส่งงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับแก่ผู้ว่าจ้าง ตามสัญญา ข้อ ๑๗, ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๓ และตามระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินงานรายได้ ค่าใช้จ่าย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

เรื่องเดิม

๑. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เสนอแผนปฏิบัติการด้านการเงิน (เงินนอกงบประมาณ) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

๑.๑ ประมาณการรายได้ จำนวน ๒๙๕.๑๘๒๐ ล้านบาท

๑.๒ ประมาณการรายจ่าย จำนวน ๓๙๓.๖๓๗๖ ล้านบาท

๒. ในคราวประชุมคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีมติที่ประชุมดังนี้

๒.๑ อนุมัติแผนปฏิบัติการด้านการเงิน (เงินนอกงบประมาณ) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๒ อนุมัติให้ใช้เงินสะสมองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จำนวน ๑๘๖.๒๙๐๐ ล้านบาท กรณีเพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานในส่วนที่รายได้ (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่าย และกรณีเกิดรายได้ไม่เป็นไปตามแผน จากการระบาดของโรคใหม่ของ COVID-๑๙

ข้อเท็จจริง

๑. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดทำแผนรายได้ และค่าใช้จ่ายแยกเป็นรายเดือน โดยผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้อนุมัติแผนรายได้ และค่าใช้จ่าย เพื่อให้สำนัก สวนสัตว์ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้มีรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านการเงิน

๒. รายงานงบการเงินได้ผ่านการสอบทานจากสำนักตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕

ผลการดำเนินงาน

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ขอรายงานผลการดำเนินงาน รายได้ ค่าใช้จ่าย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

	แผน	ผล	สูง (ต่ำ) กว่าแผน	หน่วย : ล้านบาท
๑. รายได้	๓๓.๕๔	๓๐.๗๗	(๒.๗๗)	
๒. รายจ่าย	๖๔.๒๗	๖๑.๒๔	(๓.๐๓)	
(ค่าใช้จ่าย งบรัฐบาล+องค์การ)				

ข้อเสนอเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานรายได้ ค่าใช้จ่าย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
รายได้จากการดำเนินงาน ประจำเดือน มกราคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

สวนสัตว์	แผน - งบรายได้	
	แผน	ผล
ส่วนกลาง	0.69	0.51
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	0.58	0.06
สวนสัตว์เชียงใหม่	5.81	6.97
สวนสัตว์นครราชสีมา	7.01	6.60
สวนสัตว์สงขลา	1.40	2.89
สวนสัตว์อุบลราชธานี	2.26	1.49
สวนสัตว์ขอนแก่น	7.30	3.06
โครงการ คชอาณาจักร	0.41	0.08
รวมรายได้	33.34	30.68
รายได้จากรับเงินอุดหนุนจาก		0.07
รายได้ค่าบริการรถโดยสารพิเศษในเขต		0.04
รวมรายได้จากการดำเนินงานทั้งสิ้น		30.77
รายได้ทางบัญชี - งบกำไรขาด (ส่วนขาด)		0.96
รายได้ทางบัญชี - งบกำไรขาดทั้งหมด		0.56
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล		55.54
รวมทั้งสิ้น	33.34	87.83



องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
ค่าใช้จ่าย (รัฐบาล + องค์การ) ประจำเดือน มกราคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

สวนสัตว์	แผน - ผล ค่าใช้จ่าย	
	แผน	ผล
ส่วนกลาง	22.82	14.07
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	9.92	11.75
- งบค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9.29	11.32
- งบส่วนแบ่งผู้ประกอบการ	0.63	0.43
สวนสัตว์เชียงใหม่	11.47	11.48
- งบค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8.47	8.56
- งบค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	3.00	2.92
สวนสัตว์นครราชสีมา	7.05	7.69
สวนสัตว์สงขลา	5.81	6.14
สวนสัตว์อุบลราชธานี	2.43	3.39
สวนสัตว์ขอนแก่น	3.48	5.42
โครงการ คชอาณาจักร	1.31	1.30
รวมทั้งสิ้น	64.27	61.24
ค่าใช้จ่ายทางบัญชี		36.38
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	64.27	97.63




๔.๔ รายงานผลการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
แบบสะสม ๔ เดือน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มกราคม ๒๕๖๕

การดำเนินงาน

สวนสัตว์เชียงใหม่ ขอรายงานผลการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แบบสะสม ๔ เดือน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มกราคม ๒๕๖๕ สรุปได้ ดังนี้ (ข้อมูลเบื้องต้น)

รายการ	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	รวม
รายได้ดำเนินงาน	1.161	0.891	2.677	2.555	7.284
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2.655	2.904	2.907	2.996	11.462
รายได้ สูง(-ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	- 1.494	- 2.013	- 0.230	- 0.441	- 4.178
ผู้เข้าชม (คน)	9,896	7,469	22,802	21,698	61,865

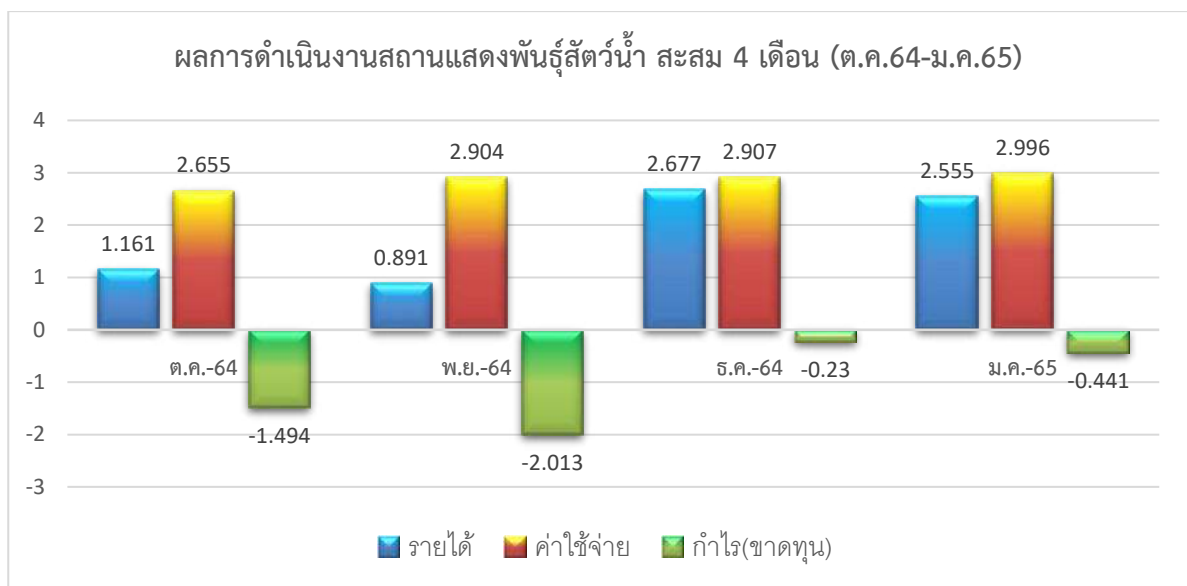

ผลการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ แบบสะสม ๔ เดือน ในภาพรวมมีรายได้ดำเนินงานเกิดขึ้นจำนวน ๗.๒๘๔ ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ที่มาจาก การจองบัตรเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานสะสม ๔ เดือน เกิดขึ้นจำนวน ๑๑.๔๖๒ ล้านบาท โดยเฉลี่ยเดือนละ ๓ ล้านบาท (๓๖ ล้านบาทต่อปี) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างเหมา ๕.๙๙๒ ล้านบาท ค่าจ้างบริหาร ๒.๕๖๘ ล้านบาท และค่าไฟฟ้า ๑.๖๗๗ ล้านบาท ค่าอาหารสัตว์น้ำ ๐.๕๖๐ ล้านบาท ค่าก๊าซ LPG ๐.๒๑๓ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๐.๔๕๒ ล้านบาท

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ ผลการดำเนินงานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แบบสะสม ๔ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มกราคม ๒๕๖๕) ข้อมูลเบื้องต้น

มติที่ประชุม

๔.๔ รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่องเดิม

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้รับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับการพิจารณากรอบวงเงินทั้งสิ้น จำนวน ๗๐๘.๐๒๖๕ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑. งบบุคลากร	๑๘๑.๙๓๗๕	ล้านบาท
๒. งบอุดหนุน	๒๒๓.๙๘๒๐	ล้านบาท
๓. งบลงทุน	๓๐๒.๑๐๗๐	ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	<u>๗๐๘.๐๒๖๕</u>	ล้านบาท

การดำเนินงาน

สำนักงานเงินและทรัพย์สิน ได้ดำเนินการรวบรวมแผน และผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวม ๕๔ รายการ วงเงิน ๓๐๒,๑๐๗,๐๐๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย

- | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|------------------------|
| ๑ | ครุภัณฑ์ | จำนวน ๔๑ รายการ | วงเงิน ๓๓,๔๔๕,๑๐๐ บาท |
| | ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๔๐ รายการ | | |
| ๒ | สิ่งก่อสร้าง | จำนวน ๑๓ รายการ | วงเงิน ๒๖๘,๖๖๑,๙๐๐ บาท |
| | ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๑๒ รายการ | | |
- (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

ข้อเสนอเพื่อทราบ

เพื่อโปรดทราบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหมวดรายจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รายงานสถานภาพตามกระบวนการพัสดุ ของงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2565 จำนวน 13 รายการ



รายงานสถานภาพตามกระบวนการพัสดุ ของงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ ประจำปี 2565 จำนวน 41 รายการ



รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



ภาพรวม

งบอุดหนุน

งบลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มค. ๖๕

รายการ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย (GFMIS)	คิดเป็น (%)	คงเหลือ
1. งบอุดหนุน	405.9195	202.9580	50.00	202.9615
2. งบลงทุน	302.1070	20.2308	6.70	281.8762
* ครุภัณฑ์	33.4451	10.4177	31.15	23.0274
* สิ่งก่อสร้าง	268.6619	9.8131	3.65	258.8488
รวมทั้งสิ้น	708.0265	223.1888	31.52	484.8377

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการดำเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ส่วนกลาง)

ครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ลำดับที่ ๑-๗ ดังนี้

๑. กล้องถ่ายภาพระบบ wifi สำหรับกล้องจุลทรรศน์	งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท
๒. ตู้เก็บบล็อกรพาราฟิน ๒ ตู้	งบประมาณ ๑๔๕,๒๐๐.-บาท
๓. ตู้เก็บแผ่นกระจกสไลด์ ๑ ตู้	งบประมาณ ๘๐,๒๕๐.-บาท
๔. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงในไมโครเพลท	งบประมาณ ๔๐๖,๖๐๐.-บาท
๕. เครื่องตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ	งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.-บาท
๖. เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพในสัตว์	งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐.-บาท
๗. ตู้เย็นแช่น้ำยา	งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐.-บาท
๘. โครงการระบบบริหารจัดการสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (Thai Zoo Ark)	งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด เป็นเงินจำนวน ๗๘๐,๐๐๐ บาท	

อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR ๑ รายการ ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-ticket)
งบประมาณ ๘,๔๔๙,๘๐๐.-บาท ขณะนี้ได้ผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้แก่ บริษัท คลิเน็กซ์ จำกัด
ในวงเงินงบประมาณจำนวน ๖,๙๘๐,๐๐๐ บาท และอยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์ผล ๗ วัน สิ้นสุดในวันที่
๔ มีนาคม ๒๕๖๕

งบประมาณปี 2565

เครื่องปั่นเหวี่ยงฮีมาโตคริต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 1 เครื่อง

เลขที่สัญญาจ้าง	3/2565 วงเงิน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินการ	เริ่มสัญญา 16 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 12 มกราคม 2565
ผู้ขาย	บริษัท กิ๊ปไทย จำกัด
การดำเนินงาน	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว



เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วรอบต่ำ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 1 เครื่อง

เลขที่สัญญาจ้าง	2/2565 วงเงิน 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินการ	เริ่มสัญญา 16 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 12 มกราคม 2565
ผู้ขาย	บริษัท กิ๊ปไทย จำกัด
การดำเนินงาน	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว




ตู้แช่แข็ง -40 องศาเซลเซียส สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 1 เครื่อง

เลขที่สัญญาจ้าง	1/2565 วงเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินการ	เริ่มสัญญา 16 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 12 มกราคม 2565
ผู้ขาย	บริษัท กิ๊ปไทย จำกัด
การดำเนินงาน	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว



เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบทศนิยม 3 ตำแหน่ง สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 1 เครื่อง

เลขที่สัญญาจ้าง	4/2565 วงเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินการ	เริ่มสัญญา 16 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 12 มกราคม 2565
ผู้ขาย	บริษัท กิ๊ปไทย จำกัด
การดำเนินงาน	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

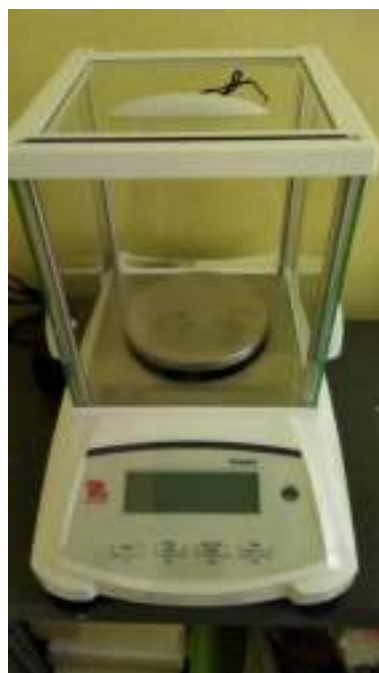

งบประมาณปี 2565

งานก่อสร้างปรับปรุงถนนแนวรั้ว และสิ่งอำนวยความสะดวก ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

เลขที่สัญญาจ้าง	7/2565 วงเงินก่อสร้าง 29,915,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินการ	เริ่มทำงานวันที่ 30 ธันวาคม 2564 หหมดสัญญาจ้าง วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ระยะเวลา 240 วัน
ผู้รับจ้าง	บริษัท พี.เอ.ไอ ซัพพลาย จำกัด
การดำเนินงาน	แบ่งงานออกเป็น 7 งวด
รายงานตั้งแต่	วันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2565
งานงวดที่ 1	จำนวนเงิน 4,200,000 บาท

งวดที่ 1 การดำเนินงานแล้ว 5%

งานปรับปรุงลานจอดรถบริเวณหน้าประตูทางเข้าถึงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างส่งวัสดุ รั้วไวซ์เมซ และบล็อกสนามหญ้า

จุดพื้นที่ก่อสร้างของเดิมที่จะปรับปรุง



นำวัสดุเข้าหน้างานก่อสร้าง



งานงวดที่ 2 จำนวนเงิน 5,000,000 บาท

งวดที่ 2 การดำเนินงานแล้ว 5%

งานรื้อถอน โรงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ของเดิม



กรรมการประชุมติดตามงานกับผู้รับจ้าง



ปัญหาและอุปสรรค

- ผู้รับจ้างดำเนินการงานล่าช้า กว่ากำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง ทางคณะกรรมการนัดประชุมติดตามงาน พร้อมทำหนังสือแจ้งเร่งงาน งวดที่ 1 ให้ทางผู้รับจ้างรับทราบ
- ผู้รับจ้างชี้แจงว่าอยู่ระหว่างสั่งวัสดุ
- ไฟดับ เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด วันที่ 3 ก.พ.65 เวลา 13.00 น. ถึงวันที่ 4 ก.พ.65 เวลา 10.00 น.

งบประมาณปี 2565

งานก่อสร้างเตาเผาซากสัตว์ปลอดมลพิษพร้อมปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

เลขที่สัญญาจ้าง	6/2565 วงเงินก่อสร้าง 4,750,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค์)
ระยะเวลาดำเนินการ	เริ่มทำงานวันที่ 28 ธันวาคม 2564 หมดสัญญาจ้าง วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ระยะเวลา 150 วัน
ผู้รับจ้าง	บริษัท ทิมเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
การดำเนินงาน	แบ่งงานออกเป็น 2 งวด
รายงานตั้งแต่	วันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2565

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 1,270,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ดำเนินการแล้วเสร็จ 25%

งานก่อสร้างอาคารเตาเผาซากสัตว์ปลอดมลพิษ

- งานพื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก



- งานปรับปรุงพร้อมแนววางรางระบายน้ำ



ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มี

สวนสัตว์เชียงใหม่

1. สิ่งก่อสร้างประจำปี 2565

1.1 งานปรับปรุงอาคารฝ่ายอนุรักษ์และวิจัย พร้อมอาคารอนุบาลลูกสัตว์ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

วงเงิน/สัญญา (บาท)	งวดงาน (จำนวน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วันที่ เริ่มสัญญา	วันที่ สิ้นสุดสัญญา	สถานะ
1,945,000.-	3 งวด	180 วัน	1 พ.ย. 64	29 เม.ย. 65	- ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว - งวดที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ และขออนุมัติเบิกเงินไปยัง อสส. - งวดที่ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการ



1.2 งานก่อสร้างโครงข่ายท่อน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

วงเงิน/สัญญา (บาท)	งวดงาน (จำนวน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วันที่ เริ่มสัญญา	วันที่ สิ้นสุดสัญญา	สถานะ
29,880,000.-	10 งวด	30 วัน	8 ก.พ. 65	4 ธ.ค. 65	- ดำเนินการทำสัญญาวันที่ 7 ก.พ. 65

2. ครุภัณฑ์ ประจำปี 2565 ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

2.1 ซื้อเครื่องอัลตราซาวด์แบบพกพาสำหรับสัตว์ป่า จำนวน 1 เครื่อง

วงเงิน/สัญญา (บาท)	งวดงาน (จำนวน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วันที่ เริ่มสัญญา	วันที่ สิ้นสุดสัญญา	สถานะ
1,453,200.-	1 งวด	120 วัน	21 ต.ค. 64	18 ก.พ. 65	- ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

2.2 ซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิทัล พร้อมเครื่องเอกซเรย์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง

วงเงิน/สัญญา (บาท)	งวดงาน (จำนวน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วันที่ เริ่มสัญญา	วันที่ สิ้นสุดสัญญา	สถานะ
1,798,000.-	1 งวด	120 วัน	29 ต.ค. 64	26 ก.พ. 65	- ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

2.3 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (cab)

วงเงิน/สัญญา (บาท)	งวดงาน (จำนวน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วันที่ เริ่มสัญญา	วันที่ สิ้นสุดสัญญา	สถานะ
644,000.-	1 งวด	60 วัน	12 ต.ต 64	11 ธ.ค. 64	- ดำเนินการส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้วและขออนุมัติเบิกเงินไปยัง อสส.





2.2 ซื้อถังเก็บน้ำบนดิน โพลีเมอร์ ขนาด 3,000 ลิตร สวนสัตว์เชียงใหม่ 10 ใบ

วงเงิน/ซื้อ (บาท)	งวดงาน (จำนวน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วันที่ เริ่มสัญญา	วันที่ สิ้นสุดสัญญา	สถานะ
77,000.-	1 งวด	7 วัน	7 ต.ต 64	13 ต.ต 64	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว



2.3 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู สำหรับคอกกักหมีแพนด้า

วงเงิน/ซื้อ (บาท)	งวดงาน (จำนวน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วันที่ เริ่มสัญญา	วันที่ สิ้นสุดสัญญา	สถานะ
65,250.-	1 งวด	30 วัน	7 ต.ต 64	30 พ.ย. 64	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว



งานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
งานก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา

ผู้รับจ้าง บริษัท เอส.ยู.แพค. จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ 09/๒๕๖๕ ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 วงเงิน สัญญาจ้าง จำนวนเงิน 9,550,000.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เริ่มดำเนินงาน 26 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน 5 งวด จำนวน ๒๔๐ วัน ผลการดำเนินงาน งวดที่ ๑ ดำเนินงานเข้าพื้นที่เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

งวดที่ 1 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน 1,500,000.-บาท

งวดที่ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นจำนวนเงิน 2,000,000.-บาท (สองล้านบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้



ปฏิบัติงาน ระยะเวลาดำเนินการ 48 วัน (นับตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2565) ดังรายการต่อไปนี้

การดำเนินงานงวดที่ 2 ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

- | | | |
|---|-----------|-----|
| 1. งานวางท่อระบายน้ำขนาด 2.10 x 2.10 ม. | แล้วเสร็จ | 60% |
| 2. งานปรับปรุงพื้นลานคอนกรีต | แล้วเสร็จ | 0% |



ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน

งานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

งานก่อสร้างอาคารผู้ล่ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา

ผู้รับจ้าง บริษัท เอส.ยู.แพค. จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ 10/๒๕๖๕ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 วงเงินสัญญาจ้าง จำนวนเงิน 24,970,000.- บาท (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เริ่มดำเนินงาน

16 ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน 5 งวด จำนวน ๒๔๐ วัน

ผลการดำเนินงาน งวดที่ ๑ ดำเนินงานเข้าพื้นที่เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 3,770,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ระยะเวลาดำเนินการ 48 วัน (นับตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565) ดังรายการต่อไปนี้

การดำเนินงาน ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

1.1 งานปรับพื้นที่ส่วนแสดงสิงโต	แล้วเสร็จ	100%
1.2 งานขุดดิน คูน้ำกันสัตว์ส่วนแสดงสิงโต	แล้วเสร็จ	90%
1.3 งานขุดดินฐานรากคอกกักสิงโต	แล้วเสร็จ	100%
1.4 งานเทคอนกรีตฐานรากคอกกักสิงโต	แล้วเสร็จ	100%
1.5 งานผูกเหล็กพื้นคูน้ำกันสัตว์ส่วนแสดงสิงโต	แล้วเสร็จ	20%
1.6 งานเทคอนกรีตพื้นคูน้ำกันสัตว์ส่วนแสดงสิงโต	แล้วเสร็จ	0%



ปัญหาอุปสรรค : _เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน_ช่วงเทศกาล ทำให้แรงงานมีจำนวนน้อยและปัญหาเกี่ยวกับการจัดส่งวัสดุ-อุปกรณ์ ล่าช้าในช่วงเทศกาล

แนวทางแก้ไข : คณะกรรมการควบคุมงานได้เข้าไปควบคุมและกำกับอย่างเคร่งครัด และขณะนี้วัสดุ-อุปกรณ์ในการดำเนินงานมีพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาในเร็ววัน

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี 2565

ประจำเดือน มกราคม 2565

สวนสัตว์สงขลา

ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 6 รายการ

ครุภัณฑ์ รายการที่ 1 รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

ผู้ขาย บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สัญญาเลขที่ 10/2565 ลงวันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ครบกำหนดส่งมอบภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 วงเงินที่ลงนาม 1,358,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. 1115/1323 ลว. 30 ธันวาคม 2564



ครุภัณฑ์ รายการที่ 2 เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพสำหรับสัตว์ จำนวน 1 เครื่อง

ผู้ขาย ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง สัญญาเลขที่ 04/2565 ลงวันที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ครอบกำหนดส่งมอบภายในวันที่ 24 มกราคม 2565 วงเงินที่ลงนาม 160,000.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ 13 มกราคม 2565

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. 1115/69 ลว. 14 มกราคม 2565

ครุภัณฑ์ รายการที่ 3 คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด

ผู้ขายร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง สัญญาเลขที่ 05/2565 ลงวันที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ครอบกำหนดส่งมอบภายในวันที่ 24 มกราคม 2565 วงเงินที่ลงนาม 28,000.00 บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ 13 มกราคม 2565

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. 1115/68 ลว. 14 มกราคม 2565



ครุภัณฑ์ รายการที่ 4 เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า

ผู้ขาย ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง สัญญาเลขที่ 06/2565 ลงวันที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ครบกำหนดส่งมอบ ภายในวันที่ 24 มกราคม 2565 วงเงินที่ลงนาม 89,500.00 บาท (แปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ 13 มกราคม 2565

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. 1115/71 ลว. 14 มกราคม 2565



ครุภัณฑ์ รายการที่ 5 เครื่องติดตามและบันทึกค่าคาร์บอนไดออกไซด์ทางเดินหายใจ แบบแมนสตริม จำนวน 1 เครื่อง

ผู้ขาย ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง สัญญาเลขที่ 07/2565 ลงวันที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ครบกำหนดส่งมอบ ภายในวันที่ 24 มกราคม 2565 วงเงินที่ลงนาม 56,000.00 บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ 13 มกราคม 2565

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. 1115/70 ลว. 14 มกราคม 2565



ครุภัณฑ์ รายการที่ 6 เครื่องบันทึกและติดตาม ปริมาณความอึดตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจรสำหรับสัตว์
จำนวน 1 เครื่อง

ผู้ขาย ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง สัญญาเลขที่ 08/2565 ลงวันที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ครบกำหนดส่งมอบ
ภายในวันที่ 24 มกราคม 2565 วงเงินที่ลงนาม 18,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ 13 มกราคม 2565

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. 1115/72 ลว. 14 มกราคม 2565



สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 รายการ

1. งานปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรแสงวิศวกรรม ในวงเงิน 30,367,440.73 บาท (สามสิบล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว กำหนดให้ผู้รับจ้าง เริ่มงานวันที่ 3 ธันวาคม 2564 และครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จในสัญญาวันที่ 29 สิงหาคม 2565 จำนวนงวดงาน 9 งวด

ผลการดำเนินงาน

- อยู่ระหว่างการดำเนินงาน งวดที่ 1

งวดที่ 1 ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

1.1 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารเตาเผาซาก

- งานเตรียมการก่อสร้าง (ปรับพื้นที่)



ถมดินปรับพื้นที่



1.2 งานโครงสร้างอาคารพยาบาลสัตว์ป่วย

- งานเตรียมการก่อสร้างทั้งหมด + งานรื้อถอน ,งานฐานราก ,งานเสาตอม่อ ,งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ 1



ระบบไฟฟ้าและสื่อสารอาคารพยาบาลสัตว์ป่วย

- งานแพ่งย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ ,งานสายไฟฟ้าและท่อรางเดินสายไฟฟ้า ระบบเมนสายไฟฟ้า



ปัญหาและอุปสรรค

1. เนื่องจากผู้รับจ้างได้เริ่มสัญญาในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนทำให้การทำงานการเตรียมการก่อสร้าง ถมดิน (ปรับพื้นที่) อาคารเตาเผาซาก ไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากการขนส่งวัสดุเข้าหน้างานจะต้องรอให้ฝนหยุดตก ทางเข้าหน้างานรถสามารถเข้าหน้างานได้ซึ่งงานดังกล่าวอยู่ในงวดที่ 1
2. งานอาคารสัตว์ป่วย หลังจากผู้รับจ้างเข้าทำงานเมื่อเปิดพื้นที่หน้างานพบก้อนหินขนาดใหญ่ซึ่ง ไม่สามารถดำเนินการตามรูปแบบรายการได้ ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ทำเรื่องปรึกษาหารือไปยังผู้ออกแบบ ดังนั้นต้องใช้ระยะเวลาทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานได้
3. เกิดข้อขัดแย้งระหว่างแบบและรายการ ทำให้ไม่สามารถทำงานตามรูปแบบและรายการได้ ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ทำเรื่องปรึกษาหารือไปยังผู้ออกแบบ ดังนั้นต้องใช้ระยะเวลาทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานได้

งานปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธุ์สมเสร็จ ภายในสวนสัตว์สงขลา

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรุ่งก่อสร้าง 2007 ในวงเงิน 16,480,000.00 บาท (สิบหกล้านบาทสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว กำหนดให้ผู้รับจ้าง เริ่มงานวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 และครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จในสัญญาวันที่ 19 สิงหาคม 2565 จำนวนงวดงาน 7 งวด

ผลการดำเนินงาน

การเบิกจ่ายเงิน

งวดที่ 1 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 1,648,000.00 บาท

งวดที่ 2 อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

งวดที่ 2 ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารคอกกัก ๔ หน่วย และอาคารคอกกัก ๓ หน่วย ,ศาลาชมสัตว์ ,ซุ้มให้อาหารสัตว์ ๔ หลัง ,ที่หลบแดดฝน ๔ หลัง และชุดอ่างน้ำ



ทำอ่างน้ำ



รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี 2565

สวนสัตว์อุบลราชธานี


ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 รายการ

ครุภัณฑ์ รายการที่ 1 แผ่นบันทึกภาพเอกซเรย์แบบดิจิทัล 4 แผ่น

ผู้รับจ้าง บริษัท เจ.เอฟ แอดวาน เมด จำกัด สัญญาเลขที่ 1/๒๕๖๕ เริ่ม 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 วงเงินที่ลงนามสัญญา 226,500.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส 1116/1383 ลว. 2 ธันวาคม 2564



ครุภัณฑ์ รายการที่ 2 ชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล 1 ชุด

ผู้รับจ้าง บริษัท เจ.เอฟ แอดวาน เมด จำกัด สัญญาเลขที่ 5/2565 เริ่ม 4 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 3 มกราคม 2565 วงเงินที่ลงนามสัญญา 1,640,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์แล้วเสร็จ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส 1116/1488 ลว. 24 ธันวาคม 2564



ครุภัณฑ์ รายการที่ 3 หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 Kva. 5 เครื่อง

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแม็ค เทคโนโลยี สัญญาเลขที่ 9/๒๕๖๕ เริ่ม 5 พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 4 มกราคม 2565 วงเงินที่ลงนามสัญญา 792,000.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์แล้วเสร็จในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

- ขออนุมัติเบิกเงินตามหนังสือเลขที่ ทส1116/1411 ลว. 8 ธันวาคม 2564



ครุภัณฑ์ รายการที่ 4 กล้องวงจรปิดติดตั้ง 8 จุด 66 ตัว

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีคอมมูนิเคชั่นเซลล์ แอดเซอร์วิส สัญญาเลขที่ 6/2565 เริ่ม 11 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 วงเงินที่ลงนามสัญญา 850,000บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์แล้วเสร็จในวันที่ 8 ธันวาคม ๒๕๖4

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส 1116/1489 ลว. 24 ธันวาคม 2564

ภาพการดำเนินงาน



สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ

งานก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ สวนสัตว์อุบลราชธานี

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

- สวนสัตว์อุบลราชธานี ได้ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ดินสอแสง ก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 56,888,000 บาท ตามประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564

- สิ้นสุดการอุทธรณ์ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564

- มีผู้ยื่นอุทธรณ์ 1 ราย บริษัท ไรท์แมน จำกัด

- องค์การสวนสัตว์ฯ ได้นำส่งวินิจฉัยผลการอุทธรณ์ให้กรมบัญชีกลางพิจารณา ตามหนังสือเลขที่ ทส 1101/19 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 อยู่ระหว่างรอผลการวินิจฉัยการอุทธรณ์

IT71284 14-57

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ สวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๙๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น

ปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม จำนวน ๑ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ดินสอแสง ก่อสร้าง (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เงินเงินทั้งสิ้น ๕๖,๘๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบหกล้านบาทแปดแสนแปดพันแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายสุวิทย์ พงษ์ศิริพันธ์)
ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี

https://procure3.gprocurement.go.th/egp3proc1607web/app/control_proc160

1/1

ครุภัณฑ์ สวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตู้แช่อาหาร ขนาด ๔๕ คิวบิกฟุต
งบประมาณ ๔๖,๐๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



ตู้แช่อาหาร ขนาด ๓๒ คิวบิกฟุต
งบประมาณ ๒๗,๐๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



เครื่องเป่าใบไม้ ๒ จังหวะ ๓ เครื่อง
งบประมาณ ๓๐,๓๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวี ๑ เครื่อง
งบประมาณ ๕๒,๙๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



ครุภัณฑ์ สวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เครื่องเลเซอร์รักษาแผลสำหรับสัตว์
1 เครื่อง งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ๓ เครื่อง
งบประมาณ ๔๔๔,๒๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า ๒ เครื่อง
งบประมาณ ๗๐,๐๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า สวนสัตว์ขอนแก่น
๒ เครื่อง งบประมาณ ๑๙,๐๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



งานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสัตว์และอาคารประกอบต่างๆ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น

ผู้รับจ้าง บริษัท ชูนพลพัฒนาการ จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ วงเงินสัญญาจ้าง
จำนวนเงิน ๗,๙๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เริ่มดำเนินงาน วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
สิ้นสุดการดำเนินงาน วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ งวด จำนวน ๒๑๐ วัน

ผลการดำเนินงาน

งวดที่ ๑ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายบำรุงสัตว์

๑.๑ งานสถาปัตยกรรม

๑.๑.๑ งานผนังและผิวผนัง แล้วเสร็จ ๐.๐๐ %

๑.๑.๒ งานพื้นและผิวพื้น แล้วเสร็จ ๐.๐๐ %

๑.๑.๓ งานประตู – หน้าต่าง แล้วเสร็จ ๐.๐๐ %

๑.๑.๔ งานวัสดุผนังหลังคา แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๑.๑.๕ งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๐.๐๐ %

๑.๑.๖ งานทาสี แล้วเสร็จ ๐.๐๐ %

๑.๑.๗ งานอื่นๆ แล้วเสร็จ ๐.๐๐ %

๑.๒ งานสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ ๐.๐๐ %

๑.๓ งานระบบประปา – สุขาภิบาล แล้วเสร็จ ๔๐ %

๑.๔ งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๑๐ %

๒. งานก่อสร้างอาคารอาคารเก็บของ

๒.๑ งานสถาปัตยกรรม

๒.๑.๑ งานผนังและผิวผนัง แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๒.๑.๒ งานพื้นและผิวพื้น แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๒.๑.๓ งานประตู – หน้าต่าง แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๒.๑.๔ งานวัสดุผนังหลังคา แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๒.๑.๕ งานทาสี แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๒.๒ งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๓. งานก่อสร้างโรงจอดรถ

๓.๑ งานสถาปัตยกรรม

๓.๑.๑ งานพื้นและผิวพื้น แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๓.๑.๒ งานวัสดุผนังหลังคา แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๓.๒ งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๔. งานก่อสร้างอาคารอาคารเก็บกล่องเคลื่อนย้ายสัตว์

๔.๑ งานสถาปัตยกรรม

๔.๑.๑ งานผนังและผิวผนัง	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๔.๑.๒ งานพื้นและผิวพื้น	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๔.๑.๓ งานประตู – หน้าต่าง	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๔.๑.๔ งานวัสดุผนังหลังคา	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๔.๑.๕ งานทาสี	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๔.๒ งานระบบไฟฟ้า

แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๕. งานต่อเติมอาคารคอกกักสัตว์ป่วย (สัตว์ปีก)

๕.๑ งานรื้อถอน	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๕.๒ งานโครงสร้าง (เหล็กรูปพรรณ)	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๕.๓ งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๕.๔ งานระบบไฟฟ้า	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๖. งานก่อสร้างรั้วแนวเขต รพ.สัตว์ ยาว ๗๐๐ เมตร แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๗. งานจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในงวดงานต่อไปเข้าพื้นที่งานก่อสร้าง

สรุป การปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๐ ตลอดระยะเวลาเริ่มโครงการจนถึง ๓๑ มกราคม ๖๕



ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
แนวทางแก้ไข –

งานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

งานก่อสร้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวน้ำ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น

ผู้รับจ้าง บริษัท ขุนพลพัฒนาการ จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ ๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ วงเงินสัญญาจ้าง จำนวนเงิน ๑๔,๕๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เริ่มดำเนินงาน ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔ งวด จำนวน ๒๔๐ วัน

ผลการดำเนินงาน งวดที่ ๑

๑. งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมภายในอาคารจัดแสดงแมวน้ำ
 - ๑.๑ งานรื้อถอนโรงจอดรถ พร้อมติดตั้งในพื้นที่สวนสัตว์กำหนดให้ แล้วเสร็จ ๐.๐๐ %
 ๒. งานปรับปรุงอาคารแสดงแมวน้ำ (งานโครงสร้าง ส่วนต่อเติม)
 - ๒.๑ งานรื้อกันแนวเขตงานก่อสร้าง แล้วเสร็จ ๑๐.๐๐ %
 - ๒.๒ งานปรับปรุงพื้นที่-ปักผัง แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ %
 - ๒.๓ งานขุดดินฐานราก แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ %
 - ๒.๔ งานเทริน งานผูกเหล็ก งานเข้าแบบและเทคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ %
 - ๒.๕ งานผูกเหล็ก งานเข้าแบบและเทคอนกรีตเสาต่อม่อ แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ %
 - ๒.๖ งานผูกเหล็ก งานเข้าแบบและเทคอนกรีตคานรับอัมจันทร์ แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ %
 - ๒.๗ งานผูกเหล็ก งานเข้าแบบและเทคอนกรีตอัมจันทร์ แล้วเสร็จ ๐.๐๐ %
 - ๒.๘ งานผูกเหล็ก งานเข้าแบบและเทคอนกรีตเสารับโครงหลังคา แล้วเสร็จ ๐.๐๐ %
 - ๒.๙ งานเชื่อมเหล็กโครงหลังคา แล้วเสร็จ ๕.๐๐ %
 ๓. งานอาคาร souvenir (งานโครงสร้าง)
 - ๓.๑ งานปรับปรุงพื้นที่-ปักผัง แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ %
 - ๓.๒ งานขุดดินฐานราก แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ %
 - ๓.๓ งานเทริน งานผูกเหล็ก งานเข้าแบบและเทคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ %
 - ๓.๔ งานผูกเหล็ก งานเข้าแบบและเทคอนกรีตเสาต่อม่อ แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ %
 - ๓.๕ งานผูกเหล็ก งานเข้าแบบและเทคอนกรีตคานคอดิน แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ %
 - ๓.๖ งานผูกเหล็ก งานเข้าแบบและเทคอนกรีตพื้น แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ %
 - ๓.๗ งานติดตั้งเสาเหล็กและงานโครงหลังคาเหล็ก แล้วเสร็จ ๒๐.๐๐ %
 ๔. งานอาคาร souvenir (งานสถาปัตยกรรม)
 - ๔.๑ งานมุงหลังคา Shingie Roof แล้วเสร็จ ๐.๐๐ %
 ๕. งานบ่อตกตะกอนและบ่อฝัง แล้วเสร็จ ๘๕.๐๐ %
 ๖. งานจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในงวดงานต่อไปเข้าพื้นที่งานก่อสร้าง

สรุป การปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๐ ตลอดระยะเวลาเริ่มโครงการจนถึง ๓๑ มกราคม ๖๕



งานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
งานก่อสร้างอาคารจักรนักล้า ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น

ผู้รับจ้าง บริษัท ขุนพลพัฒนาการ จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ วงเงินสัญญาจ้าง จำนวนเงิน ๑๔,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เริ่มดำเนินงาน ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔ งวด จำนวน ๒๔๐ วัน

ผลการดำเนินงาน งวดที่ ๑

๑. งานส่วนจัดแสดงเสือโคร่งขาว

๑.๑ งานปรับพื้นที่ - ปักผัง	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๑.๒ งานถมปรับระดับโหมดแห้งและงานซ่อมแซมคอกกัก	แล้วเสร็จ ๕๐ %
๑.๓ งานก่อสร้างโหมดน้ำสำหรับสัตว์เล่น	แล้วเสร็จ ๐.๐๐ %
๑.๔ งานขุดบึงแดดฝนและลานหินเทียม	แล้วเสร็จ ๓๐ %
๑.๕ งานเครื่องเล่นไม้จริง สำหรับสัตว์	แล้วเสร็จ ๐.๐๐ %
๑.๖ งานอาคารโรงสูบน้ำและระบบกรอง	แล้วเสร็จ ๐.๐๐ %
๑.๗ งานน้ำตกเลียนแบบธรรมชาติ	แล้วเสร็จ ๒๐ %

๒. งานส่วนจัดแสดงเสือโคร่งอินโดจีน

๒.๑ งานปรับพื้นที่ - ปักผัง	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๒.๒ งานอ่างเล่นน้ำผนังกระจก	แล้วเสร็จ ๒๐ %
๒.๓ งานบ่อน้ำดื่ม	แล้วเสร็จ ๐.๐๐ %

๓. งานจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในงวดงานต่อไปเข้าพื้นที่งานก่อสร้าง



ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี


แนวทางแก้ไข -

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ ประจำปี 2565

ประจำเดือน ธันวาคม 2564

โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

- ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรในปี 2565 จำนวน 4 รายการ

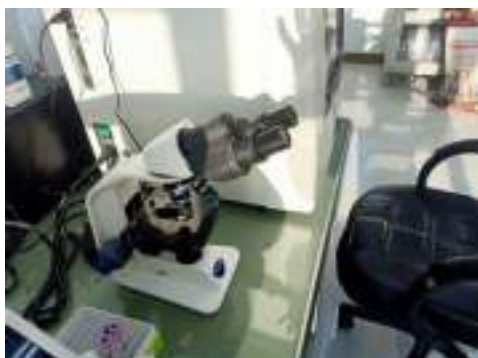

1. กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา ใบสั่งซื้อ 001/2565
บริษัท เบสท์ แล็บ แอนด์ เคมีคอล จำกัด
เบิกจ่าย 100%



2. เครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมในสภาพจริงแบบเคลื่อนที่ ใบสั่งซื้อ 004/2565
บริษัท ออฟเตอร์ แล็บ จำกัด
เบิกจ่าย 100%

ครุภัณฑ์ รายการที่ 3 เครื่องมือรักษาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดความเข้มต่ำ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
ผู้รับจ้าง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาเลขที่ 3/2565 เริ่ม 11 ต.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 8 ก.พ. 65 วงเงินที่
ลงนามสัญญา 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (ส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 14 ธันวาคม 2564)



3. เครื่องมือรักษาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดความเข้มต่ำ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
สัญญาเลขที่ 3/2565 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
เบิกจ่าย 100%

ครุภัณฑ์ รายการที่ 4 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

ผู้รับจ้าง บริษัทพีพีรี เฮฟวี่ แมชชีนเนอรี จำกัด สัญญาเลขที่ 5/2565 เริ่ม 20 พ.ย.2564 สิ้นสุดสัญญา
17 ก.พ. 2565 วงเงินที่ลงนามสัญญา 3,190,000.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) คาดว่าจะส่งมอบครุภัณฑ์
เดือน มกราคม ๒๕๖๕

ปัญหา-อุปสรรค

- ไม่มี

สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ

1.งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระการบินไทย ภายในโครงการคชอาณาจักร ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ไทยสงวน สัญญาเลขที่ 5/2565 เริ่มเริ่ม 11 พ.ย..๒๕64 สิ้นสุดสัญญา 8 ก.ค. 2565 วงเงินลงนามสัญญา 11,969,000-บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
จำนวน 5 งวด 240 วัน (โดยฝ่ายพัสดุดงค์การสวนสัตว์เป็นผู้ดำเนินการ)

ผลการดำเนินงาน

งวดที่ 1	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานงวดที่ ๒

- งานสร้างคาคอดินกันสไลด์ ความยาว ๒๕๐ เมตร ๑๐%
- งานโครงสร้างฐานราก ศาลาดูช้าง
- งานโครงสร้างฐานราก ศาลาพักผ่อน
- งานโครงสร้างฐานราก ทางเดินช้าง
- งานย้ายแทงค์เก็บน้ำ ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร ๒๐%



งานโครงสร้างฐานราก ศาลาดูช้าง



งานโครงสร้างฐานราก ทางเดินช้าง



ปัญหา-อุปสรรค - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

มติที่ประชุม
