



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักการเงินและทรัพย์สิน

ที่ ทส ๑๑๐๔/ ๑๔๖๕

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

เรียน	☒ ผู้อำนวยการสำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์	☒ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
	☒ ผู้อำนวยการสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์	☒ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
	☒ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ	☒ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา
	☒ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ	☒ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา
	☒ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทุนมนุษย์	☒ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี
	☒ ผู้อำนวยการสถาบันจัดการสวนสัตว์	☒ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น
	☒ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	☒ ผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
	☒ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ	☒ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
	☒ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ	

ตามที่ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย อนุมัติให้สำนักการเงินและทรัพย์สิน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบ สำหรับการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานในการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำนักการเงินและทรัพย์สิน จึงขอรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบตามระเบียบการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เพื่อให้คณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณฯ รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานตามระเบียบวาระการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพิมวรรณ อนนท์)

ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน

คณะทำงานและเลขานุการ



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักการเงินและทรัพย์สิน ฝ่ายงบประมาณ

ที่ ทส ๑๑๐๔.๓/ ๙๙

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน

ตามที่คุณอำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย อนุมัติให้สำนักการเงินและทรัพย์สิน ปรับเปลี่ยน รูปแบบการประชุมเป็นรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบ สำหรับการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานในการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำนักการเงินและทรัพย์สิน จึงขอรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบตามระเบียบการประชุม คณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เพื่อให้คณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณฯ รับทราบความคืบหน้า ในการดำเนินงานตามระเบียบวาระการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอโปรดลงนามในหนังสือตามที่แนบมาพร้อมนี้

- นอ. สก. , ส.ส. , ส.ท. , ส.ท. , ส.ท.

๒๕/๓/๖๕

(นางสาวสุกัญญา หงส์พันธุ์)
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ



การประชุม

คณะกรรมการด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของ
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

การประชุมเป็นรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานพร้อม
ภาพประกอบ

ระเบียบวาระการประชุม
คณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
 ๓.๑ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ (สำนักกฎหมาย/สำนักการเงินและทรัพย์สิน)
 ๓.๒ ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่
 (สวนสัตว์แห่งใหม่)
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
 ๔.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 ๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนเดือนมกราคม ๒๕๖๕
 ๔.๓ รายงานผลการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (สวนสัตว์เชียงใหม่)
 ๔.๔ รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

เอกสารประกอบการประชุม
คณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานกรรมการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานผลการดำเนินงานฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

สำนักการเงินและทรัพย์สิน ได้ส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบตามระเบียบการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ให้คณะทำงานฯ เพื่อรับทราบ ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๔/๙๔๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยสำนัก สถาบัน สวนสัตว์ และโครงการ ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว และรายงานผลการดำเนินงาน กลับให้สำนักการเงินและทรัพย์สิน ทาง e-mail และทาง line เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีรายการที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ วงเงินทั้งสิ้น ๗๔.๒๒๑๖ ล้านบาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวถูกพับไปแล้ว	มติที่ประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีสัญญาซื้อขายสัตว์ และงานก่อสร้างปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒ ดำเนินการเก็บรวบรวมเอกสาร กระบวนของงาน และรายละเอียดที่สำคัญของงานทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากรณีมีปัญหาในอนาคต	
ส่วนกลาง ๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ สัญญาที่ ๒๔/๒๕๖๑ วงเงินตามสัญญา ๑๒.๔๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๐๔๐ ล้านบาท คงเหลือ ๘.๓๙๐ ล้านบาท ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ สัญญาที่ ๒๘/๒๕๖๒ วงเงินตามสัญญา ๑๓.๖๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๙๖๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑๑.๗๓๐ ล้านบาท	๑. สำนักการเงินและทรัพย์สิน ดำเนินการทำหนังสือแจ้งบริษัทฯ ให้เร่งรัดดำเนินการตามสัญญา ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๕๔๓ และ ทส ๑๑๐๑/๕๔๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ของสัญญาที่ ๒๔/๒๕๖๑ และสัญญาที่ ๒๘/๒๕๖๒ ๒. บริษัทฯ ตอบกลับมาให้องค์การสวนสัตว์ฯ มอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นผู้นำสัตว์เข้าเนื่องจากเป็นสัตว์ตาม CITES ตามหนังสือเลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๓. สำนักการเงินและทรัพย์สิน ได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องนำเสนอสำนักกฎหมายเพื่อพิจารณา ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๔/๓๓๙๕ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๔. สำนักกฎหมายอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณา ๕. สำนักการเงินและทรัพย์สิน อยู่ระหว่างการติดตามความคืบหน้าในการพิจารณาของสำนักกฎหมาย ๖. สำนักกฎหมายได้จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้บริษัทฯ เพื่อดำเนินการด้านเอกสารการนำเข้าสัตว์จากต่างประเทศต่อกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามที่ร้องขอแล้ว และให้ สงท.แจ้งคณะกรรมการตรวจรับสัตว์ ปี ๒๕๖๒ พิจารณาเสนอความเห็นตามองค์ประกอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปเสนอ ผอ.อสส.ทราบและสั่งการต่อไป ตามเอกสารที่ ทส ๑๑๐๖/๙๑๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ๗. สำนักการเงินและทรัพย์สินมีหนังสือแจ้งคณะกรรมการตรวจรับ ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๔/๕๑๔๙ ลว.๒๗ ก.ย.๒๕๖๔ พิจารณาเสนอความเห็นตามองค์ประกอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปเสนอ ผอ.อสส. ๘. คณะกรรมการตรวจรับเสนอความเห็นต่อ ผอ.อสส. ว่าบริษัทฯ เข้าหลักเกณฑ์ผู้ขายส่งมอบสัตว์ล่าช้าเห็นควรให้มีหนังสือแจ้งสิทธิการปรับและเร่งรัดการส่งสัตว์ให้ผู้ขายทราบ โดย ผอ.อสส.ให้ทางคณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตามหนังสือที่ ทส.๑๑๐๗/๑๗๐๗ ลงวันที่ ๖ ต.ค.๒๕๖๔	๑. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีสัญญาซื้อขายสัตว์ปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อความชัดเจนในการดำเนินงาน ๒. มอบให้สำนักกฎหมายเข้ามาดูรายละเอียดและให้สรุปประเด็นปัญหาและการดำเนินงานให้ชัดเจน แล้วนำเข้าคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อพิจารณา

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	๙. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย มีหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๑๔๓๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ไปยังกรมปศุสัตว์ เพื่อสอบถามการยกเลิกประกาศโรคปากเท้าเปื่อยจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE ในพื้นที่สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในการนำออกจากประเทศต้นทางเพื่อนำกลับมาส่งยังประเทศปลายทาง (ประเทศไทย) ว่าขณะนี้ สามารถดำเนินการได้แล้วหรือไม่ ตามที่บริษัท คาสชิบา (ประเทศไทย) จำกัด ได้อ้างถึงประกาศดังกล่าวเพื่อเป็นการยืนยันจากกรมปศุสัตว์ ๑๐. ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ ๐๖๒๑/๑๖๕ ลว.๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ แจ้งมายังองค์การสวนสัตว์ว่า ปัจจุบันยังมีประกาศชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์กบคู่หรือซากสัตว์กบคู่จากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นเมื่อ ๒๓ ธ.ค.๖๔ ซึ่งมีผลบังคับเป็นเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หากมีการระบาดและยังไม่ได้รับรองสถานะการปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยจากองค์การสุขภาพโลก OIE จะมีการประกาศชะลอการนำเข้าต่อไป	
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ๑. ปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์สัตว์ให้เป็นศูนย์พัฒนาเพื่อการวิจัยและอนุรักษ์สัตว์ป่าระดับมาตรฐานภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว - วงเงิน ๒.๔๘๔ ล้านบาท - เบิกจ่ายแล้ว ๑.๓๕๑ ล้านบาท - คงเหลือ ๑.๑๓๓ ล้านบาท โดยกิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ ๖๘๙	๑. สวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีหนังสือแจ้งบริษัท เพื่อขอบอกเลิกสัญญาจ้างตามหนังสือที่ ทส ๑๑๑๒/๑๑๙๖ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๒. บริษัทฯ ขออุทธรณ์ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างฯ ตามหนังสือที่ ๕๓/๒๕๖๒.๒๐๒๑๐๔.๐๑ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ โดยผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ฯ พิจารณาให้ยืนยันการบอกเลิกสัญญา ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๕๙๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๓. สำนักการเงินและทรัพย์สิน ได้แจ้งให้บริษัทฯ รับทราบแต่หนังสือตีกลับ จึงได้จัดส่งอีกครั้งในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ตอบรับและทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ๔. สำนักการเงินและทรัพย์สิน ได้ส่งสำเนาหนังสือและเอกสารต่าง ๆ ให้สำนักกฎหมาย และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เพื่อรับทราบการดำเนินการดังกล่าวด้วยแล้ว ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๔/๓๒๗๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๕. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์สัตว์ฯ โดยใช้จากเงินประกันสัญญาของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ ๖. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว นำส่งเอกสารประกอบการแจ้งเป็นผู้ทำงานของกิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ ๖๘๙ มายังองค์การสวนสัตว์ ฯ เพื่อจัดส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาเป็นผู้ทำงาน ตามหนังสือเลขที่ ทส ๑๑๑๒/๘๙๙ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔	๑. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไปควรเช็คประวัติบริษัท ผู้รับจ้างและสถานะของบริษัท ๒. กรณีได้รับรับจ้างมาแล้ว คณะกรรมการควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานควรดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่แบ่งตามสัญญา ๓. หากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา ควรเชิญผู้รับจ้างมาร่วมประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกัน และควรมีรายงานการประชุมเพื่อให้รับรู้ทั้ง ๒ ฝ่าย ๔. หากยังดำเนินการล่าช้า สวนสัตว์ต้องดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยออกหนังสือเป็นหลักฐาน ทุกครั้ง

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	๗. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นำส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงการคลัง แจ้งให้ กิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ ๖๘๙ เป็นผู้ทำงานตามหนังสือเลขที่ ทส ๑๑๐๑/๑๐๗๖ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ๘. ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลัง ยังไม่มีหนังสือตอบกลับแจ้งให้เป็นผู้ทำงาน	
๒. ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆภายใต้โครงการความร่วมมือการเพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆร่วมกับภาชีเพื่อรองรับและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร - วงเงิน ๑๘.๘๙๒ ล้านบาท - เบิกจ่ายแล้ว ๔.๗๒๓ ล้านบาท - คงเหลือ ๑๔.๑๖๙ ล้านบาท โดยกิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ ๖๘๙	๑. สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนำส่งรายงานการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์ฯ ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๑๒/๔๕๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒. บริษัทฯ ทำหนังสือขออุทธรณ์การบอกเลิกสัญญา และขอสงวนสิทธิ์หลักประกันสัญญา ตามหนังสือเลขที่ ๓๘/๒๕๖๒.๒๐๒๑๐๔.๐๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๓. สำนักการเงินและทรัพย์สิน มีหนังสือที่ ทส ๑๑๐๔/๓๑๔๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้สำนักกฎหมายพิจารณาการขออุทธรณ์การบอกเลิกสัญญาและขอสงวนสิทธิ์หลักประกันสัญญา ๔. สำนักกฎหมายพิจารณา ให้ยืนยันการริบหลักประกันสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆ โดยองค์การสวนสัตว์ฯ ได้แจ้งให้บริษัทฯ รับทราบการยืนยันการริบหลักประกันตามหนังสือองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ที่ ทส ๑๑๐๑/๗๗๒ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๕. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้รับหลักประกันสัญญาตาม ระเบียบฯ ซึ่งทางธนาคารกรุงไทย ได้นำส่งเงินหลักประกันสัญญาให้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเรียบร้อยแล้ว ๖. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว นำส่งเอกสารประกอบการแจ้งเป็นผู้ทำงานของ กิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ ๖๘๙ มายังองค์การสวนสัตว์ ฯ เพื่อจัดส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาเป็นผู้ทำงาน ตามหนังสือเลขที่ ๑๑๑๒/๘๙๗ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๗. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นำส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงการคลัง แจ้งให้ กิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ ๖๘๙ เป็นผู้ทำงานตามหนังสือเลขที่ ทส ๑๑๐๑/๑๐๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ๘. ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลัง ยังไม่มีหนังสือตอบกลับแจ้งให้เป็นผู้ทำงาน	๑. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไปควรเช็คประวัติบริษัทผู้รับจ้างและสถานะของบริษัท ๒. กรณีได้รับรับจ้างมาแล้ว คณะกรรมการควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานควรดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่แบ่งตามสัญญา ๓. หากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา ควรเชิญผู้รับจ้างมาร่วมประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกันและควรมีรายงานการประชุมเพื่อให้รับรู้ทั้ง ๒ ฝ่าย ๔. หากยังดำเนินการล่าช้า สวนสัตว์ต้องดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยออกหนังสือเป็นหลักฐานทุกครั้ง

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
สวนสัตว์สงขลา ๑. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณน้ำตกสวนตุล ภายในสวนสัตว์สงขลา - วงเงิน ๓๘.๐๐๐๐ ล้านบาท - โดยบริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด	๑. องค์การสวนสัตว์ฯ ทำหนังสือแจ้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์และบอกเลิกสัญญา ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๑๓ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ๒. บริษัทฯ ได้ขอคัดค้านการบอกเลิกสัญญา ตามหนังสือเลขที่ CHR ๒๕๖๓/๐๑๐๒๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ๓. องค์การสวนสัตว์ฯ ได้ให้บริษัทชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๑๑๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๔. บริษัทฯ ทำหนังสือชี้แจงกลับบองค์การฯ ตามหนังสือเลขที่ CHR ๒๕๖๔/๐๒๐๕๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๕. องค์การสวนสัตว์ฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงได้ทำหนังสือแจ้งกระทรวงการคลัง ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด เป็นผู้ทำงาน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากการกระทรวงการคลัง ๖. บริษัทฯ กรุงไทย จำกัด ชำระเงินตามสัญญาค้ำประกันของ บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด ฐานะลูกหนี้ร่วมให้สวนสัตว์สงขลาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คจำนวน ๑,๙๔๐,๐๐๐ บาท ๗. องค์การสวนสัตว์ฯ มีหนังสือที่ ทส ๑๐๑๑/๑๕๐๘ ลว. ๒๘ ธ.ค.๒๕๖๔ สอบถามผลการพิจารณา ให้บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด เป็นผู้ทำงานซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลังยังไม่มีหนังสือตอบกลับแจ้งให้เป็นผู้ทำงาน	๑. ควรมีการสำรวจสภาพพื้นที่ภายในสวนสัตว์ ก่อนการออกแบบและเสนอของบประมาณ ๒. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไปควรเช็คประวัติบริษัทผู้รับจ้างและสถานะของบริษัท ๓. กรณีได้รับรับจ้างมาแล้ว คณะกรรมการควบคุมงานคณะกรรมการตรวจรับงานควรดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่แบ่งตามสัญญา ๔. หากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา ควรเชิญผู้รับจ้างมาร่วมประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกันและควรมีรายงานการประชุมเพื่อให้รับรู้ทั้ง ๒ ฝ่าย ๕. หากยังดำเนินการล่าช้า สวนสัตว์ต้องดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยออกหนังสือเป็นหลักฐานทุกครั้ง

๓.๒ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ มีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๑. ปรับปรุงอาคารสำนักงานสนาม งบประมาณ ๑.๒๐ ล้านบาท	ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว	
๒. ก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ และตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบพร้อมก่อสร้างเรือนเพาะขยายพันธุ์ งบประมาณ ๕.๘๕ ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว	
๓. ก่อสร้างถนนชั่วคราวแล้วรอบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ งบประมาณ ๘.๖๖ ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว	
๔. ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดปทุมธานี ในการสร้างสะพานบริเวณทางเข้าพื้นที่สวนสัตว์แห่งใหม่	อยู่ระหว่างดำเนินการได้ร้อยละ ๙๖ คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕	
๕. ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๖.๘๒๕๑ ลบ. จำนวน ๖ งวดงาน - งบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๖.๐๐๐๐ ลบ. - งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๐.๘๒๕๑ ลบ.	๑. เบิกจ่ายงวดที่ ๑-๓ แล้ว จำนวน ๔๔.๐๔๗๕ ลบ. โดยใช้จาก งบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๖.๐๐๐๐ ลบ. งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๘.๐๔๗๕ ลบ. ๒. งานงวดที่ ๔ อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน จากคณะกรรมการ	เร่งรัดให้คณะกรรมการทุกชุดตรวจสอบ และสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ จังหวัดปทุมธานี

๑. ปรับปรุงอาคารสำนักงานสนาม งบประมาณ ๑.๒๐ ล้านบาท (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)



๒. ก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ และตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบพร้อมก่อสร้างเรือนเพาะขยายพันธุ์ งบประมาณ ๕.๘๕ ล้านบาท (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)



๓. งานก่อสร้างถนนชั่วคราวและรั้วรอบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

การดำเนินการ

บริษัท คัพเวอร์เทค จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ก่อสร้างถนนชั่วคราวและรั้วรอบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ เรียบร้อยแล้ว งานรั้วชั่วคราวระยะ ๓,๕๐๐ เมตร วงเงินรวมทั้งสิ้น ๘,๖๖๐,๐๐๐ บาท

ด้านทิศเหนือ



ด้านทิศใต้



ด้านทิศตะวันออก



ด้านทิศตะวันตก



๔. งานที่ได้รับการสนับสนุนจาก จ.ปทุมธานี

- งานก่อสร้างสะพานทางข้าม ดำเนินการได้ร้อยละ ๙๖



ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่องเดิม

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๘๐๖.๓๑๓๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑. งบอุดหนุน จำนวน ๔๙๑.๖๗๐๓ ล้านบาท

๒. งบลงทุน จำนวน ๓๑๔.๖๔๒๗ ล้านบาท

การดำเนินงาน

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ได้เบิกจ่ายงบอุดหนุนรัฐบาล ได้ครบทุกรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับงบลงทุน เบิกจ่ายจำนวน ๑๔๘.๔๑๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๑๗ และได้กักเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑๖๖.๒๓๐๕ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑.๑ ครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ จำนวน ๕.๑๐๖๐ ล้านบาท

๑.๒. สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ ประกอบด้วย

๑.๒.๑ ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ จำนวน ๑๐๒.๗๗๗๖ ล้านบาท

๑.๒.๒ ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมี จำนวน ๑๑.๔๑๒๕ ล้านบาท
ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

๑.๒.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์และอัตลักษณ์บริเวณส่วน จำนวน ๙.๓๑๕๖ ล้านบาท
จัดแสดงสัตว์แอฟริกา สวนสัตว์นครราชสีมา

๑.๒.๔ ปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว จำนวน ๖.๒๕๐๐ ล้านบาท
(Welcome Center) สวนสัตว์อุบลราชธานี

๑.๒.๕ ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัสและส่วน จำนวน ๑๗.๓๖๘๘ ล้านบาท
แสดงจระเข้ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี

๑.๒.๖ ก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวิน จำนวน ๓.๖๕๐๐ ล้านบาท
ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น

๑.๒.๗ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน ๑๐.๓๕๐๐ ล้านบาท
ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น

๒. ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี ๒๕๖๔ ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คงเหลืออีก ๒ รายการ คือ

๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์

๒.๒ ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

ข้อเสนอเพื่อทราบ

เพื่อโปรดทราบ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ยังมีรายการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ซึ่งได้แก่ รายการค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ และรายการค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 2564



ข้อมูล ณ 28 ก.พ.65

- ส่วนกลาง 1. ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่ สัญญาสิ้นสุด 24 พ.ค. 2565 มี 6 งวดงาน
เบิกจ่ายแล้ว 1-3 งวดงาน จำนวน 8,047.5 ลบ.
กันเหลื่อมปีงวดที่ 4-6 เป็นเงินจำนวน 102,777.6 ลบ.
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ สัญญาสิ้นสุด 16 ธ.ค. 2564 กันเหลื่อมปี จำนวน 5,106.0 ลบ.
เบิกจ่ายถึงเดือน ม.ค. 2565 จำนวน 3,326 ลบ คงเหลือ 1,780.0 ลบ.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

เลขที่สัญญาจ้าง	๑๑/๒๕๖๔ วงเงิน ๑๔๖,๘๒๕,๑๐๐ บาท งบปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๐,๘๒๕,๑๐๐ บาท
ระยะเวลาดำเนินการ	๕๔๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ผู้รับจ้าง	บริษัท ดีไซน์+วิเวลลอป จำกัด

การดำเนินงาน

๑. งานงวดที่ ๑ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีการเบิกจ่ายแล้วเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๗,๓๔๑,๒๐๐ บาท

๑.๑ แบบแนวความคิดหลัก (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A ๑ จำนวน ๓ ชุด
๑.๒ แบบแนวความคิดหลัก (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A ๑ จำนวน ๑๐ ชุด
๑.๓ แบบแนวความคิดหลัก (ปิดบนกระดาษแข็ง)	ขนาด A ๑ จำนวน ๑ ชุด
๑.๔ แบบแนวความคิดหลัก (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A ๓ จำนวน ๓ ชุด
๑.๕ แบบแนวความคิดหลัก (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A ๓ จำนวน ๑๐ ชุด
๑.๖ รายงานเบื้องต้น (Inception Report) (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A ๓ จำนวน ๓ ชุด
๑.๗ รายงานเบื้องต้น (Inception Report) (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A๓ จำนวน ๑๐ ชุด

๒. งานงวดที่ ๒ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีการเบิกจ่ายแล้วเมื่อกันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๑๔,๖๘๒,๕๑๐ บาท

๒.๑ แบบร่างขั้นต้น (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A๓	จำนวน ๓ ชุด
๒.๒ แบบร่างขั้นต้น (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A๓	จำนวน ๑๐ ชุด

๓. งานงวดที่ ๓ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีการเบิกจ่ายแล้วเมื่อกันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๒๒,๐๒๓,๗๖๕ บาท


๓.๑ แบบร่างขั้นพัฒนา (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A๓	จำนวน ๓ ชุด
๓.๒ แบบร่างขั้นพัฒนา (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A๓	จำนวน ๑๐ ชุด
๓.๓ รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A๔	จำนวน ๕ ชุด
๓.๔ เอกสารแบบรูปรายการและการประมาณราคา เพื่อยื่นของบประมาณ (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A๔	จำนวน ๑ ชุด
๓.๕ เอกสารแบบรูปรายการและการประมาณราคา เพื่อยื่นของบประมาณ (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A๔	จำนวน ๔ ชุด



๔. งานงวดที่ ๔ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานจากคณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน ๔๔,๐๔๗,๕๓๐ บาท ประกอบด้วย

๔.๑ แบบรายละเอียดรายการก่อสร้าง

๔.๒ รายละเอียดประกอบแบบ บัญชีงานก่อสร้าง ราคากลาง ครอบคลุมรวมทุกสาขา

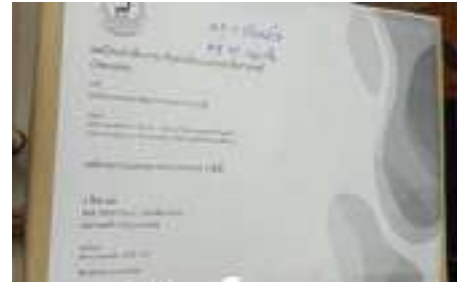

ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจากมีคณะกรรมการ ที่กำกับดูแลหลายชุด และมีความเห็นที่แตกต่างกัน จึงต้องใช้ระยะเวลา ในการสรุป แนวความคิด

แนวทางแก้ไข

เร่งรัดให้คณะกรรมการทุกชุดตรวจสอบและสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินงานรายได้ ค่าใช้จ่าย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

เรื่องเดิม

๑. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เสนอแผนปฏิบัติการด้านการเงิน (เงินนอกงบประมาณ) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

๑.๑ ประมาณการรายได้ จำนวน ๒๙๕.๑๘๒๐ ล้านบาท

๑.๒ ประมาณการรายจ่าย จำนวน ๓๙๓.๖๓๗๖ ล้านบาท

๒. ในคราวประชุมคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีมติที่ประชุมดังนี้

๒.๑ อนุมัติแผนปฏิบัติการด้านการเงิน (เงินนอกงบประมาณ) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๒ อนุมัติให้ใช้เงินสะสมองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จำนวน ๑๘๖.๒๙๐๐ ล้านบาท กรณีเพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานในส่วนที่รายได้ (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่าย และกรณีเกิดรายได้ไม่เป็นไปตามแผน จากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-๑๙

ข้อเท็จจริง

๑. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดทำแผนรายได้ และค่าใช้จ่ายแยกเป็นรายเดือน โดยผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้อนุมัติแผนรายได้ และค่าใช้จ่าย เพื่อให้สำนัก สวนสัตว์ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้มีรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านการเงิน

๒. รายงานงบการเงินได้ผ่านการสอบทานจากสำนักตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕

ผลการดำเนินงาน

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ขอรายงานผลการดำเนินงาน รายได้ ค่าใช้จ่าย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประกอบด้วย


	แผน	ผล	สูง (ต่ำ) กว่าแผน	หน่วย : ล้านบาท
๑. รายได้	๑๙.๒๒	๒๐.๘๕	๑.๖๓	
๒. รายจ่าย	๖๓.๔๗	๖๒.๔๓	(๑.๐๔)	
(ค่าใช้จ่าย งบรัฐบาล+องค์การ)				

ข้อเสนอเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานรายได้ ค่าใช้จ่าย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

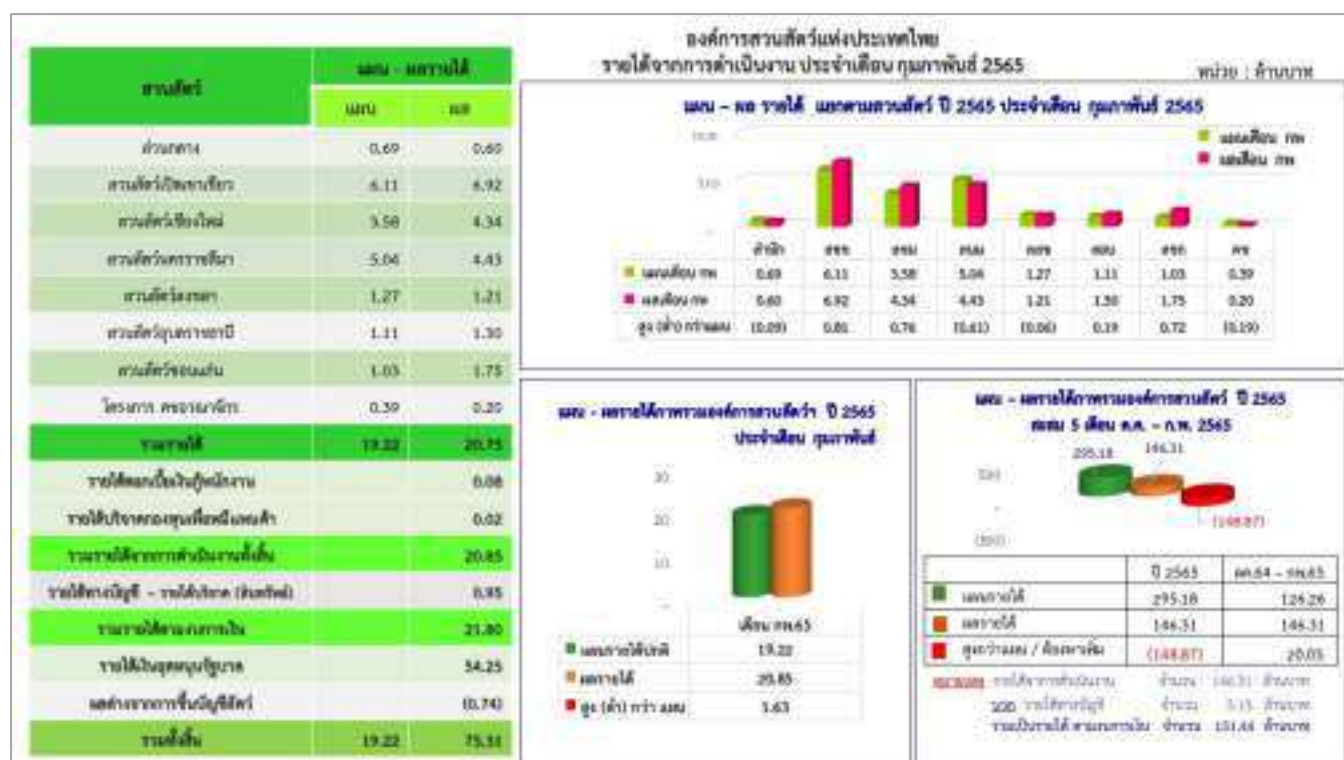


๔.๔ รายงานผลการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
แบบสะสม ๕ เดือน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

การดำเนินงาน

สวนสัตว์เชียงใหม่ ขอรายงานผลการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แบบสะสม ๕ เดือน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สรุปได้ ดังนี้ (ข้อมูลเบื้องต้น)

รายการ	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	รวม
รายได้ดำเนินงาน	1.161	0.891	2.677	2.555	1.512	8.796
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2.655	2.904	2.907	2.996	2.999	14.461
รายได้ สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	- 1.494	- 2.013	- 0.230	- 0.441	- 1.487	- 4.178
ผู้เข้าชม (คน)	9,896	7,469	22,802	21,698	12,831	74,696

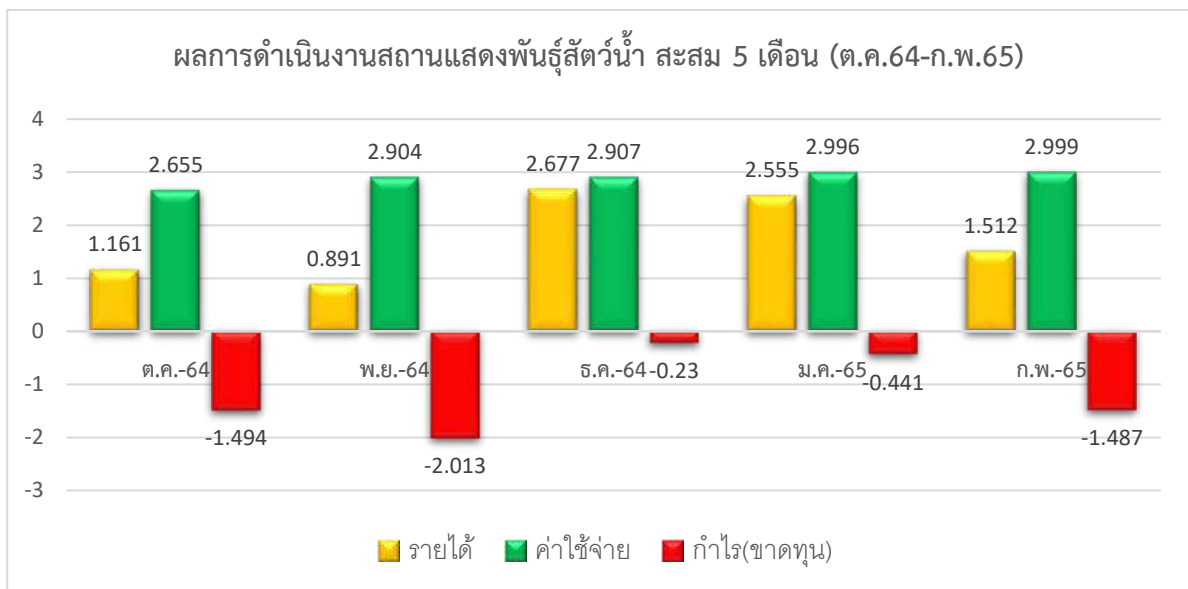

ผลการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ แบบสะสม ๕ เดือน ในภาพรวมมีรายได้ดำเนินงานเกิดขึ้นจำนวน ๘.๗๙๖ ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ที่มาจาก การจองเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานสะสม ๕ เดือน เกิดขึ้นจำนวน ๑๔.๔๖๑ ล้านบาท โดยเฉลี่ยเดือนละ ๓ ล้านบาท (๓๖ ล้านบาทต่อปี) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างเหมา ๗.๔๙๐ ล้านบาท ค่าจ้างบริหาร ๓.๒๑๐ ล้านบาท และค่าไฟฟ้า ๒.๐๘๗ ล้านบาท ค่าอาหารสัตว์น้ำ ๐.๗๑๐ ล้านบาท ค่าก๊าซ LPG ๐.๖๖๓ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๐.๓๐๑ ล้านบาท

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ ผลการดำเนินงานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แบบสะสม ๕ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ข้อมูลเบื้องต้น

มติที่ประชุม

๔.๔ รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่องเดิม

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้รับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับการพิจารณากรอบวงเงินทั้งสิ้น จำนวน ๗๐๘.๐๒๖๕ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑. งบบุคลากร	๑๘๑.๙๓๗๕	ล้านบาท
๒. งบอุดหนุน	๒๒๓.๙๘๒๐	ล้านบาท
๓. งบลงทุน	๓๐๒.๑๐๗๐	ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	<u>๗๐๘.๐๒๖๕</u>	ล้านบาท

การดำเนินงาน

สำนักงานเงินและทรัพย์สิน ได้ดำเนินการรวบรวมแผน และผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวม ๕๔ รายการ วงเงิน ๓๐๒,๑๐๗,๐๐๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย

- | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|------------------------|
| ๑ | ครุภัณฑ์ | จำนวน ๔๑ รายการ | วงเงิน ๓๓,๔๔๕,๑๐๐ บาท |
| | ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๔๐ รายการ | | |
| ๒ | สิ่งก่อสร้าง | จำนวน ๑๓ รายการ | วงเงิน ๒๖๘,๖๖๑,๙๐๐ บาท |
| | ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๑๒ รายการ | | |
- (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

ข้อเสนอเพื่อทราบ

เพื่อโปรดทราบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหมวดรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รายงานสถานภาพตามกระบวนการพัสดุ ของงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2565 จำนวน 13 รายการ



Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ภาพรวม

งบอุดหนุน

งบลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายการ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คิดเป็น (%)	คงเหลือ
1. งบอุดหนุน	405.9195	202.9580	50.00	202.9615
2. งบลงทุน	302.1070	38.0091	12.58	264.0979
* ครุภัณฑ์	33.4451	15.7941	47.22	17.6510
* สิ่งก่อสร้าง	268.6619	22.2150	8.27	246.4469
รวมทั้งสิ้น	708.0265	240.9671	34.03	467.0594

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการดำเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ส่วนกลาง)

ครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ลำดับที่ ๑-๗ ดังนี้

๑. กล้องถ่ายภาพระบบ wifi สำหรับกล้องจุลทรรศน์	งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท
๒. ตู้เก็บบล็อกรพาราฟิน ๒ ตู้	งบประมาณ ๑๔๕,๒๐๐.-บาท
๓. ตู้เก็บแผ่นกระจกสไลด์ ๑ ตู้	งบประมาณ ๘๐,๒๕๐.-บาท
๔. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงในไมโครเพลท	งบประมาณ ๔๐๖,๖๐๐.-บาท
๕. เครื่องตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ	งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.-บาท
๖. เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพในสัตว์	งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐.-บาท
๗. ตู้เย็นแช่น้ำยา	งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐.-บาท
๘. โครงการระบบบริหารจัดการสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (Thai Zoo Ark)	งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด เป็นเงินจำนวน ๗๘๐,๐๐๐ บาท	

อยู่ระหว่างรอผลการอุดหนุน ๑ รายการ ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-ticket)
งบประมาณ ๘,๔๔๔,๘๐๐.-บาท ขณะนี้ได้ผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้แก่ บริษัท คลิเน็กซ์ จำกัด
ในวงเงินงบประมาณจำนวน ๖,๙๘๐,๐๐๐ บาท และอยู่ระหว่างรอผลการอุดหนุน ๗ วัน สิ้นสุดในวันที่
๔ มีนาคม ๒๕๖๕

งบประมาณปี ๒๕๖๕

เครื่องปั่นเหวี่ยงฮีมาโตคริต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ๑ เครื่อง

เลขที่สัญญาจ้าง

ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้ขาย

การดำเนินงาน

๓/๒๕๖๕ วงเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

เริ่มสัญญา ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

บริษัท กิ๊ปไทย จำกัด

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว



เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วรอบต่ำ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ๑ เครื่อง

เลขที่สัญญาจ้าง

ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้ขาย

การดำเนินงาน

๒/๒๕๖๕ วงเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

เริ่มสัญญา ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

บริษัท กิ๊ปไทย จำกัด

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว



ตู้แช่แข็ง -๔๐ องศาเซลเซียส สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ๑ เครื่อง

เลขที่สัญญาจ้าง

๑/๒๕๖๕ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มสัญญา ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

ผู้ขาย

บริษัท กิ๊ปไทย จำกัด

การดำเนินงาน

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว



เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบทศนิยม ๓ ตำแหน่ง สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ๑ เครื่อง

เลขที่สัญญาจ้าง

๔/๒๕๖๕ วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มสัญญา ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

ผู้ขาย

บริษัท กิ๊ปไทย จำกัด

การดำเนินงาน

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว



งบประมาณปี ๒๕๖๕

งานก่อสร้างปรับปรุงถนนแนวรั้ว และสิ่งอำนวยความสะดวก ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

เลขที่สัญญาจ้าง ๗/๒๕๖๕ วงเงินก่อสร้าง ๒๙,๙๑๕,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มทำงานวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ หหมดสัญญาจ้าง วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๒๔๐ วัน
ผู้รับจ้าง บริษัท พี.เอ.ไอ ซัพพลาย จำกัด
การดำเนินงาน แบ่งงานออกเป็น ๗ งวด
รายงานตั้งแต่ วันที่ ๒๕-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

งานงวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท

กำหนดส่งมอบงาน งวดที่ ๑ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

กรรมการอยู่ระหว่าง ส่งมอบงาน ตามที่ผู้รับจ้างส่ง งานงวด ๑

งวดที่ ๑ การดำเนินงานแล้ว ๖๕%

งานปรับปรุงลานจอดรถบริเวณหน้าประตูทางเข้าถึงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

งานรื้อถอนพร้อมปรับพื้นที่



งานขอบคันหิน+สนามหญ้า



งานพื้นแอสแตมป์คอนกรีตพิมพ์ลาย (ลายพื้นทางเดิน)



กรรมการประชุมติดตามงานกับผู้รับจ้าง



ปัญหาและอุปสรรค

ผู้รับจ้างดำเนินการงานล่าช้า กว่ากำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง ทางคณะกรรมการนัดประชุมติดตามงานก่อสร้างทั้งปัญหาและแนวทางแก้ไข พร้อมทำหนังสือเร่งรัดการทำงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างให้กับทางผู้รับจ้างรับทราบ

ผู้รับจ้างชี้แจงว่าพบปัญหา เนื่องจาก มีระบบสายไฟฟ้าแรงสูง สายแลน ใต้ดินที่ใช้งานอยู่ ทำให้เครื่องจักรขุดดินฐานราก ทำงานยาก งานจึงล่าช้าแผนที่วางไว้และจะดำเนินงาน งวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ทางคณะกรรมการแจ้งผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินงานงวดที่ ๒ ให้เสร็จเร็วกว่านี้

งบประมาณปี ๒๕๖๕

งานก่อสร้างเตาเผาซากสัตว์ปลอดมลพิษพร้อมปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

เลขที่สัญญาจ้าง	๖/๒๕๖๕ วงเงินก่อสร้าง ๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท
ระยะเวลาดำเนินการ	เริ่มทำงานวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ หหมดสัญญาจ้าง วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๑๕๐ วัน
ผู้รับจ้าง	บริษัท ทิมเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
การดำเนินงาน	แบ่งงานออกเป็น ๒ งวด
รายงานตั้งแต่	วันที่ ๒๕ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
งวดที่ ๑	เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๗๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงาน งวดที่ ๑ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๕%

งานก่อสร้างอาคารเตาเผาซากสัตว์ปลอดมลพิษ

- งานติดตั้งวัสดุผนังหลังคา



- งานติดตั้งผนัง



- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่าง



- งานติดตั้งระบบสุขาภิบาล รางรับน้ำฝน



- งานนำวัสดุงวดที่ ๒ เข้าหน้างาน (เตาเผาซากสัตว์)



ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มี

สวนสัตว์เชียงใหม่

งานปรับปรุงอาคารฝ่ายอนุรักษ์และวิจัย พร้อมอาคารอนุบาลลูกสัตว์ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

ระยะเวลาดำเนินงาน : ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน (๑ พ.ย.๖๔+๒๙ เม.ย.๖๕)

สถานะการดำเนินงาน : แบ่งงานออกเป็น ๓ งาน

งานที่ ๑ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างงานงานที่ ๒ ดำเนินการมุงหลังคาเมทัลชีท และขึ้นโครงสำหรับติดตั้งฝ้าเพดาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของปริมาณงานทั้งหมด



ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มี

งบประมาณปี ๒๕๖๕
งานก่อสร้างโครงข่ายท่อน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสีย

เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

ระยะเวลาดำเนินงาน : ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

สถานะการดำเนินงาน : แบ่งงานออกเป็น ๑๐ งาน ขณะนี้อยู่ระหว่างงานงวดที่ ๑ ผู้รับจ้างเริ่มเข้างานสำรวจพื้นที่ และล้อมพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันอันตราย



ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มี

๒. ครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

๒.๑ ซื้อเครื่องอัลตราซาวด์แบบพกพาสำหรับสัตว์ป่า จำนวน ๑ เครื่อง

วงเงิน/สัญญา (บาท)	งวดงาน (จำนวน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วันที่ เริ่มสัญญา	วันที่ สิ้นสุดสัญญา	สถานะ
๑,๔๕๓,๒๐๐.-	๑ งวด	๑๒๐ วัน	๒๑ ต.ค. ๖๔	๑๘ ก.พ ๖๕	- ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๒.๒ ซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล พร้อมเครื่องเอกซเรย์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง

วงเงิน/สัญญา (บาท)	งวดงาน (จำนวน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วันที่ เริ่มสัญญา	วันที่ สิ้นสุดสัญญา	สถานะ
๑,๗๘๘,๐๐๐.-	๑ งวด	๑๒๐ วัน	๒๙ ต.ค. ๖๔	๒๖ ก.พ ๖๕	- ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๒.๓ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (cab)

วงเงิน/สัญญา (บาท)	งวดงาน (จำนวน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วันที่ เริ่มสัญญา	วันที่ สิ้นสุดสัญญา	สถานะ
๖๔๔,๐๐๐.-	๑ งวด	๖๐ วัน	๑๒ ต.ต ๖๔	๑๑ ธ.ค. ๖๔	- ดำเนินการส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้วและขออนุมัติเบิกเงินไปยัง อสส.



๒.๒ ซื้อถังเก็บน้ำบนดิน โพลีเมอร์ ขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร สวนสัตว์เชียงใหม่ ๑๐ ใบ

วงเงิน/ซื้อ (บาท)	งวดงาน (จำนวน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วันที่ เริ่มสัญญา	วันที่ สิ้นสุดสัญญา	สถานะ
๗๗,๐๐๐.-	๑ งวด	๗ วัน	๗ ต.ต ๖๔	๑๓ ต.ต ๖๔	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว



๒.๓ ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๔๘,๐๐๐ บีทียู สำหรับคอกกักหมัแพนด้า

วงเงิน/ซื้อ (บาท)	งวดงาน (จำนวน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วันที่ เริ่มสัญญา	วันที่ สิ้นสุดสัญญา	สถานะ
๖๕,๒๕๐.-	๑ งวด	๓๐ วัน	๗ ต.ต ๖๔	๓๐ พ.ย. ๖๔	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว



งานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
งานก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา

ผู้รับจ้าง บริษัท เอส.ยู.แพค. จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ ๐๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
วงเงินสัญญาจ้าง จำนวนเงิน ๙,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เริ่มดำเนินการ
งาน ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕ งวด จำนวน ๒๔๐ วัน
ผลการดำเนินงาน งวดที่ ๑ ดำเนินงานเข้าพื้นที่เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

งวดที่ ๑ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท

งวดที่ ๒ อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๔๘ วัน (นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
และอยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๒ รายละเอียดดังนี้

การดำเนินงานงวดที่ ๒ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

- | | | |
|---|-----------|-----|
| ๑. งานวางท่อระบายน้ำขนาด ๒.๑๐ x ๒.๑๐ ม. | แล้วเสร็จ | ๖๐% |
| ๒. งานปรับปรุงพื้นลานคอนกรีต | แล้วเสร็จ | ๐% |



ปัญหาและอุปสรรค

มีแรงงานในการดำเนินการไม่เพียงพอ

แนวทางแก้ไข

คณะกรรมการ กำลังทำหนังสือเร่งรัดงานงวดที่ ๒

งานก่อสร้างอาคารผู้ล่าภายในสวนสัตว์นครราชสีมา

ผู้รับจ้าง บริษัท เอส.ยู.แพค. จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วงเงิน สัญญาจ้าง จำนวนเงิน ๒๔,๙๗๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เริ่มดำเนินงาน ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕ งวด จำนวน ๒๔๐ วัน

ผลการดำเนินงาน งวดที่ ๑ ดำเนินงานเข้าพื้นที่เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๗๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ระยะเวลา ดำเนินการ ๔๘ วัน (นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ดังรายการต่อไปนี้

การดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๑.๑ งานปรับพื้นที่ส่วนแสดงสิงโต	แล้วเสร็จ	๑๐๐%
๑.๒ งานขุดดิน คูน้ำกันสัตว์ส่วนแสดงสิงโต	แล้วเสร็จ	๑๐๐%
๑.๓ งานขุดดินฐานรากคอกกักสิงโต	แล้วเสร็จ	๑๐๐%
๑.๔ งานเทคอนกรีตฐานรากคอกกักสิงโต	แล้วเสร็จ	๑๐๐%
๑.๕ งานผูกเหล็กพื้นคูน้ำกันสัตว์ส่วนแสดงสิงโต	แล้วเสร็จ	๑๐๐%
๑.๖ งานเทคอนกรีตพื้นคูน้ำกันสัตว์ส่วนแสดงสิงโต	แล้วเสร็จ	๑๐๐%



ปัญหาอุปสรรค : เกิดความล่าช้าเนื่องจาก กก.ตรวจรับงานวันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๕ บางรายการไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการ สนม ส่งเอกสารแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขงาน ผู้รับจ้างจะดำเนินการแก้ไขงานให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑ มี.ค. ๖๕ และกก จะดำเนินการตรวจรับงวดที่ ๑ วันที่ ๒ มี.ค. ๖๕

แนวทางแก้ไข : คณะกรรมการควบคุมงานได้เข้าไปควบคุมและกำกับอย่างเคร่งครัด

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

สวนสัตว์สงขลา

ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๖ รายการ

ครุภัณฑ์ รายการที่ ๑ รถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

ผู้ขาย บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ครอบ
กำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนาม ๑,๓๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพัน
บาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. ๑๑๑๕/๑๓๒๓ ลว. ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔



ครุภัณฑ์ รายการที่ ๒ เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพสำหรับสัตว์ จำนวน ๑ เครื่อง

ผู้ขาย ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง สัญญาเลขที่ ๐๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครอบกำหนดส่งมอบ ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนาม ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. ๑๑๑๕/๖๙ ลว. ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

ครุภัณฑ์ รายการที่ ๓ คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด

ผู้ขายร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง สัญญาเลขที่ ๐๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครอบกำหนดส่งมอบ ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนาม ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. ๑๑๑๕/๖๘ ลว. ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕



ครุภัณฑ์ รายการที่ ๔ เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า

ผู้ขาย ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง สัญญาเลขที่ ๐๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครอบกำหนดส่งมอบ ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนาม ๘๙,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. ๑๑๑๕/๗๑ ลว. ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕



ครุภัณฑ์ รายการที่ ๕ เครื่องติดตามและบันทึกค่าคาร์บอนไดออกไซด์ทางเดินหายใจ แบบแมนสตริม จำนวน ๑ เครื่อง

ผู้ขาย ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง สัญญาเลขที่ ๐๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครอบกำหนดส่งมอบ ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนาม ๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. ๑๑๑๕/๗๐ ลว. ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕



ครุภัณฑ์ รายการที่ ๖ เครื่องบันทึกและติดตาม ปริมาณความอึดตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจรสำหรับสัตว์ จำนวน ๑ เครื่อง

ผู้ขาย ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง สัญญาเลขที่ ๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครอบกำหนดส่งมอบ ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนาม ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. ๑๑๑๕/๗๒ ลว. ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕



สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ

๑. งานปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรแสงวิศวกรรม ในวงเงิน ๓๐,๓๖๗,๔๔๐.๗๓ บาท (สามสิบล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว กำหนดให้ผู้รับจ้าง เริ่มงานวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ และครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จในสัญญาวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวนงวดงาน ๙ งวด

ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มงานวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ และครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จในสัญญาวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๗๐ วัน

จำนวนงวดงาน ๙ งวด

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรแสงวิศวกรรม

ผลการดำเนินงาน

งวดที่ ๑ ระยะเวลาดำเนินงาน ๔๕ วัน (วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕)

ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

๑.๑ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารเตาเผาซาก ประกอบด้วย

- งานเตรียมการก่อสร้าง ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๓๐ %



- งานฐานราก , งานเสาตอม่อ , งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ ๑ , งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก , ชั้นที่ ๑ . งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ ๑ - ชั้นหลังคา , งานคานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นระดับหลังคาคอนกรีต + ชั้นวางถังน้ำ , งานพื้นชั้นระดับหลังคาคอนกรีต + ชั้นวางถังน้ำ และงานฐานรับถังบำบัดน้ำเสีย , งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จ ๐ %

๑.๒ งานโครงสร้างอาคารพยาบาลสัตว์ป่วย (บน) ประกอบด้วย

- งานเตรียมการก่อสร้างทั้งหมด + งานรื้อถอน , งานฐานราก , งานเสาตอม่อ , งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ ๑ , งานพื้นชั้นล่าง , งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นที่ ๑ , งานเสาเหล็กรูปพรรณ ชั้นที่ ๑ , งานโครงสร้างหลังคา ๑ (ปรับปรุง), งานโครงสร้างหลังคา TRUSS แล้วเสร็จ ๑๐๐ %



งวดที่ ๒ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน (วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

๒.๑ งานสถาปัตยกรรม อาคารชั้นสูตรซากและเตาเผาซาก ประกอบด้วย

- งานมุงหลังคา ASAPVC , งานก่อสร้างฉาบผนัง ,งานฝ้าเพดาน ,งานวัสดุผิวพื้น , งานวัสดุผนัง , งานบัวเชิงผนัง ,งานประตู – หน้าต่าง ,งานรายการสุขภัณฑ์ ซาย – หญิง แล้วเสร็จ ๐ %

๒.๒ งานสถาปัตยกรรม อาคารพยาบาลสัตว์ป่วย ประกอบด้วย

- งานวัสดุมุงหลังคา ASAPVC,หลังคาแผงลวดตาข่าย ๑ นิ้ว ,งานวัสดุผิวพื้น แล้วเสร็จ ๐%

- งานวัสดุผนัง แล้วเสร็จ ๘๕ %

- งานประตู - หน้าต่าง ,งานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ,งานทาสี แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ ๐ %



งวดที่ ๓ ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๐ วัน (วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕)

ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

๓.๑ ระบบไฟฟ้าและสื่อสารอาคารชั้นสูตรซากและเตาเผาซากประกอบด้วย

- งานแผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน (MDB) ,งานสายไฟและท่อ,รางเดินสายไฟฟ้าระบบเมน,ติดตั้งเครนยก ๕ ตัน ,ติดตั้งระบบทำความเย็น ,ติดตั้งเตาเผา,ติดตั้งกล่องวงจรปิด ,วางระบบประปา + สุขาภิบาลและระบบบำบัดน้ำเสีย

๓.๒ ระบบไฟฟ้าและสื่อสารอาคารพยาบาลสัตว์ป่วย ประกอบด้วย

- งานแผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ ,งานสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๐ %

- ท่อรางเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๔๐ %



- ระบบเมนสายไฟฟ้า ,ติดตั้งโคมไฟสวิตช์และเต้ารับ ,ติดตั้งระบบกล่องวงจรปิด แล้วเสร็จ ๐ %
- ระบบประปา + สุขาภิบาลและระบบบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ ๔๐ %
- ติดตั้งระบบปรับอากาศ และงานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ ๐ %



งวดที่ ๔ ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๐ วัน (วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕) ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

๔.๑ งานภูมิทัศน์ อาคารชั้นสุตรซากและเตาเผาซาก ประกอบด้วย

- งานถนนทางเข้าอาคารชั้นสุตรซากและเตาเผาซาก พื้นที่โดยประมาณ ๔๑๒ ตารางเมตร

แล้วเสร็จ ๐ %

- งานถนนด้านหน้าทางเข้าอาคารชั้นสุตรซากและเตาเผาซาก พื้นที่โดยประมาณ ๑๑๕ ตารางเมตร แล้วเสร็จ ๐ %
- งานรั้วโดยรอบอาคารชั้นสุตรซาก แล้วเสร็จ ๐ %

๔.๒ งานโครงสร้างวิศวกรรม (อาคารกักกันโรคสัตว์)

- งานเตรียมการก่อสร้างรื้อถอน, งานฐานราก แล้วเสร็จ ๑๐๐ %



บันไดลงอาคารกักกันโรค



- งานฐานรากถึงบำบัดน้ำเสีย + ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป + ถังเซต ,งานถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ,งานเสาต่อม่อ ,งานคานคอดิน ,งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ ๑,งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ ๑,งานกระเบื้องดิน ,งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ ๑,งานเสาเหล็กรูปพรรณ ชั้นที่ ๑ **แล้วเสร็จ ๐ %**
- งานโครงสร้างหลังคา (ปรับปรุง) ,งานโครงสร้างหลังคา TRUSS A , TRUSS B , TRUSS C , งานทาสี **แล้วเสร็จ ๘๐ %**



งวดที่ ๕ ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๐ วัน (วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

๕.๑ งานสถาปัตยกรรม (อาคารกักกันโรคสัตว์)

- งานมุงหลังคา ASAPVC ,งานผนัง ,งานประตู - หน้าต่าง ,งานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ,งานทาสีผนัง ,งานระบบไฟฟ้า แฉงย้อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ ,งานเดินสายไฟฟ้าและระบบเมน ระบบกล้องวงจรปิด ,ระบบประปา ,ระบบสุขาภิบาล และเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ**แล้วเสร็จ ๐ %**

๕.๒ งานโครงสร้างวิศวกรรม อาคารโรงพยาบาลสัตว์และสำนักงานส่วนแยก

- งานเตรียมการก่อสร้าง (ทั้งหมด) **แล้วเสร็จ ๑๐๐ %**
- งานรื้อถอนโรงพยาบาล(เดิม) **แล้วเสร็จ ๘๐ %**
- งานฐานราก **แล้วเสร็จ ๑๐๐ %**
- งานเสาต่อม่อ **แล้วเสร็จ ๑๐๐ %**
- งานคานคอดิน **แล้วเสร็จ ๑๐๐ %**
- งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๑,งานพื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ ๑ **แล้วเสร็จ ๕๐ %**
- งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ ๑ – ชั้นหลังคา **แล้วเสร็จ ๓๐ %**





ซ่อมหลังคาอาคารโรงพยาบาลสัตว์

อาคารส่วนต่อเติม



อาคารส่วนแยก

งานโครงสร้างอาคารส่วนแยกเข้าแบบผูกเหล็กคานพื้น



ปัญหาและอุปสรรค

๑. เนื่องจากผู้รับจ้างได้เริ่มสัญญาในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนทำให้การทำงานการเตรียมการก่อสร้าง ถมดิน (ปรับพื้นที่) อาคารเตาเผาซาก ไม่สามารถกระทำได้นี้เนื่องจากการขนส่งวัสดุเข้าหน้างานจะต้องรอให้ฝนหยุดตก ทางเข้าหน้างานรถสามารถเข้าหน้างานได้ซึ่งงานดังกล่าวอยู่ในงวดที่ ๑

๒. งานอาคารสัตว์ป่วย หลังจากผู้รับจ้างเข้าทำงานเมื่อเปิดพื้นที่หน้างานพบก้อนหินขนาดใหญ่ซึ่ง ไม่สามารถดำเนินการตามรูปแบบรายการได้ ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ทำเรื่องปรึกษาหารือไปยังผู้ออกแบบ ดังนั้นต้องใช้ระยะเวลาทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานได้

๓. เกิดข้อขัดแย้งระหว่างแบบและรายการ ทำให้ไม่สามารถทำงานตามรูปแบบและรายการได้ ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ทำเรื่องปรึกษาหารือไปยังผู้ออกแบบ ดังนั้นต้องใช้ระยะเวลาทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานได้

๒. งานปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธุ์สมเสร็จ ภายในสวนสัตว์สงขลา

สัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
วงเงิน ๑๖,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบหกล้านบาทสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มงานวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จในสัญญาวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๗๐ วัน
จำนวนงวดงาน ๗ งวด
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรุ่งก่อสร้าง ๒๐๐๗

ผลการดำเนินงาน

งวดที่ ๑ เบิกเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน ๑,๖๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท

งวดที่ ๒ ดำเนินงานแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างการขออนุมัติเบิกเงินที่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ตามหนังสือที่ ทส.๑๑๑๕/๑๙๘ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๔๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

งวดที่ ๒ ระยะเวลาดำเนินงาน ๔๐ วัน (วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

ผู้รับจ้างปฏิบัติงานงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

- งานอาคารคอกกัก ๔ หน่วย และอาคารคอกกัก ๓ หน่วย แล้วเสร็จ ๑๐๐ %



- งานศาลาชมสัตว์ ๑ หลัง แล้วเสร็จ ๑๐๐ %



- งานขุดให้อาคารสัตว์ ๔ หลัง แล้วเสร็จ ๑๐๐ %



- งานที่หลบแดดฝน ๔ หลัง แล้วเสร็จ ๑๐๐ %



- งานอ่างน้ำคอนกรีต ๔ หน่วย แล้วเสร็จ ๑๐๐ %





- โครงสร้างรับถังน้ำและโครงสร้างรับถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ ๑๐๐ %



งวดที่ ๓ ระยะเวลาดำเนินงาน ๔๐ วัน (วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕)
ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างกำแพง
- งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก อาคารคอกกัก ๔ หน่วยและอาคารคอกกัก ๓ หน่วย แล้วเสร็จ ๙๐ %



- งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก ศาลาชมสัตว์
- งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก ชุมนิให้อาหารสัตว์ ๔ หลัง
- งานโครงสร้างหลังคาเหล็กที่หลบแดดหลบฝน ๔ หลัง
- งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รวากันตก ด้านหน้าส่วนจัดแสดง
- งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กของบังคัสัตว์
- งานโครงสร้างรั้ว Wire mash
- งานโครงสร้างรั้วหินธรรมชาติ

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕

สวนสัตว์อุบลราชธานี

ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ

ครุภัณฑ์ รายการที่ ๑ แผ่นบันทึกภาพเอกซเรย์แบบดิจิตอล ๔ แผ่น

ผู้รับจ้าง บริษัท เจ.เอฟ แอดวาน เมด จำกัด สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๕ เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วงเงินที่ลงนามสัญญา ๒๒๖,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส ๑๑๑๖/๑๓๘๓ ลว. ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔



ครุภัณฑ์ รายการที่ ๒ ชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ๑ ชุด

ผู้รับจ้าง บริษัท เจ.เอฟ แอดวาน เมด จำกัด สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๕ เริ่ม ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนามสัญญา ๑,๖๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์แล้วเสร็จ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส ๑๑๑๖/๑๔๘๘ ลว. ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔



ครุภัณฑ์ รายการที่ ๓ หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ Kva. ๕ เครื่อง

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแม็ค เทคโนโลยี สัญญาเลขที่ ๙/๒๕๖๕ เริ่ม ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนามสัญญา ๗๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์แล้วเสร็จในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

- ขออนุมัติเบิกเงินตามหนังสือเลขที่ ทส๑๑๖/๑๔๑๑ ลว. ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔



ครุภัณฑ์ รายการที่ ๔ กล่องวงจรปิดติดตั้ง ๘ จุด ๖๖ ตัว

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีคอมมูนิเคชั่นเซลล์ แอดเซอร์วิส สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๕ เริ่ม ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ วงเงินที่ลงนามสัญญา ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์แล้วเสร็จในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส ๑๑๖/๑๔๘๘ ลว. ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

ภาพการดำเนินงาน



สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ

งานก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ สวนสัตว์อุบลราชธานี

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

- สวนสัตว์อุบลราชธานี ได้ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ดินสอแสง ก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖,๘๘๘,๐๐๐ บาท ตามประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

- สิ้นสุดการอุทธรณ์ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

- มีผู้ยื่นอุทธรณ์ ๑ ราย บริษัท ไรท์แมน จำกัด

- องค์การสวนสัตว์ฯ ได้นำส่งวินิจฉัยผลการอุทธรณ์ให้กรมบัญชีกลางพิจารณา ตามหนังสือเลขที่ ทส ๑๑๐๑/๑๙ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างรอผลการวินิจฉัยการอุทธรณ์

17/12/64 14:57

สำนักงานบริหารส่วนราชการ



ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ สวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๔๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น

ปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม จำนวน ๑ รายการ ผู้เสนอราคาที่จะชนะการเสนอราคา ได้แก่ ดินสอแสง ก่อสร้าง (ขายส่ง-ขายปลีก-ให้บริการ-ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖,๘๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบหกล้านบาทแปดแสนแปดพันแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายสุภัทร ทองศิริพันธ์)
ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี

<https://procure3.gprocurement.go.th/proc160/web/proc160/proc160>

1/1

ครุภัณฑ์ สวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตู้แช่อาหาร ขนาด ๔๕ คิวบิกฟุต
งบประมาณ ๔๖,๐๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



ตู้แช่อาหาร ขนาด ๓๒ คิวบิกฟุต
งบประมาณ ๒๗,๐๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



เครื่องเป่าใบไม้ ๒ จังหวะ ๓ เครื่อง
งบประมาณ ๓๐,๓๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวี ๑ เครื่อง
งบประมาณ ๕๒,๙๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



ครุภัณฑ์ สวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เครื่องเลเซอร์รักษาแผลสำหรับสัตว์
1 เครื่อง งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ๓ เครื่อง
งบประมาณ ๔๔๔,๒๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า ๒ เครื่อง
งบประมาณ ๗๐,๐๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า สวนสัตว์ขอนแก่น
๒ เครื่อง งบประมาณ ๑๙,๐๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



งานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสัตว์และอาคารประกอบต่างๆ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น

ผู้รับจ้าง บริษัท ขุนพลพัฒนาการ จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ วงเงินสัญญาจ้าง
จำนวนเงิน ๗,๙๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เริ่มดำเนินงาน วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
สิ้นสุดการดำเนินงาน วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ งวด จำนวน ๒๑๐ วัน

ผลการดำเนินงาน

งวดที่ ๑ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายบำรุงสัตว์

๑.๑ งานสถาปัตยกรรม

๑.๑.๑ งานผนังและผิวผนัง	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๑.๑.๒ งานพื้นและผิวพื้น	แล้วเสร็จ ๙๐ %
๑.๑.๓ งานประตู – หน้าต่าง	แล้วเสร็จ ๗๐ %
๑.๑.๔ งานวัสดุผนังหลังคา	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๑.๑.๕ งานฝ้าเพดาน	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๑.๑.๖ งานทาสี	แล้วเสร็จ ๖๐ %
๑.๑.๗ งานอื่นๆ	แล้วเสร็จ ๓๐ %

๑.๒ งานสุขภัณฑ์

แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๑.๓ งานระบบประปา – สุขาภิบาล

แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๑.๔ งานระบบไฟฟ้า

แล้วเสร็จ ๑๐ %

๒. งานก่อสร้างอาคารอาคารเก็บของ

๒.๑ งานสถาปัตยกรรม

๒.๑.๑ งานผนังและผิวผนัง	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๒.๑.๒ งานพื้นและผิวพื้น	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๒.๑.๓ งานประตู – หน้าต่าง	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๒.๑.๔ งานวัสดุผนังหลังคา	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๒.๑.๕ งานทาสี	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๒.๒ งานระบบไฟฟ้า

แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๓. งานก่อสร้างโรงจอดรถ

๓.๑ งานสถาปัตยกรรม

๓.๑.๑ งานพื้นและผิวพื้น	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๓.๑.๒ งานวัสดุผนังหลังคา	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๓.๒ งานระบบไฟฟ้า

แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๔. งานก่อสร้างอาคารอาคารเก็บกล่องเคลื่อนย้ายสัตว์

๔.๑ งานสถาปัตยกรรม

๔.๑.๑ งานผนังและผิวผนัง	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๔.๑.๒ งานพื้นและผิวพื้น	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๔.๑.๓ งานประตู – หน้าต่าง	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๔.๑.๔ งานวัสดุผนังหลังคา แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๔.๑.๕ งานทาสี แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๔.๒ งานระบบไฟฟ้า

แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๕.๑ งานรื้อถอน	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๕.๒ งานโครงสร้าง (เหล็กรูปพรรณ)	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๕.๓ งานสถาปัตยกรรม	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๕.๔ งานระบบไฟฟ้า	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๖. งานก่อสร้างรั้วแนวเขต รพ.สัตว์ ยาว ๗๐๐ เมตร	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๗. งานจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในงานต่อไปเข้าพื้นที่งานก่อสร้าง	



ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
แนวทางแก้ไข –

งานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

งานก่อสร้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวน้ำ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น

ผู้รับจ้าง บริษัท ขุนพลพัฒนาการ จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ ๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ วงเงินสัญญาจ้าง จำนวนเงิน ๑๔,๕๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เริ่มดำเนินงาน ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔ งวด จำนวน ๒๔๐ วัน

ผลการดำเนินงาน งวดที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน งวดที่ ๒

๑. งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมภายในอาคารจัดแสดงแมวน้ำ
 - ๑.๑ งานรื้อถอนหินเทียม พร้อมจัดเก็บวัสดุในพื้นที่สวนสัตว์กำหนดให้ แล้วเสร็จ ๐.๐๐ %
 - ๑.๒ งานรื้อถอนโครงหลังคา พร้อมจัดเก็บวัสดุในพื้นที่สวนสัตว์กำหนดให้ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
 - ๑.๓ งานรื้อถอนชุดหลอดไฟฟ้าพร้อมจัดเก็บวัสดุในพื้นที่สวนสัตว์กำหนดให้ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๒. งานปรับปรุงอาคารแสดงแมวน้ำ (งานโครงสร้าง ส่วนต่อเติม)
 - ๒.๑ งานเชื่อมเหล็กโครงหลังคา พร้อมติดตั้ง แล้วเสร็จ ๘.๐๐ %
๓. งานปรับปรุงอาคารแสดงแมวน้ำ (งานสถาปัตยกรรม และงานระบบส่วนต่อเติม)
 - ๓.๑ งานมุงหลังคา Metal sheet แล้วเสร็จ ๐.๐๐ %
 - ๓.๒ งานผนัง คสล. แต่งผิวเรียบ แล้วเสร็จ ๖.๐๐ %
 - ๓.๓ งานผิวเสา คสล. แต่งผิวเรียบ แล้วเสร็จ ๐.๐๐ %
 - ๓.๔ งานผนัง อลูมิเนียมคอมโพสิต แล้วเสร็จ ๐.๐๐ %
 - ๓.๕ งานผนังกันตกเหล็กฉลุลาย แล้วเสร็จ ๐.๐๐ %
 - ๓.๖ งานผนังกันตกอะคริลิก แล้วเสร็จ ๐.๐๐ %
 - ๓.๗ งานพื้น คสล. ผิวขัดมัน แล้วเสร็จ ๙๐.๐๐ %
 - ๓.๘ งานประตู – หน้าต่าง แล้วเสร็จ ๐.๐๐ %
 - ๓.๙ งานทาสี แล้วเสร็จ ๐.๐๐ %
 - ๓.๑๐ งานม้านั่งไฟเบอร์กลาส แล้วเสร็จ ๐.๐๐ %
 - ๓.๑๑ งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จ ๐.๐๐ %
๔. งานอาคาร souvenir (งานสถาปัตยกรรม)
 - ๔.๑ งานผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
 - ๔.๒ งานผนังฉาบปูนเรียบขัดมัน แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
 - ๔.๓ งานไม้เนื้อแข็ง ๑ ๑/๒ นิ้ว x ๒ นิ้ว แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
 - ๔.๔ งานพื้นผิวปูกระเบื้อง ๑๒ นิ้ว x ๑๒ นิ้ว แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
 - ๔.๕ งานพื้นผิวปูกระเบื้องลายไม้ ๔ นิ้ว x ๑๖ นิ้ว แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
 - ๔.๖ งานพื้นผิวขัดเรียบ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
 - ๔.๗ งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
 - ๔.๘ งานไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
 - ๔.๙ งานทาสี แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๕. งานจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในงวดงานต่อไปเข้าพื้นที่งานก่อสร้าง

สรุป การปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘๐ ตลอดระยะเวลาเริ่มโครงการจนถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕



ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
แนวทางแก้ไข –

งานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
งานก่อสร้างอาคารจระเข้ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น

ผู้รับจ้าง บริษัท ขุนพลพัฒนาการ จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ วงเงินสัญญาจ้าง จำนวนเงิน ๑๔,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เริ่มดำเนินงาน ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔ งวด จำนวน ๒๔๐ วัน

ผลการดำเนินงาน งวดที่ ๑

๑. งานส่วนจัดแสดงเสือโคร่งขาว

๑.๑ งานปรับพื้นที่ - ปักผัง	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๑.๒ งานถมดินปรับระดับโหมตแห้งและงานซ่อมแซมคอกกัก	แล้วเสร็จ ๗๐.๐๐ %
๑.๓ งานก่อสร้างโหมตน้ำ สำหรับสัตว์เล่น	แล้วเสร็จ ๒๕.๐๐ %
๑.๔ งานซุ้มบังแดดฝนและลานหินเทียม	แล้วเสร็จ ๗๕.๐๐ %
๑.๕ งานเครื่องเล่นไม้จริง สำหรับสัตว์	แล้วเสร็จ ๐.๐๐ %
๑.๖ งานอาคารโรงสูบน้ำและระบบกรอง	แล้วเสร็จ ๑๐.๐๐ %
๑.๗ งานน้ำตกเลียนแบบธรรมชาติ	แล้วเสร็จ ๓๕.๐๐ %

๒. งานส่วนจัดแสดงเสือโคร่งอินโดจีน

๒.๑ งานปรับพื้นที่ - ปักผัง	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๒.๒ งานอ่างเล่นน้ำผนังกระจก	แล้วเสร็จ ๖๐.๐๐ %
๒.๓ งานบ่อน้ำดื่ม	แล้วเสร็จ ๐.๐๐ %

๓. งานจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในงวดงานต่อไปเข้าพื้นที่งานก่อสร้าง

สรุป การปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๐ ตลอดระยะเวลาเริ่มโครงการจนถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕




ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
แนวทางแก้ไข -

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

- ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรในปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ

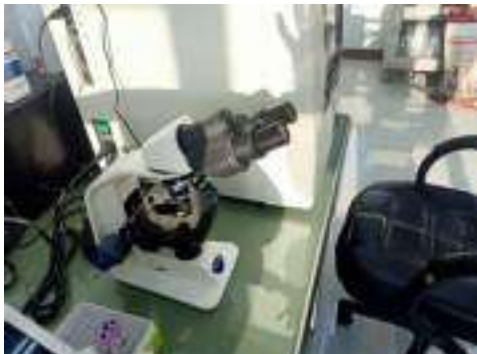

1. กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา ใบสั่งซื้อ 001/2565
บริษัท เบสท์ แล็บ แอนด์ เคมีคอล จำกัด
เบิกจ่าย 100%



2. เครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมในสภาพจริงแบบเคลื่อนที่ ใบสั่งซื้อ 004/2565
บริษัท อาฟเตอร์ แล็บ จำกัด
เบิกจ่าย 100%

ครุภัณฑ์ รายการที่ ๓ เครื่องมือรักษาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดความเข้มต่ำ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
ผู้รับจ้าง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๕ เริ่ม ๑๑ ต.ค.๖๕ สิ้นสุดสัญญา ๘ ก.พ. ๖๕
วงเงินที่ลงนามสัญญา ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (ส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕)



3. เครื่องมือรักษาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดความเข้มต่ำ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
สัญญาเลขที่ 3/2565 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
เบิกจ่าย 100%

ครุภัณฑ์ รายการที่ ๔ รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

ผู้รับจ้าง บริษัทพัชรีย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๕ เริ่ม ๒๐ พ.ย.๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา
๑๗ ก.พ. ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนามสัญญา ๓,๑๙๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) คาดว่าจะส่งมอบ
ครุภัณฑ์เดือน มกราคม ๒๕๖๕

ปัญหา-อุปสรรค

- ไม่มี

สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ

๑.งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระการบินไทย ภายในโครงการคชอาณาจักร ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ไทยสงวน สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๕ เริ่มเริ่ม ๑๑ พ.ย..๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา ๘ ก.ค. ๒๕๖๕ วงเงินลงนามสัญญา ๑๑,๙๖๙,๐๐๐-บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
จำนวน ๕ งวด ๒๔๐ วัน (โดยฝ่ายพัสดุดงค์การสวนสัตว์เป็นผู้ดำเนินการ)

ผลการดำเนินงาน

งวดที่ ๑ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานงวดที่ ๒

- งานสร้างคาคอดดินกันสไลด์ ความยาว ๒๕๐ เมตร แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานโครงสร้างฐานราก ศาลาดูช้าง แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานโครงสร้างฐานราก ศาลาพักผ่อน แล้วเสร็จ ๐%
- งานโครงสร้างฐานราก ทางเดินช้าง แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานย้ายแท่งเก็บน้ำ ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร แล้วเสร็จ ๑๐๐%

งานสร้างคาคอดดินกันสไลด์ ความยาว ๒๕๐ เมตร แล้วเสร็จ ๑๐๐%



งานสร้างคาคอดินกันสไลด์ ความยาว ๒๕๐ เมตร แล้วเสร็จ ๑๐๐%



งานโครงสร้างฐานราก ศาลาดูช้าง แล้วเสร็จ ๕๐ %



งานโครงสร้างฐานราก ศาลาดูช้าง แล้วเสร็จ ๕๐ %



งานโครงสร้างฐานราก ทางเดินช้าง แล้วเสร็จ ๑๐๐%



งานโครงสร้างฐานราก ทางเดินช้าง แล้วเสร็จ ๑๐๐%



งานย้ายแท่งเก็บน้ำ ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร แล้วเสร็จ ๑๐๐ %



ปัญหา-อุปสรรค ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินงาน ไม่เต็ม ๑๐๐% เนื่องจากคนงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา และสภาพพื้นที่ในการปฏิบัติงานเป็นทางลาดชัน

แนวทางแก้ไข ได้ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานตามสัญญาแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

มติที่ประชุม
