



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักการเงินและทรัพย์สิน

ที่ อสส ๑๑๐๕/ ๘๔๖

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

- | | | |
|-------|---|---|
| เรียน | ☐ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ | ☐ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว |
| | ☐ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย | ☐ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ |
| | ☐ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ | ☐ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา |
| | ☒ ผู้อำนวยการสำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์ | ☐ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา |
| | ☐ ผู้อำนวยการสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ | ☐ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี |
| | ☐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ | ☐ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น |
| | ☐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ | ☐ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ |
| | ☐ ผู้อำนวยการสถาบันจัดการสวนสัตว์ | ☐ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทุนมนุษย์ |
| | ☐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม | |

ตามที่ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย อนุมัติให้สำนักการเงินและทรัพย์สิน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบ สำหรับการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานในการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำนักการเงินและทรัพย์สิน จึงขอรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบตามระเบียบการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เพื่อให้คณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณฯ รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานตามระเบียบวาระการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพิมวรณ์ อนนธ์)

ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน

คณะทำงานและเลขานุการ

แจ้ง หน.ผ.พัฒนาระบบงาน และ หน.ผ.จัดสรรงบประมาณ ทราบ

และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นางสาวนันท์นิจ กุลเสรีญ)


ผู้อำนวยการสำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์

1๑๗ พอ. สมช

เพื่อโปรดพิจารณา ลงนามแทน พล.ต.ท. วราวุธ
พล.ต. จิตกร (อมป.ภค.ต.น.น.พ) พล.ต.

(นางนันท์วัน คำยมน)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์



(นางสาวสุกัญญา หงส์พันธุ์)
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ



การประชุม

คณะกรรมการด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของ
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

การประชุมเป็นรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานพร้อม
ภาพประกอบ

ระเบียบวาระการประชุม
คณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ (สำนักกฎหมาย/สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์)
๓.๒ ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่
(สำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม)
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕
๔.๓ รายงานผลการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ (สวนสัตว์เชียงใหม่)
๔.๔ รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

เอกสารประกอบการประชุม
คณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานกรรมการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๕/๓๗๒ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานผลการดำเนินงานฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

สำนักการเงินและทรัพย์สิน ได้ส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบตามระเบียบการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ให้คณะทำงานฯ เพื่อรับทราบ ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๕/๓๗๒ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ โดยสำนัก สถาบัน สวนสัตว์ และโครงการ ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว และรายงานผลการดำเนินงาน กลับให้สำนักการเงินและทรัพย์สิน ทาง e-mail และทาง line เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีรายการที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ วงเงินทั้งสิ้น ๗๔.๒๒๑๖ ล้านบาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวถูกพับไปแล้ว	มติที่ประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีสัญญาซื้อขายสัตว์ และงานก่อสร้างปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒ ดำเนินการเก็บรวบรวมเอกสาร กระบวนของงาน และรายละเอียดที่สำคัญของงานทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากรณีมีปัญหาในอนาคต	
ส่วนกลาง ๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ สัญญาที่ ๒๔/๒๕๖๑ วงเงินตามสัญญา ๑๒.๔๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๐๔๐ ล้านบาท คงเหลือ ๘.๓๙๐ ล้านบาท ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ สัญญาที่ ๒๘/๒๕๖๒ วงเงินตามสัญญา ๑๓.๖๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๙๖๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑๑.๗๓๐ ล้านบาท	๑. สำนักการเงินและทรัพย์สิน ดำเนินการทำหนังสือแจ้งบริษัทฯ ให้เร่งรัดดำเนินการตามสัญญา ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๕๔๓ และ ทส ๑๑๐๑/๕๔๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ของสัญญาที่ ๒๔/๒๕๖๑ และสัญญาที่ ๒๘/๒๕๖๒ ๒. บริษัทฯ ตอบกลับมาให้องค์การสวนสัตว์ฯ มอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นผู้นำสัตว์เข้าเนื่องจากเป็นสัตว์ตาม CITES ตามหนังสือเลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๓. สำนักการเงินและทรัพย์สิน ได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องนำเสนอสำนักกฎหมายเพื่อพิจารณา ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๔/๓๓๙๕ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๔. สำนักกฎหมายอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณา ๕. สำนักการเงินและทรัพย์สิน อยู่ระหว่างการติดตามความคืบหน้าในการพิจารณาของสำนักกฎหมาย ๖. สำนักกฎหมายได้จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้บริษัทฯ เพื่อดำเนินการด้านเอกสารการนำเข้าสัตว์จากต่างประเทศต่อกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามที่ร้องขอแล้ว และให้ สงท.แจ้งคณะกรรมการตรวจรับสัตว์ ปี ๒๕๖๒ พิจารณาเสนอความเห็นตามองค์ประกอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปเสนอ ผอ.อสส.ทราบและสั่งการต่อไป ตามเอกสารที่ ทส ๑๑๐๖/๙๑๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ๗. สำนักการเงินและทรัพย์สินมีหนังสือแจ้งคณะกรรมการตรวจรับ ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๔/๕๑๔๙ ลว.๒๗ ก.ย.๒๕๖๔ พิจารณาเสนอความเห็นตามองค์ประกอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปเสนอ ผอ.อสส ๘. คณะกรรมการตรวจรับเสนอความเห็นต่อ ผอ.อสส. ว่าบริษัทฯ เข้าหลักเกณฑ์ผู้ขายส่งมอบสัตว์ล่าช้าเห็นควรให้มีหนังสือแจ้งสิทธิการปรับและเร่งรัดการส่งสัตว์ให้ผู้ขายทราบ โดย ผอ.อสส.ให้ทางคณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตามหนังสือที่ ทส.๑๑๐๗/๑๗๐๗ ลงวันที่ ๖ ต.ค.๒๕๖๔	๑. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีสัญญาซื้อขายสัตว์ปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อความชัดเจนในการดำเนินงาน ๒. มอบให้สำนักกฎหมายเข้ามาดูรายละเอียดและให้สรุปประเด็นปัญหาและการดำเนินงานให้ชัดเจน แล้วนำเข้าคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อพิจารณา

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	๙. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย มีหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๑๔๓๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ไปยังกรมปศุสัตว์ เพื่อสอบถามการยกเลิกประกาศโรคปากเท้าเปื่อยจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE ในพื้นที่สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในการนำออกจากประเทศต้นทางเพื่อนำกลับมาส่งยังประเทศปลายทาง (ประเทศไทย) ว่าขณะนี้ สามารถดำเนินการได้แล้วหรือไม่ ตามที่บริษัท คาสชิบา (ประเทศไทย) จำกัด ได้อ้างถึงประกาศดังกล่าวเพื่อเป็นการยืนยันจากกรมปศุสัตว์ ๑๐. ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ ๐๖๒๑/๑๖๕ ลว.๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ แจ้งมายังองค์การสวนสัตว์ว่า ว่าปัจจุบันยังมีประกาศชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์กบคู่หรือซากสัตว์กบคู่จากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นเมื่อ ๒๓ ธ.ค.๖๔ ซึ่งมีผลบังคับเป็นเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หากมีการระบาดและยังไม่ได้รับรองสถานะการปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยจากองค์การสุขภาพโลก OIE จะมีการประกาศชะลอการนำเข้าต่อไป ๑๑. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ มีหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๓๙๘ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค.๒๕๖๕ เรื่อง การแจ้งสิทธิเรียกค่าปรับ ถึง กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาสชิบา (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบสัตว์จำนวน ๔ รายการ รวม ๑๘ ตัว องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ จึงขอแจ้งสิทธิเรียกค่าปรับตามสัญญาที่ ๒๘/๒๕๖๒ จำนวน ๕,๙๘๒,๙๘๐ บาท และให้ทางบริษัทฯ ทำหนังสือยินยอมเสียค่าปรับตามสัญญา ๑๒. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ มีหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๘๑ ลงวันที่ ๑๙ เม.ย.๒๕๖๕ เรื่อง บอกลีกสัญญาซื้อขายสัตว์ ถึง กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาสชิบา (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบสัตว์จำนวน ๔ รายการ รวม ๑๕ ตัว ตามสัญญาที่ ๒๔/๒๕๖๑ ซึ่งได้ล่วงเลยระยะเวลา ๒ ปี กับ ๓๔๙ วัน (๑๗ มี.ค.๖๒-๒๘ ก.พ.๖๕) แต่บริษัทฯ ยังไม่มีความเคลื่อนไหวหรือความคืบหน้าการเร่งดำเนินการส่งมอบสัตว์แต่อย่างใด จึงแจ้งบอกลีกสัญญาซื้อขายสัตว์และดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ๑. ปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์สัตว์ให้เป็นศูนย์พัฒนาเพื่อการวิจัยและอนุรักษ์สัตว์ป่าระดับมาตรฐานภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว - วงเงิน ๒.๔๘๔ ล้านบาท - เบิกจ่ายแล้ว ๑.๓๕๑ ล้านบาท - คงเหลือ ๑.๑๓๓ ล้านบาท โดยกิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ ๖๘๙		

แนว

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
๒. ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆภายใต้โครงการความร่วมมือการเพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆร่วมกับภาชีเพื่อรองรับและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร - วงเงิน ๑๘.๘๙๒ ล้านบาท - เบิกจ่ายแล้ว ๔.๗๒๓ ล้านบาท - คงเหลือ ๑๔.๑๖๙ ล้านบาท โดยกิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ ๖๘๙	๑. สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนำส่งรายงานการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์ฯ ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๑๒/๔๕๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒. บริษัทฯ ทำหนังสือขออุทธรณ์การบอกเลิกสัญญา และขอสงวนสิทธิ์หลักประกันสัญญา ตามหนังสือเลขที่ ๓๘/๒๕๖๒.๒๐๒๑๐๔.๐๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๓. สำนักการเงินและทรัพย์สิน มีหนังสือที่ ทส ๑๑๐๔/๓๑๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้สำนักกฎหมายพิจารณาการขออุทธรณ์การบอกเลิกสัญญาและขอสงวนสิทธิ์หลักประกันสัญญา ๔. สำนักกฎหมายพิจารณา ให้ยืนยันการรับหลักประกันสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆ โดยองค์การสวนสัตว์ฯ ได้แจ้งให้บริษัทฯ รับทราบการยืนยันการรับหลักประกันตามหนังสือองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ที่ ทส ๑๑๐๑/๗๗๒ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๕. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้รับหลักประกันสัญญาตาม ระเบียบฯ ซึ่งทางธนาคารกรุงไทย ได้นำส่งเงินหลักประกันสัญญาให้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเรียบร้อยแล้ว ๖. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว นำส่งเอกสารประกอบการแจ้งเป็นผู้ทำงานของ กิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ ๖๘๙มายังองค์การสวนสัตว์ฯ เพื่อจัดส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาเป็นผู้ทำงาน ตามหนังสือเลขที่ ๑๑๑๒/๘๙๗ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๗. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นำส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงการคลัง แจ้งให้ กิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ ๖๘๙ เป็นผู้ทำงานตามหนังสือเลขที่ ทส ๑๑๐๑/๑๐๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ๘. ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลัง ยังไม่มีหนังสือตอบกลับแจ้งให้เป็นผู้ทำงาน	๑. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไปควรเช็คประวัติบริษัทผู้รับจ้างและสถานะของบริษัท ๒. กรณีได้รับรับจ้างมาแล้ว คณะกรรมการควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานควรดำเนินการให้เป็นไปตามวงงานที่แบ่งตามสัญญา ๓. หากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา ควรเชิญผู้รับจ้างมาร่วมประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกันและควรมีรายงานการประชุมเพื่อให้รับรู้ทั้ง ๒ ฝ่าย ๔. หากยังดำเนินการล่าช้า สวนสัตว์ต้องดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยออกหนังสือเป็นหลักฐานทุกครั้ง

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
สวนสัตว์สงขลา ๑. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณน้ำตกสวนตุล ภายในสวนสัตว์สงขลา - วงเงิน ๓๘.๐๐๐๐ ล้านบาท - โดยบริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด	๑. องค์การสวนสัตว์ฯ ทำหนังสือแจ้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์และบอกเลิกสัญญา ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๑๓ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ๒. บริษัทฯ ได้ขอคัดค้านการบอกเลิกสัญญา ตามหนังสือเลขที่ CHR ๒๕๖๓/๐๑๐๒๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ๓. องค์การสวนสัตว์ฯ ได้ให้บริษัทชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๑๑๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๔. บริษัทฯ ทำหนังสือชี้แจงกลับองค์การฯ ตามหนังสือเลขที่ CHR ๒๕๖๔/๐๒๐๕๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๕. องค์การสวนสัตว์ฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงได้ทำหนังสือแจ้งกระทรวงการคลัง ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด เป็นผู้ทำงาน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากการกระทรวงการคลัง ๖. บริษัทฯ กรุงไทย จำกัด ชำระเงินตามสัญญาค้ำประกันของ บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด ฐานะลูกหนี้ร่วมให้สวนสัตว์สงขลาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คจำนวน ๑,๙๔๐,๐๐๐ บาท ๗. องค์การสวนสัตว์ฯ มีหนังสือที่ ทส ๑๐๑๑/๑๕๐๘ ลว. ๒๘ ธ.ค.๒๕๖๔ สอบถามผลการพิจารณา ให้บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด เป็นผู้ทำงานซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลังยังไม่มีหนังสือตอบกลับแจ้งให้เป็นผู้ทำงาน ๘. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาผู้ทำงานกรมบัญชีกลาง มีหนังสือที่ กค (อทง) ๐๔๐๕.๗/๑๕๒๕๑ ลว. ๒๘ เม.ย.๒๕๖๕ ขอให้พิจารณาคำชี้แจงของบริษัทฯ และนายเกรียงไกร ว่ารับฟังได้หรือไม่ อย่างไร พร้อมเหตุ พร้อมเหตุผลประกอบโดยละเอียดและขอให้รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งให้กรมบัญชีกลาง	๑. ควรมีการสำรวจสภาพพื้นที่ภายในสวนสัตว์ ก่อนการออกแบบและเสนอของงบประมาณ ๒. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไปควรเช็คประวัติบริษัทผู้รับจ้างและสถานะของบริษัท ๓. กรณีได้รับบับ้างมาแล้ว คณะกรรมการควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานควรดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่แบ่งตามสัญญา ๔. หากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา ควรเชิญผู้รับจ้างมาร่วมประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกันและควรมีรายงานการประชุมเพื่อให้รับรู้ทั้ง ๒ ฝ่าย ๕. หากยังดำเนินการล่าช้า สวนสัตว์ต้องดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานเป็นสายลักษณ์อักษร โดยออกหนังสือเป็นหลักฐานทุกครั้ง

๓.๒ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ มีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๑. ปรับปรุงอาคารสำนักงานสนาม งบประมาณ ๑.๒๐ ล้านบาท	ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว	
๒. ก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ และตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบพร้อมก่อสร้างเรือนเพาะขยายพันธุ์ งบประมาณ ๕.๘๕ ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว	
๓. ก่อสร้างถนนชั่วคราวแล้วรอบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ งบประมาณ ๘.๖๖ ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว	
๔. ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดปทุมธานี ในการสร้างสะพานบริเวณทางเข้าพื้นที่สวนสัตว์แห่งใหม่	อยู่ระหว่างดำเนินการได้ร้อยละ ๙๖ คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	
๕. ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๖.๘๒๕๑ ลบ. จำนวน ๖ งวดงาน - งบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๖.๐๐๐๐ ลบ. - งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๐.๘๒๕๑ ลบ.	๑. เบิกจ่ายงวดที่ ๑-๓ แล้ว จำนวน ๔๔.๐๔๗๕ ลบ. โดยใช้จาก งบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๖.๐๐๐๐ ลบ. งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๘.๐๔๗๕ ลบ. ๒. งานงวดที่ ๔ อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน จากคณะกรรมการ	เร่งรัดให้คณะกรรมการทุก ชุดตรวจสอบ และสรุปผลการ ดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ จังหวัดปทุมธานี

๑. ปรับปรุงอาคารสำนักงานสนาม งบประมาณ ๑.๒๐ ล้านบาท (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)



๒. ก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ และตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบพร้อมก่อสร้างเรือนเพาะขยายพันธุ์ งบประมาณ ๕.๘๕ ล้านบาท (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)



๓. งานก่อสร้างถนนชั่วคราวและรั้วรอบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

การดำเนินการ

บริษัท คัพเวอร์เทค จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ก่อสร้างถนนชั่วคราวและรั้วรอบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ เรียบร้อยแล้ว งานรั้วชั่วคราวระยะ ๓,๕๐๐ เมตร วงเงินรวมทั้งสิ้น ๘,๖๖๐,๐๐๐ บาท


ด้านทิศเหนือ



ด้านทิศใต้



ด้านทิศตะวันออก




ด้านทิศตะวันตก



๔. งานที่ได้รับการสนับสนุนจาก จ.ปทุมธานี

- งานก่อสร้างสะพานทางข้าม ดำเนินการได้ร้อยละ ๙๘

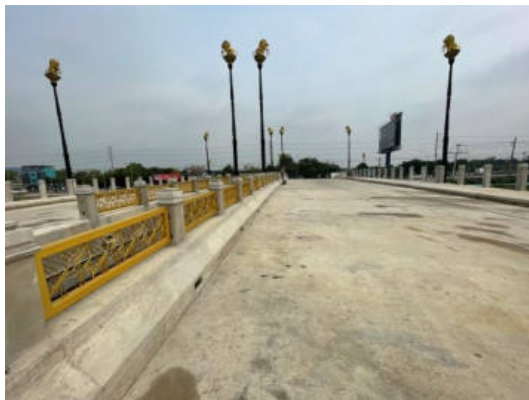

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่องเดิม

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๘๐๖.๓๑๓๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

- ๑. งบอุดหนุน จำนวน ๔๙๑.๖๗๐๓ ล้านบาท
- ๒. งบลงทุน จำนวน ๓๑๔.๖๔๒๗ ล้านบาท

การดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ได้เบิกจ่ายงบอุดหนุนรัฐบาล ได้ครบทุกรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับงบลงทุน เบิกจ่ายจำนวน ๑๔๘.๔๑๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๑๗ และได้กันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑๖๖.๒๓๐๕ ล้านบาท ประกอบด้วย

- ๑. ครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือรายการค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ จำนวน ๕.๑๐๖๐ ล้านบาท
 - ๒. สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ ประกอบด้วย
 - ๒.๑ ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ จำนวน ๑๐๒.๗๗๗๖ ล้านบาท
 - ๒.๒ ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมีภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ จำนวน ๑๑.๔๑๒๕ ล้านบาท
 - ๒.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์และอัตลักษณ์บริเวณส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน ๙.๓๑๕๖ ล้านบาท
 - ๒.๔ ปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center) ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน ๖.๒๕๐๐ ล้านบาท
 - ๒.๕ ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัสและส่วนแสดงจระเข้ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน ๑๗.๓๖๘๘ ล้านบาท
 - ๒.๖ ก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวินภายในสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน ๓.๖๕๐๐ ล้านบาท
 - ๒.๗ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำภายในสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน ๑๐.๓๕๐๐ ล้านบาท
- (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)


ข้อเสนอเพื่อทราบ

เพื่อโปรดทราบ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๕ ยังมีรายการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ซึ่งได้แก่ รายการค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ และรายการค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 2564

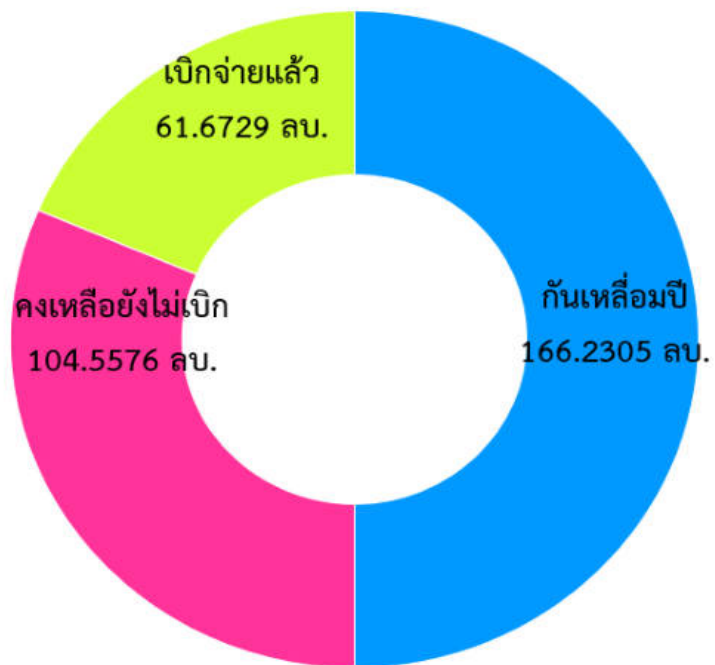

ข้อมูล ณ 30 เม.ย.65

- ส่วนกลาง
1. ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ สัญญาสิ้นสุด 24 พ.ค. 2565 มี 6 งวดงาน
เบิกจ่ายแล้ว 1-3 งวดงาน จำนวน 8.0475 ลบ.
กันเหลื่อมปีงวดที่ 4-6 เป็นเงินจำนวน 102.7776 ลบ.
 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ สัญญาสิ้นสุด 16 ธ.ค.2564 กันเหลื่อมปี จำนวน 5.1060 ลบ.
เบิกจ่ายถึงเดือน เม.ย.2565 จำนวน 3.326 ลบ คงเหลือ 1.7800 ลบ.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

เลขที่สัญญาจ้าง	๑๑/๒๕๖๔ วงเงิน ๑๔๖,๘๒๕,๑๐๐ บาท งบปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๐,๘๒๕,๑๐๐ บาท
ระยะเวลาดำเนินการ	๕๔๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ผู้รับจ้าง	บริษัท ดีไซน์+วิเวลลอป จำกัด

การดำเนินงาน

๑. งานงวดที่ ๑ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีการเบิกจ่ายแล้วเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๗,๓๔๑,๒๐๐ บาท

๑.๑ แบบแนวความคิดหลัก (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A ๑ จำนวน ๓ ชุด
๑.๒ แบบแนวความคิดหลัก (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A ๑ จำนวน ๑๐ ชุด
๑.๓ แบบแนวความคิดหลัก (ปิดบนกระดาษแข็ง)	ขนาด A ๑ จำนวน ๑ ชุด
๑.๔ แบบแนวความคิดหลัก (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A ๓ จำนวน ๓ ชุด
๑.๕ แบบแนวความคิดหลัก (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A ๓ จำนวน ๑๐ ชุด
๑.๖ รายงานเบื้องต้น (Inception Report) (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A ๓ จำนวน ๓ ชุด
๑.๗ รายงานเบื้องต้น (Inception Report) (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A๓ จำนวน ๑๐ ชุด

๒. งานงวดที่ ๒ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีการเบิกจ่ายแล้วเมื่อกันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๑๔,๖๘๒,๕๑๐ บาท

๒.๑ แบบร่างขั้นต้น (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A๓	จำนวน ๓ ชุด
๒.๒ แบบร่างขั้นต้น (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A๓	จำนวน ๑๐ ชุด

๓. งานงวดที่ ๓ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีการเบิกจ่ายแล้วเมื่อกันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๒๒,๐๒๓,๗๖๕ บาท



๓.๑ แบบร่างขั้นพัฒนา (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A๓	จำนวน ๓ ชุด
๓.๒ แบบร่างขั้นพัฒนา (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A๓	จำนวน ๑๐ ชุด
๓.๓ รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A๔	จำนวน ๕ ชุด
๓.๔ เอกสารแบบรูปรายการและการประมาณราคา เพื่อยื่นของบประมาณ (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A๔	จำนวน ๑ ชุด
๓.๕ เอกสารแบบรูปรายการและการประมาณราคา เพื่อยื่นของบประมาณ (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A๔	จำนวน ๔ ชุด



๔. งานงวดที่ ๔ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานจากคณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน ๔๔,๐๔๗,๕๓๐ บาท ประกอบด้วย

๔.๑ แบบรายละเอียดรายการก่อสร้าง

๔.๒ รายละเอียดประกอบแบบ บัญชีงานก่อสร้าง ราคากลาง ครอบคลุมรวมทุกสาขา

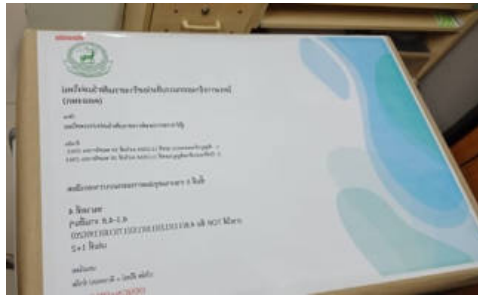

ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจากมีคณะกรรมการ ที่กำกับดูแลหลายชุด และมีความเห็นที่แตกต่างกัน จึงต้องใช้ระยะเวลา ในการสรุปแนวความคิด

แนวทางแก้ไข

เร่งรัดให้คณะกรรมการทุกชุดตรวจสอบและสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินงานรายได้ ค่าใช้จ่าย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

เรื่องเดิม

๑. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เสนอแผนปฏิบัติการด้านการเงิน (เงินนอกงบประมาณ) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

๑.๑ ประมาณการรายได้ จำนวน ๒๙๕.๑๘๒๐ ล้านบาท

๑.๒ ประมาณการรายจ่าย จำนวน ๓๙๓.๖๓๗๖ ล้านบาท

๒. ในคราวประชุมคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีมติที่ประชุมดังนี้

๒.๑ อนุมัติแผนปฏิบัติการด้านการเงิน (เงินนอกงบประมาณ) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๒ อนุมัติให้ใช้เงินสะสมองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จำนวน ๑๘๖.๒๙๐๐ ล้านบาท กรณีเพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานในส่วนที่รายได้ (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่าย และกรณีเกิดรายได้ไม่เป็นไปตามแผน จากการระบาดของระลอกใหม่ของ COVID-๑๙

ข้อเท็จจริง

๑. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดทำแผนรายได้ และค่าใช้จ่ายแยกเป็นรายเดือน โดยผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้อนุมัติแผนรายได้ และค่าใช้จ่าย เพื่อให้สำนัก สวนสัตว์ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้มีรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านการเงิน

๒. รายงานงบการเงินได้ผ่านการสอบทานจากสำนักตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๕

ผลการดำเนินงาน

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ขอรายงานผลการดำเนินงาน รายได้ ค่าใช้จ่าย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

	แผน	ผล	สูง (ต่ำ) กว่าแผน	หน่วย : ล้านบาท
๑. รายได้	๒๗.๕๘	๔๐.๔๐	๑๒.๘๒	
๒. รายจ่าย	๖๔.๗๗	๖๒.๐๒	(๒.๗๕)	
(ค่าใช้จ่าย งบรัฐบาล+องค์การ)				

ข้อเสนอเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานรายได้ ค่าใช้จ่าย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


มติที่ประชุม

ส่วนสัตว์	แผน - ผลรายได้	
	แผน	ผล
ส่วนกลาง	0.69	0.67
ส่วนสัตว์เปิดเขาเขียว	12.43	18.02
ส่วนสัตว์เชียงใหม่	3.34	7.06
ส่วนสัตว์นครราชสีมา	5.10	7.05
ส่วนสัตว์สงขลา	1.34	1.49
ส่วนสัตว์อุบลราชธานี	1.17	2.00
ส่วนสัตว์ขอนแก่น	3.14	3.99
โครงการ คชอาณาจักร	0.37	-
รวมรายได้	27.58	40.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้พนักงาน		0.08
รายได้ค่าบริการกองทุนเพื่อหมื่นแสน		0.04
รวมรายได้ดำเนินงาน (1)	27.58	40.40
รายได้ทางบัญชี - รายได้บริจาค (สินทรัพย์)		0.97
รวมรายได้ตามงบการเงิน	27.33	41.37
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานสัตว์มีชีวิต (2)		1.27
รวมรายได้จากการดำเนินงานทั้งสิ้น (1) + (2)		41.67
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล		56.00
รวมทั้งสิ้น	27.33	98.64

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
รายได้จากการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2565

หน่วย : ล้านบาท

แผน - ผล รายได้ แยกตามสวนสัตว์ ปี 2565 ประจำเดือน เมษายน 2565




แผน - ผลรายได้ภาพรวมองค์การสวนสัตว์ ปี 2565



รวมรายได้
รายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 40.40 ล้านบาท
รวมรายได้ทางบัญชี จำนวน 0.97 ล้านบาท
รวมรายได้ตามงบการเงิน จำนวน 41.37 ล้านบาท
ทั้งนี้ รายได้จากการดำเนินงาน 40.40 ลบ. ยังไม่รวม กำไรขาดทุนจากการดำเนินงานสัตว์มีชีวิต 27 ลบ.

แผน - ผลรายได้ภาพรวมองค์การสวนสัตว์ ปี 2565



รวมรายได้
รายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 209.45 ล้านบาท
รวมรายได้ทางบัญชี จำนวน 6.67 ล้านบาท
รวมเป็นรายได้ ตามงบการเงิน จำนวน 216.12 ล้านบาท

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
ค่าใช้จ่าย (รัฐบาล + องค์การ) ประจำเดือน เมษายน 2565

หน่วย : ล้านบาท

ส่วนสัตว์	แผน - ผล ค่าใช้จ่าย	
	แผน	ผล
ส่วนกลาง	23.35	15.43
ส่วนสัตว์เปิดเขาเขียว	9.39	12.05
- แผนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9.39	12.05
- แผนส่วนแบ่งผู้ประกอบการ	-	-
ส่วนสัตว์เชียงใหม่	11.04	10.86
- แผนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8.04	7.87
- แผนค่าใช้จ่ายคววเรือน	3.00	2.99
ส่วนสัตว์นครราชสีมา	7.19	7.58
ส่วนสัตว์สงขลา	5.85	6.01
ส่วนสัตว์อุบลราชธานี	4.13	3.49
ส่วนสัตว์ขอนแก่น	5.51	5.30
โครงการ คชอาณาจักร	1.30	1.30
รวมทั้งสิ้น	64.77	62.02
ค่าใช้จ่ายทางบัญชี		39.24
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	62.36	101.26

แผน - ผลค่าใช้จ่ายแยกตามสวนสัตว์ ปี 2565 ประจำเดือน เมษายน 2565



แผน - ผล ค่าใช้จ่าย ภาพรวมองค์การสวนสัตว์ ปี 2565 สิ้น 7 เดือน (ตุลาคม 2564 - เมษายน 2565)




สำนักงานเงินและทรัพย์สิน

๔.๔ รายงานผลการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
แบบสะสม ๗ เดือน ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เมษายน ๒๕๖๕

การดำเนินงาน

สวนสัตว์เชียงใหม่ ขอรายงานผลการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แบบสะสม ๗ เดือน ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เมษายน ๒๕๖๕ สรุปได้ ดังนี้ (ข้อมูลเบื้องต้น)

รายการ	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	รวม
รายได้ดำเนินงาน	1.161	0.891	2.678	2.555	1.513	1.690	2.802	13.290
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2.655	2.904	2.908	2.999	2.999	2.999	3.000	20.464
รายได้ สูง(-ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	- 1.494	- 2.013	- 0.230	- 0.444	- 1.486	- 1.309	- 0.198	- 7.174
ผู้เข้าชม (คน)	9,896	7,469	22,802	21,698	12,831	14,390	23,867	112,953

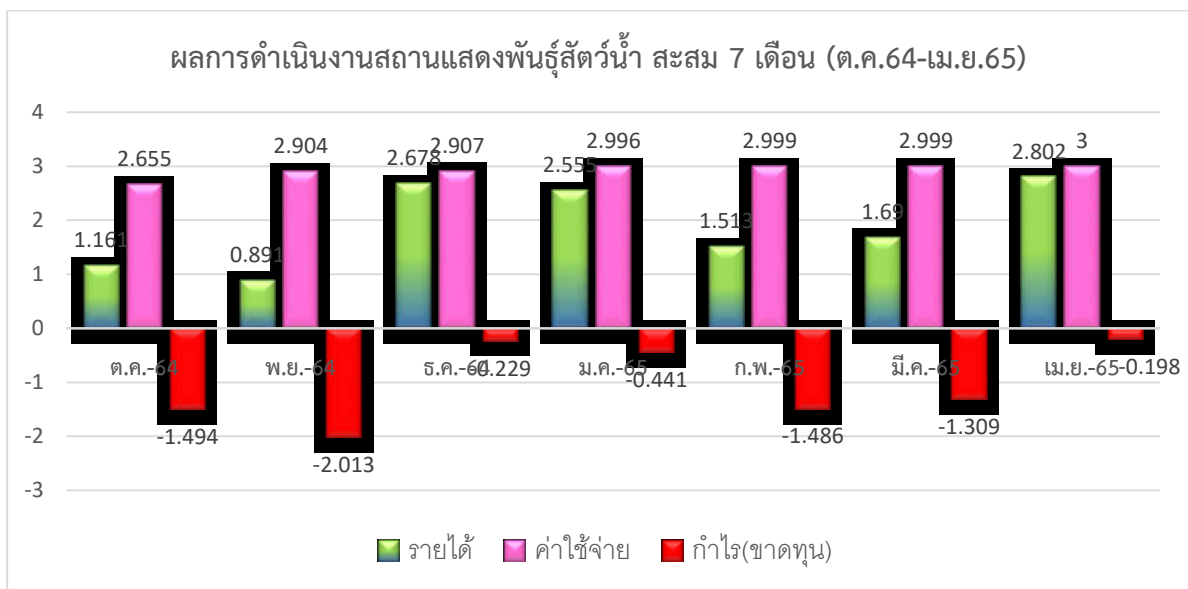

ผลการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ แบบสะสม ๗ เดือน ในภาพรวมมีรายได้ดำเนินงานเกิดขึ้นจำนวน ๑๓.๒๙๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ที่มาจากการจำหน่ายบัตรเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานสะสม ๗ เดือน เกิดขึ้นจำนวน ๒๐.๔๖๔ ล้านบาท โดยเฉลี่ยเดือนละ ๓ ล้านบาท (๓๖ ล้านบาทต่อปี) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างเหมา ๑๐.๔๘๖ ล้านบาท ค่าจ้างบริหาร ๔.๔๙๔ ล้านบาท และค่าไฟฟ้า ๒.๘๗๓ ล้านบาท ค่าอาหารสัตว์น้ำ ๑.๐๔๐ ล้านบาท ค่าก๊าซ LPG ๑.๑๒๙ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๐.๔๔๒ ล้านบาท

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ ผลการดำเนินงานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แบบสะสม ๗ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เมษายน ๒๕๖๕) ข้อมูลเบื้องต้น

๔.๔ รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่องเดิม

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้รับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับการพิจารณากรอบเงินทั้งสิ้น จำนวน ๗๐๘.๐๒๖๕ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑. งบบุคลากร	๑๘๑.๙๓๗๕	ล้านบาท
๒. งบอุดหนุน	๒๒๓.๙๘๒๐	ล้านบาท
๓. งบลงทุน	๓๐๒.๑๐๗๐	ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	<u>๗๐๘.๐๒๖๕</u>	ล้านบาท

การดำเนินงาน

สำนักงานเงินและทรัพย์สิน ได้ดำเนินการรวบรวมแผน และผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวม ๕๔ รายการ วงเงิน ๓๐๒,๑๐๗,๐๐๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย

- | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|------------------------|
| ๑ | ครุภัณฑ์ | จำนวน ๔๑ รายการ | วงเงิน ๓๓,๔๔๕,๑๐๐ บาท |
| | ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๔๑ รายการ | | |
| ๒ | สิ่งก่อสร้าง | จำนวน ๑๓ รายการ | วงเงิน ๒๖๘,๖๖๑,๙๐๐ บาท |
| | ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๑๓ รายการ | | |

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

ข้อเสนอเพื่อทราบ

เพื่อโปรดทราบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหมวดรายจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รายงานสถานภาพตามกระบวนการพัสดุ ของงบลงทุน
รายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2565 จำนวน 13 รายการ



รายงานสถานภาพตามกระบวนการพัสดุ ของงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ ประจำปี 2565 จำนวน 41 รายการ

จัดทำ TOR

อยู่ระหว่างขอซื้อขอจ้าง

รอลงนามในสัญญา

ลงนามสัญญา
41 รายการ

เบิกจ่ายแล้ว
38 รายการ


1. ส่วนกลาง 9 รายการ
2. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 5 รายการ
3. สวนสัตว์เชียงใหม่ 5 รายการ
4. สวนสัตว์สงขลา 6 รายการ
5. สวนสัตว์อุบลราชธานี 4 รายการ
6. สวนสัตว์ขอนแก่น 8 รายการ
7. โครงการคชอาณาจักร 4 รายการ

⇒ เบิกจ่ายรวมเป็นเงิน
18.7073 ลบ.

- 37 รายการ เบิกจ่ายครบเรียบร้อยแล้ว
- 1 รายการ คือ รายการระบบบริหารจัดการสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (Thai Zoo Ark) เบิกแล้ว 2 งวด
- 3 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ
 - โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบจำหน่ายบัตร (E-ticket)
 - รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (เขาเขียว)
 - เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิทัล (เชียงใหม่)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

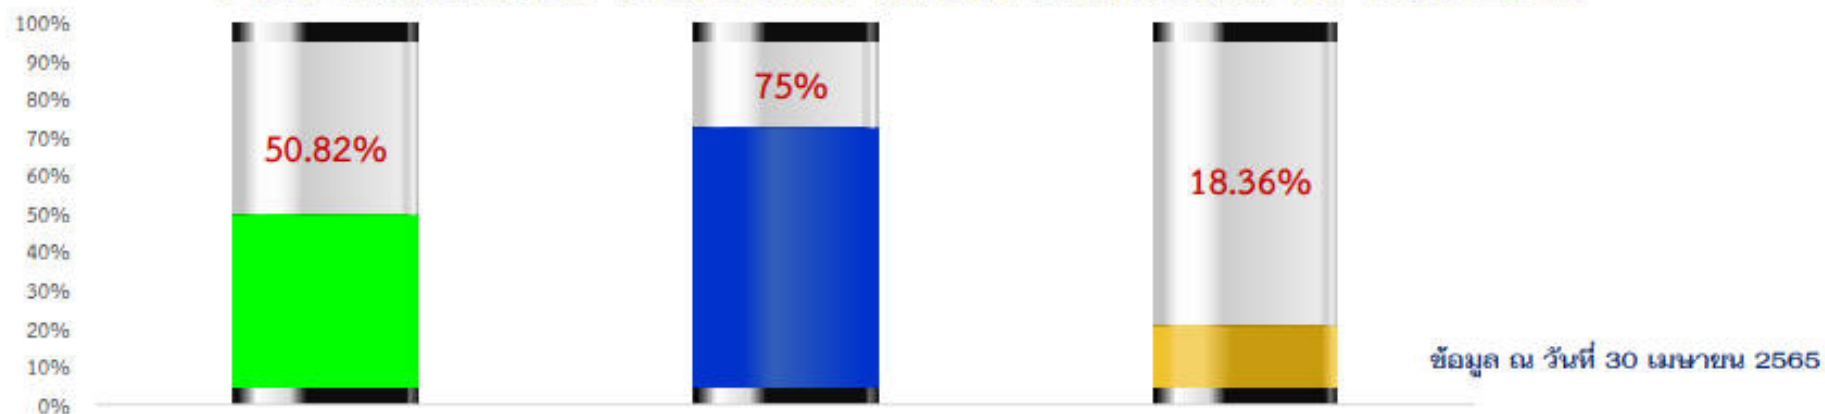

ภาพรวม

งบอุดหนุน

งบลงทุน

รายการ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย /GFMS	คิดเป็น (%)	คงเหลือ
1. งบอุดหนุน	405.9195	304.3178	74.97	101.6017
2. งบลงทุน	302.1070	55.4792	18.36	246.6278
* ครุภัณฑ์	33.4451	18.8073	56.23	14.6378
* สิ่งก่อสร้าง	268.6619	36.6719	13.65	231.9900
รวมทั้งสิ้น	708.0265	359.7970	50.82	348.2295

หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ตรงกับระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการดำเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ส่วนกลาง)

ครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ลำดับที่ ๑-๗ ดังนี้

๑. กล้องถ่ายภาพระบบ wifi สำหรับกล้องจุลทรรศน์	งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท
๒. ตู้เก็บบล็อกรพาราฟิน ๒ ตู้	งบประมาณ ๑๔๕,๒๐๐.-บาท
๓. ตู้เก็บแผ่นกระจกสไลด์ ๑ ตู้	งบประมาณ ๘๐,๒๕๐.-บาท
๔. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงในไมโครเพลท	งบประมาณ ๔๐๖,๖๐๐.-บาท
๕. เครื่องตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ	งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.-บาท
๖. เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพในสัตว์	งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐.-บาท
๗. ตู้เย็นแช่น้ำยา	งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐.-บาท
๘. โครงการระบบบริหารจัดการสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (Thai Zoo Ark)	งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด เป็นเงินจำนวน ๗๘๐,๐๐๐ บาท	

อยู่ระหว่างรอผลการอุดหนุน ๑ รายการ ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-ticket)
งบประมาณ ๘,๔๔๔,๘๐๐.-บาท ขณะนี้ได้ผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้แก่ บริษัท คลิเน็กซ์ จำกัด
ในวงเงินงบประมาณจำนวน ๖,๙๘๐,๐๐๐ บาท และอยู่ระหว่างรอผลการอุดหนุน ๗ วัน สิ้นสุดในวันที่
๔ มีนาคม ๒๕๖๕

งบประมาณปี ๒๕๖๕

เครื่องปั่นเหวี่ยงฮีมาโตคริต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ๑ เครื่อง

เลขที่สัญญาจ้าง

๓/๒๕๖๕ วงเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มสัญญา ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

ผู้ขาย

บริษัท กิ๊ปไทย จำกัด

การดำเนินงาน

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว



เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วรอบต่ำ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ๑ เครื่อง

เลขที่สัญญาจ้าง

๒/๒๕๖๕ วงเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มสัญญา ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

ผู้ขาย

บริษัท กิ๊ปไทย จำกัด

การดำเนินงาน

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว



ตู้แช่แข็ง -๔๐ องศาเซลเซียส สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ๑ เครื่อง

เลขที่สัญญาจ้าง

๑/๒๕๖๕ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มสัญญา ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

ผู้ขาย

บริษัท กิ๊ปไทย จำกัด

การดำเนินงาน

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว



เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบทศนิยม ๓ ตำแหน่ง สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ๑ เครื่อง

เลขที่สัญญาจ้าง

๔/๒๕๖๕ วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ


เริ่มสัญญา ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

ผู้ขาย

บริษัท กิ๊ปไทย จำกัด

การดำเนินงาน

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

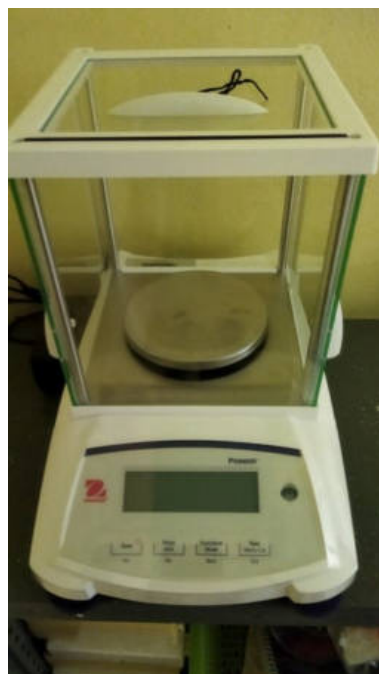

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ สูบ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ

ไม่ต่ำกว่า ๗,๗๐๐ ซีซี กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า แบบกระบะเหล็ก พร้อมติดเครนไฮดรอลิก

เลขที่สัญญาจ้าง	๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงิน ๒,๘๓๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินการ	เริ่มวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ หหมดสัญญาจ้าง วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๙๐ วัน ขยายระยะเวลา ๓๐ วัน จากสิ้นสุดวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุด ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ผู้รับจ้าง	บริษัท ทวีโชค ทรัค แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด
การดำเนินงาน	แบ่งงานออกเป็น ๑ งวด งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) ตรวจรับงานวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๓๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่งเบิกเงินเข้าองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ที่ อสส. ๑๑๑๓/๑๐๙ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
รูป	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ สูบ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๗,๗๐๐ ซีซี กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า แบบกระบะเหล็ก พร้อมติดเครนไฮดรอลิก



งบประมาณปี ๒๕๖๕

งานก่อสร้างปรับปรุงถนนแนวรั้ว และสิ่งอำนวยความสะดวก ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

เลขที่สัญญาจ้าง ๗/๒๕๖๕ วงเงินก่อสร้าง ๒๙,๙๑๕,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มทำงานวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ หมดสัญญาจ้าง วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๒๔๐ วัน
ผู้รับจ้าง บริษัท พี.เอ.ไอ ซัพพลาย จำกัด
การดำเนินงาน แบ่งงานออกเป็น ๗ งวด
รายงานตั้งแต่ วันที่ ๑๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

งานงวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กำหนดส่งมอบงาน งวดที่ ๒ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ การดำเนินงานแล้ว ๕๕%

งานประกอบแบบคานคอดิน ค.ส.ล. (จุดอาคารเอนกประสงค์ จุดที่ ๑)



งานผูกเหล็กเสริม (จุดอาคารเอนกประสงค์ จุดที่ ๒+ห้องน้ำ)



งานติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป +งานติดตั้งเสาเหล็ก (จุดอาคารเอนกประสงค์ ๓+๔)



งานติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป ทางเดินเชื่อมระหว่าง จุดอาคารเอนกประสงค์



ปัญหาและอุปสรรค

ผู้รับจ้างชี้แจง งานงวดที่ ๒ ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง เนื่องจากบริษัทพบปัญหาบริเวณพื้นที่ก่อสร้างนั้นอยู่บนจุดสถานีหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลักของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่ใช้งานอยู่ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้และการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร การใช้เครื่องจักรจะต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยทั้งนักทอ่งเทียวกที่ใกล้บริเวณก่อสร้างดังกล่าวและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติเอง อีกทั้งช่วงนี้ฝนตกหนักเกือบทุกวันทำให้งานล่าช้า

ดำเนินการงานล่าช้า กว่ากำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง ทางคณะกรรมการนัดประชุมติดตามงานก่อสร้างทั้งปัญหาและแนวทางแก้ไข พร้อมทำหนังสือเร่งรัดการทำงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างให้กับทางผู้รับจ้างรับทราบ



รูปภาพปัญหาความล่าช้า จุดสถานีหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างแนวทางแก้ไข

ผู้รับจ้าง บริษัท พี.เอ.ไอ ซัพพลาย จำกัด ชี้แจงว่าจะเร่งดำเนินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานโดยเร็วที่สุด และจะส่งงวดที่ ๒ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

การดำเนินงานของคณะกรรมการ

จัดทำหนังสือเร่งรัดการทำงานให้แล้วเสร็จตามทีระบุในสัญญาจ้าง พร้อมนัดประชุมติดตามงานทุก ๑๕ วัน กับ ทางผู้รับจ้าง บริษัท พี.เอ.ไอ ซัพพลาย จำกัด พร้อมให้ทางผู้รับจ้างจัดเอกสารแผนงานแล้วเสร็จ และชี้แจงเหตุผลปัญหา อุปสรรค กรณีที่ไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง พร้อมแนวทางแก้ไข

งบประมาณปี ๒๕๖๕

งานก่อสร้างเตาเผาซากสัตว์ปลอดมลพิษพร้อมปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

เลขที่สัญญาจ้าง	๖/๒๕๖๕ วงเงินก่อสร้าง ๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค์)
ระยะเวลาดำเนินการ	เริ่มทำงานวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ หหมดสัญญาจ้าง วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๑๕๐ วัน
ผู้รับจ้าง	บริษัท ทิมเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
การดำเนินงาน	แบ่งงานออกเป็น ๒ งวด
รายงานตั้งแต่	วันที่ ๑ - ๗ เมษายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๘๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดส่งมอบงาน งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐%

ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว กรรมการฯตรวจรับเอกสารส่งมอบ งวด๒ (งวดสุดท้าย) เสร็จเรียบร้อยส่งตามระบบ
งานก่อสร้างเตาเผาซากสัตว์ปลอดมลพิษ ขนาด ๓๐๐ กก. / ๒๔ ชม. (ชนิดแก๊ส)

- งานติดตั้งระบบ Gas station พร้อมตู้ควบคุม เตาเผาซากสัตว์



- งานทดสอบระบบ เตาเผาซากสัตว์





- กรรมการตรวจรับงานงวด ๒ (งวดสุดท้าย) อาคารเตาเผาซากสัตว์



- รูปโดยรวม อาคารเตาเผาซากสัตว์



ปัญหาและอุปสรรค


- ไม่มี

สวนสัตว์เชียงใหม่ งบประมาณปี ๒๕๖๕

งานปรับปรุงอาคารฝ่ายอนุรักษ์และวิจัย พร้อมอาคารอนุบาลลูกสัตว์ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

ระยะเวลาดำเนินงาน : ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

สถานะการดำเนินงาน : แบ่งงานออกเป็น ๓ งวด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๓ ติดตั้งไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และงานทาสีเก็บกวาดพื้นที่ งานแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด

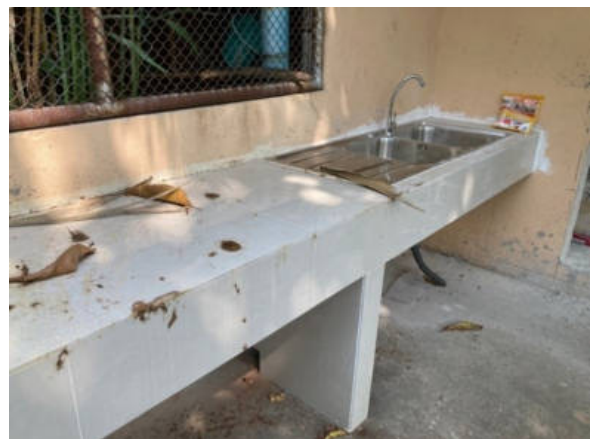

งบประมาณปี ๒๕๖๕
งานก่อสร้างโครงข่ายท่อน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสีย
เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

ระยะเวลาดำเนินงาน : ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

สถานะการดำเนินงาน : แบ่งงานออกเป็น ๑๐ งวด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ ๑,๒ และ ๓ ทั้ง ๓ งวดงานไปพร้อมกัน และรอผู้ผลิตท่อจัดส่งวัสดุเข้าพื้นที่ก่อสร้างภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ จึงจะสามารถส่งงานได้ ๓ งวด งานแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของปริมาณงานทั้งหมด คณะกรรมการอยู่ระหว่างแจ้งหนังสือเร่งงานก่อสร้าง



๒. ครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

๒.๑ ซื้อเครื่องอัลตราซาวด์แบบพกพาสำหรับสัตว์ป่า จำนวน ๑ เครื่อง





วงเงิน/สัญญา (บาท)	งวดงาน (จำนวน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วันที่ เริ่มสัญญา	วันที่ สิ้นสุดสัญญา	สถานะ
๑,๔๕๓,๒๐๐.-	๑ งวด	๑๒๐ วัน	๒๑ ต.ค. ๖๔	๑๘ ก.พ ๖๕	- ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๒.๒ ซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล พร้อมเครื่องเอกซเรย์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง

วงเงิน/สัญญา (บาท)	งวดงาน (จำนวน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วันที่ เริ่มสัญญา	วันที่ สิ้นสุดสัญญา	สถานะ
๑,๗๘๘,๐๐๐.-	๑ งวด	๑๒๐ วัน	๒๙ ต.ค. ๖๔	๒๖ ก.พ ๖๕	- ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๒.๓ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (cab)

วงเงิน/สัญญา (บาท)	งวดงาน (จำนวน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วันที่ เริ่มสัญญา	วันที่ สิ้นสุดสัญญา	สถานะ
๖๔๔,๐๐๐.-	๑ งวด	๖๐ วัน	๑๒ ต.ต ๖๔	๑๑ ธ.ค. ๖๔	- ดำเนินการส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้วและขออนุมัติเบิกเงินไปยัง อสส.

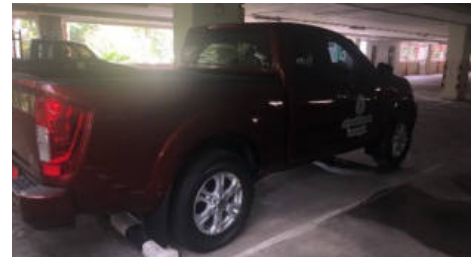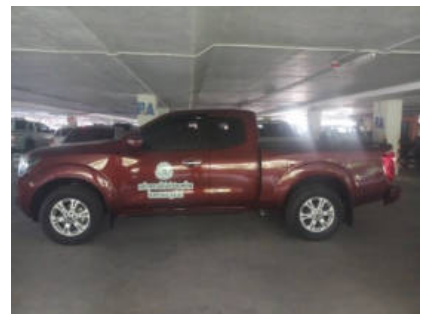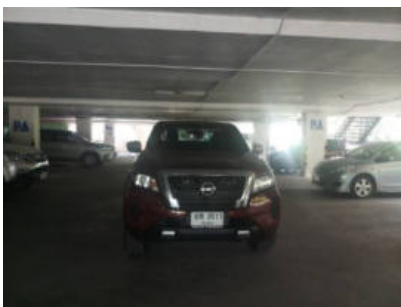

๒.๒ ซื้อถังเก็บน้ำบนดิน โพลีเมอร์ ขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร สวนสัตว์เชียงใหม่ ๑๐ ใบ

วงเงิน/ซื้อ (บาท)	งวดงาน (จำนวน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วันที่ เริ่มสัญญา	วันที่ สิ้นสุดสัญญา	สถานะ
๗๗,๐๐๐.-	๑ งวด	๗ วัน	๗ ต.ต ๖๔	๑๓ ต.ต ๖๔	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว



๒.๓ ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๔๘,๐๐๐ บีทียู สำหรับคอกกักหมี่แพนด้า

วงเงิน/ซื้อ (บาท)	งวดงาน (จำนวน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วันที่ เริ่มสัญญา	วันที่ สิ้นสุดสัญญา	สถานะ
๖๕,๒๕๐.-	๑ งวด	๓๐ วัน	๗ ต.ต ๖๔	๓๐ พ.ย. ๖๔	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว



งานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
งานก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา

๑. งานก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา

ผู้รับจ้าง บริษัท เอส.ยู.แพค. จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ ๐๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วงเงินสัญญาจ้าง จำนวนเงิน ๙,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เริ่มดำเนินการ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕ งวด จำนวน ๒๔๐ วัน

งวดที่ ๑ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๒ ปัจจุบันผู้รับจ้างได้มีการส่งผลิตท่อเหลี่ยมขนาดใหญ่ ๒.๑๐x๒.๑๐ เมตร ซึ่งไม่มีขายตามท้องตลาด ต้องสั่งผลิต คาดว่าท่อที่ส่งผลิตจะได้ประมาณเดือนเดือนเมษายน ระหว่างรอท่อ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการในส่วนที่เปลี่ยนแปลงในงวดที่ ๒ งานปรับปรุงรูปหล่อสัตว์ไฟเบอร์

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานระยะเวลาดำเนินการ ๔๘ วัน (นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ดังรายการต่อไปนี้

๑. งานวางท่อระบายน้ำขนาด ๒.๑๐ x ๒.๑๐ .	แล้วเสร็จ	๑๐๐%
๒. งานปรับปรุงพื้นลานคอนกรีต	แล้วเสร็จ	๑๐๐%

การดำเนินงานงวดที่ ๒

๑. งานวางท่อระบายน้ำขนาด ๒.๑๐ x ๒.๑๐ ม.	แล้วเสร็จ	๒๐%
๒. งานปรับปรุงพื้นลานคอนกรีต	แล้วเสร็จ	๕๐%

ปัญหาและอุปสรรค

ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน เกิดความล่าช้า เนื่องจากการสั่งซื้อวัสดุล่าช้า ทำให้การทำงานล่าช้า และแรงงานไม่พอเพียงในการปฏิบัติงาน จึงทำให้งานล่าช้า

แนวทางแก้ไขปัญหา

สวนสัตว์นครราชสีมา โดยคณะกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ออกหนังสือเร่งรัดงานครั้งที่ ๓ และกรรมการนัดผู้รับจ้างประชุมร่วมปรึกษาหารือในวันที่พุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ และกรรมการได้ลงไปกำกับดูแลหน้างานอย่างใกล้ชิด

๑. งานวางท่อระบายน้ำขนาด ๒.๑๐x ๒.๑๐ เมตร ผู้รับจ้างแจ้งว่าได้ที่ส่งผลิตท่อระบายน้ำ แต่ทางบริษัทที่ผลิต แจ้งว่าการผลิตท่อจะมีการจัดส่งล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากคอนกรีตที่ผลิตขนาดใหญ่ในการการหล่อคอนกรีต ต้องใช้ระยะเวลาในการหล่อท่อและทิ้งระยะเวลาหลังจากหล่อท่อเสร็จไม่น้อยกว่า ๑๔ วันหรือมากกว่า ๑๔ วัน ถึงจะทำการขนย้ายได้ ซึ่งทำให้การส่งสินค้าที่ส่งล่าช้า

๒. งานเทคอนกรีตได้เริ่มได้ดำเนินการบางส่วนแล้วในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และคอนกรีตแล้วเสร็จ ๕๐% ทั้งหมด เนื่องจากในเดือน พ.ค. ๖๕ มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่อนข้างเยอะ และพายุลมฝนเข้าทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเทคอนกรีต

และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จคาดว่าจะส่งมอบงานและตรวจรับงานระหว่าง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

รูปภาพงานก่อสร้างระบบปรับปรุงสาธารณูปโภคเขตที่ ๒



คณะกรรมการได้ร่วมสำรวจปรับปรุงพื้นที่ลานคอนกรีตก่อนดำเนินการงานปรับปรุงพื้นลานคอนกรีตในเขตที่ ๒



รูปภาพ ดำเนินการในส่วนที่เปลี่ยนแปลงในงวดที่ ๒ งานปรับปรุงรูปหล่อสัตว์ไฟเบอร์



งานก่อสร้างอาณาจักรผู้ล่า ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา

ผู้รับจ้าง บริษัท เอส.ยู.แพค. จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วงเงิน สัญญาจ้าง จำนวนเงิน ๒๔,๙๗๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เริ่มดำเนินงาน ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕ งวด จำนวน ๒๔๐ วัน

อยู่ระหว่างผลการดำเนินงานงวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๔๘ วัน (นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕) ดังรายการต่อไปนี้

๓.๑ งานโครงเหล็กหลังคาคอกกักสิงโต	แล้วเสร็จ	๑๐๐%
๓.๒ งานกำแพงหินเทียมส่วนแสดงสิงโต	แล้วเสร็จ	๑๐๐%
๓.๓ งานเพิงพักสัตว์ส่วนแสดงสิงโต	แล้วเสร็จ	๑๐๐%
๓.๔ งานน้ำตกส่วนแสดงสิงโต	แล้วเสร็จ	๑๐๐%
๓.๕ งานคอกกักสิงโต	แล้วเสร็จ	๑๐๐%

การดำเนินงาน ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๓.๑ งานโครงเหล็กหลังคาคอกกักสิงโต	แล้วเสร็จ	๑๐๐%
๓.๒ งานกำแพงหินเทียมส่วนแสดงสิงโต	แล้วเสร็จ	๑๐๐%
๓.๓ งานเพิงพักสัตว์ส่วนแสดงสิงโต	แล้วเสร็จ	๐%
๓.๔ งานน้ำตกส่วนแสดงสิงโต	แล้วเสร็จ	๕๐%
๓.๕ งานคอกกักสิงโต	แล้วเสร็จ	๗๐%

ปัญหาและอุปสรรค

ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน เกิดความล่าช้า เนื่องจากการสั่งซื้อวัสดุล่าช้า วันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทำให้การแรงงานไม่พอเพียงในการปฏิบัติงาน จึงทำให้งานล่าช้า

แนวทางแก้ไขปัญหา

สวนสัตว์นครราชสีมา โดยคณะกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ออกหนังสือเร่งรัดงานครั้งที่ ๒ และคณะกรรมการฯได้เข้าไปตรวจพื้นที่ก่อสร้างในทุกๆวันอย่างเคร่งครัด

รูปภาพประกอบงานอาณาจักรผู้ล่า





รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

สวนสัตว์สงขลา

ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๖ รายการ

ครุภัณฑ์ รายการที่ ๑ รถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

ผู้ขาย บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ครอบคลุมกำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนาม ๑,๓๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. ๑๑๑๕/๑๓๒๓ ลว. ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔



ครุภัณฑ์ รายการที่ ๒ เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพสำหรับสัตว์ จำนวน ๑ เครื่อง

ผู้ขาย ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง สัญญาเลขที่ ๐๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครอบกำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนาม ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. ๑๑๑๕/๖๙ ลว. ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

ครุภัณฑ์ รายการที่ ๓ คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด

ผู้ขายร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง สัญญาเลขที่ ๐๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครอบกำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนาม ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. ๑๑๑๕/๖๘ ลว. ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕



ครุภัณฑ์ รายการที่ ๔ เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า

ผู้ขาย ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง สัญญาเลขที่ ๐๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครอบกำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนาม ๘๙,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. ๑๑๑๕/๗๑ ลว. ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕



ครุภัณฑ์ รายการที่ ๕ เครื่องติดตามและบันทึกค่าคาร์บอนไดออกไซด์ทางเดินหายใจ แบบแมนสตริม จำนวน ๑ เครื่อง

ผู้ขาย ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง สัญญาเลขที่ ๐๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครบกำหนดส่งมอบ ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนาม ๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. ๑๑๑๕/๗๐ ลว. ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕



ครุภัณฑ์ รายการที่ ๖ เครื่องบันทึกและติดตาม ปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจรสำหรับสัตว์ จำนวน ๑ เครื่อง

ผู้ขาย ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง สัญญาเลขที่ ๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครบกำหนดส่งมอบ ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนาม ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. ๑๑๑๕/๗๒ ลว. ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕



๑. งานปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรแสงวิศวกรรม ในวงเงิน ๓๐,๓๖๗,๔๔๐.๗๓ บาท (สามสิบล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว กำหนดให้ผู้รับจ้าง เริ่มงานวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ และครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จในสัญญาวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวนงวดงาน ๙ งวด

ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มงานวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ และครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จในสัญญาวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๗๐ วัน

จำนวนงวดงาน ๙ งวด

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรแสงวิศวกรรม

ผลการดำเนินงาน

๑. สวนสัตว์สงขลาได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงวดงานของโครงการปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส.๑๑๑๕/๓๕๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ และได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการเป็นที่ยอมรับแล้วตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ อสส ๑๐๐๕/๑๖๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างการทำเอกสารแนบท้ายสัญญา

๒. ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานงวดที่ ๑ ยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญาและรายละเอียดตามแบบก่อสร้าง ตรงตามที่คณะกรรมการควบคุมงานนำเสนอ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์ไม่รับงานจ้าง งวดที่ ๑ ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรแสงวิศวกรรม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแจ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรแสงวิศวกรรมให้ดำเนินการงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จตามสัญญา และรายละเอียดตามแบบก่อสร้างเมื่อดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการส่งมอบงานปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา งวดที่ ๑ อีกครั้ง

งวดที่ ๑ ระยะเวลาดำเนินงาน ๔๕ วัน (วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕) ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

๑.๑ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารเตาเผาซาก แล้วเสร็จ ๔๓.๓๔ % ประกอบด้วย

- งานเตรียมการก่อสร้าง ทั้งหมด ,งานฐานราก , งานเสาตอม่อ ,งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ ๑ ,งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ,ชั้นที่ ๑ .งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ ๑ - ชั้นหลังคา ,งานคานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นระดับหลังคาคอนกรีต + ชั้นวางถังน้ำ ,งานพื้นชั้นระดับหลังคาคอนกรีต + ชั้นวางถังน้ำ และงานฐานรับถังบำบัดน้ำเสีย ,งานโครงสร้างหลังคา

๑.๒ งานโครงสร้างอาคารพยาบาลสัตว์ป่วย (บน) แล้วเสร็จ ๑๐๐ % ประกอบด้วย

- งานเตรียมการก่อสร้างทั้งหมด + งานรื้อถอน ,งานฐานราก ,งานเสาตอม่อ งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ ๑ ,งานพื้นชั้นล่าง ,งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นที่ ๑ , งานเสาเหล็กรูปพรรณ ชั้นที่ ๑ ,งานโครงสร้างหลังคา ๑ (ปรับปรุง),งานโครงสร้างหลังคา TRUSS

สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ ๑ แล้วเสร็จ ๗๑.๖๗ % คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ ได้ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน (วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

๒.๑ งานสถาปัตยกรรม อาคารชั้นสุตรซากและเตาเผาซาก แล้วเสร็จ ๐ % ประกอบด้วย

- งานมุงหลังคา ASAPVC , งานก่อฉาบผนัง

๒.๒ งานสถาปัตยกรรม อาคารพยาบาลสัตว์ป่วย แล้วเสร็จ ๐ % ประกอบด้วย

- งานวัสดุมุงหลังคา ASAPVC , งานวัสดุผิวพื้น , งานวัสดุผนัง , งานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ,งานทาสีแล้วเสร็จ

๒.๓ งานโครงสร้างวิศวกรรม อาคารโรงพยาบาลสัตว์และสำนักงานส่วนแยก แล้วเสร็จ ๑๐๐ % ประกอบด้วย

- งานเตรียมการก่อสร้าง (ทั้งหมด) ,งานรื้อถอนโรงพยาบาล (เดิม) ,งานฐานราก ,งานเสาตอม่อ ,งานคานคอดิน ,งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๑ ,งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๑ , งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๑ - ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ

สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ ๒ แล้วเสร็จ ๓๓.๓๔ % คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๒ ได้ในปลายเดือนพฤษภาคม

๒๕๖๕

งวดที่ ๓ ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๐ วัน (วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕) ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

๓.๑ ระบบไฟฟ้าและสื่อสารอาคารชั้นสุตรซากและเตาเผาซาก แล้วเสร็จ ๐ % ประกอบด้วย

- งานแผงสวิทช์ไฟฟ้าประธาน (MDB) ,งานสายไฟและท่อ,รางเดินสายไฟฟ้าระบบเมน, วางระบบประปา + สุขาภิบาลและระบบบำบัดน้ำเสีย

๓.๒ ระบบไฟฟ้าและสื่อสารอาคารพยาบาลสัตว์ป่วย แล้วเสร็จ ๘๐ % ประกอบด้วย

- งานแผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ ,งานสายไฟฟ้าและท่อรางเดินสายไฟฟ้า ,ระบบเมนสายไฟฟ้า ,ติดตั้งคอมพิวเตอร์และเต้ารับ ,ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด, ระบบประปา + สุขาภิบาลและระบบบำบัดน้ำเสีย และงานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆแล้วเสร็จ

สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ ๓ แล้วเสร็จ ๔๐ % คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๓ ได้ในปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๔ ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๐ วัน (วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕) ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

๔.๑ งานภูมิทัศน์ อาคารชั้นสุตรซากและเตาเผาซาก แล้วเสร็จ ๐ % ประกอบด้วย

- งานหลังคาแผงลาดตาข่าย ๑ นิ้ว และงานประตู - หน้าต่าง แล้วเสร็จ

๔.๒ งานโครงสร้างวิศวกรรม (อาคารกักกันโรคสัตว์) แล้วเสร็จ ๙๐ % ประกอบด้วย

- งานเตรียมการก่อสร้างรื้อถอน ,งานฐานราก ,งานฐานรากถึงบำบัดน้ำเสีย + ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป + ถังเซต ,งานถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ,งานเสาตอม่อ ,งานคานคอดิน ,งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ ๑ ,งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ ๑ ,งานกระเบื้องดิน ,งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ ๑ ,งานเสาเหล็กรูปพรรณ ชั้นที่ ๑ ,งานโครงสร้างหลังคา (ปรับปรุง) ,งานโครงสร้างหลังคา TRUSS A , TRUSS B , TRUSS C , งานทาสีแล้วเสร็จ

สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ ๔ แล้วเสร็จ ๔๕ % คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๔ ได้ในปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๕ ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๐ วัน (วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕) ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

๕.๑ งานสถาปัตยกรรม (อาคารกักกันโรคสัตว์) แล้วเสร็จ ๒๐ % ประกอบด้วย

- งานมุงหลังคา ASAPVC ,งานผนัง ,งานประตู - หน้าต่าง ,งานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ,งานทาสีผนัง ,งานระบบไฟฟ้าแผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ ,งานเดินสายไฟฟ้าและระบบเมน ระบบกล้องวงจรปิด ,ระบบประปา ,ระบบสุขาภิบาล และเบ็ดเตล็ดอื่น ๆแล้วเสร็จ

๕.๒ งานโครงสร้างวิศวกรรม อาคารโรงพยาบาลสัตว์และสำนักงานส่วนแยก แล้วเสร็จ ๒๐ % ประกอบด้วย

- งานฝ้าเพดาน ,งานวัสดุผิวพื้น ,งานวัสดุผนัง ,งานบัวเชิงผนัง ,งานประตู - หน้าต่าง ,งานรายการสุขภัณฑ์ ชาย - หญิง

สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ ๕ แล้วเสร็จ ๒๐ % คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๕ ได้ในกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๖ ระยะเวลาดำเนินงาน ๔๐ วัน (วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕) ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

๖.๑ งานโครงสร้างวิศวกรรม อาคารโรงพยาบาลสัตว์และสำนักงานส่วนแยก แล้วเสร็จ ๗๐ % ประกอบด้วย

- งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก ,งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นหลังคา ,งานพื้นชั้นหลังคา

- งานโครงสร้างอาคาร Generator ทั้งหมด

๖.๒ งานสถาปัตยกรรม อาคารสำนักงานส่วนแยก แล้วเสร็จ ๔๐ % ประกอบด้วย

- งานวัสดุผนังหลังคา ASA PVC , งานก่อฉาบผนัง ,งานวัสดุผิวพื้น ,งานบัวเชิงผนัง ,งานวัสดุผนัง ,งานฝ้าเพดาน ,งานประตู - หน้าต่าง ,รายการสุขภัณฑ์ ,งานทาสี ,งานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ แล้วเสร็จ

- งานก่อฉาบผนัง ,งานวัสดุผิวพื้น ,งานประตู - หน้าต่าง อาคาร Generator

สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ ๖ แล้วเสร็จ ๕๕ % คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๖ ได้ในกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๗ ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๐ วัน (วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕) ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

๗.๑ งานสถาปัตยกรรม อาคารโรงพยาบาลสัตว์เดิม **แล้วเสร็จ ๕๐ %** ประกอบด้วย

- งานหลังคาซีแพค (ซ่อมโครงหลังคาเดิม), งานก่อฉาบผนัง, งานวัสดุพื้น, งานบัวเชิงผนัง, งานวัสดุผนัง, งานฝ้าเพดาน, งานประตู – หน้าต่าง, งานสุขภัณฑ์, งานเบ็ดเตล็ด, งานทาสี **แล้วเสร็จ**

๗.๒ งานครุภัณฑ์อาคารชั้นสูตรซากและเตาเผาซาก **แล้วเสร็จ ๐ %** ประกอบด้วย

- งานติดตั้งเครนยก ๕ ตัน, ติดตั้งระบบทำความเย็นสำหรับเก็บซากสัตว์, ติดตั้งเตาเผา, ติดตั้งกล้องวงจรปิดและติดตั้งระบบปรับอากาศ

สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ ๗ แล้วเสร็จ ๒๕ % คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๗ ได้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๘ ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๐ วัน (วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕) ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

๘.๑ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร อาคารโรงพยาบาลสัตว์เดิม **แล้วเสร็จ ๕๐ %** ประกอบด้วย

- งานแผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน (MDB) (EDB), งานสายไฟฟ้าและท่อ, รางเดินสายไฟฟ้าระบบเมน, ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นที่ ๑ ติดตั้งคอมพิวเตอร์และสวิตช์และเต้ารับ, ระบบสื่อสาร (โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์), ระบบกล้องวงจรปิด, ติดตั้งระบบปรับอากาศและเครื่อง Generator

๘.๒ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร อาคารสำนักงานแยก **แล้วเสร็จ ๐ %** ประกอบด้วย

- งานคอมพิวเตอร์, สวิตช์และเต้ารับ, สายไฟ, ท่อและรางเดินสายไฟ, ระบบสื่อสาร (โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์), ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบกล้องวงจรปิดและติดตั้งระบบปรับอากาศ **แล้วเสร็จ**

๘.๓ งานภูมิทัศน์ อาคารชั้นสูตรซากและเตาเผาซาก **แล้วเสร็จ ๐ %** ประกอบด้วย

- งานถนนทางเข้าอาคารชั้นสูตรซากและเตาเผาซาก พื้นที่โดยประมาณ ๔๑๒ ตารางเมตร
- งานถนนด้านหน้าทางเข้าอาคารชั้นสูตรซากและเตาเผาซาก พื้นที่โดยประมาณ ๑๑๕ ตารางเมตร
- งานรั้วโดยรอบอาคารชั้นสูตรซาก **แล้วเสร็จ**

สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ ๘ แล้วเสร็จ ๑๖.๖๗ % คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๘ ได้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

สรุปการดำเนินงานปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา ตลอดระยะเวลาเริ่มโครงการจนถึง ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ คิดเป็น ๓๔.๐๘ %

ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- หลังจากการทำสัญญาจ้างแล้วเสร็จมีฝนตกชุกในระยะเวลาดังกล่าวจึงทำให้ไม่สามารถถมดินได้ เนื่องจากบ่อดินลูกรังไม่สามารถขุดดินได้ต้องรอให้ฝนหยุดและดินแห้ง จึงมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานก่อสร้างเตาเผาซาก ผู้รับจ้างปรับเปลี่ยนแผนงานโดยการดำเนินงานในงวดงานที่ ๒ งานสถาปัตยกรรม อาคารพยาบาลสัตว์ป่วย, งานโครงสร้างวิศวกรรมอาคารโรงพยาบาลสัตว์และสำนักงานส่วนแยก, งวดที่ ๔ งานโครงสร้างวิศวกรรม (อาคารกักกันโรคสัตว์) ไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง หากแต่งงานไม่เป็นไปตามงวดงานที่ได้แบ่งไว้ข้างต้น

- คณะกรรมการฯได้จัดทำบันทึกข้อความเลขที่ พน.๑๑๑๕.๕ / ๘๑ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ แจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการงานก่อสร้างปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา

- ในการดำเนินงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต้องมีการบ่มคอนกรีตเพื่อให้คอนกรีตเซ็ตตัว หากมีการเร่งรีบเกินไปจะทำให้เกิดเป็นเหตุวิบัติของคอนกรีตได้

ภาพการดำเนินงาน
งานปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารเตาเผาซาก




งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารเตาเผาซาก



งานโครงสร้างอาคารพยาบาลสัตว์ป่วย (บน)



งานโครงสร้างอาคารพยาบาลสัตว์ป่วย (บน)

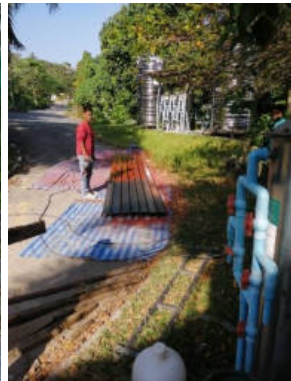

งานอาคารโรงพยาบาลสัตว์



อาคารส่วนแยก



งานอาคารกักกันโรคสัตว์



งานปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธุ์สมเสร็จ ภายในสวนสัตว์สงขลา

สัญญาเลขที่	๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
วงเงิน	๑๖,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบหกล้านบาทสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินงาน	เริ่มงานวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จในสัญญาวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๗๐ วัน
จำนวนงวดงาน	๗ งวด
ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรุ่งก่อสร้าง ๒๐๐๗

ผลการดำเนินงาน

งวดที่ ๑ เบิกเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน ๑,๖๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท

งวดที่ ๒ เบิกเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน ๒,๑๔๒,๔๐๐.๐๐ บาท

งวดที่ ๓ ดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา (วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕)

ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างกำแพง แล้วเสร็จ ๐ %
- งานโครงหลังคาเหล็ก อาคารคอกกัก ๔ หน่วยและอาคารคอกกัก ๓ หน่วย แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานโครงหลังคาเหล็ก ศาลาชมสัตว์ แล้วเสร็จ ๙๐ %
- งานโครงหลังคาเหล็ก ชุมนิให้อาหารสัตว์ ๔ หลัง แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานโครงหลังคาเหล็กที่หลบแดดหลบฝน ๔ หลัง แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ราวกันตก ด้านหน้าส่วนจัดแสดง แล้วเสร็จ ๐ %
- งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กของบังคัสัตว์ แล้วเสร็จ ๐ %
- งานโครงสร้างรั้ว Wire mesh แล้วเสร็จ ๐ %
- งานโครงสร้างรั้วหินธรรมชาติ แล้วเสร็จ ๐ %

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

๑. ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ โดยทางคณะกรรมการฯได้ทำบันทึกข้อความแจ้งให้ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรุ่งก่อสร้าง ๒๐๐๗ เร่งเข้าดำเนินงานโครงการฯให้แล้วเสร็จตามข้อกำหนดเงื่อนไขสัญญาจ้างแล้ว จำนวน ๒ ฉบับ (เร่งรัด ครั้งที่ ๒) ทำให้การทำงานในงวดที่ ๓ การดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา

๒. ผู้รับจ้างให้เหตุผลในที่ประชุมเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ว่าเนื่องจากคนงานของผู้รับจ้างติดเชื้อโควิด-๑๙ บางส่วนและบางส่วนจำเป็นต้องกักตัวตามคำสั่งสาธารณสุข โดยคณะกรรมการฯได้ลงมติในที่ประชุมให้ทางผู้รับจ้าง ฯ จัดทำเอกสารชี้แจงปัญหาอุปสรรคและส่งเอกสารเกี่ยวกับคนงานติดเชื้อโควิด-๑๙ หากแต่ ปัจจุบันสวนสัตว์สงขลา ยังไม่ได้รับเอกสารฉบับดังกล่าว

๓. ปัจจุบันงานในงวดที่ ๓ มีความก้าวหน้าน้อยมากส่งผลกระทบในการเบิกจ่ายเงินตามงวดงาน และอาจส่งผลให้ งานไม่แล้วเสร็จตามข้อกำหนดเงื่อนไขสัญญาจ้าง ฯ จึงเห็นควรให้มีการเร่งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ตามข้อกำหนดเงื่อนไขสัญญาจ้าง

ภาพการดำเนินการ
โครงการปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธุ์สมเสร็จ ภายในสวนสัตว์สงขลา





รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕

สวนสัตว์อุบลราชธานี

ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ

ครุภัณฑ์ รายการที่ ๑ แผ่นบันทึกภาพเอกซเรย์แบบดิจิทัล ๔ แผ่น

ผู้รับจ้าง บริษัท เจ.เอฟ แอดวาน เมด จำกัด สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๕ เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วงเงินที่ลงนามสัญญา ๒๒๖,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส ๑๑๑๖/๑๓๘๓ ลว. ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔




ครุภัณฑ์ รายการที่ ๒ ชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ๑ ชุด

ผู้รับจ้าง บริษัท เจ.เอฟ แอดวาน เมด จำกัด สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๕ เริ่ม ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนามสัญญา ๑,๖๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์แล้วเสร็จ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส ๑๑๑๖/๑๔๘๘ ลว. ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

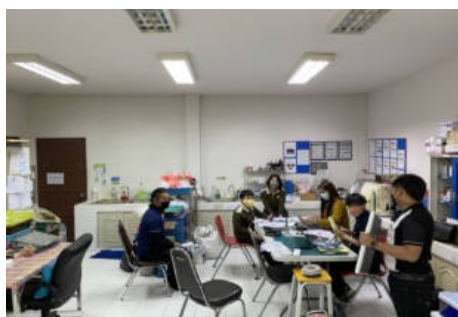

ครุภัณฑ์ รายการที่ ๓ หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ Kva. ๕ เครื่อง

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแม็ค เทคโนโลยี สัญญาเลขที่ ๙/๒๕๖๕ เริ่ม ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนามสัญญา ๗๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์แล้วเสร็จในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

- ขออนุมัติเบิกเงินตามหนังสือเลขที่ ทส๑๑๑๖/๑๔๑๑ ลว. ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔



ครุภัณฑ์ รายการที่ ๔ กล่องวงจรปิดติดตั้ง ๘ จุด ๖๖ ตัว

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีคอมมูนิเคชั่นเซลล์ แอดเซอร์วิส สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๕ เริ่ม ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ วงเงินที่ลงนามสัญญา ๘๕๐,๐๐๐บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์แล้วเสร็จในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส ๑๑๑๖/๑๔๘๘ ลว. ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

ภาพการดำเนินงาน



สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ

งานก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ สวนสัตว์อุบลราชธานี

ผลการดำเนินงาน

- สวนสัตว์อุบลราชธานี ได้ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ดินสอแสง ก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖,๘๘๘,๐๐๐ บาท ตามประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
- สิ้นสุดการอุทธรณ์ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
- มีผู้ยื่นอุทธรณ์ ๑ ราย บริษัท ไรท์แมน จำกัด
- องค์การสวนสัตว์ฯ ได้นำส่งวินิจฉัยผลการอุทธรณ์ให้กรมบัญชีกลางพิจารณา ตามหนังสือเลขที่ ทส ๑๑๐๑/๑๙ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างรอผลการวินิจฉัยการอุทธรณ์
- ผลวินิจฉัยการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง ให้สวนสัตว์อุบลราชธานีดำเนินการเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่
- ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) ครั้งที่ ๒ แล้วกำหนดเคาะราคา วันที่ ๑๙-๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาผล โดยมีผู้ยื่นเสนอราคาจำนวน ๔ ราย และรอผลการอุทธรณ์อีก ๗ วัน หากไม่มีผู้อุทธรณ์ คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ครุภัณฑ์ สวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตู้แช่อาหาร ขนาด ๔๕ คิวบิกฟุต
งบประมาณ ๔๖,๐๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



ตู้แช่อาหาร ขนาด ๓๒ คิวบิกฟุต
งบประมาณ ๒๗,๐๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



เครื่องเป่าใบไม้ ๒ จังหวะ ๓ เครื่อง
งบประมาณ ๓๐,๓๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวี ๑ เครื่อง
งบประมาณ ๕๒,๙๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



ครุภัณฑ์ สวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เครื่องเลเซอร์รักษาแผลสำหรับสัตว์
1 เครื่อง งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ๓ เครื่อง
งบประมาณ ๔๔๔,๒๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า ๒ เครื่อง
งบประมาณ ๗๐,๐๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า สวนสัตว์ขอนแก่น
๒ เครื่อง งบประมาณ ๑๙,๐๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสัตว์และอาคารประกอบต่างๆ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น

ผลการดำเนินงาน

งวดที่ ๑ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน หมวดที่ ๓ (หมวดสุดท้าย) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (๘๐ วัน)

- | | |
|--|-----------------|
| ๑. งานปรับปรุงอาคาร รพ.สัตว์ | |
| ๑.๑ งานรื้อถอน | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๑.๒ งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๑.๓ งานระบบไฟฟ้า | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๑.๔ งานอื่นๆ | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๑.๕ งานระบบความปลอดภัย | แล้วเสร็จ ๘๐ % |
| ๒. งานต่อเติมบันไดทางขึ้นโรงพยาบาลสัตว์ | |
| ๒.๑ งานโครงสร้าง | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๒.๒ งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๒.๓ งานระบบไฟฟ้า | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๓. งานต่อเติมคอกกักสัตว์ป่วย (สัตว์กัก) | |
| ๓.๑ งานโครงสร้าง | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๓.๒ งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๓.๓ งานระบบประปา | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๔. งานต่อเติมอาคารผ่าซากสัตว์ | |
| ๔.๑ งานรื้อถอน | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๔.๒ งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๔.๓ งานอื่นๆ | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๕. งานต่อเติมบ้านแมวจรจัด | |
| ๕.๑ งานโครงสร้าง | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๕.๒ งานสถาปัตยกรรม | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๖. งานก่อสร้างรั้วแนวเขต รพ.สัตว์ ยาว ๗๐๐ เมตร | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๗. งานครุภัณฑ์ | แล้วเสร็จ ๘๐ % |
| ๘. งานก่อสร้างต่างๆ ที่มีปรากฏในสัญญาและรูปแบบ | แล้วเสร็จ ๘๐ % |

รายการทั้งหมดพร้อมทำความสะอาดบริเวณงานก่อสร้าง

สรุป การปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ ๙๕ ตลอดระยะเวลาเริ่มโครงการจนถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕



ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
แนวทางแก้ไข -

งานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

งานก่อสร้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวน้ำ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น

ผู้รับจ้าง บริษัท ชุนพลพัฒนาการ จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ ๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ วงเงินสัญญาจ้าง
จำนวนเงิน ๑๔,๕๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เริ่มดำเนินงาน ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔ งวด จำนวน ๒๔๐ วัน

งวดที่ ๑ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน งวดที่ ๒ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕
(๖๐ วัน) บริษัทฯ ส่งมอบงานมา คณะกรรมการฯ ส่งคืนเอกสารมอบงานไม่สามารถรับงานได้เนื่องจากเนื่องจาก

บางรายการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ปัจจุบันยังไม่ส่งมอบงานมา

๑. งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมภายในอาคารจัดแสดงแมวน้ำ

- | | |
|--|-----------------|
| ๑.๑ งานรื้อถอนหินเทียม พร้อมจัดเก็บวัสดุในพื้นที่สวนสัตว์กำหนดให้ | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๑.๒ งานรื้อถอนโครงหลังคา พร้อมจัดเก็บวัสดุในพื้นที่สวนสัตว์กำหนดให้ | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๑.๓ งานรื้อถอนชุดหลอดไฟฟ้าพร้อมจัดเก็บวัสดุในพื้นที่สวนสัตว์กำหนดให้ | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |

๒. งานปรับปรุงอาคารแสดงแมวน้ำ (งานโครงสร้าง ส่วนต่อเติม)

- | | |
|---|-----------------|
| ๒.๑ งานเชื่อมเหล็กโครงหลังคา พร้อมติดตั้ง | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
|---|-----------------|

๓. งานปรับปรุงอาคารแสดงแมวน้ำ (งานสถาปัตยกรรม และงานระบบส่วนต่อเติม)

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| ๓.๑ งานมุงหลังคา Metal sheet | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๓.๒ งานผนัง คสล. แต่งผิวเรียบ | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๓.๓ งานผิวเสา คสล. แต่งผิวเรียบ | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๓.๔ งานผนัง อลูมิเนียมคอมโพสิต | แล้วเสร็จ ๘๐ % |
| ๓.๕ งานผนังกันตกเหล็กฉลุลาย | แล้วเสร็จ ๐.๐๐ % |
| ๓.๖ งานผนังกันตกอะคริลิก | แล้วเสร็จ ๐.๐๐ % |
| ๓.๗ งานพื้น คสล. ผิวขัดมัน | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๓.๘ งานประตู – หน้าต่าง | แล้วเสร็จ ๐.๐๐ % |
| ๓.๙ งานทาสี | แล้วเสร็จ ๐.๐๐ % |
| ๓.๑๐ งานม้านั่งไฟเบอร์กลาส | แล้วเสร็จ ๑๐ % |
| ๓.๑๑ งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง | แล้วเสร็จ ๐.๐๐ % |

๔. งานอาคาร souvenir (งานสถาปัตยกรรม)

- | | |
|--|-----------------|
| ๔.๑ งานผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๔.๒ งานผนังฉาบปูนเรียบขัดมัน | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๔.๓ งานไม้เนื้อแข็ง ๑ ๑/๒ นิ้ว x ๒ นิ้ว | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๔.๔ งานพื้นผิวปูกระเบื้อง ๑๒ นิ้ว x ๑๒ นิ้ว | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๔.๕ งานพื้นผิวปูกระเบื้องลายไม้ ๔ นิ้ว x ๑๖ นิ้ว | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๔.๖ งานพื้นผิวขัดเรียบ | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๔.๗ งานฝ้าเพดาน | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๔.๘ งานไฟฟ้า | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๔.๙ งานทาสี | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |

๕. งานจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในงวดงานต่อไปเข้าพื้นที่งานก่อสร้าง

ผลการดำเนินงาน งานที่ ๓ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ (๔๕ วัน)

๑. งานปรับปรุงอาคารแสดงแมวน้ำ (งานสถาปัตยกรรม และงานระบบส่วนต่อเติม)

- | | |
|---|------------------|
| ๑.๑ งานระบบกรองเกลือ | แล้วเสร็จ ๙๐ % |
| ๑.๒ งานระบบประปาและสุขาภิบาล | แล้วเสร็จ ๕๐ % |
| ๑.๓ งานระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑๘ จุด พร้อมชุดควบคุม | แล้วเสร็จ ๐.๐๐ % |
| ๑.๔ งานระบบกระจายเสียงบริเวณส่วนจัดแสดง | แล้วเสร็จ ๐.๐๐ % |

พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| ๑.๕ งานระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ | แล้วเสร็จ ๐.๐๐ % |
|--------------------------------|------------------|

๒. งานอาคาร Souvenir (งานสถาปัตยกรรม)

- | | |
|--------------|------------------|
| ๒.๑ งานอื่นๆ | แล้วเสร็จ ๐.๐๐ % |
|--------------|------------------|

๓. งานจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในงานต่อไปเข้าพื้นที่งานก่อสร้าง

สรุป การปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ ตลอดระยะเวลาเริ่มโครงการจนถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕



ปัญหาและอุปสรรค บริษัทฯ ส่งมอบงานมา คณะกรรมการฯ ส่งคืนเอกสารมอบงานไม่สามารถรับงานได้เนื่องจากเนื้องานบางรายการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ปัจจุบันยังไม่ส่งมอบงานมา

แนวทางแก้ไข ทำหนังสือแจ้งเร่งรัดไปยังบริษัทฯ เพื่อให้ดำเนินงานให้เป็นไปตามสัญญาและส่งมอบงานงวดที่ ๒ โดยเร่งด่วน

งานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

งานก่อสร้างอาคารจักรนักล้า ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น

ผู้รับจ้าง บริษัท ขุนพลพัฒนาการ จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ วงเงินสัญญาจ้าง จำนวนเงิน ๑๔,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เริ่มดำเนินงาน ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔ งวด จำนวน ๒๔๐ วัน

งวดที่ ๑ เบิกจ่ายแล้ว

ผลการดำเนินงาน งวดที่ ๒ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ (๖๐ วัน) มีเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง กระทบงวด ๒-๔ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการไป องค์การสวนสัตว์ เมื่อวันที่ ๕ พ.ค.๖๕

๑. งานส่วนจัดแสดงเสือโคร่งขาว

- | | |
|--|------------------|
| ๑.๑ งานติดตั้งกล้องวงจรปิดและอินเทอร์เน็ต ส่วนจัดแสดงและคอกกัก | แล้วเสร็จ ๐.๐๐ % |
| ๑.๒ งานรั้วกั้นรอบพื้นที่คอกกัก ความยาว ๙๒ เมตร | แล้วเสร็จ ๒๐ % |
| ๑.๓ งานประตูล้อเลื่อน | แล้วเสร็จ ๐.๐๐ % |
| ๑.๔ งานถนน ค.ส.ล. เข้าคอกกัก หน้า ๑๕ ซม. พื้นที่ ๗๕ ตร.ม. | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |

๒. งานส่วนจัดแสดงเสือโคร่งอินโดจีน

- | | |
|--|------------------|
| ๒.๑ งานประตูล้อเลื่อน | แล้วเสร็จ ๐.๐๐ % |
| ๒.๒ งานถนนทางเข้าคอกกัก ค.ส.ล. หน้า ๑๕ ซม. พื้นที่ ๑๕๕ ตร.ม. | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๒.๓ งานรั้วกั้นรอบพื้นที่คอกกัก ยาว ๑๐๐ เมตร | แล้วเสร็จ ๒๐ % |
| ๒.๔ งานขุ้มบังแดดฝนและลานหินเทียม | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๒.๕ งานอาคารโรงสูบน้ำและระบบกรอง | แล้วเสร็จ ๘๐ % |
| ๒.๖ งานน้ำตกเลียนแบบธรรมชาติ | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |

๓. งานส่วนจัดแสดงสิงโตขาว

- | | |
|--|------------------|
| ๓.๑ งานประตูล้อเลื่อน | แล้วเสร็จ ๐.๐๐ % |
| ๓.๒ งานถนนทางเข้าคอกกัก ค.ส.ล. หน้า ๑๕ ซม. พื้นที่ ๙๘๐ ตร.ม. | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๓.๓ งานรั้วกั้นรอบพื้นที่คอกกัก ยาว ๑๓๐ เมตร | แล้วเสร็จ ๓๐ % |

๔. งานภูมิทัศน์

- | | |
|------------------------------|----------------|
| ๔.๑ งานพรรณไม้ยืนต้น | แล้วเสร็จ ๕๐ % |
| ๔.๒ งานพรรณไม้พุ่มไม้คลุมดิน | แล้วเสร็จ ๕๐ % |

๕. งานจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในงวดงานต่อไปเข้าพื้นที่งานก่อสร้าง

สรุป การปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ ๕๖ ตลอดระยะเวลาเริ่มโครงการจนถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕





ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
แนวทางแก้ไข –

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕


ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

- ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรในปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ



1. กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา ใบสั่งซื้อ 001/2565
บริษัท เบสท์ แล็บ แอนด์ เคมีคอล จำกัด
เบิกจ่าย 100%

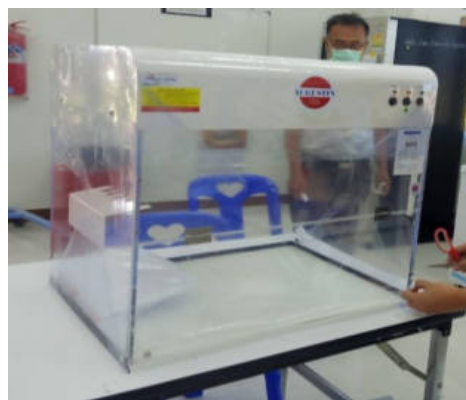


2. เครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมในสภาพจริงแบบเคลื่อนที่ ใบสั่งซื้อ 004/2565
บริษัท อาฟเตอร์ แล็บ จำกัด
เบิกจ่าย 100%

ครุภัณฑ์ รายการที่ ๓ เครื่องมือรักษาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดความเข้มต่ำ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
 ผู้รับจ้าง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๕ เริ่ม ๑๑ ต.ค.๖๕ สิ้นสุดสัญญา ๘ ก.พ. ๖๕
 วงเงินที่ลงนามสัญญา ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (ส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕)



3. เครื่องมือรักษาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดความเข้มต่ำ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
 สัญญาเลขที่ 3/2565 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
 เบิกจ่าย 100%

ครุภัณฑ์ รายการที่ ๔ รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
 ผู้รับจ้าง บริษัทพัชริ เฮฟวี่ แมชชีนเนอรี จำกัด สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๕ เริ่ม ๒๐ พ.ย.๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา ๑๗ ก.พ.
 ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนามสัญญา ๓,๑๙๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
 (ส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

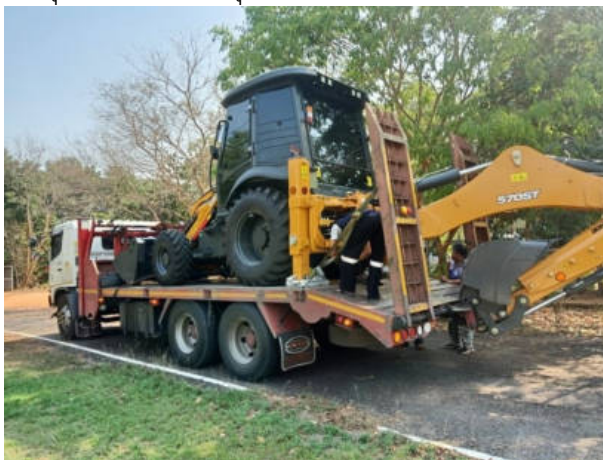

๔. รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
 สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๕ บริษัทพัชริ เฮฟวี่ แมชชีนเนอรี จำกัด
 เบิกจ่าย ๑๐๐%

งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระการบินไทย ภายในโครงการคชอาณาจักร

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ไทยสงวน สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๕ เริ่มเริ่ม ๑๑ พ.ย..๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา ๘ ก.ค. ๒๕๖๕ วงเงินลงนามสัญญา ๑๑,๙๖๙,๐๐๐.-บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จำนวน ๕ งวด ๒๔๐ วัน (โดยฝ่ายพัสดุดงค์การสวนสัตว์เป็นผู้ดำเนินการ)

ผลการดำเนินงาน งวดที่ ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่งเบิกจ่ายไปยัง อสส.เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐% (รอส่งมอบงาน)

- งานสร้างคาคอดินกันสไลด์ ความยาว ๒๕๐ เมตร แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานโครงสร้างฐานราก ศาลาดูช้าง แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานโครงสร้างฐานราก ศาลาพักผ่อน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานโครงสร้างฐานราก ทางเดินช้าง แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานย้ายแทงค์เก็บน้ำ ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร แล้วเสร็จ ๑๐๐%

อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ ๓

- งานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา ศาลาดูช้าง แล้วเสร็จ ๓๐%
- งานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา ศาลาพักผ่อน แล้วเสร็จ ๐%
- งานวางผังทางเดินและเทคอนกรีตปรับระดับ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานเทคอนกรีตและปรับระดับ ทางเดินช้าง แล้วเสร็จ ๑๐๐%

งวดที่ ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐% (รอส่งมอบงาน)

งานสร้างคาคอดินกันสไลด์ ความยาว ๒๕๐ เมตร



งานโครงสร้างฐานราก ศาลาดูช้าง



งานโครงสร้างฐานราก ศาลาพักผ่อน



งานโครงสร้างฐานราก ทางเดินช้าง



งานย้ายแท่งเก็บน้ำ ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร



อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ ๓

- งานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา ศาลาดูช้าง แล้วเสร็จ ๓๐%
- งานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา ศาลาพักผ่อน แล้วเสร็จ ๐%
- งานวางผังทางเดินและเทคอนกรีตปรับระดับ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานเทคอนกรีตและปรับระดับ ทางเดินช้าง แล้วเสร็จ ๑๐๐%

งานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา ศาลาดูช้าง แล้วเสร็จ ๓๐%



งานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา ศาลาพักผ่อน แล้วเสร็จ ๐%



งานวางผังทางเดินและเทคอนกรีตปรับระดับ แล้วเสร็จ ๑๐๐%



งานเทคอนกรีตและปรับระดับ ทางเดินข้าง แล้วเสร็จ ๑๐๐%



ปัญหา-อุปสรรค

สืบเนื่องมาจากปัญหาของโรคระบาดในคราวที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อถึงงานก่อสร้าง ต้องขยับล่าช้าออกไป ประกอบกับวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ เดือน เมษายน จึงทำให้งานก่อสร้างงวด ๓ ทำให้งานล่าช้าออกไปอีก ๑ เดือน จึงเป็นอุปสรรคต่องานงวดที่ ๓ ซึ่งทั้งนี้ผู้ควบคุมงานได้เร่งให้ผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินงานงวดที่ ๓ ให้เสร็จทันภายใน ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ต่อไป

แนวทางแก้ไข

๑. คณะกรรมการควบคุมงานได้ออกหนังสือ ที่อสส๑๑๑๙/๔๘ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่องเร่งรัดการส่งมอบงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระการบินไทย งานงวดที่ ๒ ครั้งที่ ๑ โดยให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ ไทยสงวน ทำหนังสือส่งมอบงานงวดที่ ๒ ภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น
๒. คณะกรรมการควบคุมงานได้ออกหนังสือ ที่อสส๑๑๑๙/๔๔ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่องเร่งรัดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ งานงวดที่ ๓ โดยให้เข้ามาดำเนิน งานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา ศาลาดูช้าง และงานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา ศาลาพักผ่อน ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น

คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ไม่เกินวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

มติที่ประชุม
