


รายงานสถานภาพตามกระบวนการพัสดุ ของงบลงทุน
รายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2565 จำนวน 13 รายการ

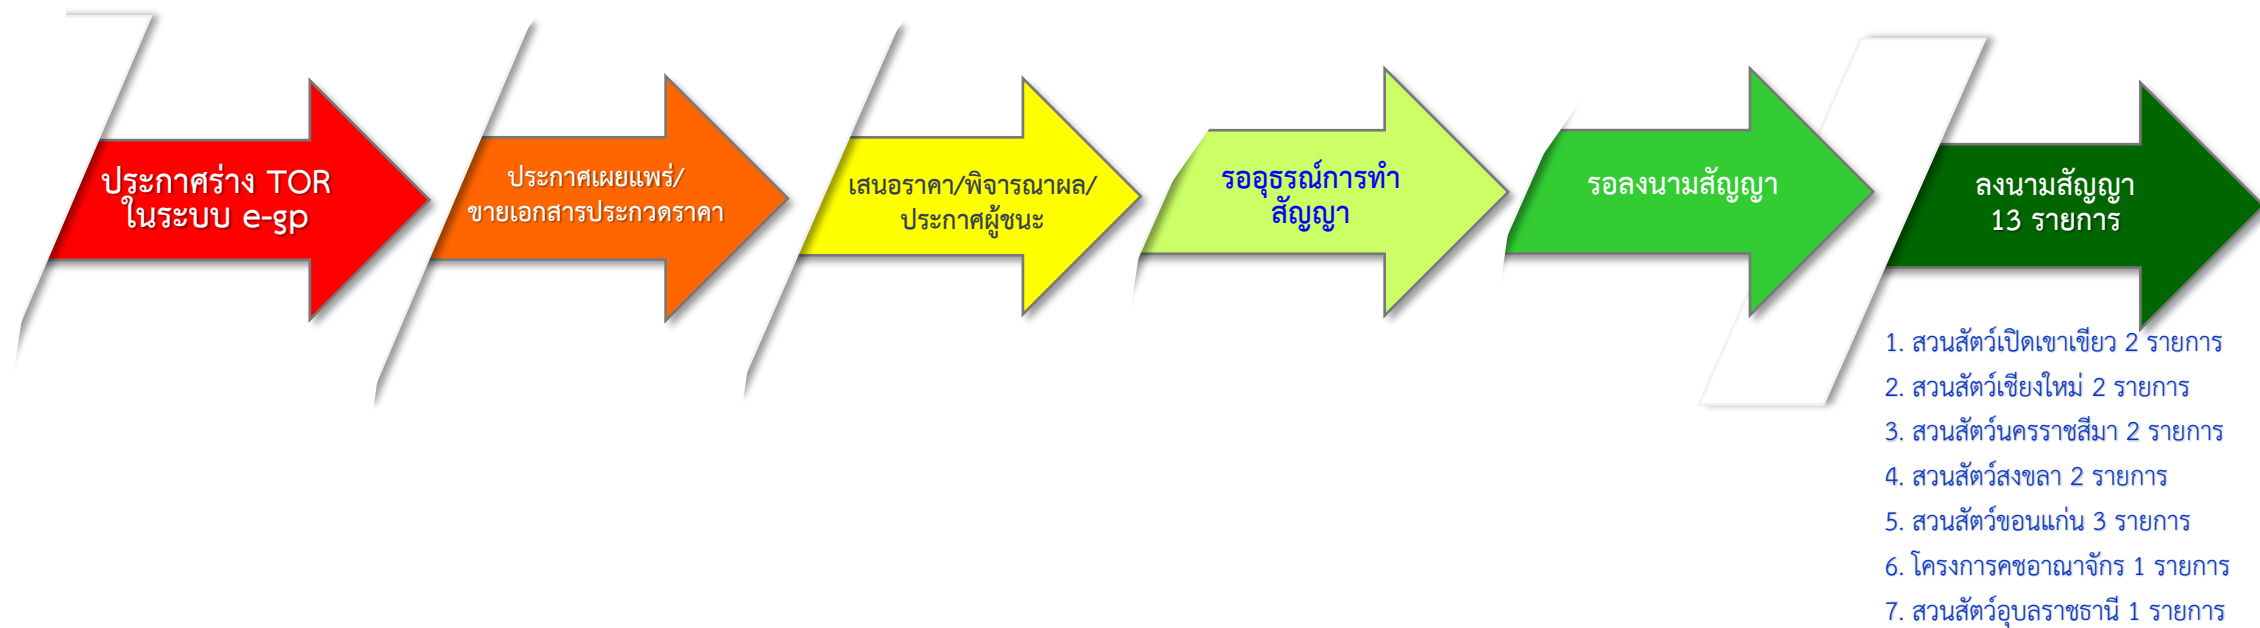

รายงานสถานภาพตามกระบวนการพัสดุ ของงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ ประจำปี 2565 จำนวน 41 รายการ

จัดทำ TOR

อยู่ระหว่างขอซื้อขोज้าง

รอลงนามในสัญญา

ลงนามสัญญา
41 รายการ

เบิกจ่ายแล้ว
38 รายการ




⇒ เบิกจ่ายรวมเป็นเงิน
21.6373 ลบ.

1. ส่วนกลาง 9 รายการ
2. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 5 รายการ
3. สวนสัตว์เชียงใหม่ 5 รายการ
4. สวนสัตว์สงขลา 6 รายการ
5. สวนสัตว์อุบลราชธานี 4 รายการ
6. สวนสัตว์ขอนแก่น 8 รายการ
7. โครงการคชอาณาจักร 4 รายการ

- 38 รายการ เบิกจ่ายครบเรียบร้อยแล้ว
- 1 รายการ คือ รายการระบบบริหารจัดการสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (Thai Zoo Ark) เบิกแล้ว 2 งวด
- 2 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ
 - โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบจำหน่ายบัตร (E-ticket)
 - เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิทัล (เชียงใหม่)

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%



ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ภาพรวม

งบอุดหนุน

งบลงทุน

รายการ		งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย /GFMIS	คิดเป็น (%)	คงเหลือ
1. งบอุดหนุน		405.9195	304.3178	74.97	101.6017
2. งบลงทุน		302.1070	80.0842	26.51	222.0228
* ครุภัณฑ์		33.4451	21.6373	64.69	11.8078
* สิ่งก่อสร้าง		268.6619	58.4469	21.75	210.2150
รวมทั้งสิ้น		708.0265	384.4020	54.29	323.6245

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
รายการสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2565

ลำดับ	สวนสัตว์	รายการ	งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน
		สิ่งก่อสร้าง		
1	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	ปรับปรุงถนนแนวรั้วและสิ่งอำนวยความสะดวก สัญญาที่ 7/2565 บจก.พี.เอ.ไอ ซัพพลาย จำนวน 6 งวดงาน เริ่มต้น 30 ธันวาคม 2564 สิ้นสุด 26 สิงหาคม 2565 - งวดที่ 2 กำหนดแล้วเสร็จ 9 มีนาคม 2565 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) - งวดที่ 3 กำหนดแล้วเสร็จ 18 เมษายน 2565	29,915,000	- เบิกจ่ายงวด 1 เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวด 2 เนื่องจากบริเวณก่อสร้างอยู่ใกล้แนวไฟฟ้าแรงสูงเดิมที่ยังใช้งานอยู่ เมื่อขุดดิน ลงฐานราก จึงต้องมีความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสียหาย ประกอบกับวัสดุในการ ก่อสร้าง เช่น แผงแนวรั้ว ทางผู้ผลิตไม่สามารถส่งของได้ เนื่องจากพนักงานติดโควิด จึงทำให้งานก่อสร้างล่าช้า - วันที่ 21 เม.ย. 65 คณะกรรมการได้ติดตามและเร่งรัดบริษัทฯ แล้ว - วันที่ 19 พ.ค. 65 คณะกรรมการได้เชิญบริษัทฯ เข้ามาคุย เพื่อหาแนวทางการ การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน - งวดงานที่ 2 ดำเนินการได้ในปริมาณงานร้อยละ 70 ยังคงเหลืองานขึ้นโครง หลังคาและมุงหลังคา - สวนสัตว์ยืนยันว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 2 ได้ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565
2	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	ก่อสร้างเตาเผาซากสัตว์ปลอดมลพิษพร้อมปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการ สัญญาที่ 6/2565 บจก.ทิมเท็ค แอนด์เอ็นจิเนียริง จำนวน 2 งวดงาน เริ่มต้น 27 ธันวาคม 2564 สิ้นสุด 26 พฤษภาคม 2565	4,750,000	- เบิกจ่ายครบเรียบร้อยแล้ว
3	สวนสัตว์เชียงใหม่	ปรับปรุงอาคารฝ่ายอนุรักษ์ วิจัยฯ พร้อมอาคารอนุบาลลูกสัตว์ สัญญาที่ 9/2565 บจก.อันนา เทรดิง จำนวน 3 งวดงาน เริ่มต้น 17 ธันวาคม 2564 สิ้นสุด 29 เมษายน 2565	1,945,000	- เบิกจ่ายครบเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	สวนสัตว์	รายการ	งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน
4	สวนสัตว์เชียงใหม่	ก่อสร้างโครงข่ายท่อน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สัญญาที่ 18/2565 หจก.กรีนเทค เอสโซซิเอท จำนวน 10 งวดงาน เริ่มต้น 8 กุมภาพันธ์ 2565 สิ้นสุด 4 ธันวาคม 2565 - งวดที่ 4 กำหนดส่งมอบงาน 7 มิถุนายน 2565	29,880,000	- เบิกจ่ายงวดที่ 1-3 เรียบร้อยแล้ว - งานงวด 4 อยู่ระหว่างการดำเนินงาน - ในการก่อสร้างดังกล่าวมีจำนวน 10 งวดงาน โดยงวดงานที่ 8-10 กำหนดส่งมอบงานในปี 2566 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) - สวนสัตว์ฯ ยืนยันจะเร่งดำเนินการงานงวดที่ 8 ให้สามารถเบิกจ่ายได้ภายในสิ้นเดือนกันยายน 2565 ดังนั้น รายการนี้จะถูกกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีจำนวน 2 งวดงาน คือ งวดที่ 9-10 คิดเป็นร้อยละ 2.22 ของภาพรวมงานก่อสร้าง
5	สวนสัตว์นครราชสีมา	ขยายพื้นที่ส่วนจัดแสดงสัตว์อาณาจักรผู้ล่า สัญญาที่ 10/2565 บจก.เอส.ยู.แพค จำนวน 5 งวดงาน เริ่มต้นวันที่ 17 ธันวาคม 2564 สิ้นสุด 13 สิงหาคม 2565 - งวดที่ 3 กำหนดส่งมอบงาน 9 พฤษภาคม 2565	24,970,000	- เบิกจ่ายเงินงวด 1 เรียบร้อยแล้ว - เบิกจ่ายเงินงวด 2 เรียบร้อยแล้ว - สาเหตุการล่าช้า เนื่องจากปัญหาการสั่งซื้อวัสดุล่าช้า มีวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทำให้แรงงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงทำให้เกิดความล่าช้า - โดยงานงวดที่ 3 ได้ดำเนินการงานโครงหลังคาคอกกักสิงโต งานกำแพงหินเทียม และงานน้ำตกส่วนแสดงสิงโตแล้วเสร็จ เหลือเพียงงานเพิงพักส่วนแสดงสิงโตที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 40% และงานคอกกักสิงโตแล้วเสร็จ 71% คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 3 ได้ ภายใน 15 มิถุนายน 2565
6	สวนสัตว์นครราชสีมา	ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สัญญาเลขที่ 7/2565 บริษัท เอส.ยู.แพค จำกัด จำนวน 5 งวดงาน เริ่มต้นวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุด 23 กรกฎาคม 2565 - งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบงาน 1 มีนาคม 2565 - งวดที่ 3 กำหนดส่งมอบงาน 18 เมษายน 2565	9,950,000	- เบิกจ่ายเงินงวด 1 เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวด 2 สาเหตุการล่าช้าเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงการส่งผลิตท่อระบายน้ำ ซึ่งเป็นท่อน้ำเหลี่ยมที่มีขนาดใหญ่ต้องสั่งทำแต่ทางบริษัทที่ผลิต แจ้งว่าการผลิตท่อจะมีการจัดส่งล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากคอนกรีตที่ผลิตขนาดใหญ่ในการหล่อคอนกรีตต้องใช้ระยะเวลาในการหล่อท่อและทิ้งระยะเวลาหลังจากหล่อท่อเสร็จ

ลำดับ	สวนสัตว์	รายการ	งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน
				ไม่น้อยกว่า 14 วันหรือมากกว่า 14 วัน ถึงจะทำการขนย้ายได้ - งานเทคอนกรีตได้เริ่มได้ดำเนินการบางส่วนแล้วในวันที่ 25 เม.ย.65 และคอนกรีตแล้วเสร็จ 50% แต่เนื่องจากในเดือน พ.ค. 65 มีวันหยุดค่อนข้างเยอะ และพายุลมฝนเข้าทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเทคอนกรีตไม่แห้ง และล่าช้า - คณะกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้นัดประชุมร่วมกับผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 และมีหนังสือเร่งรัดงานครั้งที่ 5 ไปยังบริษัท เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สวนสัตว์ยืนยันว่าจะสามารถส่งงานงวดที่ 2 ได้ภายใน วันที่ 8 มิถุนายน 2565
7	สวนสัตว์สงขลา	ปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ สัญญาเลขที่ 12/2565 หจก.มิตรแสงวิศวกรรม จำนวน 9 งวดงาน เริ่มต้นวันที่ 3 ธันวาคม 2564 สิ้นสุด 29 สิงหาคม 2565 - งวดที่ 1 กำหนดส่งมอบงาน 16 มกราคม 2565 - งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบงาน 15 กุมภาพันธ์ 2565 - งวดที่ 3 กำหนดส่งมอบงาน 17 มีนาคม 2565 - งวดที่ 4 กำหนดส่งมอบงาน 16 เมษายน 2565 - งวดที่ 5 กำหนดส่งมอบงาน 16 พฤษภาคม 2565	30,367,441	- งานงวดที่ 1 บริษัทฯ ส่งมอบงานวันที่ 30 มี.ค.65 - คณะกรรมการตรวจรับวันที่ 8 เม.ย.65 พบว่างานแล้วเสร็จเพียง 72% จึงแจ้งให้บริษัทฯ เร่งดำเนินการ ซึ่งบริษัทฯ แจ้งว่าดำเนินการและส่งมอบได้ภายในวันที่ 5 พ.ค.65 - บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 5 พ.ค.65 คณะกรรมการตรวจรับฯ วันที่ 17 พ.ค.65 ปรากฏว่างานยังไม่แล้วเสร็จ อาคารเตาเผาซาก คงเหลืองานในส่วนของพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 1 แล้วเสร็จ 80% งานพื้นชั้นระดับหลังคา คอนกรีต+ชั้นวางถังน้ำและงานฐานรับถังบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จ 90% งานโครงสร้างหลังคายังไม่แล้วเสร็จ งานงวดที่ 1 แล้วเสร็จประมาณ 89.17% คงเหลืองานที่ยังไม่แล้วเสร็จ 10.83% สวนสัตว์ยืนยันว่างานจะแล้วเสร็จและส่งมอบงวดที่ 1 ในวันที่ 7 มิถุนายน 65 - สวนสัตว์ฯ ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงวดงานตั้งแต่งวดที่ 2 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 - งานงวดที่ 2 ดำเนินการแล้ว 40% เนื่องจากติดปัญหาฝนตกหนักในพื้นที่ทำหาคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นระดับหลังคาคอนกรีตในงวดที่ 1 ล่าช้าส่งผลให้การปฏิบัติ

ลำดับ	สวนสัตว์	รายการ	งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน
				งานงวดที่ 2 งานสถาปัตยกรรม งานมุงหลังคา ASAPVC งานก่อฉาบผนังดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานงวด คาดว่าจะส่งมอบงานงวด 2 ได้ภายใน 15 มิ.ย.65 - งวดที่ 3 ภาพรวมดำเนินการแล้วเสร็จ 45% งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารอาคารพยาบาลสัตว์ป่วยแล้วเสร็จ 90% คงเหลือระบบไฟฟ้าและสื่อสารอาคารชั้นสูตรซากและเตาเผาซากที่ยังไม่ดำเนินการ คาดจะส่งมอบงานได้ปลายเดือน มิ.ย.65 - งวดงานที่ 4 ดำเนินการได้ 45% ได้ดำเนินงานโครงสร้างวิศวกรรมอาคารกอกักโรคสัตว์แล้วเสร็จ 90% ยังคงเหลืองานภูมิทัศน์อาคารชั้นสูตรซากและเตาเผาซากที่ยังไม่ได้ดำเนินการคาดว่าจะส่งมอบงานได้ในเดือน ก.ค.65 - งวดงานที่ 5 ดำเนินการได้ 20% งานอาคารกักโรคสัตว์ งานโครงสร้างวิศวกรรม อาคารโรงพยาบาลสัตว์และสำนักงานส่วนแยก คาดว่าส่งมอบงานได้ปลายเดือน ก.ค.65
8	สวนสัตว์สงขลา	ปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธุ์สมเสร็จ สวนสัตว์สงขลา สัญญาที่ 11/2565 หจก.ชัยรุ่งก่อสร้าง 2007 จำนวน 7 งวดงาน เริ่มต้น 23 พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุด 19 สิงหาคม 2565 - งวดที่ 3 กำหนดส่งมอบงาน 16 มีนาคม 2565 - งวดที่ 4 กำหนดส่งมอบงาน 25 เมษายน 2565 - งวดที่ 5 กำหนดส่งมอบงาน 30 พฤษภาคม 2565	16,480,000	- เบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว - เบิกจ่ายงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว - งวดงานที่ 3 คณะกรรมการฯ ได้ทำหนังสือแจ้งให้บริษัทฯ เข้ามาดำเนินงานจำนวน 2 ครั้ง โดยบริษัท ได้หยุดงานไปตั้งแต่วันที่ 1 มีค - 8 เม.ย. 65 รวม 39 วัน และวันที่ 9-10 เม.ย.65 เข้ามาตรวจสอบรายละเอียดงาน แต่เริ่มเข้ามาดำเนินการเมื่อวันที่ 11 เม.ย.65 - ดำเนินการได้ 90% บริษัทฯ ส่งมอบงานวันที่ 26 พ.ค.65 อยู่ระหว่างขั้นตอนของคณะกรรมการตรวจรับงาน - งวดงานที่ 4 บริษัทฯ งานมุงหลังคา ระบบไฟฟ้า ฉาบ ก่ออิฐฉาบ สวนสัตว์สงขลาแจ้งว่าคาดว่าจะส่งมอบงานได้ภายในวันที่ 25 มิ.ย.65

ลำดับ	สวนสัตว์	รายการ	งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน
9	สวนสัตว์ขอนแก่น	ปรับปรุงส่วนจัดแสดงอาณาจักรนักล้า สวนสัตว์ขอนแก่น สัญญาที่ 18/2565 บจก.ขุนพลพัฒนาการ จำนวน 4 งวดงาน เริ่มต้น วันที่ 24 ธันวาคม 2564 สิ้นสุด 20 สิงหาคม 2565 - งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบงาน 22 เมษายน 2565 - งวดที่ 3 กำหนดส่งมอบงาน 21 มิถุนายน 2565	14,990,000	- เบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว - งานงวดที่ 2 ดำเนินการแล้ว 90% แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการในบางส่วน สวนสัตว์ขอนแก่นจึงได้ทำหนังสือขอเปลี่ยนแปลงรายการมายังองค์การสวนสัตว์ฯ ตามหนังสือที่ อสส1118/182 ลว. 4 พ.ค.65 - สำหรับงานงวดที่ 3 ดำเนินการแล้ว 50%
10	สวนสัตว์ขอนแก่น	ปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวน้ำ สัญญาที่ 11/2565 บจก.ขุนพลพัฒนาการ จำนวน 4 งวดงาน เริ่มต้น วันที่ 15 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 11 มิถุนายน 2565 - งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบงาน 14 มีนาคม 2565 - งวดที่ 3 กำหนดส่งมอบงาน 28 เมษายน 2565 - งวดที่ 4 (สุดท้าย) กำหนดส่งมอบงาน 12 มิถุนายน 2565	14,567,000	- เบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว - งานงวดที่ 2 สวนสัตว์ขอนแก่น ได้ส่งเรื่องเบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 31 พ.ค.65 - งวดงานที่ 3 มีการขอเปลี่ยนแปลงงานรูปปั้นแมวน้ำจากไฟเบอร์กลาส มาเป็นงานรูปปั้นแมวน้ำปูนปั้น คสล. เพื่อให้เกิดความแข็งแรง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สพส. - สำหรับงานโครงสร้างดำเนินการแล้ว 100% อยู่ระหว่างการทดสอบระบบกลี้องวงจรปิด และ ระบบไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ - งวดงานที่ 4 (สุดท้าย) ดำเนินการแล้วเสร็จ 90% อยู่ระหว่างการทดสอบระบบของจอ LED และเครื่องเสียง - คาดว่างานงวดที่ 3-4 (สุดท้าย) จะส่งได้ทันตามกำหนดในสัญญาคือ วันที่ 12 มิ.ย.65
11	สวนสัตว์ขอนแก่น	ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสัตว์และอาคารประกอบต่างๆ สัญญาที่ 10/2565 บจก.ขุนพลพัฒนาการ จำนวน 3 งวดงาน เริ่มต้น วันที่ 15 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด วันที่ 12 พฤษภาคม 2565	7,979,000	- เบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว - เบิกจ่ายงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว - งานงวด 3 (สุดท้าย) สวนสัตว์ขอนแก่น ได้เรื่องเบิกจ่ายเมื่อวันที่ 31 พ.ค.65

ลำดับ	สวนสัตว์	รายการ	งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน
12	โครงการคชอาณาจักร	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระการบินไทย โครงการคชอาณาจักร สุรินทร์ สัญญาที่ 5/2565 หจก.สุรินทร์ไทยสงวน จำนวน 5 งวดงาน เริ่มต้น วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 - งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบงาน 23 กุมภาพันธ์ 2565 - งวดที่ 3 กำหนดส่งมอบงาน 9 เมษายน 2565 - งวดที่ 4 กำหนดส่งมอบงาน 24 พฤษภาคม 2565	11,969,000	- เบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว - งวดที่ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % แจ้งว่าจะส่งมอบงานได้วันที่ 15 มิ.ย.65 - งวดที่ 3 งานทางเดินและงานเทคอนกรีตแล้วเสร็จ 100 % คงเหลืองานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคาดูช้าง ดำเนินการแล้วเสร็จ 50% และเหลืองานโครงสร้างหลังคาและศาลาพักผ่อนดำเนินการแล้วเสร็จ 20% คาดว่าจะส่งมอบงานในวันที่ 15 มิ.ย.65 - งวดที่ 4 ดำเนินการแล้ว 30% เนื่องจากต้องรอกงานงวดที่ 3 ในส่วนของโครง หลังคาให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะดำเนินการในเรื่องการวางระบบสาธารณูปโภคและงาน ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งต้นไม้จะเริ่มส่งได้ในต้นเดือน มิ.ย.65
13	สวนสัตว์อุบลราชธานี	ปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม สวนสัตว์ สัญญาที่ 21/2565 หจก.กรีนเทค เอสโซซิเอท จำนวน 6 งวดงาน สัญญาเริ่ม 6 พ.ค. - 31 ธ.ค.65 จำนวน 240 วัน - งวดที่ 1 กำหนดส่งมอบ 22 มิถุนายน 2565	61,848,000	- ลงนามสัญญาวันที่ 6 พ.ค. สิ้นสุด 31 ธ.ค.65 จำนวน 240 วัน - งวดที่ 1 ดำเนินงานได้ 20% คาดว่าสามารถส่งมอบงาน ได้ทันตามกำหนดระยะเวลาตามสัญญาภายในวันที่ 22 มิ.ย.65

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่องเดิม	๑. ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร) ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ เรื่อง ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นการดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ทั้งในส่วนของงบลงทุน เพื่อดำเนินงานปกติและงบลงทุนตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ๒. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้รับงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๓๐๒.๑๐๗๐ ล้านบาท รวม ๕๔ รายการ ประกอบด้วย ๓.๑ รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๔๑ รายการ เป็นเงิน ๓๓.๔๔๕๑ ล้านบาท ๓.๒ รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ เป็นเงิน ๒๖๘.๖๖๑๙ ล้านบาท ๓. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๖.๒๓๐๕ ล้านบาท จำนวน ๘ รายการ ประกอบด้วย ๒.๑ รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๕.๑๐๖๐ ล้านบาท ๒.๒ รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๑๖๑.๑๒๔๕ ล้านบาท																																																																		
การดำเนินงาน	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย มีผลการดำเนินงานงบลงทุน ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สรุปดังนี้																																																																		
	๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๔ รายการ <table><tr><th>รายการ</th><th>จำนวน (รายการ)</th><th>วงเงิน (ล้านบาท)</th><th>เบิกจ่าย (ล้านบาท)</th><th>ร้อยละ</th><th>หมายเหตุ</th></tr><tr><td>รวมทั้งสิ้น</td><td>๕๔</td><td>๓๐๒.๑๐๗๐</td><td>๘๐.๐๘๔๒</td><td>๒๖.๕๑</td><td></td></tr><tr><td>๑. ครุภัณฑ์</td><td>๔๑</td><td>๓๓.๔๔๕๑</td><td></td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>- ลงนามสัญญา</td><td>๔๑</td><td>๓๐.๙๒๘๙</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- เงินเหลือจ่าย</td><td></td><td>๒.๕๑๖๒</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ผลเบิกจ่ายครุภัณฑ์</td><td>๓๘</td><td></td><td>๒๑.๖๓๗๓</td><td>๖๔.๖๙</td><td></td></tr><tr><td>๒. สิ่งก่อสร้าง</td><td>๑๓</td><td>๒๖๘.๖๖๑๙</td><td></td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>- รอลงนามสัญญา</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- ลงนามสัญญา</td><td>๑๓</td><td>๒๕๑.๒๖๐๔</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- เงินเหลือจ่าย</td><td></td><td>๑๗.๔๐๑๕</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ผลเบิกจ่ายสิ่งก่อสร้าง</td><td></td><td></td><td>๕๘.๔๔๖๙</td><td>๒๑.๗๕</td><td></td></tr></table>	รายการ	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	หมายเหตุ	รวมทั้งสิ้น	๕๔	๓๐๒.๑๐๗๐	๘๐.๐๘๔๒	๒๖.๕๑		๑. ครุภัณฑ์	๔๑	๓๓.๔๔๕๑		-		- ลงนามสัญญา	๔๑	๓๐.๙๒๘๙				- เงินเหลือจ่าย		๒.๕๑๖๒				ผลเบิกจ่ายครุภัณฑ์	๓๘		๒๑.๖๓๗๓	๖๔.๖๙		๒. สิ่งก่อสร้าง	๑๓	๒๖๘.๖๖๑๙		-		- รอลงนามสัญญา						- ลงนามสัญญา	๑๓	๒๕๑.๒๖๐๔				- เงินเหลือจ่าย		๑๗.๔๐๑๕				ผลเบิกจ่ายสิ่งก่อสร้าง			๕๘.๔๔๖๙	๒๑.๗๕	
รายการ	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	หมายเหตุ																																																														
รวมทั้งสิ้น	๕๔	๓๐๒.๑๐๗๐	๘๐.๐๘๔๒	๒๖.๕๑																																																															
๑. ครุภัณฑ์	๔๑	๓๓.๔๔๕๑		-																																																															
- ลงนามสัญญา	๔๑	๓๐.๙๒๘๙																																																																	
- เงินเหลือจ่าย		๒.๕๑๖๒																																																																	
ผลเบิกจ่ายครุภัณฑ์	๓๘		๒๑.๖๓๗๓	๖๔.๖๙																																																															
๒. สิ่งก่อสร้าง	๑๓	๒๖๘.๖๖๑๙		-																																																															
- รอลงนามสัญญา																																																																			
- ลงนามสัญญา	๑๓	๒๕๑.๒๖๐๔																																																																	
- เงินเหลือจ่าย		๑๗.๔๐๑๕																																																																	
ผลเบิกจ่ายสิ่งก่อสร้าง			๕๘.๔๔๖๙	๒๑.๗๕																																																															

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี จำนวน ๘ รายการ

รายการ	เงินกันเหลือมปี (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)
รวมทั้งสิ้น	๑๖๖.๒๓๐๕	๖๑.๖๗๒๙	๑๐๔.๕๕๗๖
ครุภัณฑ์			
๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์	๕.๑๐๖๐	๓.๓๒๖๐	๑.๗๘๐๐
สิ่งก่อสร้าง			
๑. ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่	๑๐๒.๗๗๗๖		๑๐๒.๗๗๗๖
๒. ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมี ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่	๑๑.๔๑๒๕	๑๑.๔๑๒๕	-
๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์และอัตลักษณ์บริเวณส่วนจัดแสดงสัตว์ สัตว์แอฟริกา ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	๙.๓๑๕๖	๙.๓๑๕๖	-
๔. ปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center) ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี	๖.๒๕๐๐	๖.๒๕๐๐	-
๕. ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัสและส่วนแสดงจระเข้ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี	๑๗.๓๖๘๘	๑๗.๓๖๘๘	-
๖. ก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวิน ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น	๓.๖๕๐๐	๓.๖๕๐๐	-
๗. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ภายในสวนสัตว์ ขอนแก่น	๑๐.๓๕๐๐	๑๐.๓๕๐๐	-

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[illegible]

งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[illegible]

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[illegible]

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[illegible]

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	วงเงินที่ลงนาม	ส่งเรื่องเบิกจ่ายแล้ว			ส่วนกลาง	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์	โครงการ
			คีย์ GFMS แล้ว	รอคีย์ GFMS	รวม		เปิดเขาเขียว	เชียงใหม่	นครราชสีมา	สงขลา	อุบลราชธานี	ขอนแก่น	
	ครุภัณฑ์	22,150,905	20,590,905	-	20,590,905								
1	โครงการระบบบริหารจัดการสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (Thai Zoo Ark) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร	3,900,000	2,340,000		2,340,000								
2	กล้องถ่ายภาพระบบ wifi สำหรับกล้องจุลทรรศน์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	120,000	120,000		120,000	GFMS							
3	ตู้เก็บเปลือกพาราฟิน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	145,520	145,520		145,520	GFMS							
4	ตู้เก็บแผ่นกระจกสไลด์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	80,250	80,250		80,250	GFMS							
5	เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงในไมโครเพลท องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	406,600	406,600		406,600	GFMS							
6	เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพในสัตว์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	220,000	220,000		220,000	GFMS							
7	ตู้เย็นแช่น้ำยา องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	140,000	140,000		140,000	GFMS							
8	เครื่องตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	250,000	250,000		250,000	GFMS							
9	เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วรอบต่ำ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	170,000	170,000		170,000	GFMS							
10	เครื่องปั่นเหวี่ยงฮิมาโตคริต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	130,000	130,000		130,000	GFMS							

ลำดับ	รายการ	วงเงินที่ลงนาม	ส่งเรื่องเบิกจ่ายแล้ว			ส่วนกลาง	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์	โครงการ
			คีย์ GFMS แล้ว	รอคีย์ GFMS	รวม		เปิดเขาเขียว	เชียงใหม่	นครราชสีมา	สงขลา	อุบลราชธานี	ขอนแก่น	
11	เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบทศนิยม 3 ตำแหน่ง สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	80,000	80,000		80,000	GFMS							
12	ตู้แช่แข็ง -40 องศาเซลเซียส สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ตู้	150,000	150,000		150,000	GFMS							
13	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (cab) สวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	644,000	644,000		644,000			GFMS					
14	ถังเก็บน้ำบนดิน โพลีเมอร์ ขนาด 3,000 ลิตร สวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 10 ใบ	77,000	77,000		77,000			GFMS					
15	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู สวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	65,250	65,250		65,250			GFMS					
16	รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,358,000	1,358,000		1,358,000					GFMS			
17	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	89,500	89,500		89,500					GFMS			
18	เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพในสัตว์ สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	160,000	160,000		160,000					GFMS			
19	เครื่องบันทึกและติดตามปริมาณความอึดตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจรสำหรับสัตว์ สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	18,000	18,000		18,000					GFMS			
20	เครื่องติดตามและบันทึกค่าคาร์บอนไดออกไซด์ทางเดินหายใจแบบแมนสตรัม สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	56,000	56,000		56,000					GFMS			

ลำดับ	รายการ	วงเงินที่ลงนาม	ส่งเรื่องเบิกจ่ายแล้ว			ส่วนกลาง	สวนสัตว์ เปิดเขาเขียว	สวนสัตว์ เชียงใหม่	สวนสัตว์ นครราชสีมา	สวนสัตว์ สงขลา	สวนสัตว์ อุบลราชธานี	สวนสัตว์ ขอนแก่น	โครงการ คชอาณาจักร
			คีย์ GFMS แล้ว	รอคีย์ GFMS	รวม								
21	โคมไฟผ่าตัด สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	28,000	28,000		28,000					GFMS			
22	ชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล สวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,640,000	1,640,000		1,640,000						GFMS		
23	แผ่นบันทึกภาพเอกซเรย์แบบดิจิทัล สวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	226,500	226,500		226,500						GFMS		
24	หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 Kva สวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 5 เครื่อง	792,000	792,000		792,000						GFMS		
25	กล่องวงจรปิดจำนวน 8 จุด สวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 66 ตัว	850,000	850,000		850,000						GFMS		
26	เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวี สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	52,900	52,900		52,900							GFMS	
27	เครื่องเลเซอร์รักษาแผลสำหรับสัตว์ สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	840,000	840,000		840,000							GFMS	
28	เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 3 เครื่อง	439,200	439,200		439,200							GFMS	
29	เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า รั้วไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้า สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 2 เครื่อง	70,000	70,000		70,000							GFMS	
30	เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 2 เครื่อง	18,000	18,000		18,000							GFMS	

ลำดับ	รายการ	วงเงินที่ลงนาม	ส่งเรื่องเบิกจ่ายแล้ว			ส่วนกลาง	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์	โครงการ
			คีย์ GFMS แล้ว	รอคีย์ GFMS	รวม		เปิดเขาเขียว	เชียงใหม่	นครราชสีมา	สงขลา	อุบลราชธานี	ขอนแก่น	
31	ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 ตู้	46,000	46,000		46,000							GFMS	
32	ตู้แช่อาหาร ขนาด 32 คิวบิกฟุต สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 ตู้	27,000	27,000		27,000							GFMS	
33	เครื่องเป่าใบไม้ 2 จังหวะ 3.8 แรงม้า จำนวน 6 เครื่อง สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 3 เครื่อง	27,285	27,285		27,285							GFMS	
34	เครื่องมือรักษาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดความเข้มต่ำ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	850,000	850,000		850,000								GFMS
35	เครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมในสภาพจริงแบบเคลื่อนที่ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	480,000	480,000		480,000								GFMS
36	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	30,700	30,700		30,700								GFMS
37	รถตักหน้าขุดหลัง ล้อยาง เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) มีกำลังไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน 2200 รอบต่อนาที โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน	3,190,000	3,190,000		3,190,000								GFMS
38	เครื่องอัลตราซาวด์แบบพกพาสำหรับสัตว์ป่า สวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,453,200	1,453,200		1,453,200			GFMS					
39	รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 สูบ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่น้อยกว่า 7,700 ซีซี มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้าแบบกระบะบรรทุกแบบกระบะเหล็ก พร้อมติดเครนไฮดรอลิก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน	2,830,000	2,830,000		2,830,000		GFMS						

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	สวนสัตว์	วงเงิน ลงนามสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	การดำเนินงาน	ส่วนกลาง	สวนสัตว์เปิด เขาเขียว	สวนสัตว์ เชียงใหม่	สวนสัตว์ นครราชสีมา	สวนสัตว์ สงขลา	สวนสัตว์ อุบลราชธานี	สวนสัตว์ ขอนแก่น	โครงการคช อาณาจักร
	ครุภัณฑ์ ทั้งสิ้น 41 รายการ	33,445,100.00	30,928,905.00										
	- เบิกจ่ายแล้ว 38 รายการ			20,590,905									
	- ยังไม่เบิกจ่าย 3 รายการ			10,338,000									
	ครุภัณฑ์												
1	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-ticket) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร	ส่วนกลาง วงเงิน งบประมาณ 8,449,800	6,980,000		ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 14 มีค 2565								
2	โครงการระบบบริหารจัดการสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (Thai Zoo Ark) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร	ส่วนกลาง	3,900,000			26 กพ 65							
3	เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิทัล พร้อมเครื่องเอกซเรย์แบบตั้งโต๊ะ สวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	สวนสัตว์เชียงใหม่	1,798,000					26 กพ 65					
