



สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์

รับที่ 1353/2565

วันที่ 2 ก.ค. 65

เวลา 08.06 น.

## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักการเงินและทรัพย์สิน

ที่ อสส ๑๑๐๕/ ๑๓๙๔

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

- |       |                                                                             |                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| เรียน | <input type="checkbox"/> ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ                            | <input type="checkbox"/> ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว    |
|       | <input type="checkbox"/> ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย                             | <input type="checkbox"/> ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่       |
|       | <input type="checkbox"/> ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ                       | <input type="checkbox"/> ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา      |
|       | <input type="checkbox"/> ผู้อำนวยการสำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์                | <input type="checkbox"/> ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา           |
|       | <input type="checkbox"/> ผู้อำนวยการสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์             | <input type="checkbox"/> ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี     |
|       | <input type="checkbox"/> ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ                        | <input type="checkbox"/> ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น         |
|       | <input type="checkbox"/> ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ                        | <input type="checkbox"/> ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ |
|       | <input type="checkbox"/> ผู้อำนวยการสถาบันจัดการสวนสัตว์                    | <input type="checkbox"/> ผู้อำนวยการสำนักบริหารทุนมนุษย์    |
|       | <input type="checkbox"/> ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากายภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม |                                                             |

ตามที่ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย อนุมัติให้สำนักการเงินและทรัพย์สิน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบ สำหรับการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานในการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบตามระเบียบการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เพื่อให้คณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณฯ รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานตามระเบียบวาระการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้

ใน/น. ๑๐. ๓๓๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ใน/น. ๑๐. ๓๓๖

ใน/น. ๑๐. ๓๓๖

(นางนันทวัน ค่ายม่น)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์

(นางพิมารรณ อนนท์)

ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน มอบ ทน.๘.๑๓๙๔งบประมาณ  
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ  
การแก้ไขรายงาน ให้ถูกต้อง

(นางสาวนันทนิจ กุศลเจริญ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์



## บันทึกข้อความ

**หน่วยงาน** คณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณฯ

**ที่**

**วันที่** ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

**เรื่อง** รายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

**เรียน** ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน

ตามที่ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย อนุมัติให้สำนักการเงินและทรัพย์สิน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบ สำหรับการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานในการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบตามระเบียบการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เพื่อให้คณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณฯ รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานตามระเบียบวาระการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอโปรดลงนามในหนังสือตามที่แนบมาพร้อมนี้

- หอสมุด, สำนัก, สำนัก กว/กคท

๑  
๑/๓/๖๕

(นางสาวสุกัญญา หงส์พันธุ์)  
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ



## การประชุม

คณะกรรมการด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัด  
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของ  
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

การประชุมเป็นรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงาน  
พร้อมภาพประกอบ

ระเบียบวาระการประชุม  
คณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

---

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
๓.๑ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ (สำนักกฎหมาย/สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์)  
๓.๒ ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่  
(สำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม)
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ  
๔.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕  
๔.๓ รายงานผลการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ (สวนสัตว์เชียงใหม่)  
๔.๔ รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

เอกสารประกอบการประชุม  
คณะกรรมการด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ  
ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

---

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานกรรมการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมคณะกรรมการด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย  
ได้อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบ  
ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๕/๘๔๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

## ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานผลการดำเนินงานฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

สำนักการเงินและทรัพย์สิน ได้ส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบตามระเบียบการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ให้คณะทำงานฯ เพื่อรับทราบ ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๕/๘๔๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยสำนัก สถาบัน สวนสัตว์ และโครงการ ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว และรายงานผลการดำเนินงาน กลับให้สำนักการเงินและทรัพย์สิน ทาง e-mail และทาง line เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

| รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | แนวทางแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีรายการที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ วงเงินทั้งสิ้น ๗๔.๒๒๑๖ ล้านบาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวถูกพับไปแล้ว                                                                               | มติที่ประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีสัญญาซื้อขายสัตว์ และงานก่อสร้างปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒ ดำเนินการเก็บรวบรวมเอกสาร กระบวนของงาน และรายละเอียดที่สำคัญของงานทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากรณีมีปัญหาในอนาคต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>ส่วนกลาง</b></p> <p>๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ สัญญาที่ ๒๔/๒๕๖๑ วงเงินตามสัญญา ๑๒.๔๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๐๔๐ ล้านบาท คงเหลือ ๘.๓๙๐ ล้านบาท</p> <p>๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ สัญญาที่ ๒๘/๒๕๖๒ วงเงินตามสัญญา ๑๓.๖๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๙๖๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑๑.๗๓๐ ล้านบาท</p> | <p>๑. สำนักการเงินและทรัพย์สิน ดำเนินการทำหนังสือแจ้งบริษัทฯ ให้เร่งรัดดำเนินการตามสัญญา ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๕๔๓ และ ทส ๑๑๐๑/๕๔๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ของสัญญาที่ ๒๔/๒๕๖๑ และสัญญาที่ ๒๘/๒๕๖๒</p> <p>๒. บริษัทฯ ตอบกลับมาให้องค์การสวนสัตว์ฯ มอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นผู้นำสัตว์เข้าเนื่องจากเป็นสัตว์ตาม CITES ตามหนังสือเลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p> <p>๓. สำนักการเงินและทรัพย์สิน ได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องนำเสนอสำนักกฎหมายเพื่อพิจารณา ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๔/๓๓๙๕ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔</p> <p>๔. สำนักกฎหมายอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณา</p> <p>๕. สำนักการเงินและทรัพย์สิน อยู่ระหว่างการติดตามความคืบหน้าในการพิจารณาของสำนักกฎหมาย</p> <p>๖. สำนักกฎหมายได้จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้บริษัทฯ เพื่อดำเนินการด้านเอกสารการนำเข้าสัตว์จากต่างประเทศต่อกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามที่ร้องขอแล้ว และให้ สท.แจ้งคณะกรรมการตรวจรับสัตว์ ปี ๒๕๖๒ พิจารณาเสนอความเห็นตามองค์ประกอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปเสนอ ผอ.อสส.ทราบและสั่งการต่อไป ตามเอกสารที่ ทส ๑๑๐๖/๙๑๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>๗. สำนักการเงินและทรัพย์สินมีหนังสือแจ้งคณะกรรมการตรวจรับ ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๔/๕๑๔๙ ลว.๒๗ ก.ย.๒๕๖๔ พิจารณาเสนอความเห็นตามองค์ประกอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปเสนอ ผอ.อสส</p> <p>๘. คณะกรรมการตรวจรับเสนอความเห็นต่อ ผอ.อสส. ว่าบริษัทฯ เข้าหลักเกณฑ์ผู้ขายส่งมอบสัตว์ล่าช้าเห็นควรให้มีหนังสือแจ้งสิทธิการปรับและเร่งรัดการส่งสัตว์ให้ผู้ขายทราบ โดย ผอ.อสส.ให้ทางคณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตามหนังสือที่ ทส.๑๑๐๗/๑๗๐๗ ลงวันที่ ๖ ต.ค.๒๕๖๔</p> | <p>๑. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีสัญญาซื้อขายสัตว์ปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อความชัดเจนในการดำเนินงาน</p> <p>๒. มอบให้สำนักกฎหมายเข้ามาดูรายละเอียดและให้สรุปประเด็นปัญหาและการดำเนินงานให้ชัดเจน แล้วนำเข้าคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อพิจารณา</p> |

| รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | แนวทางแก้ไข |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>๙. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย มีหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๑๔๓๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ไปยังกรมปศุสัตว์ เพื่อสอบถามการยกเลิกประกาศโรคปากเท้าเปื่อยจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE ในพื้นที่สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในการนำออกจากประเทศต้นทางเพื่อนำกลับมาส่งยังประเทศปลายทาง (ประเทศไทย) ว่าขณะนี้ สามารถดำเนินการได้แล้วหรือไม่ ตามที่บริษัท คาสชิบา (ประเทศไทย) จำกัด ได้อ้างถึงประกาศดังกล่าวเพื่อเป็นการยืนยันจากกรมปศุสัตว์ <a href="#">๒๕๖๕</a></p> <p>๑๐. ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ ๐๖๒๑/๑๖๕ ลว.๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ แจ้งมายังองค์การสวนสัตว์ว่า ว่าปัจจุบันยังมีประกาศชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์กบคู่หรือซากสัตว์กบคู่จากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นเมื่อ ๒๓ ธ.ค.๖๔ ซึ่งมีผลบังคับเป็นเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หากมีการระบาดและยังไม่ได้รับรองสถานะการปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยจากองค์การสุขภาพโลก OIE จะมีการประกาศชะลอการนำเข้าต่อไป</p> <p>๑๑. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ มีหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๓๙๘ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค.๒๕๖๕ เรื่อง การแจ้งสิทธิเรียกค่าปรับ ถึง กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาสชิบา (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบสัตว์จำนวน ๔ รายการ รวม ๑๘ ตัว องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ จึงขอแจ้งสิทธิเรียกค่าปรับตามสัญญาที่ ๒๘/๒๕๖๒ จำนวน ๕,๙๘๒,๙๘๐ บาท และให้ทางบริษัทฯ ทำหนังสือยินยอมเสียค่าปรับตามสัญญา</p> <p>๑๒. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ มีหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๘๑ ลงวันที่ ๑๙ เม.ย.๒๕๖๕ เรื่อง บอกลีกสัญญาซื้อขายสัตว์ ถึง กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาสชิบา (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบสัตว์จำนวน ๔ รายการ รวม ๑๕ ตัว ตามสัญญาที่ ๒๔/๒๕๖๑ ซึ่งได้ล่วงเลยระยะเวลา ๒ ปี กับ ๓๔๙ วัน (๑๗ มี.ค.๖๒-๒๘ ก.พ.๖๕) แต่บริษัทฯ ยังไม่มีความเคลื่อนไหวหรือความคืบหน้าการเร่งดำเนินการส่งมอบสัตว์แต่อย่างใด จึงแจ้งบอกลีกสัญญาซื้อขายสัตว์และดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> |             |
| <p><b>สวนสัตว์เปิดเขาเขียว</b></p> <p>๑. ปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์สัตว์ให้เป็นศูนย์พัฒนาเพื่อการวิจัยและอนุรักษ์สัตว์ป่าระดับมาตรฐานภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- วงเงิน ๒.๔๘๔ ล้านบาท</li><li>- เบิกจ่ายแล้ว ๑.๓๕๑ ล้านบาท</li><li>- คงเหลือ ๑.๑๓๓ ล้านบาท</li></ul> <p>โดยกิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ ๖๘๙</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |

แนว



| รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แนวทางแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>๒. ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆภายใต้<br/>โครงการความร่วมมือการเพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆร่วมกับภาชี<br/>เพื่อรองรับและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร</p> <p>- วงเงิน ๑๘.๘๙๒ ล้านบาท<br/>- เบิกจ่ายแล้ว ๔.๗๒๓ ล้านบาท<br/>- คงเหลือ ๑๔.๑๖๙ ล้านบาท</p> <p>โดยกิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ ๖๘๙</p> | <p>๑. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว นำส่งรายงานการบอกเลิกสัญญาจ้าง<br/>ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์ฯ ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๑๒/๔๕๖ ลงวันที่<br/>๑๒ เมษายน ๒๕๖๔</p> <p>๒. บริษัทฯ ทำหนังสือขออุทธรณ์การบอกเลิกสัญญา และขอสงวน<br/>สิทธิ์หลักประกันสัญญา ตามหนังสือเลขที่<br/>๓๘/๒๕๖๒.๒๐๒๑๐๔.๐๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔</p> <p>๓. สำนักการเงินและทรัพย์สิน มีหนังสือที่ ทส ๑๑๐๔/๓๑๙๕ ลง<br/>วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้สำนักกฎหมายพิจารณาการขอ<br/>อุทธรณ์การบอกเลิกสัญญาและขอสงวนสิทธิ์หลักประกันสัญญา</p> <p>๔. สำนักกฎหมายพิจารณา ให้ยืนยันการรับหลักประกันสัญญาจ้าง<br/>โครงการก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆ โดยองค์การสวน<br/>สัตว์ฯ ได้แจ้งให้บริษัทฯ รับทราบการยืนยันการรับหลักประกันตาม<br/>หนังสือองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ที่ ทส ๑๑๐๑/๗๗๒ ลง<br/>วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔</p> <p>๕. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้รับหลักประกันสัญญาตาม ระเบียบฯ ซึ่ง<br/>ทางธนาคารกรุงไทย ได้นำส่งเงินหลักประกันสัญญาให้สวนสัตว์เปิดเขา<br/>เขียวเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๖. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว นำส่งเอกสารประกอบการแจ้งเป็นผู้ทำงาน<br/>ของ กิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ ๖๘๙ มายังองค์การสวนสัตว์ ฯ เพื่อ<br/>จัดส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาเป็นผู้ทำงาน ตามหนังสือเลขที่ ทส<br/>๑๑๑๒/๘๙๗ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔</p> <p>๗. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นำส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวง<br/>การคลัง แจ้งให้ กิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ ๖๘๙ เป็นผู้ทำงานตาม<br/>หนังสือเลขที่ ทส ๑๑๐๑/๑๐๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>๘. ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลัง ยังไม่มีหนังสือตอบกลับแจ้งให้<br/>เป็นผู้ทำงาน</p> | <p>๑. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไปควรเช็ค<br/>ประวัติบริษัทผู้รับจ้างและสถานะของบริษัท</p> <p>๒. กรณีได้รับรับจ้างมาแล้ว คณะกรรมการ<br/>ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานควร<br/>ดำเนินการให้เป็นไปตามวงงานที่แบ่งตามสัญญา</p> <p>๓. หากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา ควร<br/>เชิญผู้รับจ้างมาร่วมประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกันและ<br/>ควรมีรายงานการประชุมเพื่อให้รับรู้ทั้ง ๒ ฝ่าย</p> <p>๔. หากยังดำเนินการล่าช้า สวนสัตว์ต้อง<br/>ดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร<br/>โดยออกหนังสือเป็นหลักฐานทุกครั้ง</p> |

| รายละเอียด                                                                                                                                                                                                         | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | แนวทางแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>สวนสัตว์สงขลา</b></p> <p>๑. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณน้ำตกสวนตุล ภายในสวนสัตว์สงขลา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วงเงิน ๓๘.๐๐๐๐ ล้านบาท</li> <li>- โดยบริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด</li> </ul> | <p>๑. องค์การสวนสัตว์ฯ ทำหนังสือแจ้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์และบอกเลิกสัญญา ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๑๓ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓</p> <p>๒. บริษัทฯ ได้ขอคัดค้านการบอกเลิกสัญญา ตามหนังสือเลขที่ CHR ๒๕๖๓/๐๑๐๒๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓</p> <p>๓. องค์การสวนสัตว์ฯ ได้ให้บริษัทชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๑๑๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔</p> <p>๔. บริษัทฯ ทำหนังสือชี้แจงกลับองค์การฯ ตามหนังสือเลขที่ CHR ๒๕๖๔/๐๒๐๕๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔</p> <p>๕. องค์การสวนสัตว์ฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงได้ทำหนังสือแจ้งกระทรวงการคลัง ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัดcv เป็นผู้ทำงาน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากกระทรวงการคลัง</p> <p>๖. บริษัทฯ กรุงไทย จำกัด ชำระเงินตามสัญญาค้ำประกันของ บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด ฐานะลูกหนี้ร่วมให้สวนสัตว์สงขลาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คจำนวน ๑,๙๔๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๗. องค์การสวนสัตว์ฯ มีหนังสือที่ ทส ๑๐๑๑/๑๕๐๘ ลว. ๒๘ ธ.ค.๒๕๖๔ สอบถามผลการพิจารณา ให้บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด เป็นผู้ทำงานซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลังยังไม่มีหนังสือตอบกลับแจ้งให้เป็นผู้ทำงาน</p> <p>๘. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาผู้ทำงานกรมบัญชีกลาง มีหนังสือที่ กค (อทง) ๐๔๐๕.๗/๑๕๒๕๑ ลว. ๒๘ เม.ย.๒๕๖๕ ขอให้พิจารณาคำชี้แจงของบริษัทฯ และนายเกรียงไกร ว่ารับฟังได้หรือไม่ อย่างไร พร้อมเหตุ พร้อมเหตุผลประกอบโดยละเอียดและขอให้รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งให้กรมบัญชีกลาง</p> | <p>๑. ควรมีการสำรวจสภาพพื้นที่ภายในสวนสัตว์ ก่อนการออกแบบและเสนอของงบประมาณ</p> <p>๒. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไปควรเช็คประวัติบริษัทผู้รับจ้างและสถานะของบริษัท</p> <p>๓. กรณีได้รับรับจ้างมาแล้ว คณะกรรมการควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานควรดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่แบ่งตามสัญญา</p> <p>๔. หากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา ควรเชิญผู้รับจ้างมาร่วมประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกันและควรมีรายงานการประชุมเพื่อให้รับรู้ทั้ง ๒ ฝ่าย</p> <p>๕. หากยังดำเนินการล่าช้า สวนสัตว์ต้องดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยออกหนังสือเป็นหลักฐานทุกครั้ง</p> |

### ๓.๒ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

| รายละเอียด                                                                                                                                                                    | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                 | แนวทางแก้ไข                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ มีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ประกอบด้วย<br>๑. ปรับปรุงอาคารสำนักงานสนาม<br>งบประมาณ ๑.๒๐ ล้านบาท                             | ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |
| ๒. ก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ และตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบพร้อมก่อสร้างเรือนเพาะขยายพันธุ์ งบประมาณ ๕.๘๕ ล้านบาท                                                    | ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |
| ๓. ก่อสร้างถนนชั่วคราวแล้วรอบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ งบประมาณ ๘.๖๖ ล้านบาท                                                                                            | ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |
| ๔. ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดปทุมธานี ในการสร้างสะพานบริเวณทางเข้าพื้นที่สวนสัตว์แห่งใหม่                                                                                    | อยู่ระหว่างดำเนินการได้ร้อยละ ๙๖ <u>คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</u>                                                                                                             | <b>ปัจจุบันเลยสิ้นเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้ว</b>                                                                 |
| ๕. ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๖.๘๒๕๑ ลบ.<br>จำนวน ๖ งวดงาน<br>- งบประมาณปี ๒๕๖๓<br>จำนวน ๓๖.๐๐๐๐ ลบ.<br>- งบประมาณปี ๒๕๖๔<br>จำนวน ๑๑๐.๘๒๕๑ ลบ. | ๑. เบิกจ่ายงวดที่ ๑-๓ แล้ว<br>จำนวน ๔๔.๐๔๗๕ ลบ. โดยใช้จาก<br>งบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๖.๐๐๐๐ ลบ.<br>งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๘.๐๔๗๕ ลบ.<br>๒. งานงวดที่ ๔ อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน<br>จากคณะกรรมการ | เร่งรัดให้คณะกรรมการทุกชุด<br>ตรวจสอบ และสรุปผลการ<br>ดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตาม<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

## โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ จังหวัดปทุมธานี

### ๑. ปรับปรุงอาคารสำนักงานสนาม งบประมาณ ๑.๒๐ ล้านบาท (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)



### ๒. ก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ และตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบพร้อมก่อสร้างเรือนเพาะขยายพันธุ์ งบประมาณ ๕.๘๕ ล้านบาท (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)



### ๓. งานก่อสร้างถนนชั่วคราวและรั้วรอบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

#### การดำเนินการ

บริษัท คัพเวอร์เทค จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ก่อสร้างถนนชั่วคราวและรั้วรอบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ เรียบร้อยแล้ว งานรั้วชั่วคราวระยะ ๓,๕๐๐ เมตร วงเงินรวมทั้งสิ้น ๘,๖๖๐,๐๐๐ บาท

ด้านทิศเหนือ



ด้านทิศใต้



ด้านทิศตะวันออก



ด้านทิศตะวันตก



### ๔. งานที่ได้รับการสนับสนุนจาก จ.ปทุมธานี

- งานก่อสร้างสะพานทางข้าม ดำเนินการได้ร้อยละ ๙๘





ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่องเดิม

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๘๐๖.๓๑๓๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

- ๑. งบอุดหนุน จำนวน ๔๙๑.๖๗๐๓ ล้านบาท
- ๒. งบลงทุน จำนวน ๓๑๔.๖๔๒๗ ล้านบาท

การดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ได้เบิกจ่ายงบอุดหนุนรัฐบาล ได้ครบทุกรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับงบลงทุน เบิกจ่ายจำนวน ๑๔๘.๔๑๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๑๗ และได้กันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑๖๖.๒๓๐๕ ล้านบาท ประกอบด้วย

- ๑. ครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือรายการค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ จำนวน ๕.๑๐๖๐ ล้านบาท
- ๒. สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ ประกอบด้วย
  - ๒.๑ ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ จำนวน ๑๐๒.๗๗๗๖ ล้านบาท
  - ๒.๒ ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมี ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ จำนวน ๑๑.๔๑๒๕ ล้านบาท
  - ๒.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์และอัตลักษณ์บริเวณส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน ๙.๓๑๕๖ ล้านบาท
  - ๒.๔ ปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center) ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน ๖.๒๕๐๐ ล้านบาท
  - ๒.๕ ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัสและส่วนแสดงจะเข้ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน ๑๗.๓๖๘๘ ล้านบาท
  - ๒.๖ ก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวิน ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน ๓.๖๕๐๐ ล้านบาท
  - ๒.๗ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน ๑๐.๓๕๐๐ ล้านบาท

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)


ข้อเสนอเพื่อทราบ

เพื่อโปรดทราบ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ยังมีรายการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ซึ่งได้แก่ รายการค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ และรายการค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

## ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 2564

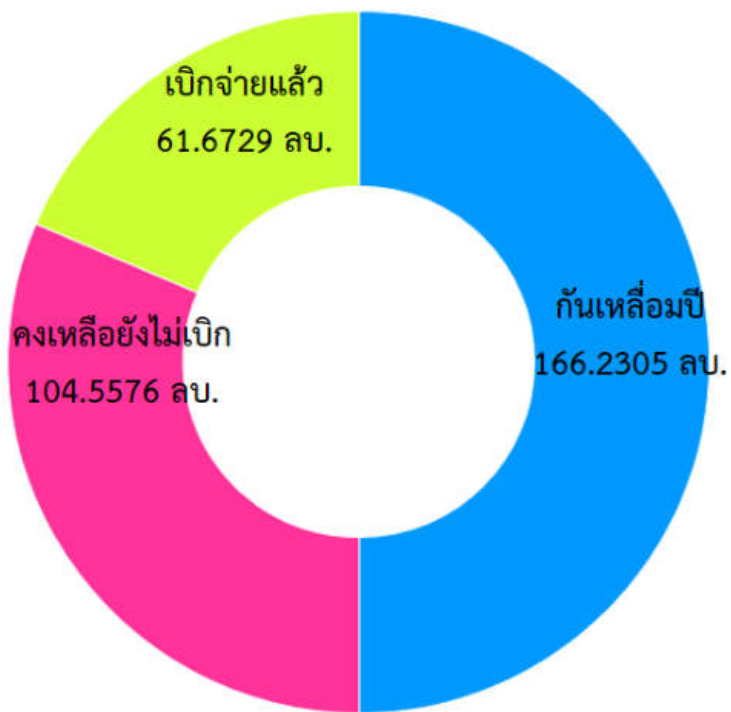

ข้อมูล ณ 31 พ.ค.65

- ส่วนกลาง**
1. ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ สัญญาสิ้นสุด 24 พ.ค. 2565 มี 6 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว 1-3 งวดงาน จำนวน 8.0475 ลบ. กันเหลื่อมปีงวดที่ 4-6 เป็นเงินจำนวน 102.7776 ลบ.
  2. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ สัญญาสิ้นสุด 16 ธ.ค. 2564 กันเหลื่อมปี จำนวน 5.1060 ลบ. เบิกจ่ายถึงเดือน เม.ย. 2565 จำนวน 3.326 ลบ คงเหลือ 1.7800 ลบ.

พฤษภาคม

## ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

|                   |                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เลขที่สัญญาจ้าง   | ๑๑/๒๕๖๔ วงเงิน ๑๔๖,๘๒๕,๑๐๐ บาท<br>งบปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท<br>งบปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๐,๘๒๕,๑๐๐ บาท |
| ระยะเวลาดำเนินการ | ๕๔๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕                                   |
| ผู้รับจ้าง        | บริษัท ดีไซน์+วิเวลลอป จำกัด                                                                        |

### การดำเนินงาน

๑. งานงวดที่ ๑ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีการเบิกจ่ายแล้วเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๗,๓๔๑,๒๐๐ บาท

|                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| ๑.๑ แบบแนวความคิดหลัก (ต้นฉบับในรูปเล่ม)                  | ขนาด A ๑ จำนวน ๓ ชุด  |
| ๑.๒ แบบแนวความคิดหลัก (สำเนาในรูปเล่ม)                    | ขนาด A ๑ จำนวน ๑๐ ชุด |
| ๑.๓ แบบแนวความคิดหลัก (ปิดบนกระดาษแข็ง)                   | ขนาด A ๑ จำนวน ๑ ชุด  |
| ๑.๔ แบบแนวความคิดหลัก (ต้นฉบับในรูปเล่ม)                  | ขนาด A ๓ จำนวน ๓ ชุด  |
| ๑.๕ แบบแนวความคิดหลัก (สำเนาในรูปเล่ม)                    | ขนาด A ๓ จำนวน ๑๐ ชุด |
| ๑.๖ รายงานเบื้องต้น (Inception Report) (ต้นฉบับในรูปเล่ม) | ขนาด A ๓ จำนวน ๓ ชุด  |
| ๑.๗ รายงานเบื้องต้น (Inception Report) (สำเนาในรูปเล่ม)   | ขนาด A๓ จำนวน ๑๐ ชุด  |

๒. งานงวดที่ ๒ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีการเบิกจ่ายแล้วเมื่อกันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๑๔,๖๘๒,๕๑๐ บาท

|                                       |         |              |
|---------------------------------------|---------|--------------|
| ๒.๑ แบบร่างขั้นต้น (ต้นฉบับในรูปเล่ม) | ขนาด A๓ | จำนวน ๓ ชุด  |
| ๒.๒ แบบร่างขั้นต้น (สำเนาในรูปเล่ม)   | ขนาด A๓ | จำนวน ๑๐ ชุด |

๓. งานงวดที่ ๓ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีการเบิกจ่ายแล้วเมื่อกันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๒๒,๐๒๓,๗๖๕ บาท

|                                                                                          |         |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| ๓.๑ แบบร่างขั้นพัฒนา (ต้นฉบับในรูปเล่ม)                                                  | ขนาด A๓ | จำนวน ๓ ชุด  |
| ๓.๒ แบบร่างขั้นพัฒนา (สำเนาในรูปเล่ม)                                                    | ขนาด A๓ | จำนวน ๑๐ ชุด |
| ๓.๓ รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของ<br>โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ (ต้นฉบับในรูปเล่ม) | ขนาด A๔ | จำนวน ๕ ชุด  |
| ๓.๔ เอกสารแบบรูปรายการและการประมาณราคา<br>เพื่อยื่นของบประมาณ (ต้นฉบับในรูปเล่ม)         | ขนาด A๔ | จำนวน ๑ ชุด  |
| ๓.๕ เอกสารแบบรูปรายการและการประมาณราคา<br>เพื่อยื่นของบประมาณ (สำเนาในรูปเล่ม)           | ขนาด A๔ | จำนวน ๔ ชุด  |







๔. งานงวดที่ ๔ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานจากคณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน ๔๔,๐๔๗,๕๓๐ บาท ประกอบด้วย

๔.๑ แบบรายละเอียดรายการก่อสร้าง

๔.๒ รายละเอียดประกอบแบบ บัญชีงานก่อสร้าง ราคากลาง ครอบคลุมรวมทุกสาขา

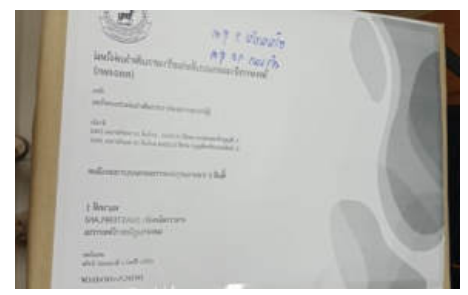

## ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจากมีคณะกรรมการ ที่กำกับดูแลหลายชุด และมีความเห็นที่แตกต่างกัน จึงต้องใช้ระยะเวลา ในการสรุปแนวความคิด

## แนวทางแก้ไข

เร่งรัดให้คณะกรรมการทุกชุดตรวจสอบและสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

## ๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

### ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินงานรายได้ ค่าใช้จ่าย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

#### เรื่องเดิม

๑. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เสนอแผนปฏิบัติการด้านการเงิน (เงินนอกงบประมาณ) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

๑.๑ ประมาณการรายได้ จำนวน ๒๙๕.๑๘๒๐ ล้านบาท

๑.๒ ประมาณการรายจ่าย จำนวน ๓๙๓.๖๓๗๖ ล้านบาท

๒. ในคราวประชุมคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีมติที่ประชุมดังนี้

๒.๑ อนุมัติแผนปฏิบัติการด้านการเงิน (เงินนอกงบประมาณ) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๒ อนุมัติให้ใช้เงินสะสมองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จำนวน ๑๘๖.๒๙๐๐ ล้านบาท กรณีเพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานในส่วนที่รายได้ (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่าย และกรณีเกิดรายได้ไม่เป็นไปตามแผน จากการระบาดของโรคใหม่ของ COVID-๑๙

#### ข้อเท็จจริง

๑. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดทำแผนรายได้ และค่าใช้จ่ายแยกเป็นรายเดือน โดยผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้อนุมัติแผนรายได้ และค่าใช้จ่าย เพื่อให้สำนัก สวนสัตว์ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้มีรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านการเงิน

๒. รายงานงบการเงินได้ผ่านการสอบทานจากสำนักตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๕

#### ผลการดำเนินงาน

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ขอรายงานผลการดำเนินงาน รายได้ ค่าใช้จ่าย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

|                               | แผน   | ผล    | สูง (ต่ำ) กว่าแผน | หน่วย : ล้านบาท |
|-------------------------------|-------|-------|-------------------|-----------------|
| ๑. รายได้                     | ๒๔.๕๑ | ๓๓.๘๒ | ๙.๓๑              |                 |
| ๒. รายจ่าย                    | ๖๔.๖๑ | ๖๒.๔๐ | (๒.๒๑)            |                 |
| (ค่าใช้จ่าย งบรัฐบาล+องค์การ) |       |       |                   |                 |

#### ข้อเสนอเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานรายได้ ค่าใช้จ่าย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

#### มติที่ประชุม

| สวนสัตว์                                          | แผน - ผลรายได้ |              |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------|
|                                                   | แผน            | ผล           |
| ส่วนกลาง                                          | 0.69           | 0.75         |
| สวนสัตว์เปิดเขาเขียว                              | 12.08          | 13.41        |
| สวนสัตว์เชียงใหม่                                 | 2.89           | 6.47         |
| สวนสัตว์นครราชสีมา                                | 4.77           | 6.65         |
| สวนสัตว์สงขลา                                     | 1.11           | 2.01         |
| สวนสัตว์อุบลราชธานี                               | 1.12           | 1.54         |
| สวนสัตว์ขอนแก่น                                   | 1.46           | 2.90         |
| โครงการ คชอาณาจักร                                | 0.39           | -            |
| <b>รวมรายได้</b>                                  | <b>24.51</b>   | <b>33.73</b> |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้พนักงาน                      |                | 0.08         |
| รายได้บริจาคกองทุนเพื่อหมูป่า                     |                | 0.01         |
| <b>รวมรายได้ดำเนินงาน (1)</b>                     | <b>24.51</b>   | <b>33.82</b> |
| รายได้ทางบัญชี - รายได้บริจาค (สินทรัพย์)         |                | 0.95         |
| <b>รวมรายได้ตามงบการเงิน</b>                      | <b>24.51</b>   | <b>34.77</b> |
| แตกต่างจากการขึ้นและจำหน่ายบัญชีสัตว์ (2)         |                | 2.57         |
| <b>รวมรายได้จากการดำเนินงานทั้งสิ้น (1) + (2)</b> |                | <b>37.34</b> |
| รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล                           |                | 51.12        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                | <b>24.51</b>   | <b>88.46</b> |

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย  
รายได้จากการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

แผน - ผล รายได้ แยกตามสวนสัตว์ปี 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565



แผน - ผลรายได้ภาพรวมองค์การสวนสัตว์ปี 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม



หมายเหตุ:

รายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 33.82 ล้านบาท  
รวม รายได้ทางบัญชี จำนวน 0.95 ล้านบาท  
รวม รายได้ตามงบการเงิน จำนวน 34.77 ล้านบาท

แผน - ผลรายได้ภาพรวมองค์การสวนสัตว์ปี 2565

สะสม 8 เดือน ค.ค. - พ.ค. 2565



|                            | ปี 2565 | ค.ค. 64 - พ.ค. 65 |
|----------------------------|---------|-------------------|
| แผนรายได้                  | 297.19  | 205.68            |
| ผลรายได้                   | 243.27  | 243.27            |
| (ต้องหาเพิ่ม) / สูงกว่าแผน | (53.92) | 37.59             |


หมายเหตุ: รายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 243.27 ล้านบาท  
รวม รายได้ทางบัญชี จำนวน 7.62 ล้านบาท  
รวมเป็นรายได้ ตามงบการเงิน จำนวน 250.89 ล้านบาท

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย  
ค่าใช้จ่าย (รัฐบาล + องค์การ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

| สวนสัตว์                     | แผน - ผล ค่าใช้จ่าย |              |
|------------------------------|---------------------|--------------|
|                              | แผน                 | ผล           |
| ส่วนกลาง                     | 22.04               | 17.28        |
| สวนสัตว์เปิดเขาเขียว         | 9.39                | 10.05        |
| - แผนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน     | 9.39                | 10.05        |
| - แผนส่วนแบ่งผู้ประกอบการ    | -                   | -            |
| สวนสัตว์เชียงใหม่            | 10.07               | 10.81        |
| - แผนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน     | 7.07                | 7.82         |
| - แผนค่าใช้จ่ายควาเรียม      | 3.00                | 2.99         |
| สวนสัตว์นครราชสีมา           | 7.05                | 8.47         |
| สวนสัตว์สงขลา                | 5.85                | 6.04         |
| สวนสัตว์อุบลราชธานี          | 3.67                | 3.56         |
| สวนสัตว์ขอนแก่น              | 5.24                | 4.89         |
| โครงการ คชอาณาจักร           | 1.30                | 1.30         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>           | <b>64.61</b>        | <b>62.40</b> |
| ค่าใช้จ่ายทางบัญชี           |                     | 31.76        |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b> | <b>64.61</b>        | <b>94.16</b> |

แผน - ผลค่าใช้จ่ายแยกตามสวนสัตว์ปี 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

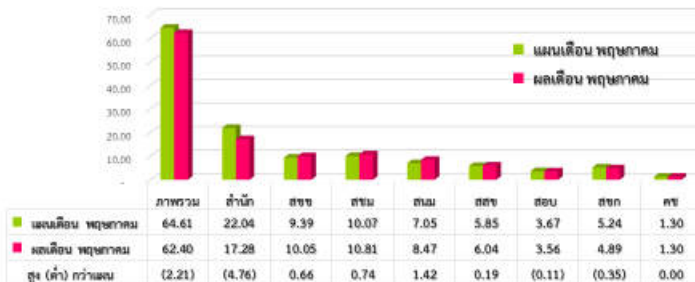

หมายเหตุ: ผลการดำเนินงานของ สวนสัตว์เชียงใหม่ รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานของควาเรียม จำนวน 2.99 ลบ.

แผน - ผล ค่าใช้จ่าย ภาพรวมองค์การสวนสัตว์ปี 2565 สะสม 8 เดือน (ตุลาคม 2564 - พฤษภาคม 2565)



สำนักงานเงินและทรัพย์สิน

4.3


## 4.4 รายงานผลการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบสะสม 8 เดือน ประจำปีเดือนตุลาคม 2564 ถึง พฤษภาคม 2565

การดำเนินงาน

สวนสัตว์เชียงใหม่ ขอรายงานผลการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบสะสม 8 เดือน ประจำปีเดือนตุลาคม 2564 ถึง พฤษภาคม 2565 สรุปได้ ดังนี้ (ข้อมูลเบื้องต้น)

| รายการ                         | ต.ค.-64 | พ.ย.-64 | ธ.ค.-64 | ม.ค.-65 | ก.พ.-65 | มี.ค.-65 | เม.ย.-65 | พ.ค.-65 | รวม     |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| รายได้ดำเนินงาน                | 1.161   | 0.891   | 2.678   | 2.555   | 1.513   | 1.690    | 2.802    | 2.534   | 15.824  |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน            | 2.655   | 2.904   | 2.908   | 2.999   | 2.999   | 2.999    | 2.999    | 2.999   | 23.462  |
| รายได้ สูง(-ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย | - 1.494 | - 2.013 | - 0.230 | - 0.444 | - 1.486 | - 1.309  | - 0.197  | - 0.465 | - 7.638 |
| ผู้เข้าชม (คน)                 | 9,896   | 7,469   | 22,802  | 21,698  | 12,831  | 14,390   | 23,867   | 21,650  | 134,603 |

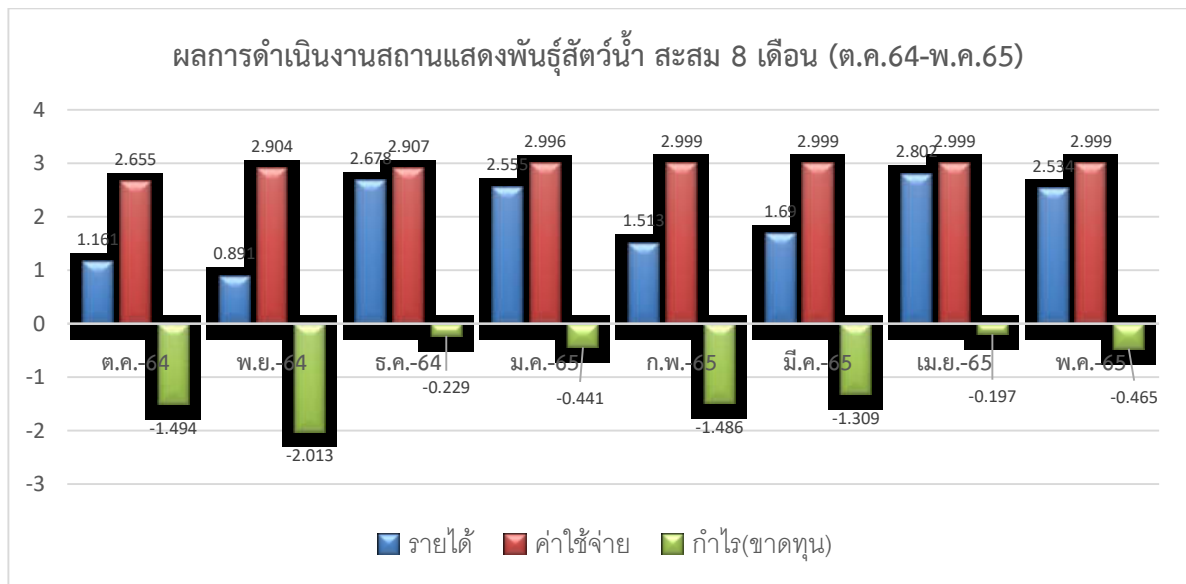

ผลการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ แบบสะสม 8 เดือน ในภาพรวมมีรายได้ดำเนินงานเกิดขึ้นจำนวน 15.824 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ที่มาจาก การจองเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานสะสม 8 เดือน เกิดขึ้นจำนวน 23.462 ล้านบาท โดยเฉลี่ยเดือนละ 3 ล้านบาท (36 ล้านบาทต่อปี) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างเหมา 11.984 ล้านบาท ค่าจ้างบริหาร 5.136 ล้านบาท และค่าไฟฟ้า 3.290 ล้านบาท ค่าอาหารสัตว์น้ำ 1.188 ล้านบาท ค่าก๊าซ LPG 1.309 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.555 ล้านบาท

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ ผลการดำเนินงานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบสะสม 8 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึง พฤษภาคม 2565) ข้อมูลเบื้องต้น

มติที่ประชุม

#### ๔.๔ รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

##### เรื่องเดิม

ข้อความส่วนนี้ ไม่น่าจะใช้ในช่วงเวลานี้ เพราะล่วงเลยช่วงนั้นมานานแล้ว

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้รับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับการพิจารณากรอบวงเงินทั้งสิ้น จำนวน ๗๐๘.๐๒๖๕ ล้านบาท ประกอบด้วย

|              |          |         |
|--------------|----------|---------|
| ๑. งบบุคลากร | ๑๘๑.๙๓๗๕ | ล้านบาท |
| ๒. งบอุดหนุน | ๒๒๓.๙๘๒๐ | ล้านบาท |
| ๓. งบลงทุน   | ๓๐๒.๑๐๗๐ | ล้านบาท |
| รวมทั้งสิ้น  | ๗๐๘.๐๒๖๕ | ล้านบาท |

##### การดำเนินงาน

สำนักงานเงินและทรัพย์สิน ได้ดำเนินการรวบรวมแผน และผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวม ๕๔ รายการ วงเงิน ๓๐๒,๑๐๗,๐๐๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย

- ๑ ครุภัณฑ์ จำนวน ๔๑ รายการ วงเงิน ๓๓,๔๔๕,๑๐๐ บาท  
ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๔๑ รายการ
- ๒ สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ วงเงิน ๒๖๘,๖๖๑,๙๐๐ บาท  
ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๑๓ รายการ

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)


##### ข้อเสนอเพื่อทราบ

เพื่อโปรดทราบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหมวดรายจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

##### มติที่ประชุม

รายงานสถานภาพตามกระบวนการพัสดุ ของงบลงทุน  
รายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2565 จำนวน 13 รายการ

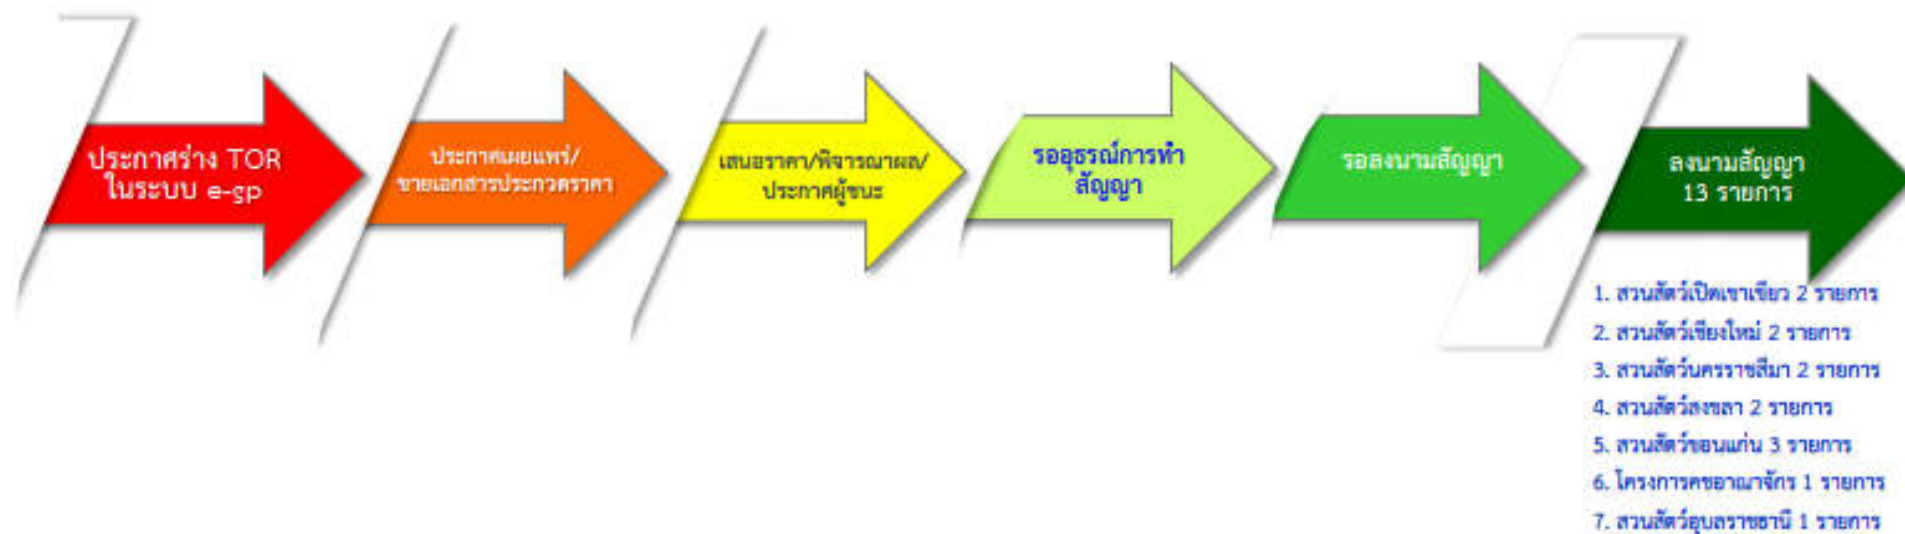


รายงานสถานภาพตามกระบวนการพัสดุ ของงบลงทุน  
รายการครุภัณฑ์ ประจำปี 2565 จำนวน 41 รายการ



ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565



## รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

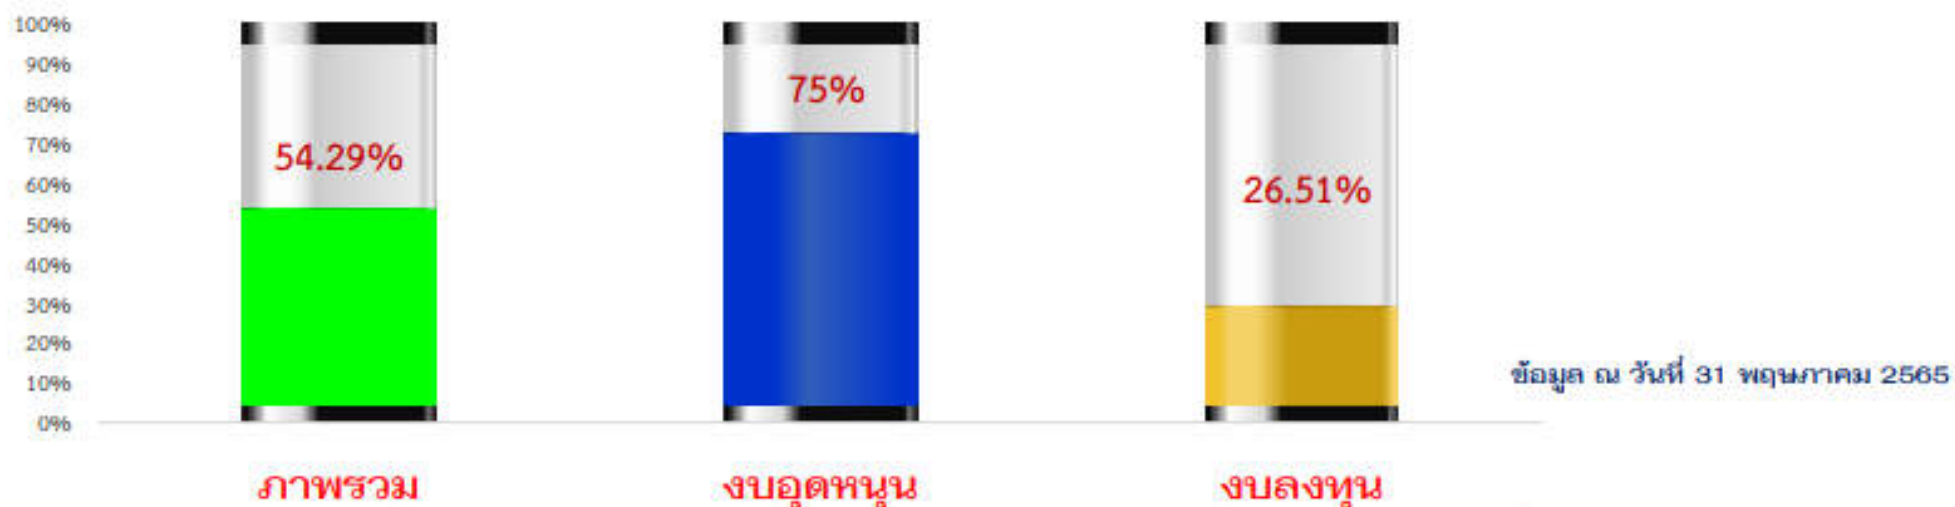

| รายการ         | งบประมาณ | ผลเบิกจ่าย /GFMIS | คิดเป็น (%) | คงเหลือ  |
|----------------|----------|-------------------|-------------|----------|
| 1. งบอุดหนุน   | 405.9195 | 304.3178          | 74.97       | 101.6017 |
| 2. งบลงทุน     | 302.1070 | 80.0842           | 26.51       | 222.0228 |
| * ครุภัณฑ์     | 33.4451  | 21.6373           | 64.69       | 11.8078  |
| * สิ่งก่อสร้าง | 268.6619 | 58.4469           | 21.75       | 210.2150 |
| รวมทั้งสิ้น    | 708.0265 | 384.4020          | 54.29       | 323.6245 |

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ผลการดำเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ส่วนกลาง)

ครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ลำดับที่ ๑-๗ ดังนี้

|                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ๑. กล้องถ่ายภาพระบบ wifi สำหรับกล้องจุลทรรศน์                  | งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท   |
| ๒. ตู้เก็บบล็อกรพาราฟิน ๒ ตู้                                  | งบประมาณ ๑๔๕,๒๐๐.-บาท   |
| ๓. ตู้เก็บแผ่นกระจกสไลด์ ๑ ตู้                                 | งบประมาณ ๘๐,๒๕๐.-บาท    |
| ๔. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงในไมโครเพลท                       | งบประมาณ ๔๐๖,๖๐๐.-บาท   |
| ๕. เครื่องตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ              | งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.-บาท   |
| ๖. เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพในสัตว์                      | งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐.-บาท   |
| ๗. ตู้เย็นแช่น้ำยา                                             | งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐.-บาท   |
| ๘. โครงการระบบบริหารจัดการสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (Thai Zoo Ark) | งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท |
| เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด เป็นเงินจำนวน ๗๘๐,๐๐๐ บาท                   |                         |

อยู่ระหว่างรอผลการอุดหนุน ๑ รายการ ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-ticket)  
งบประมาณ ๘,๔๔๘,๘๐๐.-บาท ขณะนี้ได้ผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้แก่ บริษัท คลิเน็กซ์ จำกัด  
ในวงเงินงบประมาณจำนวน ๖,๙๘๐,๐๐๐ บาท และอยู่ระหว่างรอผลการอุดหนุน ๗ วัน สิ้นสุดในวันที่  
๔ มีนาคม ๒๕๖๕

ข้อมูลครบเป็นปัจจุบันมากกว่านี้

### งบประมาณปี ๒๕๖๕

#### เครื่องปั่นเหวี่ยงฮีมาโตคริต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ๑ เครื่อง

เลขที่สัญญาจ้าง

๓/๒๕๖๕ วงเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มสัญญา ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

ผู้ขาย

บริษัท กิ๊ปไทย จำกัด

การดำเนินงาน

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว



#### เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วรอบต่ำ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ๑ เครื่อง

เลขที่สัญญาจ้าง

๒/๒๕๖๕ วงเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มสัญญา ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

ผู้ขาย

บริษัท กิ๊ปไทย จำกัด

การดำเนินงาน

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว



**ตู้แช่แข็ง -๔๐ องศาเซลเซียส สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ๑ เครื่อง**

เลขที่สัญญาจ้าง

๑/๒๕๖๕ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มสัญญา ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

ผู้ขาย

บริษัท กิ๊ปไทย จำกัด

การดำเนินงาน

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว



**เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบทศนิยม ๓ ตำแหน่ง สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ๑ เครื่อง**

เลขที่สัญญาจ้าง

๔/๒๕๖๕ วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ


เริ่มสัญญา ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

ผู้ขาย

บริษัท กิ๊ปไทย จำกัด

การดำเนินงาน

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

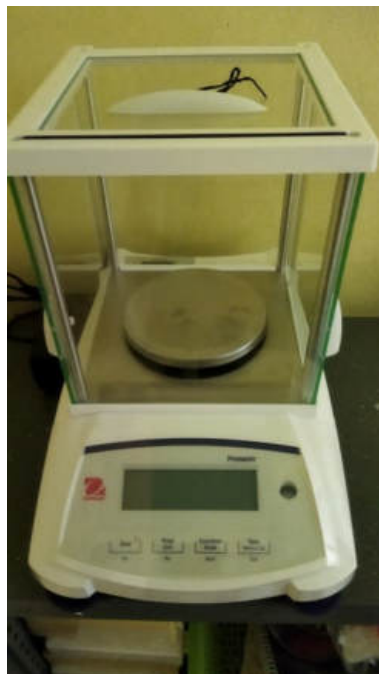



## สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ สูบ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ

ไม่ต่ำกว่า ๗,๗๐๐ ซีซี กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า แบบกระเบเหล็ก พร้อมติดเครนไฮดรอลิก

เลขที่สัญญาจ้าง ๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงิน ๒,๘๓๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ หหมดสัญญาจ้าง วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๙๐ วัน ขยายระยะเวลา ๓๐ วัน จากสิ้นสุดวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุด ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ผู้รับจ้าง บริษัท ทวีโชค ทรัค แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด

การดำเนินงาน แบ่งงานออกเป็น ๑ งาน

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) ตรวจรับงานวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๓๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐%

ส่งเบิกเงินเข้าองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ที่ อสส. ๑๑๑๓/๑๐๙ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

รูป

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ สูบ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๗,๗๐๐ ซีซี กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า แบบกระเบเหล็ก พร้อมติดเครนไฮดรอลิก



## งบประมาณปี ๒๕๖๕

### งานก่อสร้างปรับปรุงถนนแนวรั้ว และสิ่งอำนวยความสะดวก ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

|                   |                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เลขที่สัญญาจ้าง   | 7/2565 วงเงินก่อสร้าง 29,915,000 บาท ( ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน )                                   |
| ระยะเวลาดำเนินการ | เริ่มทำงานวันที่ 30 ธันวาคม 2564 หหมดสัญญาจ้าง วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ระยะเวลา 240 วัน                                  |
| ผู้รับจ้าง        | บริษัท พี.เอ.ไอ ซัพพลาย จำกัด                                                                                           |
| การดำเนินงาน      | แบ่งงานออกเป็น 7 งวด                                                                                                    |
| รายงานตั้งแต่     | วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 – 4 มิถุนายน 2565                                                                                |
| งวดงานที่ 1       | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว                                                                                                   |
| งวดงานที่ 2       | จำนวนเงิน 5,000,000 บาท กำหนดส่งมอบงาน งวดที่ 2 วันที่ 9 มีนาคม 2565<br><u>ณ เดือนพฤษภาคม 2565 การดำเนินงานแล้ว 70%</u> |

งานติดตั้งเสาเหล็กและคานเหล็ก ชั้น 2 (จุดอาคารเอนกประสงค์ จุดที่ 1)



งานติดตั้งเสาเหล็กและคานเหล็ก ชั้น 2 (จุดอาคารเอนกประสงค์ จุดที่ 2 + ห้องน้ำ)



งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กเสาและโครงสร้างหลังคา (จุดอาคารเอนกประสงค์ 3+4)





งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กเสาและโครงสร้างหลังคา (จุดอาคารเอนกประสงค์ 3+4)



งานติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป ทางเดินเชื่อมระหว่าง จุดอาคารเอนกประสงค์



### ปัญหาและอุปสรรค

ผู้รับจ้างชี้แจง งานงวดที่ 2 ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง เนื่องจากบริษัทพบปัญหาบริเวณพื้นที่ก่อสร้างนั้นอยู่บนจุดสถานีหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลักของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่ใช้งานอยู่ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้และการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร การใช้เครื่องจักรจะต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยทั้งนักทอ่งเทียวที่ไกล้บริเวณก่อสร้างดังกล่าวและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติเอง อีกทั้งสภาพอากาศในพื้นที่มีฝนตกในช่วงเวลาบ่ายทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนและล่าช้า

ดำเนินการงานล่าช้า กว่ากำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง ทางคณะกรรมการนัดประชุมติดตามงานก่อสร้างทั้งปัญหาและแนวทางแก้ไข พร้อมทำหนังสือเร่งรัดการทำงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างให้กับทางผู้รับจ้างรับทราบ



## รูปภาพปัญหาความล่าช้า จุดสถานีหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง



### แนวทางแก้ไข

ผู้รับจ้าง บริษัท พี.เอ.ไอ ซัพพลาย จำกัด ได้ดำเนินการปฏิบัติงานล่วงเวลา (17.00 – 20.00 น.) เพื่อเร่งดำเนินการให้งานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด โดยเร็วที่สุด

### การดำเนินงานของคณะกรรมการ

จัดทำหนังสือเร่งรัดการทำงานให้แล้วเสร็จตามที่ระบุในสัญญาจ้าง พร้อมนัดประชุมติดตามงานทุก 15 วัน กับ ทางผู้รับจ้าง บริษัท พี.เอ.ไอ ซัพพลาย จำกัด พร้อมให้ทางผู้รับจ้างจัดเอกสารแผนงานแล้วเสร็จ และชี้แจงเหตุผลปัญหา อุปสรรค กรณีที่ไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง พร้อมแนวทางแก้ไข

### ปรับปรุงถนนแนวรั้วและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

#### เอกสารหนังสือเร่งรัดผู้รับเหมา

จำนวน 3 ฉบับ

1. วันที่ 4 เมษายน 2565
2. วันที่ 9 เมษายน 2565
3. วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

## งบประมาณปี ๒๕๖๕

### งานก่อสร้างเตาเผาซากสัตว์ปลอดมลพิษพร้อมปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

|                   |                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| เลขที่สัญญาจ้าง   | ๖/๒๕๖๕ วงเงินก่อสร้าง ๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท                                                   |
| ระยะเวลาดำเนินการ | เริ่มทำงานวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ หหมดสัญญาจ้างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๑๕๐ วัน |
| ผู้รับจ้าง        | บริษัท ทีมเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด                                               |
| การดำเนินงาน      | แบ่งงานออกเป็น ๒ งวด                                                                  |
| รายงานตั้งแต่     | วันที่ ๑ - ๗ เมษายน ๒๕๖๕                                                              |

งวดที่ ๑ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

#### งานก่อสร้างเตาเผาซากสัตว์ปลอดมลพิษ ขนาด ๓๐๐ กก. / ๒๔ ชม. (ชนิดแก๊ส)

- งานติดตั้งระบบ Gas station พร้อมตู้ควบคุม เตาเผาซากสัตว์



- งานทดสอบระบบ เตาเผาซากสัตว์







- กรรมการฯตรวจรับงานงวด ๒ (งวดสุดท้าย) อาคารเตาเผาซากสัตว์



- รูปโดยรวม อาคารเตาเผาซากสัตว์



ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มี

## สวนสัตว์เชียงใหม่ งบประมาณปี ๒๕๖๕

งานปรับปรุงอาคารฝ่ายอนุรักษ์และวิจัย พร้อมอาคารอนุบาลลูกสัตว์ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่  
ระยะเวลาดำเนินงาน : ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕  
สถานะการดำเนินงาน : แบ่งงานออกเป็น ๓ งวด ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วทั้ง ๓ งวดงาน





งบประมาณปี ๒๕๖๕  
งานก่อสร้างโครงข่ายท่อน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสีย  
เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

ระยะเวลาดำเนินงาน : ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

สถานะการดำเนินงาน : แบ่งงานออกเป็น 10 งวด

- งวดที่ 1-3    เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- งวดงานที่ 4    อยู่ระหว่างดำเนินงานซึ่งดำเนินการไปแล้ว 35% และขณะนี้การดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 35 ของปริมาณงานทั้งหมด



๒. ครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

๒.๑ ซื้อเครื่องอัลตราซาวด์แบบพกพาสำหรับสัตว์ป่า จำนวน ๑ เครื่อง



| วงเงิน/สัญญา<br>(บาท) | งวดงาน<br>(จำนวน) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>(วัน) | วันที่<br>เริ่มสัญญา | วันที่<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานะ                     |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| ๑,๔๕๓,๒๐๐.-           | ๑ งวด             | ๑๒๐ วัน                        | ๒๑ ต.ค.<br>๖๔        | ๑๘ ก.พ ๖๕              | - ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว |

๒.๒ ซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล พร้อมเครื่องเอกซเรย์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง

| วงเงิน/สัญญา<br>(บาท) | งวดงาน<br>(จำนวน) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>(วัน) | วันที่<br>เริ่มสัญญา | วันที่<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานะ                     |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| ๑,๗๙๘,๐๐๐.-           | ๑ งวด             | ๑๒๐ วัน                        | ๒๙ ต.ค.<br>๖๔        | ๒๖ ก.พ ๖๕              | - ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว |

๒.๓ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (cab)

| วงเงิน/สัญญา<br>(บาท) | งวดงาน<br>(จำนวน) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>(วัน) | วันที่<br>เริ่มสัญญา | วันที่<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานะ                                                             |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ๖๔๔,๐๐๐.-             | ๑ งวด             | ๖๐ วัน                         | ๑๒ ต.ต ๖๔            | ๑๑ ธ.ค. ๖๔             | - ดำเนินการส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้วและขออนุมัติเบิกเงินไปยัง อสส. |

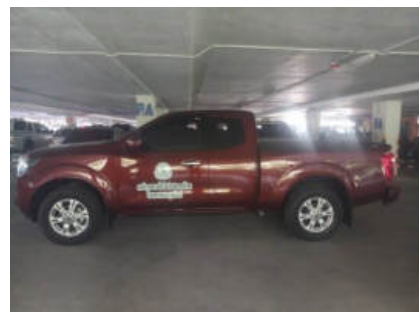



๒.๒ ซื้อถังเก็บน้ำบนดิน โพลีเมอร์ ขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร สวนสัตว์เชียงใหม่ ๑๐ ใบ

| วงเงิน/ซื้อ<br>(บาท) | งวดงาน<br>(จำนวน) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>(วัน) | วันที่<br>เริ่มสัญญา | วันที่<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานะ                    |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| ๗๗,๐๐๐.-             | ๑ งวด             | ๗ วัน                          | ๗ ต.ต ๖๔             | ๑๓ ต.ต ๖๔              | - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |



๒.๓ ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๔๘,๐๐๐ บีทียู สำหรับคอกกักหมี่แพนด้า

| วงเงิน/ซื้อ<br>(บาท) | งวดงาน<br>(จำนวน) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>(วัน) | วันที่<br>เริ่มสัญญา | วันที่<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานะ                    |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| ๖๕,๒๕๐.-             | ๑ งวด             | ๓๐ วัน                         | ๗ ต.ต ๖๔             | ๓๐ พ.ย. ๖๔             | - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |



## สวนสัตว์เชียงใหม่

### 2.2 ซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิทัล พร้อมเครื่องเอกซเรย์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง

| วงเงิน/สัญญา<br>(บาท) | งวดงาน<br>(จำนวน) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>(วัน) | วันที่<br>เริ่มสัญญา | วันที่<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานะ                                                     |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1,798,000.-           | 1 งวด             | 120 วัน                        | 29 ต.ค. 64           | 26 ก.พ. 65             | - ดำเนินการส่งมอบพัสดุและ<br>เบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว |



**งานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**  
**งานก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา**

**๑. งานก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา**

ผู้รับจ้าง บริษัท เอส.ยู.แพค. จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ ๐๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วงเงินสัญญาจ้าง จำนวนเงิน ๙,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เริ่มดำเนินการ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕ งวด จำนวน ๒๔๐ วัน

**ผลการดำเนินงาน**

**งวดที่ ๑ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว**

**งวดที่ ๒** อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๒ ผู้รับจ้างได้มีการสั่งผลิตท่อเหลี่ยมขนาดใหญ่ ๒.๑๐x๒.๑๐ เมตร ซึ่งไม่มีขายตามท้องตลาด ต้องสั่งผลิต ระหว่างรอท่อคอนกรีตขนาดใหญ่ ๒.๑๐x๒.๑๐ เมตร

**งานงวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านบาทถ้วน)** เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานระยะเวลาดำเนินการ ๔๘ วัน (นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ดังรายการต่อไปนี้

|                                        |           |      |
|----------------------------------------|-----------|------|
| ๑. งานวางท่อระบายน้ำขนาด ๒.๑๐ x ๒.๑๐ . | แล้วเสร็จ | ๑๐๐% |
| ๒. งานปรับปรุงพื้นลานคอนกรีต           | แล้วเสร็จ | ๑๐๐% |

**การดำเนินงานงวดที่ ๒ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕**

|                                        |           |      |
|----------------------------------------|-----------|------|
| ๑.งานวางท่อระบายน้ำขนาด ๒.๑๐ x ๒.๑๐ ม. | แล้วเสร็จ | ๕๐%  |
| ๒.งานปรับปรุงพื้นลานคอนกรีต            | แล้วเสร็จ | ๑๐๐% |

**ปัญหาและอุปสรรค**

งานล่าช้าเนื่องจากต้องสั่งผลิตท่อเหลี่ยมขนาด ๒.๑๐x๒.๑๐ เมตร ,แรงงานไม่เพียงพอ

**แนวทางแก้ไขปัญหา**

สวนสัตว์นครราชสีมา โดยคณะกรรมการควบคุมงาน,คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและงานพัสดุ ได้ออกหนังสือเชิญผู้รับจ้างประชุมร่วมปรึกษาหารือในวันที่พฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ และได้จัดส่งหนังสือเร่งรัดงานไปแล้ว ๕ ครั้ง

๑. งานวางท่อระบายน้ำขนาด ๒.๑๐x๒.๑๐ เมตร อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการวางท่อเนื่องจากได้รับท่อที่สั่งผลิตจัดส่งมาที่สวนสัตว์นครราชสีมาเรียบร้อยแล้ว

๒. งานเทคอนกรีตได้เริ่มได้ดำเนินการส่วนที่ค้างไว้แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

**หมายเหตุ:-** คาดว่าจะดำเนินงานงวดที่ ๒ แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕



รูปภาพประกอบงานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เขตที่ ๒



## งานก่อสร้างอาคารผู้ล่า ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา

ผู้รับจ้าง บริษัท เอส.ยู.แพค. จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วงเงิน สัญญาจ้าง จำนวนเงิน ๒๔,๙๗๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เริ่มดำเนินงาน ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕ งวด จำนวน ๒๔๐ วัน

### ผลการดำเนินงาน

๑. งานงวดที่ ๑ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
๒. งานงวดที่ ๒ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
๓. **ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๓**

**งานงวดที่ ๓** เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ระยะเวลา ดำเนินการ ๔๘ วัน (นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕) ดังรายการต่อไปนี้

|                                   |           |      |
|-----------------------------------|-----------|------|
| ๓.๑ งานโครงเหล็กหลังคาคอกกักสิงโต | แล้วเสร็จ | ๑๐๐% |
| ๓.๒ งานกำแพงหินเทียมส่วนแสดงสิงโต | แล้วเสร็จ | ๑๐๐% |
| ๓.๓ งานเพิงพักสัตว์ส่วนแสดงสิงโต  | แล้วเสร็จ | ๑๐๐% |
| ๓.๔ งานน้ำตกส่วนแสดงสิงโต         | แล้วเสร็จ | ๑๐๐% |
| ๓.๕ งานคอกกักสิงโต                | แล้วเสร็จ | ๑๐๐% |

### การดำเนินงาน งวดที่ ๓ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

|                                   |           |      |
|-----------------------------------|-----------|------|
| ๓.๑ งานโครงเหล็กหลังคาคอกกักสิงโต | แล้วเสร็จ | ๑๐๐% |
| ๓.๒ งานกำแพงหินเทียมส่วนแสดงสิงโต | แล้วเสร็จ | ๑๐๐% |
| ๓.๓ งานเพิงพักสัตว์ส่วนแสดงสิงโต  | แล้วเสร็จ | ๖๐%  |
| ๓.๔ งานน้ำตกส่วนแสดงสิงโต         | แล้วเสร็จ | ๑๐๐% |
| ๓.๕ งานคอกกักสิงโต                | แล้วเสร็จ | ๘๐%  |

### ปัญหาและอุปสรรค

ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน เกิดความล่าช้า เนื่องจากแรงงานไม่พอเพียงในการปฏิบัติงาน

### แนวทางแก้ไขปัญหา

สวนสัตว์นครราชสีมา โดยคณะกรรมการควบคุมงาน,คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและงานพัสดุได้ทำหนังสือเชิญผู้รับจ้างร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไข เมื่อวันพฤหัสบดี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยผู้รับจ้างจะปรับแผนงานในส่วนของการทำงานล่วงเวลาเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและคาดว่าจะส่งงวดงานที่ ๓ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕



## รูปภาพประกอบงานก่อสร้างส่วนแสดงอาณาจักรผู้ล่า



รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕  
สวนสัตว์สงขลา


ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๖ รายการ

ครุภัณฑ์ รายการที่ ๑ รถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

ผู้ขาย บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ครอบคลุมกำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนาม ๑,๓๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. ๑๑๑๕/๑๓๒๓ ลว. ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

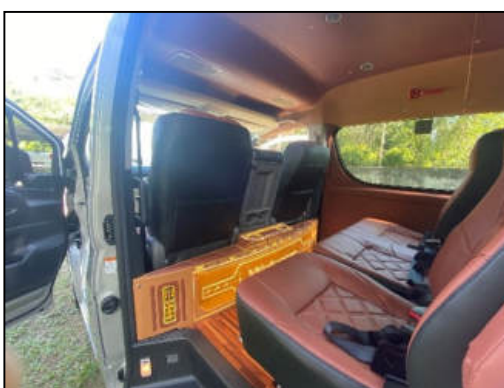



**ครุภัณฑ์ รายการที่ ๒ เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพสำหรับสัตว์ จำนวน ๑ เครื่อง**

ผู้ขาย ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง สัญญาเลขที่ ๐๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครอบกำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนาม ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

**ผลการดำเนินงาน** - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. ๑๑๑๕/๖๙ ลว. ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

**ครุภัณฑ์ รายการที่ ๓ คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด**

ผู้ขายร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง สัญญาเลขที่ ๐๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครอบกำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนาม ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

**ผลการดำเนินงาน** - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. ๑๑๑๕/๖๘ ลว. ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕



**ครุภัณฑ์ รายการที่ ๔ เครื่องจีห้ามเล็ดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า**

ผู้ขาย ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง สัญญาเลขที่ ๐๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครอบกำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนาม ๘๙,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

**ผลการดำเนินงาน** - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. ๑๑๑๕/๗๑ ลว. ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕



ครุภัณฑ์ รายการที่ ๕ เครื่องติดตามและบันทึกค่าคาร์บอนไดออกไซด์ทางเดินหายใจ แบบแมนสตรีม จำนวน ๑ เครื่อง

ผู้ขาย ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง สัญญาเลขที่ ๐๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครบกำหนดส่งมอบ ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนาม ๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

**ผลการดำเนินงาน** - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. ๑๑๑๕/๗๐ ลว. ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕



ครุภัณฑ์ รายการที่ ๖ เครื่องบันทึกและติดตาม ปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจรสำหรับสัตว์ จำนวน ๑ เครื่อง

ผู้ขาย ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง สัญญาเลขที่ ๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครบกำหนดส่งมอบ ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนาม ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

**ผลการดำเนินงาน** - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. ๑๑๑๕/๗๒ ลว. ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕



## 1. งานปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรแสงวิศวกรรม ในวงเงิน 30,367,440.73 บาท (สามสิบล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว กำหนดให้ผู้รับจ้าง เริ่มงานวันที่ 3 ธันวาคม 2564 และครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จในสัญญาวันที่ 29 สิงหาคม 2565 จำนวนงวดงาน 9 งวด

**ระยะเวลาดำเนินงาน** เริ่มงานวันที่ 3 ธันวาคม 2564 และครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จในสัญญาวันที่

29 สิงหาคม 2565 ระยะเวลาดำเนินงาน 270 วัน

**จำนวนงวดงาน** 9 งวด

**ผู้รับจ้าง** ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรแสงวิศวกรรม

### ผลการดำเนินงาน

1. สวนสัตว์สงขลาได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงวดงานของโครงการปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส.1115/350 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565 และได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ อสส 1105/165 ลงวันที่ 12 เมษายน 2565 ดำเนินการจัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 คณะกรรมการตรวจรับงานเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานงวดที่ 1 ยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญาและรายละเอียดตามแบบก่อสร้าง ตรงตามที่ได้คณะกรรมการควบคุมงานนำเสนอ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์ไม่รับงานจ้าง งวดที่ 1 ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรแสงวิศวกรรม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแจ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรแสงวิศวกรรมให้ดำเนินการงานงวดที่ 1 ให้แล้วเสร็จตามสัญญาและรายละเอียดตามแบบก่อสร้างเมื่อดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการส่งมอบงานปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา งวดที่ 1 อีกครั้ง

**งวดที่ 1** ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน (วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2565) ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

1.1 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารเตาเผาซาก **แล้วเสร็จ 78.34 %** ประกอบด้วย

- งานเตรียมการก่อสร้างทั้งหมด ,งานฐานราก , งานเสาตอม่อ ,งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ 1 ,งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ,ชั้นที่ 1 .งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ 1 - ชั้นหลังคา ,งานคานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นระดับหลังคาคอนกรีต + ชั้นวางถังน้ำ ,งานพื้นชั้นระดับหลังคาคอนกรีต + ชั้นวางถังน้ำ และงานฐานรับถังบำบัดน้ำเสีย ,งานโครงสร้างหลังคา

1.2 งานโครงสร้างอาคารพยาบาลสัตว์ป่วย (บน ) **แล้วเสร็จ 100 %** ประกอบด้วย

- งานเตรียมการก่อสร้างทั้งหมด + งานรื้อถอน ,งานฐานราก ,งานเสาตอม่อ งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ 1 ,งานพื้นชั้นล่าง ,งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นที่ 1 , งานเสาเหล็กรูปพรรณ ชั้นที่ 1 ,งานโครงสร้างหลังคา 1 (ปรับปรุง),งานโครงสร้างหลังคา TRUSS

**สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ 1 แล้วเสร็จ 89.17 %**

**งวดที่ 2** ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน (วันที่ 17 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565) ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

2.1 งานสถาปัตยกรรม อาคารชั้นสูตรซากและเตาเผาซาก **แล้วเสร็จ 0 %** ประกอบด้วย

- งานมุงหลังคา ASAPVC , งานก่อฉาบผนัง

2.2 งานสถาปัตยกรรม อาคารพยาบาลสัตว์ป่วย **แล้วเสร็จ 60 %** ประกอบด้วย

- งานวัสดุมุงหลังคา ASAPVC, งานวัสดุผิวพื้น, งานวัสดุผนัง, งานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ,งานทาสีแล้วเสร็จ

2.3 งานโครงสร้างวิศวกรรม อาคารโรงพยาบาลสัตว์และสำนักงานส่วนแยก **แล้วเสร็จ 100 %** ประกอบด้วย

- งานเตรียมการก่อสร้าง (ทั้งหมด), งานรื้อถอนโรงพยาบาล (เดิม), งานฐานราก, งานเสาตอม่อ, งานคานคอดิน, งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 1, งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 1 , งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 1 - ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ

**เนื่องจากในช่วงเดือนพฤษภาคม ฝนตกหนักทำให้การดำเนินงานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นระดับหลังคาคอนกรีตในงวดที่ 1 ล่าช้าส่งผลให้การปฏิบัติงานงวดที่ 2 งานสถาปัตยกรรม งานมุงหลังคา ASAPVC , งานก่อฉาบผนังดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานงวด ซึ่งหากดำเนินงานดังกล่าวแล้วเสร็จสามารถส่งมอบงานงวดที่ 2 ได้**

**สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ 2 แล้วเสร็จ 53.34 %**



**งวดที่ 3** ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2565) ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

3.1 ระบบไฟฟ้าและสื่อสารอาคารชั้นสุตราชากและเตาเผาซาก **แล้วเสร็จ 0 %** ประกอบด้วย

- งานแผงสวิทช์ไฟฟ้าประธาน (MDB) ,งานสายไฟและท่อ,รางเดินสายไฟฟ้าระบบเมน, วางระบบประปา + สุขาภิบาลและระบบบำบัดน้ำเสีย

3.2 ระบบไฟฟ้าและสื่อสารอาคารพยาบาลสัตว์ป่วย **แล้วเสร็จ 80 %** ประกอบด้วย

- งานแผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ ,งานสายไฟฟ้าและท่อรางเดินสายไฟฟ้า ,ระบบเมนสายไฟฟ้า ,ติดตั้งคอมพิวเตอร์และเดสก์ ,ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด, ระบบประปา + สุขาภิบาลและระบบบำบัดน้ำเสีย และงานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆแล้วเสร็จ

**สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ 3 แล้วเสร็จ 40 %**

**งวดที่ 4** ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน (วันที่ 18 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2565) ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

4.1 งานภูมิทัศน์ อาคารชั้นสุตราชากและเตาเผาซาก **แล้วเสร็จ 0 %** ประกอบด้วย

- งานหลังคาแผงลวดตาข่าย 1 นิ้ว และงานประตู - หน้าต่าง แล้วเสร็จ

4.2 งานโครงสร้างวิศวกรรม (อาคารกักกันโรคสัตว์) **แล้วเสร็จ 90 %** ประกอบด้วย

- งานเตรียมการก่อสร้างรื้อถอน ,งานฐานราก ,งานฐานรากถึงบำบัดน้ำเสีย + ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป + ถังเซต ,งานถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ,งานเสาตอม่อ ,งานคานคอดิน ,งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ 1 ,งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ 1 ,งานกระเบื้องดิน ,งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ 1 ,งานเสาเหล็กรูปพรรณ ชั้นที่ 1 ,งานโครงสร้างหลังคา (ปรับปรุง) ,งานโครงสร้างหลังคา TRUSS A , TRUSS B , TRUSS C , งานทาสีแล้วเสร็จ

**สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ 4 แล้วเสร็จ 45 %**

**งวดที่ 5** ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน (วันที่ 17 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ) ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

5.1 งานสถาปัตยกรรม (อาคารกักกันโรคสัตว์) **แล้วเสร็จ 50 %** ประกอบด้วย

- งานมุงหลังคา ASPVC ,งานผนัง ,งานประตู - หน้าต่าง ,งานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ,งานทาสีผนัง ,งานระบบไฟฟ้าแผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ ,งานเดินสายไฟฟ้าและระบบเมน ระบบกล้องวงจรปิด, ระบบประปา ,ระบบสุขาภิบาล และเบ็ดเตล็ดอื่น ๆแล้วเสร็จ

5.2 งานโครงสร้างวิศวกรรม อาคารโรงพยาบาลสัตว์และสำนักงานส่วนแยก **แล้วเสร็จ 40 %** ประกอบด้วย

- งานฝ้าเพดาน, งานวัสดุผิวพื้น, งานวัสดุผนัง, งานบัวเชิงผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานรายการสุขภัณฑ์ ขยาย - หญิง

**สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ 5 แล้วเสร็จ 45 %**

**งวดที่ 6** ระยะเวลาดำเนินงาน 40 วัน (วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ) ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

6.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม อาคารโรงพยาบาลสัตว์และสำนักงานส่วนแยก **แล้วเสร็จ 80 %** ประกอบด้วย

- งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก, งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นหลังคา, งานพื้นชั้นหลังคา

- งานโครงสร้างอาคาร Generator ทั้งหมด

6.2 งานสถาปัตยกรรม อาคารสำนักงานส่วนแยก **แล้วเสร็จ 50 %** ประกอบด้วย

- งานวัสดุผนังหลังคา ASA PVC , งานก่อฉาบผนัง, งานวัสดุผิวพื้น, งานบัวเชิงผนัง, งานวัสดุผนัง, งานฝ้าเพดาน ,งานประตู - หน้าต่าง ,รายการสุขภัณฑ์ ,งานทาสี ,งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ แล้วเสร็จ

- งานก่อฉาบผนัง, งานวัสดุผิวพื้น, งานประตู - หน้าต่าง อาคาร Generator

**สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ 6 แล้วเสร็จ 65 %**

**งวดที่ 7** ระยะเวลาดำเนินงาน 20 วัน (วันที่ 26 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565) ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

7.1 งานสถาปัตยกรรม อาคารโรงพยาบาลสัตว์เดิม **แล้วเสร็จ 60 %** ประกอบด้วย

- งานหลังคาซีแพค (ซ่อมโครงหลังคาเดิม), งานก่อฉาบผนัง, งานวัสดุพื้น, งานบัวเชิงผนัง, งานวัสดุผนัง, งานฝ้าเพดาน, งานประตู - หน้าต่าง, งานสุขภัณฑ์, งานเบ็ดเตล็ด, งานทาสี แล้วเสร็จ

7.2 งานครุภัณฑ์อาคารชั้นสุตราชากและเตาเผาซาก **แล้วเสร็จ 0 %** ประกอบด้วย

- งานติดตั้งครุภัณฑ์ 5 ตัน, ติดตั้งระบบทำความเย็นสำหรับเก็บซากสัตว์, ติดตั้งเตาเผา, ติดตั้งกล้องวงจรปิดและติดตั้งระบบปรับอากาศ

### สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ 7 แล้วเสร็จ 30 %

งวดที่ 8 ระยะเวลาดำเนินงาน 20 วัน (วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2565) ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

8.1 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร อาคารโรงพยาบาลสัตว์เดิม **แล้วเสร็จ 50 %** ประกอบด้วย

- งานแผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน (MDB) (EDB), งานสายไฟฟ้าและท่อ, รังเดินสายไฟฟ้าระบบเมน, ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นที่ 1 ติดตั้งคอมพิวเตอร์และสวิตช์และเต้ารับ, ระบบสื่อสาร (โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์), ระบบกล้องวงจรปิด, ติดตั้งระบบปรับอากาศและเครื่อง Generator

8.2 ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร อาคารสำนักงานแยก **แล้วเสร็จ 50 %** ประกอบด้วย

- งานคอมพิวเตอร์, สวิตช์และเต้ารับ, สายไฟ, ท่อและรังเดินสายไฟ, ระบบสื่อสาร (โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์), ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบกล้องวงจรปิดและติดตั้งระบบปรับอากาศ **แล้วเสร็จ**

8.3 งานภูมิทัศน์ อาคารชั้นสุตรางและเตาเผาซาก **แล้วเสร็จ 0 %** ประกอบด้วย

- งานถนนทางเข้าอาคารชั้นสุตรางและเตาเผาซาก พื้นที่โดยประมาณ 412 ตารางเมตร
- งานถนนด้านหน้าทางเข้าอาคารชั้นสุตรางและเตาเผาซาก พื้นที่โดยประมาณ 115 ตารางเมตร
- งานรั้วโดยรอบอาคารชั้นสุตราง **แล้วเสร็จ**

### สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ 8 แล้วเสร็จ 33.34 %

งวดที่ 8 ระยะเวลาดำเนินงาน 25 วัน (วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2565) ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

9.1 งานระบบสุขาภิบาล โรงพยาบาลสัตว์ **แล้วเสร็จ 0 %** ประกอบด้วย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบท่อน้ำประปา น้ำทิ้ง โสโครก และท่ออากาศ

9.2 ระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร **แล้วเสร็จ 0 %** ประกอบด้วย

- งานระบบท่อระบายน้ำภายนอกอาคาร และงานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ **แล้วเสร็จ** พร้อมทั้งเก็บกวาดทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยทุกประการพร้อมทั้งทดสอบระบบต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้

สรุปการดำเนินงานปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา ตลอดระยะเวลาเริ่มโครงการจนถึง 24 พฤษภาคม 2565 คิดเป็น 45.45 %

### ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- ขาดแคลนแรงงาน แนวทางแก้ไขให้ผู้รับจ้างเพิ่มคนงาน

**เป็นปัญหาของผู้รับจ้าง ที่ไม่น่าจะเป็นเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาฯ ได้**

ภาพการดำเนินงาน

งานปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารเตาเผาซาก





## งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารเตาเผาซาก





## งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารเตาเผาซาก





## งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารเตาเผาซาก



## งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารเตาเผาซาก





## งานโครงสร้างอาคารพยาบาลสัตว์ป่วย (บน )





## งานโครงสร้างอาคารพยาบาลสัตว์ป่วย (บน )



## งานโครงสร้างอาคารพยาบาลสัตว์ป่วย (บน )





## งานอาคารโรงพยาบาลสัตว์



## งานอาคารโรงพยาบาลสัตว์



## อาคารส่วนแยก





งานอาคารกักกันโรคสัตว์



งานอาคารกักกันโรคสัตว์



## งานปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธุ์สมเสร็จ ภายในสวนสัตว์สงขลา

สัญญาเลขที่ 11/2565 ลงวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
วงเงิน 16,480,000.00 บาท (สิบหกล้านบาทสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  
ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มงานวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 และครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จในสัญญาวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ระยะเวลาดำเนินงาน 270 วัน  
จำนวนงวดงาน 7 งวด  
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรุ่งก่อสร้าง 2007

### ผลการดำเนินงาน

### ผลการดำเนินงาน

งวดที่ 1 เบิกเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 1,648,000.00 บาท

งวดที่ 2 เบิกเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 2,142,400.00 บาท

งวดที่ 3 ดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน 40 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2565) สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ 3 แล้วเสร็จ 88.89 %

ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างกำแพง แล้วเสร็จ 80 %
- งานโครงหลังคาเหล็ก อาคารคอกกัก 4 หน่วยและอาคารคอกกัก 3 หน่วย แล้วเสร็จ 100 %
- งานโครงหลังคาเหล็ก ศาลาชมสัตว์ แล้วเสร็จ 100 %
- งานโครงหลังคาเหล็ก ชุมนให้อาหารสัตว์ 4 หลัง แล้วเสร็จ 100 %
- งานโครงหลังคาเหล็กที่หลบแดดหลบฝน 4 หลัง แล้วเสร็จ 100 %
- งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ราวกันตก ด้านหน้าส่วนจัดแสดง แล้วเสร็จ 80 %
- งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กของบังคับสัตว์ แล้วเสร็จ 80 %
- งานโครงสร้างรั้ว Wire mash แล้วเสร็จ 80 %
- งานโครงสร้างรั้วหินธรรมชาติ แล้วเสร็จ 80 %

### ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

- ไม่มี




## ภาพการดำเนินการ

โครงการปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธุ์สมเสร็จ ภายในสวนสัตว์สงขลา





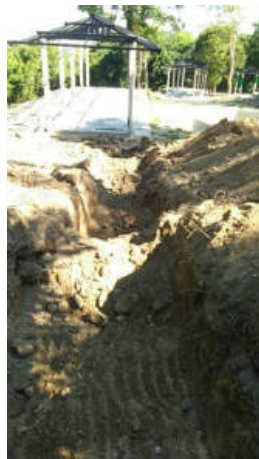







## รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี 2565

### สวนสัตว์อุบลราชธานี


#### ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 รายการ

##### ครุภัณฑ์ รายการที่ 1 แผ่นบันทึกภาพเอกซเรย์แบบดิจิทัล 4 แผ่น

ผู้รับจ้าง บริษัท เจ.เอฟ แอดวาน เมด จำกัด สัญญาเลขที่ 1/๒๕๖๕ เริ่ม 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 วงเงินที่ลงนามสัญญา 226,500.๐๐ บาท ( สองแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน )

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส 1116/1383 ลว. 2 ธันวาคม 2564


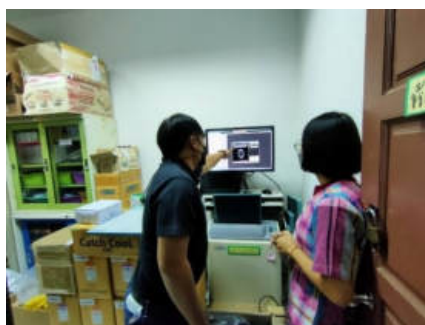


##### ครุภัณฑ์ รายการที่ 2 ชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ๑ ชุด

ผู้รับจ้าง บริษัท เจ.เอฟ แอดวาน เมด จำกัด สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๕ เริ่ม ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนามสัญญา ๑,๖๔๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน )

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์แล้วเสร็จ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส ๑๑๑๖/๑๔๘๘ ลว. ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

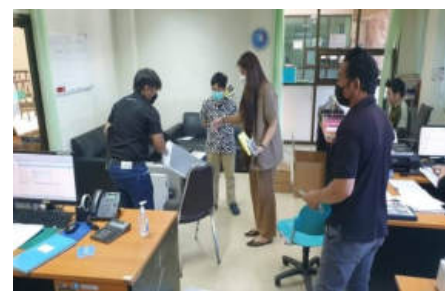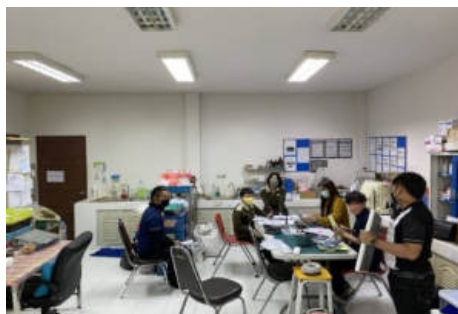



### ครุภัณฑ์ รายการที่ ๓ หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ Kva. ๕ เครื่อง

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแม็ค เทคโนโลยี สัญญาเลขที่ ๙/๒๕๖๕ เริ่ม ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนามสัญญา ๗๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท ( เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน )

**ผลการดำเนินงาน** - ส่งมอบครุภัณฑ์แล้วเสร็จในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

- ขออนุมัติเบิกเงินตามหนังสือเลขที่ ทส๑๑๑๖/๑๔๑๑ ลว. ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔



### ครุภัณฑ์ รายการที่ ๔ กล่องวงจรปิดติดตั้ง ๘ จุด ๖๖ ตัว

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีคอมมูนิเคชั่นเซลล์ แอดเซอร์วิส สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๕ เริ่ม ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ วงเงินที่ลงนามสัญญา ๘๕๐,๐๐๐ บาท ( แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )

**ผลการดำเนินงาน** - ส่งมอบครุภัณฑ์แล้วเสร็จในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส ๑๑๑๖/๑๔๘๘ ลว. ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

#### ภาพการดำเนินงาน



## งานก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วน กรีนเทค เอสโซซิเอท สัญญาจ้างเลขที่ 21/2565 วงเงินสัญญา จำนวนเงิน 53,498,000 บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เริ่มดำเนินการ 6 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุดการดำเนินงาน วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 6 งวด จำนวน 240 วัน

### ผลการดำเนินงาน

**งวดที่ 1** อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1 ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด งานงวดที่ 1 กำหนดส่งมอบงานวันที่ 22 มิถุนายน 2565

#### หมวดงานที่ 2 งานปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกา และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ Zone B

##### 2.1 คอกกักในอาลา

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2.1.1 งานปรับเคลือบพื้นที่                                  | แล้วเสร็จ 100 % |
| 2.2.2 งานโครงสร้าง ค.ส.ล. (ฐานราก,ตอม่อ,เสา,คานาคอดิน,พื้น) | แล้วเสร็จ 60 %  |
| 2.3.3 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (นำวัสดุเข้าหน้างาน)         | -               |

##### 2.2 อาคารบริการ 2

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2.2.1 งานปรับเคลือบพื้นที่                                  | แล้วเสร็จ 100 % |
| 2.2.2 งานโครงสร้าง ค.ส.ล. (ฐานราก,ตอม่อ,เสา,คานาคอดิน,พื้น) | แล้วเสร็จ 80 %  |
| 2.2.3 งานโครงสร้างหลังคา<br>(นำวัสดุเข้าหน้างาน)            | -               |

##### 2.3 คอกกักวัวเตอร์บัด

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2.3.1 งานปรับเคลือบพื้นที่                                  | แล้วเสร็จ 100 % |
| 2.3.2 งานโครงสร้าง ค.ส.ล. (ฐานราก,ตอม่อ,เสา,คานาคอดิน,พื้น) | แล้วเสร็จ 60 %  |
| 2.3.3 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (นำวัสดุเข้าหน้างาน)         | -               |

##### 2.4 อาคารชมสัตว์ A จำนวน 2 หลัง

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2.4.1 งานปรับเคลือบพื้นที่                                  | แล้วเสร็จ 100 % |
| 2.4.2 งานโครงสร้าง ค.ส.ล. (ฐานราก,ตอม่อ,เสา,คานาคอดิน,พื้น) | แล้วเสร็จ 70 %  |
| 2.4.3 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (นำวัสดุเข้าหน้างาน)         | -               |

#### หมวดงานที่ 3 งานปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกา และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ Zone C

##### 3.1 ส่วนจัดแสดงสัตว์ขนาดเล็ก

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| 3.1.3 งานประกอบตามรูปแบบส่วนแสดงสัตว์                   |                |
| - แม่พิมพ์ลายพื้น ลาย Random size 45x45 cm. จำนวน 5 ชุด | แล้วเสร็จ 50 % |
| - แม่พิมพ์ลายพื้น ลาย Blind A size 45x45 cm.จำนวน 5 ชุด | แล้วเสร็จ 50 % |
| - แม่พิมพ์ลายพื้น ลาย Ashlar size 23"x23" จำนวน 5 ชุด   | แล้วเสร็จ 50 % |
| - แม่พิมพ์ลายพื้น ลาย London size 17"x29" จำนวน 3 ชุด   | แล้วเสร็จ 50 % |
| - แม่พิมพ์ลายพื้น ลาย Granit size 24"x36" จำนวน 2 ชุด   | แล้วเสร็จ 50 % |



### 3.2 งาน Landscape ปรับภูมิทัศน์,งานรั้ว,งานป้าย

#### 3.2.1 ภูมิทัศน์ถนน

- งานปรับเคลียทางป่าขุดต่อพื้นที่โครงการ
- งานถมดินปรับพื้นที่ จำนวน 900 ลบ.ม.

แล้วเสร็จ 50 %

แล้วเสร็จ 90 %

#### 3.2.6 รั้วตาข่ายกันสัตว์

3.2.6.1 รั้วตาข่าย A จำนวน 100 แผง/ระยะรวม 300 เมตร ไม่รวมติดตั้ง

แล้วเสร็จ 70 %

3.2.6.4 รั้วตาข่ายกันกวาง(ชั่วคราว)

แล้วเสร็จ 100 %





ครุภัณฑ์ สวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตู้แช่อาหาร ขนาด ๔๕ คิวบิกฟุต  
งบประมาณ ๔๖,๐๐๐.-บาท  
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



ตู้แช่อาหาร ขนาด ๓๒ คิวบิกฟุต  
งบประมาณ ๒๗,๐๐๐.-บาท  
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



เครื่องเป่าใบไม้ ๒ จังหวะ ๓ เครื่อง  
งบประมาณ ๓๐,๓๐๐.-บาท  
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว




เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวี ๑ เครื่อง  
งบประมาณ ๕๒,๙๐๐.-บาท  
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



ครุภัณฑ์ สวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เครื่องเลเซอร์รักษาแผลสำหรับสัตว์  
1 เครื่อง งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐.-บาท  
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว

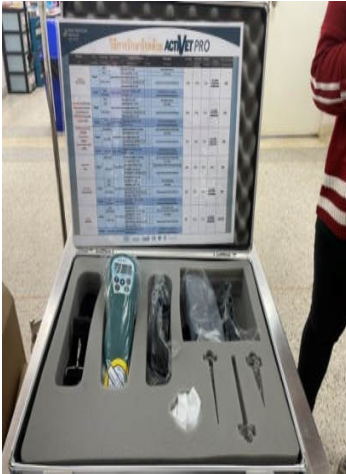

เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ๓ เครื่อง  
งบประมาณ ๔๔๔,๒๐๐.-บาท  
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า ๒ เครื่อง  
งบประมาณ ๗๐,๐๐๐.-บาท  
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า สวนสัตว์ขอนแก่น  
๒ เครื่อง งบประมาณ ๑๙,๐๐๐.-บาท  
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว





## งานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

### ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสัตว์และอาคารประกอบต่างๆ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น

ผู้รับจ้าง บริษัท ชุนพลพัฒนาการ จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ วงเงินสัญญาจ้าง จำนวนเงิน ๗,๙๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เริ่มดำเนินงาน วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดการดำเนินงาน วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ งวด จำนวน ๒๑๐ วัน

#### ผลการดำเนินงาน

- |          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| งวดที่ ๑ | ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว              |
| งวดที่ ๒ | ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว              |
| งวดที่ ๓ | (งวดสุดท้าย) ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |





## งานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

### งานก่อสร้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวน้ำ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น

ผู้รับจ้าง บริษัท ขุนพลพัฒนาการ จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ ๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ วงเงินสัญญาจ้าง จำนวนเงิน ๑๔,๕๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เริ่มดำเนินงาน ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔ งวด จำนวน ๒๔๐ วัน

งวดที่ ๑      ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒      ดำเนินการแล้วเสร็จ

งวดที่ ๓      อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน งวดที่ ๓ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ (๔๕ วัน)

๑. งานปรับปรุงอาคารแสดงแมวน้ำ (งานสถาปัตยกรรม และงานระบบส่วนต่อเติม)

๑.๑ งานระบบกรองเกลือ      แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๑.๒ งานระบบประปาและสุขาภิบาล      แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๑.๓ งานระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑๘ จุด พร้อมชุดควบคุม      แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๑.๔ งานระบบกระจายเสียงบริเวณส่วนจัดแสดง      แล้วเสร็จ ๘๐ %

พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง

๑.๕ งานระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์      แล้วเสร็จ ๘๐ %

๒. งานอาคาร Souvenir (งานสถาปัตยกรรม)

๒.๑ งานอื่นๆ      แล้วเสร็จ ๑๐ %

๓. งานจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในงวดงานต่อไปเข้าพื้นที่งานก่อสร้าง

ผลการดำเนินงาน งวดที่ ๔ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ (๔๕ วัน)

๑. งานปรับปรุงอาคารแสดงแมวน้ำ (งานสถาปัตยกรรม และงานระบบส่วนต่อเติม)

๑.๑ งานระบบอำนวยความสะดวกอื่นๆ      แล้วเสร็จ ๘๕ %

จอแสดงภาพ LED ๓.๖๐ x ๒.๘๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง

๑.๒ งานตกแต่งภูมิทัศน์      แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๑.๓ งานครุภัณฑ์      แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๒. งานก่อสร้างต่างๆ ที่ปรากฏในสัญญาและรูปแบบรายการทั้งหมด      แล้วเสร็จ ๗๐ %

พร้อมทำความสะอาดบริเวณงานก่อสร้าง

สรุป การปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๕ ตลอดระยะเวลาเริ่มโครงการจนถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕



ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี  
แนวทางแก้ไข ไม่มี

งานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

งานก่อสร้างอาคารจักรนักล้า ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น

ผู้รับจ้าง บริษัท ขุนพลพัฒนาการ จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ วงเงินสัญญาจ้าง จำนวนเงิน ๑๔,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เริ่มดำเนินงาน ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔ งวด จำนวน ๒๔๐ วัน

งวดที่ ๑ เบิกจ่ายแล้ว

ผลการดำเนินงาน งวดที่ ๒ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ( ๖๐ วัน ) มีเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง กระทบงวด ๒-๔ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการไป อสส. ๕ พ.ค.๖๕ ได้รับอนุมัติแล้ว

๑. งานส่วนจัดแสดงเสือโคร่งขาว
- ๑.๑ งานติดตั้งกล่องวงจรปิดและอินเทอร์เน็ต ส่วนจัดแสดงและคอกกัก

แล้วเสร็จ ๐.๐๐ %
- ๑.๒ งานรั้วกั้นรอบพื้นที่คอกกัก ความยาว ๙๒ เมตร

แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ๑.๓ งานประตูล้อเลื่อน

แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ๑.๔ งานถนน ค.ส.ล. เข้าคอกกัก หน้า ๑๕ ชม. พื้นที่ ๗๕ ตร.ม.

แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๒. งานส่วนจัดแสดงเสือโคร่งอินโดจีน
- ๒.๑ งานประตูล้อเลื่อน

แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ๒.๒ งานถนนทางเข้าคอกกัก ค.ส.ล. หน้า ๑๕ ชม. พื้นที่ ๑๕๕ ตร.ม.

แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ๒.๓ งานรั้วกั้นรอบพื้นที่คอกกัก ยาว ๑๐๐ เมตร

แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ๒.๔ งานซุ้มบังแดดฝนและลานหินเทียม

แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ๒.๕ งานอาคารโรงสูบน้ำและระบบกรอง

แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ๒.๖ งานน้ำตกเลียนแบบธรรมชาติ

แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๓. งานส่วนจัดแสดงสิงโตขาว
- ๓.๑ งานประตูล้อเลื่อน

แล้วเสร็จ ๐.๐๐ %
- ๓.๒ งานถนนทางเข้าคอกกัก ค.ส.ล. หน้า ๑๕ ชม. พื้นที่ ๙๘๐ ตร.ม.

แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ๓.๓ งานรั้วกั้นรอบพื้นที่คอกกัก ยาว ๑๓๐ เมตร

แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๔. งานภูมิทัศน์
- ๔.๑ งานพรรณไม้ยืนต้น

แล้วเสร็จ ๕๐ %
- ๔.๒ งานพรรณไม้พุ่มไม้คลุมดิน

แล้วเสร็จ ๕๐ %
๕. งานจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในงวดงานต่อไปเข้าพื้นที่งานก่อสร้าง

สรุป การปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๐ ตลอดระยะเวลาเริ่มโครงการจนถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕



## งานก่อสร้างอาคารจักรนักล้า ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น





ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี  
แนวทางแก้ไข ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕


ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

- ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรในปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ

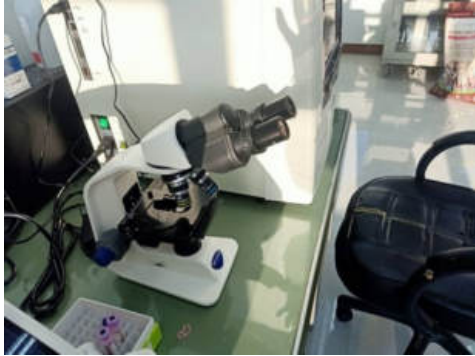

1. กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา ใบสั่งซื้อ 001/2565  
บริษัท เบสท์ แล็บ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
เบิกจ่าย 100%

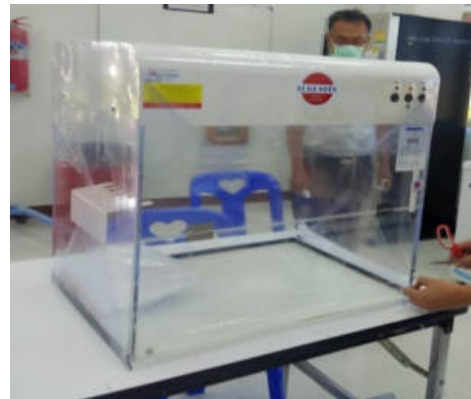

2. เครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมในสภาพจริงแบบเคลื่อนที่ ใบสั่งซื้อ 004/2565  
บริษัท อาฟเตอร์ แล็บ จำกัด  
เบิกจ่าย 100%

ครุภัณฑ์ รายการที่ ๓ เครื่องมือรักษาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดความเข้มต่ำ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์  
 ผู้รับจ้าง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๕ เริ่ม ๑๑ ต.ค.๖๔ สิ้นสุดสัญญา ๘ ก.พ. ๖๕  
 วงเงินที่ลงนามสัญญา ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (ส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ )



3. เครื่องมือรักษาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดความเข้มต่ำ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์  
 สัญญาเลขที่ 3/2565 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด  
 เบิกจ่าย 100%

ครุภัณฑ์ รายการที่ ๔ รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์  
 ผู้รับจ้าง บริษัทพัชริ เฮฟวี่ แมชชีนเนอรี จำกัด สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๕ เริ่ม ๒๐ พ.ย.๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา ๑๗ ก.พ.  
 ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนามสัญญา ๓,๑๙๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  
 (ส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ )



๔. รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์  
 สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๕ บริษัทพัชริ เฮฟวี่ แมชชีนเนอรี จำกัด  
 เบิกจ่าย ๑๐๐%



## งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระการบินไทย ภายในโครงการคชอาณาจักร

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ไทยสงวน สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๕ เริ่มเริ่ม ๑๑ พ.ย..๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา ๘ ก.ค. ๒๕๖๕ วงเงินลงนามสัญญา ๑๑,๙๖๙,๐๐๐.-บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จำนวน ๕ งวด ๒๔๐ วัน (โดยฝ่ายพัสดุดงค์การสวนสัตว์เป็นผู้ดำเนินการ)

**ผลการดำเนินงาน**      งวดที่ ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่งเบิกจ่ายไปยัง อสส.เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐% (รอส่งมอบงาน)

- งานสร้างคาคอดินกันสไลด์ ความยาว ๒๕๐ เมตร      แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานโครงสร้างฐานราก ศาลาดูช้าง      แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานโครงสร้างฐานราก ศาลาพักผ่อน      แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานโครงสร้างฐานราก ทางเดินช้าง      แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานย้ายแทงค์เก็บน้ำ ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร      แล้วเสร็จ ๑๐๐%

งวดที่ ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐% (รอส่งมอบงาน)

อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ ๓

- งานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา ศาลาดูช้าง      แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา ศาลาพักผ่อน      แล้วเสร็จ ๒๐%
- งานวางผังทางเดินและเทคอนกรีตปรับระดับ      แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานเทคอนกรีตและปรับระดับ ทางเดินช้าง      แล้วเสร็จ ๑๐๐%

อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ ๔

- งานศาลาดูช้าง      แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานศาลาพักผ่อนช้าง      แล้วเสร็จ ๒๐%
- งานทางเดินช้าง      แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานทางเดินเท้า      แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานวางระบบรดน้ำต้นไม้      แล้วเสร็จ ๒๐%
- งานปลูกต้นไม้และจัดสวน      แล้วเสร็จ ๒๐%

## งวดที่ ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐% (รอส่งมอบงาน)

งานสร้างคาคอดินกันสไลด์ ความยาว ๒๕๐ เมตร



งานโครงสร้างฐานราก ศาลาดูช้าง



งานโครงสร้างฐานราก ศาลาพักผ่อน







งานโครงสร้างฐานราก ทางเดินช้าง



งานย้ายแทงค์เก็บน้ำ ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร





### อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ ๓

- งานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา ศาลาดูช้าง      แล้วเสร็จ ๖๐%
- งานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา ศาลาพักผ่อน      แล้วเสร็จ ๒๐%
- งานวางผังทางเดินและเทคอนกรีตปรับระดับ      แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานเทคอนกรีตและปรับระดับ ทางเดินช้าง      แล้วเสร็จ ๑๐๐%

#### งานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา ศาลาดูช้าง      แล้วเสร็จ ๖๐%





งานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา ศาลาพักผ่อน แล้วเสร็จ ๒๐%






งานวางผังทางเดินและเทคอนกรีตปรับระดับ แล้วเสร็จ ๑๐๐%



งานเทคอนกรีตและปรับระดับ ทางเดินข้าง แล้วเสร็จ ๑๐๐%

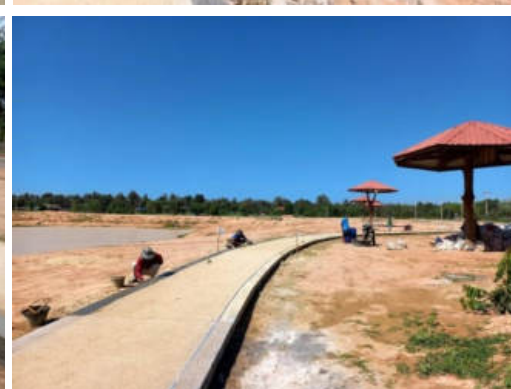



## อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ ๔

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| - งานศาลาดูช้าง          | แล้วเสร็จ ๖๐%  |
| - งานศาลาพักผ่อนช้าง     | แล้วเสร็จ ๒๐%  |
| - งานทางเดินช้าง         | แล้วเสร็จ ๑๐๐% |
| - งานทางเดินเท้า         | แล้วเสร็จ ๑๐๐% |
| - งานวางระบบรดน้ำต้นไม้  | แล้วเสร็จ ๒๐%  |
| - งานปลูกต้นไม้และจัดสวน | แล้วเสร็จ ๒๐%  |

### งานศาลาดูช้าง แล้วเสร็จ ๖๐%



งานศาลาพักผ่อนข้าง แล้วเสร็จ ๒๐%



งานวางระบบรดน้ำต้นไม้ แล้วเสร็จ ๒๐%





งานปลูกต้นไม้และจัดสวนแล้วเสร็จ ๒๐%



ปัญหา-อุปสรรค

สืบเนื่องจากผู้รับเหมาเข้ามาปฏิบัติงานไม่เต็ม ๑๐๐% จึงทำให้งานก่อสร้าง และงวด ๔ ทำให้งานล่าช้าออกไป จึงเป็นอุปสรรคต่องานก่อสร้างในครั้งนี้ ผู้ควบคุมงานได้เร่งให้ผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินงาน งวด ๔ ให้เสร็จทันภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น



#### แนวทางแก้ไข

๑. คณะกรรมการผู้ควบคุมงานได้ออกหนังสือ ที่อสส๑๑๑๙/๔๘ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่องเร่งรัดการส่งมอบงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระการบินไทย งานงวดที่ ๒ ครั้งที่ ๑ โดยให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ไทยสงวน ทำหนังสือส่งมอบงานงวดที่ ๒ ภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น
๒. คณะกรรมการผู้ควบคุมงานได้ออกหนังสือ ที่อสส๑๑๑๙/๔๔ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่องเร่งรัดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ งานงวดที่ ๓ โดยให้เข้ามาดำเนิน งานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา ศาลาดูช้าง และงานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา ศาลาพักผ่อน ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น
๓. คณะกรรมการผู้ควบคุมงานได้ออกหนังสือ ที่อสส๑๑๑๙/๘๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่องเร่งรัดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ งานงวดที่ ๓ ครั้งที่ ๒ โดยให้เข้ามาดำเนินงานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา ศาลาดูช้าง และงานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา ศาลาพักผ่อน ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น
๔. คณะกรรมการผู้ควบคุมงาน ได้ออกหนังสือ ที่อสส๑๑๑๙/๖๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่องขอเชิญประชุมหารือเรื่องงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระการบินไทย โดยประชุมวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน โดยมีนายภาสกร อรสุญญ ผู้จัดการโครงการเป็นประธานในการประชุมครั้ง พร้อมคณะกรรมการผู้ควบคุมและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ไทยสงวน ในการเข้าประชุมหารือครั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าของงานก่อสร้าง งวด ๓ และงวด ๔ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงานงวดที่ ๒
๕. คณะกรรมการผู้ควบคุมงานได้ออกหนังสือ ที่อสส๑๑๑๙/๑๑๙ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่องเร่งรัดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ งานงวดที่ ๓ ครั้งที่ ๓ โดยให้เข้ามาดำเนินงานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา ศาลาดูช้าง และงานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา ศาลาพักผ่อน ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
๖. คณะกรรมการผู้ควบคุมงานได้ออกหนังสือ ที่อสส๑๑๑๙/๑๑๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่องเร่งรัดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ งานงวดที่ ๔ ครั้งที่ ๑ โดยให้เข้ามาดำเนินงานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา ศาลาดูช้าง และงานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา ศาลาพักผ่อน งานวางระบบรดน้ำต้นไม้ และงานปลูกต้นไม้จัดสวน ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

-ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างการทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการตรวจรับ เพื่อเบิกจ่าย ไม่เกิน วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๕      เรื่องอื่นๆ

มติที่ประชุม
