



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักการเงินและทรัพย์สิน

ที่ อสส ๑๑๐๕/๑๘๔๑

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

เรียน	☒ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ	☒ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
	☒ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	☒ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
	☒ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ	☒ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา
	☒ ผู้อำนวยการสำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์	☒ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา
	☒ ผู้อำนวยการสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์	☒ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี
	☒ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ	☒ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น
	☒ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ	☒ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ
	☒ ผู้อำนวยการสถาบันจัดการสวนสัตว์	☒ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทุนมนุษย์
	☒ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากายภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม	

ตามที่ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย อนุมัติให้สำนักการเงินและทรัพย์สิน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบ สำหรับการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานในการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบตามระเบียบการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เพื่อให้คณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณฯ รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานตามระเบียบวาระการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพิมวรณ์ อนนธ์)

ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน

• • •
คณะทำงานและเลขานุการ



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณฯ

ที่

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน

ตามที่ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย อนุมัติให้สำนักการเงินและทรัพย์สิน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบ สำหรับการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานในการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบตามระเบียบการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เพื่อให้คณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณฯ รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานตามระเบียบวาระการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอโปรดลงนามในหนังสือตามที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวสุกัญญา หงส์พันธุ์)
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

แจ้งเวียน

1/8/65



การประชุม

คณะกรรมการด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของ
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

การประชุมเป็นรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงาน
พร้อมภาพประกอบ

ระเบียบวาระการประชุม
คณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
 ๓.๑ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ (สำนักกฎหมาย/สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์)
 ๓.๒ ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่
 (สำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม)
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
 ๔.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 ๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
 ๔.๓ รายงานผลการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ (สวนสัตว์เชียงใหม่)
 ๔.๔ รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานกรรมการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมคณะกรรมการด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
ได้อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบ
ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๕/๑๓๙๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานผลการดำเนินงานฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

สำนักการเงินและทรัพย์สิน ได้ส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบตามระเบียบการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ให้คณะทำงานฯ เพื่อรับทราบ โดยสำนัก สถาบันสวนสัตว์ และโครงการ ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว และรายงานผลการดำเนินงาน กลับให้สำนักการเงินและทรัพย์สินทาง e-mail และทาง line เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม



รายงานการประชุม
คณะกรรมการการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ผ่านการประชุมออนไลน์ Application ZOOM

คณะกรรมการที่มาร่วมประชุมผ่านการประชุมออนไลน์ Application ZOOM

๑. นายอรรถพร ศรีเหรัญ	ประธานคณะกรรมการ
ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	
๒. นายอภิเดช สิงห์เสนี	คณะกรรมการ
รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	
๓. นางจกกลณี แก้วสด	คณะกรรมการ
รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	
๔. ผู้อำนวยการบริหารแผนยุทธศาสตร์	คณะกรรมการ
๕. ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว	คณะกรรมการ
๗. ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่	คณะกรรมการ
๘. ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา	คณะกรรมการ
๙. ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา	คณะกรรมการ
๙. ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี	คณะกรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น	คณะกรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน	คณะกรรมการและเลขานุการ
๑๒. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรงบประมาณ	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการที่ไม่มาประชุม

๑. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ	คณะกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการสำนักบริหารทุนมนุษย์	คณะกรรมการ
๓. ผู้อำนวยการสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์	คณะกรรมการ
๔. ผู้อำนวยการสถาบันจัดการสวนสัตว์	คณะกรรมการ
๕. ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน	คณะกรรมการ
๖. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๗. หัวหน้าฝ่ายแผนงาน	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



ผู้เข้าร่วมประชุมจากส่วนกลางผ่านระบบประชุมทางไกล

๑. นางบังอร	สนธิสุวรรณ	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
๒. นายสุทัศน์	สุทธีวงศ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม
๓. นางสาวกัลยา	มุลพงษ์	หัวหน้างานบัญชีและงบประมาณโครงการ
๔. นางสาวนริศรา	แก้วทิพย์รัตน์	เจ้าหน้าที่งบประมาณ
๕. นางสาวเสาวลักษณ์	สุวรรณโกชน	สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
		เจ้าหน้าที่งบประมาณ
๖. นางสาวอินทิรา	ไพศาลนิธิกุล	สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
๗. นางสาวสุคนธร	บุญมาเจริญ	หัวหน้างานบริหารสัญญา
๘. นางธัญญ์จุฑา	สุขรอด	เจ้าหน้าที่พัสดุ
๙. นางสาวสุติมา	ว่องเจริญกุล	เจ้าหน้าที่พัสดุ
๑๐. นายธนิต	สกุลทอง	เจ้าหน้าที่พัสดุ
		ช่วยปฏิบัติงานสำนักการเงินและทรัพย์สิน

ผู้เข้าร่วมประชุมจากส่วนสัตว์ ผ่านระบบประชุมทางไกลสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

๑. นายเทวินทร์	รัตนวงษะวัต	ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
๒. นางสาวภาภรณ์	จันทร์บาง	หัวหน้าฝ่ายผู้เยี่ยมชม
๓. นางสาวจันทยา	จุลศรี	เจ้าหน้าที่พัสดุ ๖
๔. นางสาวศุภาภรณ์	พวงพิศ	เจ้าหน้าที่บัญชี ๔ ปฏิบัติงานพัสดุและสินทรัพย์

สวนสัตว์เชียงใหม่

๓. นายวุฒิชัย	ม่วงมัน	ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
๔. นางกรองแก้ว	ทัพนวชัย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
๕. นางสาววาสนา	บุฉกาการ	หัวหน้างานภูมิทัศน์
๖. นายเดชภทร	ยิณศิริส	หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพ
๗. นายวชิกร	คุณใจดี	หัวหน้างานบัญชี
๘. นางนิลพันธุ์	แย้มคลี	หัวหน้างานพัสดุ
๙. นายบัญชา	จันทาทอง	รักษาการหัวหน้างานซ่อมบำรุง
๑๐. นางสาวสุลักษณ์	แก้วประกิจ	สถาปนิก ๖



สวสัต์ว่นครราชสีมา

๑๑. นายธนชน	เคนสิงห์	ผู้อำนวยการสวสัต์ว่นครราชสีมา
๑๑. นางสาวสุกัญญา	รัตนไตรศรี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวสัต์ว่นครราชสีมา
๑๒. นางจุฑามาศ	ถ่ายสูงเนิน	นักบริหาร ๖ หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์
๑๓. นางจิตราภรณ์	กรีซสูงเนิน	เจ้าหน้าที่พัสดุ ๖
๑๔. นางสาวจรรีรัตน์	ปัญญาพุนตระกูล	เจ้าหน้าที่พัสดุ ๖
๑๕. นายสุวิจักขณ์	อาจปรุ	เจ้าหน้าที่พัสดุ ๕
๑๖. นางนภัสสร	คุณขุนทด	เจ้าหน้าที่บัญชี ๖

สวสัต์ว่งขลา

๑๗. นายวันชัย	ตันวัฒนะ	ผู้อำนวยการสวสัต์ว่งขลา
๑๘. นายผดุงศักดิ์	จันทร์รัตน์	หัวหน้างานบำรุงสัต์ว่งเล็กน้อยคลานฝ่ายบำรุงสัต์ว่ง
		รักษาการหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัย และสุขภาพสัต์ว่ง
๑๙. นางสาวพนิดา	ชูเชิด	หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์
๒๐. นางสาวชุติมา	สุภาวะไตร	เจ้าหน้าที่พัสดุ ๖

สวสัต์ว่อบลราชธานี

๒๑. นายฐิตพร	ทองดีพันธุ์	ผู้อำนวยการสวสัต์ว่อบลราชธานี
๒๒. นางสาวปวีศา	ก้อนศรี	นักบริหาร ๗ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๒๓. นางสาวปรีธาดา	วิสุทธิวรคุณ	เจ้าหน้าที่พัสดุ ๖ รักษาการ หัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สิน
๒๔. นางสาวกมลชนก	เจือจันทร์	เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน ๖ รักษาการ
		หัวหน้างานวางแผนและและจัดสรรงบประมาณ

สวสัต์ว๋ขอนแก่น

๒๕. นายณรงวิทย์	ชดช้อย	ผู้อำนวยการสวสัต์ว๋ขอนแก่น
๒๖. นางทิพาดี	กิตติคุณ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวสัต์ว๋ขอนแก่น
๒๗. นายอัศม์	ประภัสสร	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๒๘. นางสาวดี	น้อยมี	หัวหน้างานพัสดุ
๒๙. นางสาวมนัสภรณ์	ดำนพงษ์	หัวหน้างานวางแผนและจัดสรรงบประมาณ

โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

๓๐. นายภาสกร	อรสุญ	ผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
๓๑. นายกริตติคุณ	กรีธาพล	นักบริหาร ๗ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๓๒. นายธนานันต์	เยี่ยมวิริยะกุล	นักบริหาร ๗ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสวสัต์ว่ง
๓๓. นางสาวทิพย์วารี	ดอกยี่สุ่น	เจ้าหน้าที่พัสดุและยานพาหนะ



เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายอรรถพร ศรีเจริญ ประธานคณะกรรมการ แจ้งในที่ประชุมว่า ขอให้ฝ่ายเลขาธิการงาน ว่าครั้งที่ผ่านมาประชุมแบบไหน และครั้งนี้ประชุมแบบไหน และในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีวาระอะไร ที่ประชุมบ้าง เพราะส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องรายงาน ว่าหน่วยงานมีการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ หรือไม่ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมามีการประชุมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยท่านปลัดฯ เน้นย้ำเรื่องการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นเรื่องสำคัญของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและขณะนี้งบประมาณปี ๒๕๖๖ ได้เข้าสู่การพิจารณาครั้งที่ ๒ โดยหน่วยราชการต้องเข้าไปชี้แจงต่อคณะกรรมการเป็นรายหน่วยงาน ซึ่งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้ชี้แจงเรียบร้อยแล้วคงเหลือที่ต้องเข้าไปชี้แจงอีกหนึ่งคณะในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คือ คณะอนุกรรมการศึกษาการจัดทำงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทย่อยและแผนปฏิบัติการของวุฒิสภา โดยคณะนี้จะไม่ส่งผลกระทบอะไรกับงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย การพิจารณาของคณะอนุกรรมการครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน ได้มีการปรับลดงบประมาณในภาพรวมปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ งานก่อสร้างค่ายเยาวชนรักษาสันติไทย โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ จากวงเงินเดิม ๔๔,๔๑๖,๐๐๐ บาท ปรับลดลงคงเหลือจำนวน ๔๑,๔๑๖,๐๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๖ ในภาพรวมคงเหลือทั้งสิ้นจำนวน ๑,๗๘๑,๔๕๖,๗๐๐ บาท สำหรับงบประมาณبودทุนและงบลงทุนรายการอื่นไม่มีการปรับลด แต่เงื่อนไขหนึ่งที่ได้รับแจ้งก็คือหากหน่วยงานไหนไม่มีความพร้อมในการดำเนินงาน และมีความประสงค์ปรับเปลี่ยนแก้ไขรายการ สามารถดำเนินการได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลที่ชัดเจนถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงซึ่งข้อมูลต้องมีละเอียดพอสมควร หากต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับงบประมาณมาแล้ว หากหน่วยงานไหนได้รับงบประมาณไปแล้วไม่มีความพร้อมในการดำเนินงานก็จะเป็นผลกับงบประมาณที่จะพิจารณาจัดสรรในปีงบประมาณต่อไป

มติที่ประชุม

๑. รับทราบกรอบวงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๒. ให้ทุกสำนัก/ สถาบัน/ สวนสัตว์ และโครงการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานผลการคณะกรรมการด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

นางพิมาวรรณ อนนท์ คณะทำงานและเลขานุการฯ รายงานในที่ประชุมว่า ระเบียบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งเอกสาร
ให้ตรวจสอบความถูกต้องถ้ามีการเปลี่ยนแปลงขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการเพื่อจะได้ปรับปรุงในเรื่องของมติที่ประชุมโดย
ขอให้ ส่งฝ่ายเลขานุการให้ทราบภายใน ๗ วัน เพื่อรับรองต่อไป

มติที่ประชุม

๑. รับรองรายงานรับรองรายงานผลการคณะกรรมการด้านการเงิน งบประมาณ และการ
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่
๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

๒. กรณีที่ต้องการแก้ไขข้อความในรายงานฯ ขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายใน
๗ วัน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

นางพิมาวรรณ อนนท์ คณะทำงานและเลขานุการฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ขอแจ้งผล
การเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	รวมเบิกทั้งสิ้น	คิดเป็น (%)	คงเหลือ
๑. งบอุดหนุน	๔๐๕,๙๑๙,๕๐๐.๐๐	๓๐๔,๓๑๗,๘๐๐.๐๐	๗๔.๙๗	๑๐๑,๖๐๑,๗๐๐.๐๐
๒. งบลงทุน	๓๐๒,๑๐๗,๐๐๐.๐๐	๑๑๖,๔๒๙,๗๔๖.๐๐	๓๘.๕๔	๑๘๕,๖๗๗,๒๕๔.๐๐
* ครุภัณฑ์	๓๓,๔๔๕,๑๐๐.๐๐	๒๖,๓๐๑,๑๐๐.๐๐	๗๘.๖๔	๗,๑๔๔,๐๐๐.๐๐
* สิ่งก่อสร้าง	๒๖๘,๖๖๑,๙๐๐.๐๐	๙๐,๑๒๘,๖๔๖.๐๐	๓๓.๕๕	๑๗๘,๕๓๓,๒๕๔.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๗๐๘,๐๒๖,๕๐๐.๐๐	๔๒๐,๗๔๗,๕๔๖.๐๐	๕๙.๔๓	๒๘๗,๒๗๘,๙๕๔.๐๐



ครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีทั้งสิ้นจำนวน ๔๑ รายการ ได้ดำเนินการลงนามสัญญาและเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๓๙ รายการ ซึ่งยังคงเหลือครุภัณฑ์ของส่วนกลาง จำนวน ๒ รายการที่ยังเบิกจ่ายตามงวดงานในสัญญาไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่

๑. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-ticket)
๒. โครงการระบบบริหารจัดการสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (Thai Zoo Ark)

สิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีทั้งสิ้นจำนวน ๑๓ รายการ ได้ดำเนินการลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายการที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่

๑. ก่อสร้างเตาเผาซากสัตว์ปลอดมลพิษพร้อมปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
๒. ปรับปรุงอาคารฝ่ายอนุรักษ์และวิจัย พร้อมอาคารอนุบาลลูกสัตว์ สวนสัตว์เชียงใหม่
๓. ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสัตว์และอาคารประกอบต่างๆ สวนสัตว์ขอนแก่น

นางพิมารรณ อนนท์ คณะทำงานและเลขานุการฯ แจ้งในที่ประชุมว่า เนื่องจากในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ มีผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง จึงขอให้แต่ละสวนสัตว์รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายเทวินทร์ รัตนวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว รายงานในที่ประชุมว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้บริหารจัดการงบประมาณ รายการสิ่งก่อสร้างจำนวน ๒ รายการ และได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ รายการ ได้แก่ ก่อสร้างเตาเผาซากสัตว์ปลอดมลพิษพร้อมปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการ งานปรับปรุงถนนแนวรั้วและสิ่งอำนวยความสะดวก ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีทั้งสิ้น ๖ งวดงาน เบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๒ ในภาพรวมถือว่าการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนด้วยเหตุหลายประการ แต่หากถ้าดูในหน้างานการก่อสร้าง ผู้รับจ้างได้ลงปฏิบัติงานทุกงวดงานแล้วประมาณงานละ ๒๐% ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่ ๒ และช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จะส่งมอบงวดที่ ๓ ตามมา ประเด็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นก็คืองวดสุดท้าย งวด ๕ และงวด ๖ ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงงวดงานรายการสิ่งก่อสร้าง คือ การปรับสำนักงานให้เป็นศูนย์อาหาร และปรับศูนย์อาหารตรงอาคาร Green zoo ที่อาคารจอดรถเป็นสำนักงาน ซึ่งต้องปรับศูนย์อาหารให้เสร็จก่อนถึงจะย้ายสำนักงานไปที่ศูนย์อาหารได้สำหรับงานรายการนี้อาจจะเกินสัญญาประมาณ ๑ เดือน และได้เชิญผู้รับจ้างมาคุยแล้วโดยขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อจะไม่ต้องกันเงินเหลือมี

นายอรรถพร ศรีเจริญ ประธานคณะทำงาน แจ้งในที่ประชุมว่า ขอให้สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เร่งรัดงานงวดสุดท้ายให้เป็นไปตามสัญญาด้วย เพอร์เซ็นการเบิกจ่ายจะได้ โชว์ เวลารายงานผลการเบิกจ่ายที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางกระทรวงฯ จะดึงผลการเบิกจ่ายมาจากระบบ GFMIS เป็นหลักว่าแต่ละหน่วยงานมีการเบิกจ่ายมาแล้วคิดเป็นร้อยละเท่าไรและจะเปรียบเทียบกับปีที่แล้วว่าปีที่แล้ว ณ เดือนนั้นๆ เบิกจ่ายได้เท่าไร เพราะฉะนั้น จึงอยากให้ความสำคัญกับการเบิกจ่ายตามงวดงาน จึงขอให้เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จทัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด และขอให้ติดตามหากมีปัญหาอะไรขอให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว



สำหรับงานก่อสร้างหรืองานปรับปรุง ที่ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่าย ๑๐๐% ขอให้รายงานเข้ามาด้วยว่าเริ่มใช้งานแล้วหรือยัง มีการเข้าไปใช้ประโยชน์ของงบลงทุนนั้นๆ แล้วหรือไม่ เพื่อจะได้ตอบโจทยว่าส่งงานเสร็จสิ้นแล้ว มีการเข้าไปใช้ประโยชน์แล้ว และต้องวัดผลสัมฤทธิ์ว่าเงินที่ได้ไป ได้ใช้งานแล้วคุ้มค่าคุ้มประโยชน์แล้วหรือไม่อย่างไร ขอให้เพิ่มเติมทั้งของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ และสวนสัตว์ขอนแก่น ที่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงานก่อสร้างเสร็จสิ้นครบจบทุกงวดงาน เพราะมีประเด็นว่าบางหน่วยเบิกจ่ายครบแล้ว แต่ใช้งานไม่ได้ ขอให้สวนสัตว์ที่ดำเนินงานแล้วเสร็จเพิ่มเติมประเด็นในการรายงานในคราวต่อไปด้วยว่าเข้าไปใช้งานได้หรือยัง หรือยังต้องเข้าไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เหตุใดจึงยังไม่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ รายงานในที่ประชุมว่า งานก่อสร้างโครงข่ายท่อน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ มีทั้งสิ้นจำนวน ๑๐ งวดงาน ส่งมอบงานแล้วจำนวน ๓ งวดงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งงานงวดที่ ๔ คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งได้คุยกับผู้รับจ้างไปแล้ว

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ประธานคณะกรรมการ แจ้งในที่ประชุมว่า ในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณขอให้ทุกสวนสัตว์ดำเนินการจัดทำบันทึกว่าได้ติดตามเร่งรัดในลักษณะใด เช่น มีการประชุมติดตามผู้รับจ้างก็ครั้งขอให้ทำบันทึกไว้ มีการประชุมกับผู้รับจ้างก็ครั้ง กรณีปัญหาอุปสรรคให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร และขอให้มี Time line ที่ชัดเจน ในกรณีที่ Time line ถูกขยับออกให้กำหนดวันแล้วเสร็จให้ชัดเจนแล้วปรับ Time line ให้เป็นปัจจุบัน และทำข้อตกลงกับผู้รับจ้างให้เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ขอให้ใช้ Time line เดิม กรณีปรับ Time line ต้องมีเหตุผลที่จะปรับ โดยให้รับรู้กันทุกฝ่ายว่าระยะสิ้นสุดโครงการถูกขยับออกไป ขอให้ทุกสวนสัตว์ดำเนินการจัดทำบันทึกแบบนี้ทุกครั้งที่ด้วย

นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา รายงานในที่ประชุมว่า งานก่อสร้างสวนสัตว์นครราชสีมา มี ๒ รายการ คือ ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และงานก่อสร้างส่วนจัดแสดงสัตว์อาณาจักรผู้ล่า ทั้ง ๒ รายการมีทั้งหมด ๕ งวดงาน ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานที่ ๓ เข้ามาแล้วทั้ง ๒ รายการ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามงวดงาน แต่ได้คำนวณดูแล้วทั้ง ๒ งาน จะเสร็จเรียบร้อยก่อนวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งงานทั้ง ๒ รายการมีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ประธานคณะกรรมการ แจ้งในที่ประชุมว่า กรณีงานของสวนสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ ขอให้เจ้าหน้าที่ ที่ตรวจแบบ แก้ไขแบบของส่วนกลาง หารือกับสวนสัตว์ที่ขอปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการก่อน หากดำเนินการแล้วไม่มีอะไรติดขัดให้เซ็นต์กำกับเอกสารส่งมาได้เลย ถือว่าได้ตรวจสอบกันมาเรียบร้อยแล้ว เมื่อถึงห้องผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ฯ จะได้รับเซ็นต์ออกให้ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการเดินทางของเอกสารให้รวดเร็ว และขอให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กรณีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ หากไม่ปรับเปลี่ยนได้เป็นดี แต่หากต้องปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการ ขอให้รีบดำเนินการและคุยกันให้เรียบร้อยและทำหนังสือส่งมา หรือหากทางสำนักพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม อยากจะให้สวนสัตว์ทำแบบไหนที่จะเร็วขึ้นก็ขอให้คุยกันก่อน เมื่อเอกสารส่งมาจะได้ส่งกลับไปได้ทันทีเช่นกัน และขอให้มีบันทึกเงื่อนไขของการ



เปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนว่าเกิดจากสาเหตุอะไร ได้คุยกันแล้วมีเหตุผลความจำเป็นอย่างไรให้ลงบันทึกไว้ด้วยซึ่งของสวนสัตว์นครราชสีมาไม่น่าจะมีปัญหาอะไร สามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

นายวันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา รายงานในที่ประชุมว่า โรงพยาบาลสัตว์ได้ส่งมอบงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่ ๒ งานก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ ได้ดำเนินการไปแล้วทุกงวดงาน คาดว่างานอื่นๆจะเร็วขึ้นกว่าเดิม และสำหรับงานปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธุ์สมบูรณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๔

นายอรรถพร ศรีเจริญ ประธานคณะกรรมการ แจ้งในที่ประชุมว่า ประเด็นสวนสัตว์สงขลา โรงพยาบาลสัตว์ มีประเด็นเดียวที่เราช่วยกันแก้ก็คือการเขียนงานงวดไม่สอดคล้องกับวิธีการปฏิบัติ จึงอยากให้ทุกสวนสัตว์เขียน TOR หรือ สัญญา ให้ดูลักษณะของงานที่สอดคล้องกันด้วยเพราะถ้าเขียนงานแล้วไม่สอดคล้องกัน จะทำให้งานนั้นดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น รายงานในที่ประชุมว่า งานก่อสร้างของสวนสัตว์ขอนแก่น ได้ดำเนินการส่งมอบงานแล้วเสร็จ ๒ รายการ ได้แก่ ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสัตว์และอาคารประกอบต่างๆ และ งานปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวน้ำ ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ๑๐๐% รายการสุดท้าย งานปรับปรุงส่วนจัดแสดงอาณาจักรนกกิ้งโครง ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๓ แล้ว คาดว่าจะตรวจรับและส่งเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ สำหรับงานงวดที่ ๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๐% ซึ่งเป็นไปตามแผน คาดว่าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด

นายอรรถพร ศรีเจริญ ประธานคณะกรรมการ แจ้งในที่ประชุมว่า ถึงแม้ว่างานจะเสร็จตามแผนก็ตามขอให้มีการติดตามภายในด้วย และขอให้เขียนสรุปวิธีการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ด้วยว่าเพราะอะไร หรือทำไม ผู้รับจ้างได้ทำงานและส่งมอบงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด จะได้เอาไว้เป็นกรณีศึกษา ทำให้เป็นไปตามแผนและเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจรับงานโดยต้องตรงตามแบบที่กำหนดในสัญญา มิใช่ว่าตรวจรับไปก่อนแบบนี้ไม่ได้เพราะถ้ามีปัญหาตอนหลังจะแก้ไขไม่ทัน

นายภาสกร อรสุณ ผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ รายงานในที่ประชุมว่า ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระการบินไทย ภายในโครงการคชอาณาจักร มีทั้งสิ้นจำนวน ๕ งาน งานที่ ๑ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว งานที่ ๒-๓ อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน งานที่ ๔-๕ (สุดท้าย) ส่งมอบงานตามสัญญาแล้ว ยังคงเหลืองานงานเคลียร์อีกนิดหน่อยส่วนงานอื่นดำเนินการครบเรียบร้อยแล้ว

นายอรรถพร ศรีเจริญ ประธานคณะกรรมการ แจ้งในที่ประชุมว่า สำหรับงานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระการบินไทย ภายในโครงการคชอาณาจักร งานที่ ๒-๓ ซึ่งได้ดำเนินงานแล้วเสร็จงานแล้ว แต่ทางผู้รับจ้างไม่ส่งเบิกเงินเป็นเพราะอะไรให้หาข้อมูลประกอบไปด้วย การส่งมอบงานให้ไปดูการลงรับเอกสารว่าเกินเวลาหรือไม่ ถ้าเกินจะมีค่าปรับเพราะฉะนั้นกรรมการ เมื่อผู้รับจ้างส่งงานแล้วต้องบันทึกวันที่ส่งมอบงาน ส่วนกรรมการจะมี



เวลาการตรวจรับว่าต้องไปตรวจรับแล้วเสร็จภายในกี่วัน ขอขยายเวลาตรวจรับได้ แต่ท่านต้องดูให้ดีให้สอดคล้องขอให้หารือและปรึกษากับเจ้าหน้าที่พัสดุสวนสัตว์นครราชสีมาหรือที่ส่วนกลางก็ได้

นายฐิติพร ทองดีพันธุ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี รายงานในที่ประชุมว่า งานปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม มีทั้งสิ้น ๖ งาน ตรวจรับและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ ๒

นายอรรถพร ศรีเจริญ ประธานคณะกรรมการ แจ้งในที่ประชุมว่า งานปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม มีทั้งสิ้น ๖ งาน สัญญา ๒๔๐ วัน จะสิ้นสุดคือเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ สวนสัตว์อุบลราชธานีต้องถอดบทเรียนและเก็บรายละเอียดเหตุการณ์ของรายการนี้ให้หมด เพราะอะไรถึงลงนามสัญญาได้ล่าช้ามีการอุทธรณ์ผลไปกี่ครั้ง กรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์กี่วัน ใช้ระยะเวลาที่เดือนกว่าจะลงนามสัญญาได้แล้วเสร็จ ต้องทำบันทึกรายละเอียดไว้เพราะเมื่อมีการสอบถามย้อนหลัง สวนสัตว์อุบลราชธานีจะได้อธิบายและชี้แจงเหตุผลได้ว่าได้ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ขั้นตอนไหนที่ทำให้เกิดการผิดพลาดและทำให้เกิดความล่าช้า

นายอรรถพร ศรีเจริญ ประธานคณะกรรมการ แจ้งในที่ประชุม ให้สวนสัตว์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และเงินกองทุนเพื่อหมูปันด้า รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน

นางพิมาวรรณ อนนท์ คณะทำงานและเลขานุการฯ แจ้งในที่ประชุมว่า โครงการก่อสร้าง Mini Zoo ระยะที่ ๒ ใช้เงินจาก ๒ แหล่ง คือ เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๕ และเงินสนับสนุนโดยใช้จากเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๑,๔๙๓,๓๐๐ บาท วิธีการดำเนินการเองโดยใช้บุคลากรขององค์การสวนสัตว์ดำเนินการเองทั้งหมด และตอนนี้ได้ดำเนินการใกล้จะแล้วเสร็จ กระบวนการอยู่ระหว่างขั้นตอนเรื่องเอกสารการเบิกจ่าย

นายอรรถพร ศรีเจริญ ประธานคณะกรรมการ แจ้งในที่ประชุมว่า โครงการก่อสร้าง Mini Zoo ระยะที่ ๒ ถูกบอกว่าให้ทำก่อนที่จะมีเงินเพราะฉะนั้นจะไม่มีค่าแรงใช้แรงงานและคนของเราเองทำ และเบิกซื้อของเข้ามาทำเอง ให้สำนักการเงินและทรัพย์สินแยกออกจากตารางที่แนบมา เนื่องจากไม่มีสัญญา ไม่มีการลงนามในประกาศ ให้ไปแยกเป็นโมเดลใหม่ว่าโครงการก่อสร้าง Mini Zoo ระยะที่ ๒ ใช้รูปแบบวิธีการแบบไหนและเบิกจ่ายมาทั้งหมดก็รายการใช้เงินไปเท่าไร

นายเทวินทร์ รัตนวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว รายงานในที่ประชุมว่าโครงการกิจกรรมสำหรับฮิปโป แม่มะลิ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใช้จากเงินกองทุนเพื่อหมูปันด้า งานโครงสร้างดำเนินการแล้วเสร็จในวงเงินงบประมาณจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท เหลือส่วนที่เหลืออีกจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท จะเป็นค่าอาหารเสริมของแม่มะลิ และคาดว่าจะมีการเบิกจ่ายแล้วเสร็จได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ นี้

นายอรรถพร ศรีเจริญ ประธานคณะกรรมการ แจ้งในที่ประชุมว่า ขอให้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนำส่งภาพ Perspective ที่แล้วเสร็จ จะมีหน้าตาแบบไหน กิจกรรมวันเกิดแม่มะลิมีแผนประชาสัมพันธ์



อย่างไร จะเชิญชวนผู้บริจาคในรูปแบบไหนขอให้ดำเนินการจัดส่งให้ด้วย เพื่อจะได้นำไปแจ้งในที่ประชุมกองทุนแพนด้า

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ รายงานในที่ประชุมว่า งานปรับปรุงประสิทธิภาพลพิตโดยสารเพื่อความสะดวกปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว งบประมาณ ๒,๒๔๗,๐๐๐ บาท ใช้จากเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR และราคากลางซึ่งจะลงนามสัญญาให้เสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ สำหรับงานปรับปรุงส่วนจัดแสดงแพนด้า งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ใช้จากเงินกองทุนเพื่อหมีแพนด้าอยู่ระหว่างการจัดทำ TOR และราคากลาง

นายอรรถพร ศรีเจริญ ประธานคณะกรรมการ แจ้งในที่ประชุมว่าตัวลพิตเป็นเรื่องของความปลอดภัยเสร็จเมื่อไรก็เมื่อนั้น แต่งานปรับปรุงส่วนจัดแสดงแพนด้าเน้นใช้งบของกองทุนแพนด้า เช่นเดียวกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ขอให้ส่งภาพ Perspective ที่แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ให้นำเสนอภาพก่อนปรับปรุงและภาพหลังปรับปรุง เมื่อแล้วเสร็จหน้าตาเป็นแบบไหน เพราะเรานำเงินบริจาคของกองทุนแพนด้ามาใช้ประโยชน์เพื่อสวัสดิภาพสัตว์ ขอให้ทำแผนเพื่อรายงานอนุกรรมการกองทุนเพื่อหมีแพนด้าว่าเงินที่เอาไปจากกองทุนแพนด้า เมื่อสัมฤทธิ์ผลแล้ว จะจัด Event เดือนไหน มีรูปแบบอย่างไรโดยบอกกล่าวว่าเงินที่บริจาคได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านไหนอย่างไร

นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา รายงานในที่ประชุมว่า สวนสัตว์นครราชสีมา ได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินกองทุนเพื่อหมีแพนด้า เพื่อดำเนินงาน ๒ รายการ ได้แก่ งานปรับปรุงส่วนจัดแสดงลิงอุรังอุตัง จำนวน ๗๘๗,๐๐๐ บาท และงานปรับปรุงส่วนแสดงนกเล็กเล็บสั้น จำนวน ๔๕๖,๘๐๐ บาท งานทั้ง ๒ รายการได้ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเข้าสำรวจพื้นที่ ปรับวางผังภายใน คาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จก่อนปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในส่วนเรื่องของ Event ที่สวนสัตว์นครราชสีมา จะจัด ได้คุยกันเบื้องต้นว่ามี ๑ รายการที่จะทำในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ คือส่วนแสดงนกเล็กเล็บสั้น

นายอรรถพร ศรีเจริญ ประธานคณะกรรมการ แจ้งในที่ประชุมว่า การจัด Event จะดำเนินการในเดือนตุลาคม หรือธันวาคม ๒๕๖๕ ก็ได้ แต่ขอให้ส่งภาพ Perspective งานที่ปรับปรุงเมื่อแล้วเสร็จที่แล้วเสร็จ และแผนการจัดกิจกรรมเพื่ออนุกรรมการกองทุนเพื่อหมีแพนด้ารับทราบว่าได้นำเงินกองทุนไปใช้ประโยชน์ด้านไหน เมื่อกระบวนการสำเร็จแล้วมีผลสัมฤทธิ์อย่างไร โดยให้นำส่งภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

นายวันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา แจ้งในที่ประชุมว่า สวนสัตว์สงขลาได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๒ รายการ จากเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าพร้อมติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง งบประมาณ ๔๙๙,๙๐๐ บาท ซึ่งได้เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างได้ดำเนินการเข้าพื้นที่แล้วและคาดว่าจะแล้วเสร็จได้ในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ สำหรับงานปรับปรุงหลังคาผ้าใบเวทีโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า งบประมาณ ๒,๔๖๑,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลและรออุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ตามแผนงาน คือ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจะแล้วเสร็จได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕



นายอรรถพร ศรีเจริญ ประธานคณะกรรมการ แจ้งในที่ประชุมว่าเรื่องไฟฟ้าถ้าเสร็จแล้ว ก็ดูผลว่ากลับมาใช้งานดีขึ้นหรือเปล่า สำหรับปรับปรุงหลังคาผ้าใบเวทีโชนวิจิตรสัตว์ป่า เมื่อแล้วเสร็จน่าจะใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ ขอให้ทำภาพเก็บไว้ด้วย Before -After สภาพก่อนปรับปรุงและเมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จ สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้อีกปี

นายฐิติพร ทองดีพันธุ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี รายงานในที่ประชุมว่า ปรับปรุงคอกกักเสือโคร่งอินโดจีนและคอกกักเสือด้า งบประมาณ ๑,๙๙๙,๐๐๐ บาท ใช้จากจากเงินกองทุนเพื่อ หนีแพนด้า อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากเหล็กปรับราคาสูงขึ้น สวนสัตว์อุบลราชธานีจึงต้อง ปรับเอกสารประมาณราคาใหม่ โดยให้ทางสวนสัตว์นครราชสีมาช่วยดำเนินการในครั้งนี้

นายอรรถพร ศรีเจริญ ประธานคณะกรรมการ แจ้งในที่ประชุมว่าสวนสัตว์อุบลราชธานี ต้องเร่งการดำเนินงาน หากติดขัดเรื่องอะไรต้องรีบบอกแต่เนิ่นๆ อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไป เพราะว่างานตัวนี้เป็น งานปรับปรุงคอกกัก เป็นแบบเดิมแค่ปรับเปลี่ยนวัสดุ งบประมาณที่ได้รับไปแล้ว ๑,๙๙๙,๐๐๐ บาท แยกเป็น ๓ section เมื่อปรับปรุงแล้วจะมีเสือได้ประโยชน์ก็ตัวอะไรบ้าง สวนสัตว์อุบลราชธานีต้องทำ presentation ให้ดีกว่า สภาพความเป็นอยู่เดิมเป็นอย่างไร กรงขึ้นสนิมจะเป็นอันตรายต่อสัตว์และผู้ดูแล พยายามสื่อออกมาให้เห็นว่า เงินที่ได้รับจากกองทุนแพนด้า นั้น ได้นำไปช่วยสวัสดิภาพสัตว์ได้อย่างไร และขอให้จัดทำแผนการจัด Event ขอบคุนแพนด้าที่ช่วยปรับปรุงบ้านของเสือให้มีความทันสมัยและน่าอยู่ขึ้นด้วย

นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น แจ้งในที่ประชุมว่า สวนสัตว์ ขอนแก่น ได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง ในวงเงินงบประมาณจำนวน ๑,๐๖๓,๕๐๐ บาท เพื่อดำเนินการปรับปรุงส่วนจัดแสดง ๓ รายการ ได้แก่ ปรับปรุงส่วนจัดแสดง Rock Hyrax ปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวดาว และปรับปรุงเครื่องเล่นภายในส่วนจัดแสดงหมีหมา-หมีควาย จะลงนามสัญญาได้ ภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แผนบริหารสัญญาอยู่ที่ ๔๕ วัน คาดว่าไม่เกินวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ก็สามารถจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จได้

มติที่ประชุม

๑. รับทราบ
๒. ให้สวนสัตว์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินกองทุนเพื่อหนีแพนด้า ดำเนินการจัดส่งภาพ Perspective งานที่เสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และให้จัดทำแผนการจัดกิจกรรม เพื่อให้ทางอนุกรรมการกองทุนแพนด้า ได้รับทราบว่าเงินที่ได้รับจัดสรรได้นำไปใช้ประโยชน์ในด้านใด และเมื่อ กระบวนการสำเร็จแล้วมีผลสัมฤทธิ์อย่างไร



๓.๒ ติดตามแผนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

นายอรรถพร ศรีเจริญ ประธานคณะทำงาน แจ้งในที่ประชุมว่า เนื่องจากขณะนี้ งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างการพิจารณาในวาระที่ ๒ ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหาร ICT รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน ในคณะกรรมการ วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยได้ปรับลดวงเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในหมวดงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ รายการก่อสร้างค่ายเยาวชนรักษาช้างไทย โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ ๔๔,๔๑๖,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔๑,๔๑๖,๐๐๐ บาท ดังนั้น องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จะคงเหลืองบประมาณในภาพรวม จำนวน ๑,๗๘๑,๔๕๖,๗๐๐ บาท ประกอบด้วย

๑.๑ งบบุคลากรภาครัฐ	จำนวน	๒๑๙,๐๙๒,๒๐๐ บาท
๑.๒ งบอุดหนุน	จำนวน	๑๘๖,๘๒๓,๖๐๐ บาท
๑.๓ งบลงทุน	จำนวน	๑,๓๗๕,๕๔๐,๙๐๐ บาท
๑.๓.๑ ครุภัณฑ์		๑๕,๙๒๑,๕๐๐ บาท
๑.๓.๒ สิ่งก่อสร้าง		๒๕๐,๕๕๒,๙๐๐ บาท
๑.๓.๓ ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่		๑,๑๐๙,๐๖๖,๕๐๐ บาท

นางพิมวรรณ อนนท์ คณะทำงานและเลขานุการฯ แจ้งในที่ประชุมว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศใช้ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยได้ แจ้งเวียนเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ขาวคอตแดง) เพื่อให้สำนัก สถาบัน สวนสัตว์ และโครงการ รับทราบรายการงบประมาณที่ได้รับการพิจารณา เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงขั้นได้ผู้รับจ้างแต่ยังไม่ต้องลงนามสัญญา หรือตกลงเป็นหนังสือ โดยให้กำหนดในเอกสารประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือในหนังสือข้อตกลงว่าจะมีการลงนามสัญญาได้ต่อเมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้ และในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้ ทั้งนี้การลงนามในสัญญาให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๗ (๑) และได้ดำเนินการจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้อำนาจผู้อำนวยการสวนสัตว์ และผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงินเกินงบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความคล่องตัว สะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๓๒๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

นายอรรถพร ศรีเจริญ ประธานคณะทำงาน แจ้งในที่ประชุมว่า สำหรับครุภัณฑ์ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ รายการ ขอให้รับดำเนินการและเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้เลย และสำหรับงานก่อสร้าง ขอให้ทุกสวนสัตว์ทบทวนราคาและแบบรูปรายการ หากสวนสัตว์ไหนพร้อมสามารถจัดส่ง



มายังส่วนกลางเพื่อขออนุมัติแบบรูปารายการจากผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ได้เลย และขอให้ทุกสวนสัตว์เร่งดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เนื่องจากได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ดำเนินการสวนสัตว์ และผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว ซึ่งจะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการสวนสัตว์ ขอให้ดูได้เลยว่าท่านทำอะไรได้บ้าง หากมีข้อสงสัยตรงไหนให้รับถามส่วนกลาง สำหรับเรื่องขอความเห็นชอบ TOR และราคากลางไม่ต้องส่งมายังส่วนกลาง

สำหรับโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ รายการก่อสร้างค่ายเยาวชนรักษ์ช้างไทย โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ จากวงเงินเดิม ๔๔,๔๑๖,๐๐๐ บาท ปรับลดลงเหลือจำนวน ๔๑,๔๑๖,๐๐๐ บาท ขอให้รีบดำเนินการปรับแบบและราคา เพื่อจะได้เข้ากระบวนการได้ทัน

สำหรับรายการแบบของปี ๒๕๖๖ ที่ส่งมาให้เซ็นต่อนุมัติแบบ ขอให้สำนักที่เกี่ยวข้องดำเนินการ check list รายการแบบที่สวนสัตว์ส่งมาว่ามีสวนสัตว์ไหนได้ดำเนินการส่งมาแล้วบ้าง สวนสัตว์ไหนยังไม่ส่งมา สำหรับปีนี้ท่านประธานให้นโยบายว่าถ้าเรื่องไหนไม่พร้อมขอให้รีบดำเนินการแต่เนิ่นๆ หากไม่เอาก็คือไม่เอาเปลี่ยนแปลงก็คือเปลี่ยนแปลงไปเลย การขออนุมัติแบบต้องพร้อมส่งกลับไปภายใน ๗ วัน ซึ่งวันนี้ได้เชิญสำนักงานเลขาธิการผู้อำนวยการมารับทราบด้วยแล้ว สำหรับปี ๒๕๖๖ การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างต้องเร็วขึ้นกว่าปีที่แล้วและต้องเร็วขึ้นกว่าเดิม

มติที่ประชุม

๑. รับทราบ
๒. ให้สวนสัตว์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินกองทุนเพื่อหมี่แพนด้า ดำเนินการจัดส่งภาพ Perspective งานที่เสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และให้จัดทำแผนการจัดกิจกรรม เพื่อให้ทางอนุกรรมการกองทุนแพนด้า ได้รับทราบว่าเงินที่ได้รับจัดสรรได้นำไปใช้ประโยชน์ในด้านใด และเมื่อกระบวนการสำเร็จแล้วมีผลสัมฤทธิ์อย่างไร

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

นายอรรถพร ศรีเจริญ ประธานคณะกรรมการ แจ้งในที่ประชุมว่า สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้ให้แนวทางและคุยเรื่องแผนค่าใช้จ่ายกับสำนักบริหารทุนมนุษย์ สำนักการเงินและทรัพย์สิน และสำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์ ในการจัดทำงบประมาณค่าจ้างลูกจ้าง ไว้เป็น ๓ โมเดล โดยให้ดูวงเงินว่าแต่ละรายการใช้เงินไปเท่าไร ดังนี้

๑. จ้างรายวัน ที่มีจำนวนวันเพิ่มขึ้นกว่าเดิม
๒. จ้างเต็มเดือน
๓. จ้างแบบผสม คือแบบรายวัน และรายเดือน

ในปี ๒๕๖๖ เราจะสู้กันต่ออย่างไรก็แล้วแต่จะไม่ให้เหมือนในปีที่ผ่านมา อาจจะมีการปรับเปลี่ยนมากขึ้นหรือน้อยอยู่ที่การวิเคราะห์สนับสนุนข้อมูล ปีนี้เรามีแผนที่จะบรรจุทดแทนแต่อยากให้เราไปทำการบ้านมาว่าจะสามารถบรรจุทดแทนตำแหน่งที่ว่างได้กี่คนเป็นวงเงินเท่าไร



สำหรับโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ไม่ได้บริหารจัดการงบประมาณจากรัฐบาล แต่ทุกสวนสัตว์ก็ยังคงต้องรับนักเรียนเข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์ ขอให้สวนสัตว์เตรียมความพร้อมที่จะรับโรงเรียนที่แจ้งความประสงค์ที่จะมาใช้บริการ จัดทำแผนรองรับหากนักเรียนเข้ามา ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะมีอะไรบ้าง ถ้ามีค่าใช้จ่ายจะเก็บนักเรียนหัวละเท่าไร โปรโมชันหรือแพ็คเกจมีแบบไหน อยากให้ทุกสวนสัตว์คุยกับทางสถาบันจัดการสวนสัตว์ด้วย ตอนนี้ มีเอเจนซี่ (Agency) ทำทัวร์นักเรียน ติดต่อมาจะมีทั้ง service รถบัส ทำ marketing ไปเอาโรงเรียนรอบๆ จังหวัด มาเที่ยวสวนสัตว์ โดยจะขอราคาไปทำเพื่อไปขายตามโรงเรียนแล้วนำนักเรียนมาใช้บริการสวนสัตว์ โดยตั้งเป้าไว้อย่างน้อยสวนสัตว์และหนึ่งแสนคนถึงจะคุ้มค่ากับที่เอารถไปปรับตามโรงเรียน เพราะฉะนั้นสวนสัตว์จะมีรายได้ส่วนนี้เพิ่มขึ้น โดยที่สวนสัตว์ไม่ได้เป็นเซลล์ไปขายเอง จะมีบริษัทที่ทำตลาดนักเรียนให้ สำหรับสวนสัตว์อื่นที่ยังไม่มีเอเจนซี่ (Agency) เข้าไปติดต่อ ท่านต้องทำแผนการตลาดของท่านว่าจะไปขายโรงเรียนเท่าไร ต้องทำความเข้าใจให้โรงเรียนรับทราบว่าสวนสัตว์ไม่มีบัตรให้เข้าฟรี แต่ถ้าโรงเรียนจะมาสวนสัตว์ จะมี service อะไรบ้าง ขอให้ทำข้อมูลเตรียมไว้

สำหรับวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้มีการขอเสนอให้เด็กเที่ยวฟรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยไม่เก็บค่าบริการผ่านประตูเด็กที่มีความสูงไม่เกิน ๑๓๕ ซม. จึงขอให้ทุกสวนสัตว์เพิ่มเติมเข้าไปในข่าวสารและดำเนินการประชาสัมพันธ์ได้เลย

มติที่ประชุม

๑. รับทราบ

๒. ให้ทุกสวนสัตว์ไปจัดทำแผนรองรับนักเรียนที่จะเข้าเที่ยวชมสวนสัตว์ จะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ถ้ามีค่าใช้จ่ายจะเก็บนักเรียนหัวละเท่าไร จัดแพ็คเกจอะไรบ้าง ส่วนลดของโรงเรียน โดยให้ทำความเข้าใจและแจ้งให้โรงเรียนรับทราบว่าสวนสัตว์ไม่มีบัตรเที่ยวชมฟรีแล้ว

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๕๐ น.

.....
(นางพิมารรณ อนนท์)

คณะทำงานและเลขานุการ

.....
(นางสาวสุกัญญา หงส์พันธ์)

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

.....
(นางสาวนริศรา แก้วทิพย์รัตน์)

ผู้จัด/บันทึกgrayงานการประชุม



ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีรายการที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ วงเงินทั้งสิ้น ๗๔.๒๒๑๖ ล้านบาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวถูกพับไปแล้ว	มติที่ประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีสัญญาซื้อขายสัตว์ และงานก่อสร้างปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒ ดำเนินการเก็บรวบรวมเอกสาร กระบวนของงาน และรายละเอียดที่สำคัญของงานทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากรณีมีปัญหาในอนาคต	
ส่วนกลาง ๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ สัญญาที่ ๒๔/๒๕๖๑ วงเงินตามสัญญา ๑๒.๔๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๐๔๐ ล้านบาท คงเหลือ ๘.๓๙๐ ล้านบาท ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ สัญญาที่ ๒๘/๒๕๖๒ วงเงินตามสัญญา ๑๓.๖๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๙๖๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑๑.๗๓๐ ล้านบาท	๑. สำนักการเงินและทรัพย์สิน ดำเนินการทำหนังสือแจ้งบริษัทฯ ให้เร่งรัดดำเนินการตามสัญญา ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๕๔๓ และ ทส ๑๑๐๑/๕๔๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ของสัญญาที่ ๒๔/๒๕๖๑ และสัญญาที่ ๒๘/๒๕๖๒ ๒. บริษัทฯ ตอบกลับมาให้องค์การสวนสัตว์ฯ มอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นผู้นำสัตว์เข้าเนื่องจากเป็นสัตว์ตาม CITES ตามหนังสือเลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๓. สำนักการเงินและทรัพย์สิน ได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องนำเสนอสำนักกฎหมายเพื่อพิจารณา ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๔/๓๓๙๕ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๔. สำนักกฎหมายอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณา ๕. สำนักการเงินและทรัพย์สิน อยู่ระหว่างการติดตามความคืบหน้าในการพิจารณาของสำนักกฎหมาย ๖. สำนักกฎหมายได้จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้บริษัทฯ เพื่อดำเนินการด้านเอกสารการนำเข้าสัตว์จากต่างประเทศต่อกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามที่ร้องขอแล้ว และให้ สงท.แจ้งคณะกรรมการตรวจรับสัตว์ ปี ๒๕๖๒ พิจารณาเสนอความเห็นตามองค์ประกอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปเสนอ ผอ.อสส.ทราบและสั่งการต่อไป ตามเอกสารที่ ทส ๑๑๐๖/๙๑๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ๗. สำนักการเงินและทรัพย์สินมีหนังสือแจ้งคณะกรรมการตรวจรับ ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๔/๕๑๔๙ ลว.๒๗ ก.ย.๒๕๖๔ พิจารณาเสนอความเห็นตามองค์ประกอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปเสนอ ผอ.อสส ๘. คณะกรรมการตรวจรับเสนอความเห็นต่อ ผอ.อสส. ว่าบริษัทฯ เข้าหลักเกณฑ์ผู้ขายส่งมอบสัตว์ล่าช้าเห็นควรให้มีหนังสือแจ้งสิทธิการปรับและเร่งรัดการส่งสัตว์ให้ผู้ขายทราบ โดย ผอ.อสส.ให้ทางคณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตามหนังสือที่ ทส.๑๑๐๗/๑๗๐๗ ลงวันที่ ๖ ต.ค.๒๕๖๔	๑. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีสัญญาซื้อขายสัตว์ปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อความชัดเจนในการดำเนินงาน ๒. มอบให้สำนักกฎหมายเข้ามาดูรายละเอียดและให้สรุปประเด็นปัญหาและการดำเนินงานให้ชัดเจน แล้วนำเข้าคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อพิจารณา

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	๙. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย มีหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๑๔๓๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ไปยังกรมปศุสัตว์ เพื่อสอบถามการยกเลิกประกาศโรคปากเท้าเปื่อยจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE ในพื้นที่สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในการนำออกจากประเทศต้นทางเพื่อนำกลับมาส่งยังประเทศปลายทาง (ประเทศไทย) ว่าขณะนี้ สามารถดำเนินการได้แล้วหรือไม่ ตามที่บริษัท คาสชิบา (ประเทศไทย) จำกัด ได้อ้างถึงประกาศดังกล่าวเพื่อเป็นการยืนยันจากกรมปศุสัตว์ ๑๐. ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ ๐๖๒๑/๑๖๕ ลว.๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ แจ้งมายังองค์การสวนสัตว์ว่า ว่าปัจจุบันยังมีประกาศชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์กบคู่หรือซากสัตว์กบคู่จากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นเมื่อ ๒๓ ธ.ค.๖๔ ซึ่งมีผลบังคับเป็นเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หากมีการระบาดและยังไม่ได้รับรองสถานะการปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยจากองค์การสุขภาพโลก OIE จะมีการประกาศชะลอการนำเข้าต่อไป ๑๑. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ มีหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๓๙๘ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค.๒๕๖๕ เรื่อง การแจ้งสิทธิเรียกค่าปรับ ถึง กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาสชิบา (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบสัตว์จำนวน ๔ รายการ รวม ๑๘ ตัว องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ จึงขอแจ้งสิทธิเรียกค่าปรับตามสัญญาที่ ๒๘/๒๕๖๒ จำนวน ๕,๙๘๒,๙๘๐ บาท และให้ทางบริษัทฯ ทำหนังสือยินยอมเสียค่าปรับตามสัญญา ๑๒. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ มีหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๘๑ ลงวันที่ ๑๙ เม.ย.๒๕๖๕ เรื่อง บอกลีกสัญญาซื้อขายสัตว์ ถึง กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาสชิบา (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบสัตว์จำนวน ๔ รายการ รวม ๑๕ ตัว ตามสัญญาที่ ๒๔/๒๕๖๑ ซึ่งได้ล่วงเลยระยะเวลา ๒ ปี กับ ๓๔๙ วัน (๑๗ มี.ค.๖๒-๒๘ ก.พ.๖๕) แต่บริษัทฯ ยังไม่มีความเคลื่อนไหวหรือความคืบหน้าการเร่งดำเนินการส่งมอบสัตว์แต่อย่างใด จึงแจ้งบอกลีกสัญญาซื้อขายสัตว์และดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ๑. ปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์สัตว์ให้เป็นศูนย์พัฒนาเพื่อการวิจัยและอนุรักษ์สัตว์ป่าระดับมาตรฐานภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว - วงเงิน ๒.๔๘๔ ล้านบาท - เบิกจ่ายแล้ว ๑.๓๕๑ ล้านบาท - คงเหลือ ๑.๑๓๓ ล้านบาท โดยกิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ ๖๘๙		

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
๒. ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆภายใต้โครงการความร่วมมือการเพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆร่วมกับภาชีเพื่อรองรับและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร - วงเงิน ๑๘.๘๙๒ ล้านบาท - เบิกจ่ายแล้ว ๔.๗๒๓ ล้านบาท - คงเหลือ ๑๔.๑๖๙ ล้านบาท โดยกิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ ๖๘๙	๑. สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนำส่งรายงานการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์ฯ ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๑๒/๔๕๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒. บริษัทฯ ทำหนังสือขออุทธรณ์การบอกเลิกสัญญา และขอสงวนสิทธิ์หลักประกันสัญญา ตามหนังสือเลขที่ ๓๘/๒๕๖๒.๒๐๒๑๐๔.๐๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๓. สำนักการเงินและทรัพย์สิน มีหนังสือที่ ทส ๑๑๐๔/๓๑๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้สำนักกฎหมายพิจารณาการขออุทธรณ์การบอกเลิกสัญญาและขอสงวนสิทธิ์หลักประกันสัญญา ๔. สำนักกฎหมายพิจารณา ให้ยืนยันการรับหลักประกันสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆ โดยองค์การสวนสัตว์ฯ ได้แจ้งให้บริษัทฯ รับทราบการยืนยันการรับหลักประกันตามหนังสือองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ที่ ทส ๑๑๐๑/๗๗๒ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๕. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้รับหลักประกันสัญญาตาม ระเบียบฯ ซึ่งทางธนาคารกรุงไทย ได้นำส่งเงินหลักประกันสัญญาให้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเรียบร้อยแล้ว ๖. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว นำส่งเอกสารประกอบการแจ้งเป็นผู้ทำงานของ กิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ ๖๘๙มายังองค์การสวนสัตว์ ฯ เพื่อจัดส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาเป็นผู้ทำงาน ตามหนังสือเลขที่ ๑๑๑๒/๘๙๗ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๗. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นำส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงการคลัง แจ้งให้ กิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ ๖๘๙ เป็นผู้ทำงานตามหนังสือเลขที่ ทส ๑๑๐๑/๑๐๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ๘. ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลัง ยังไม่มีหนังสือตอบกลับแจ้งให้เป็นผู้ทำงาน	๑. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไปควรเช็คประวัติบริษัทผู้รับจ้างและสถานะของบริษัท ๒. กรณีได้รับรับจ้างมาแล้ว คณะกรรมการควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานควรดำเนินการให้เป็นไปตามวงงานที่แบ่งตามสัญญา ๓. หากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา ควรเชิญผู้รับจ้างมาร่วมประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกันและควรมีรายงานการประชุมเพื่อให้รับรู้ทั้ง ๒ ฝ่าย ๔. หากยังดำเนินการล่าช้า สวนสัตว์ต้องดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยออกหนังสือเป็นหลักฐานทุกครั้ง

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
สวนสัตว์สงขลา ๑. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณน้ำตกสวนตุล ภายในสวนสัตว์สงขลา - วงเงิน ๓๘.๐๐๐๐ ล้านบาท - โดยบริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด	๑. องค์การสวนสัตว์ฯ ทำหนังสือแจ้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์และบอกเลิกสัญญา ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๑๓ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ๒. บริษัทฯ ได้ขอคัดค้านการบอกเลิกสัญญา ตามหนังสือเลขที่ CHR ๒๕๖๓/๐๑๐๒๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ๓. องค์การสวนสัตว์ฯ ได้ให้บริษัทชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๑๑๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๔. บริษัทฯ ทำหนังสือชี้แจงกลับองค์การฯ ตามหนังสือเลขที่ CHR ๒๕๖๔/๐๒๐๕๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๕. องค์การสวนสัตว์ฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงได้ทำหนังสือแจ้งกระทรวงการคลัง ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัดcv เป็นผู้ทำงาน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากการกระทรวงการคลัง ๖. บริษัทฯ กรุงไทย จำกัด ชำระเงินตามสัญญาค้ำประกันของ บริษัทฯ ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด ฐานะลูกหนี้ร่วมให้สวนสัตว์สงขลาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คจำนวน ๑,๙๔๐,๐๐๐ บาท ๗. องค์การสวนสัตว์ฯ มีหนังสือที่ ทส ๑๐๑๑/๑๕๐๘ ลว. ๒๘ ธ.ค.๒๕๖๔ สอบถามผลการพิจารณา ให้บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด เป็นผู้ทำงานซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลังยังไม่มีหนังสือตอบกลับแจ้งให้เป็นผู้ทำงาน ๘. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาผู้ทำงานกรมบัญชีกลาง มีหนังสือที่ กค (อทง) ๐๔๐๕.๗/๑๕๒๕๑ ลว. ๒๘ เม.ย.๒๕๖๕ ขอให้พิจารณาคำชี้แจงของบริษัทฯ และนายเกรียงไกร ว่ารับฟังได้หรือไม่ อย่างไร พร้อมเหตุ พร้อมเหตุผลประกอบโดยละเอียดและขอให้รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งให้กรมบัญชีกลาง	๑. ควรมีการสำรวจสภาพพื้นที่ภายในสวนสัตว์ ก่อนการออกแบบและเสนอของงบประมาณ ๒. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไปควรเช็คประวัติบริษัทผู้รับจ้างและสถานะของบริษัท ๓. กรณีได้รับรับจ้างมาแล้ว คณะกรรมการควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานควรดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่แบ่งตามสัญญา ๔. หากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา ควรเชิญผู้รับจ้างมาร่วมประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกันและควรมีรายงานการประชุมเพื่อให้รับรู้ทั้ง ๒ ฝ่าย ๕. หากยังดำเนินการล่าช้า สวนสัตว์ต้องดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยออกหนังสือเป็นหลักฐานทุกครั้ง

๓.๒ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ มีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๑. ปรับปรุงอาคารสำนักงานสนาม งบประมาณ ๑.๒๐ ล้านบาท	ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว	
๒. ก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ และตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบพร้อมก่อสร้างเรือนเพาะขยายพันธุ์ งบประมาณ ๕.๘๕ ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว	
๓. ก่อสร้างถนนชั่วคราวแล้วรอบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ งบประมาณ ๘.๖๖ ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว	
๔. ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดปทุมธานี ในการสร้างสะพานบริเวณทางเข้าพื้นที่สวนสัตว์แห่งใหม่	อยู่ระหว่างดำเนินการได้ร้อยละ ๙๖ คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	
๕. ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๖.๘๒๕๑ ลบ. จำนวน ๖ งวดงาน - งบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๖.๐๐๐๐ ลบ. - งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๐.๘๒๕๑ ลบ.	๑. เบิกจ่ายงวดที่ ๑-๓ แล้ว จำนวน ๔๔.๐๔๗๕ ลบ. โดยใช้จาก งบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๖.๐๐๐๐ ลบ. งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๘.๐๔๗๕ ลบ. ๒. งานงวดที่ ๔ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยใช้จากงบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔๔.๐๔๗๕ ลบ. ๓. งานงวดที่ ๕ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานจากคณะกรรมการ	เร่งรัดให้คณะกรรมการทุกชุด ตรวจสอบ และสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ จังหวัดปทุมธานี

๑. ปรับปรุงอาคารสำนักงานสนาม งบประมาณ ๑.๒๐ ล้านบาท (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)



๒. ก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ และตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบพร้อมก่อสร้างเรือนเพาะขยายพันธุ์ งบประมาณ ๕.๘๕ ล้านบาท (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)



๓. งานก่อสร้างถนนชั่วคราวและรั้วรอบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

การดำเนินการ

บริษัท คัพเวอร์เทค จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ก่อสร้างถนนชั่วคราวและรั้วรอบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ เรียบร้อยแล้ว งานรั้วชั่วคราวระยะ ๓,๕๐๐ เมตร วงเงินรวมทั้งสิ้น ๘,๖๖๐,๐๐๐ บาท

ด้านทิศเหนือ



ด้านทิศใต้



ด้านทิศตะวันออก




ด้านทิศตะวันตก



๔. งานที่ได้รับการสนับสนุนจาก จ.ปทุมธานี

- งานก่อสร้างสะพานทางข้าม ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐%

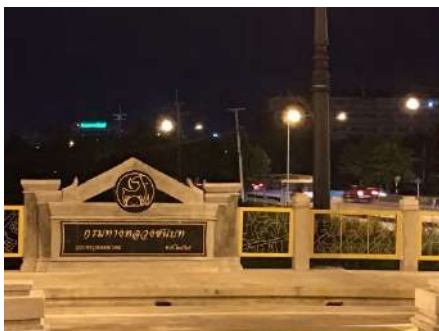

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่องเดิม

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๘๐๖.๓๑๓๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

- ๑. งบอุดหนุน จำนวน ๔๙๑.๖๗๐๓ ล้านบาท
- ๒. งบลงทุน จำนวน ๓๑๔.๖๔๒๗ ล้านบาท

การดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ได้เบิกจ่ายงบอุดหนุนรัฐบาล ได้ครบทุกรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับงบลงทุน เบิกจ่ายจำนวน ๑๔๘.๔๑๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๑๗ และได้กันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑๖๖.๒๓๐๕ ล้านบาท ประกอบด้วย

- ๑. ครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือรายการค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ จำนวน ๕.๑๐๖๐ ล้านบาท
- ๒. สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ ประกอบด้วย
 - ๒.๑ ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ จำนวน ๑๐๒.๗๗๗๖ ล้านบาท
 - ๒.๒ ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมี ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ จำนวน ๑๑.๔๑๒๕ ล้านบาท
 - ๒.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์และอัตลักษณ์บริเวณส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน ๙.๓๑๕๖ ล้านบาท
 - ๒.๔ ปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center) ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน ๖.๒๕๐๐ ล้านบาท
 - ๒.๕ ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัสและส่วนแสดงจระเข้ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน ๑๗.๓๖๘๘ ล้านบาท
 - ๒.๖ ก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวิน ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน ๓.๖๕๐๐ ล้านบาท
 - ๒.๗ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน ๑๐.๓๕๐๐ ล้านบาท

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)


ข้อเสนอเพื่อทราบ

เพื่อโปรดทราบ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ยังมีรายการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ซึ่งได้แก่ รายการค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ และรายการค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 2564

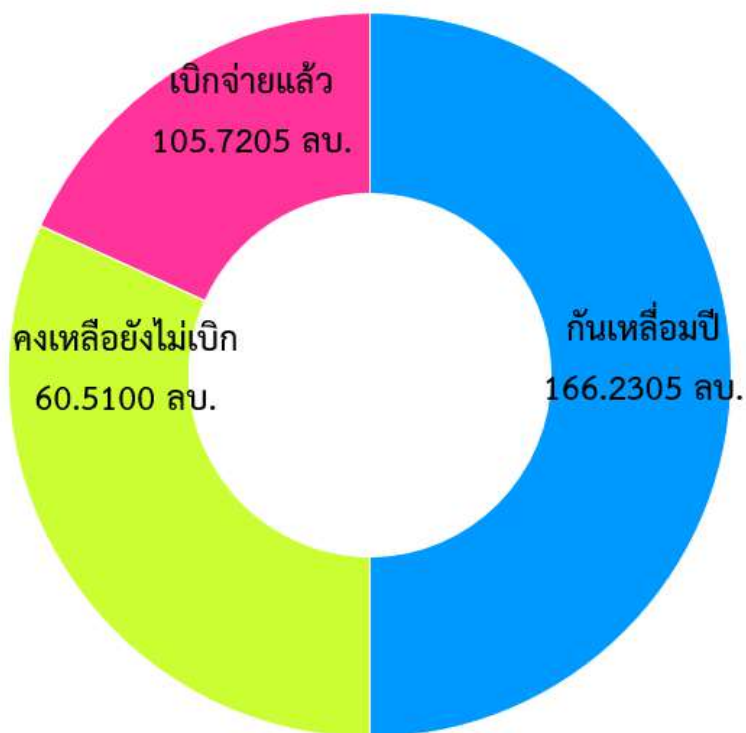

ข้อมูล ณ 30 มิ.ย.65

- ส่วนกลาง**
1. ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ สัญญาสิ้นสุด 15 ก.ค. 2565 มี 6 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว 1-4 งวดงาน จำนวน 88.0950 ลบ. กันเหลื่อมเหลือเบิก งวดที่ 5-6 เป็นเงินจำนวน 58.7300 ลบ.
 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ สัญญาสิ้นสุด 16 ธ.ค.2564 กันเหลื่อมปี จำนวน 5.1060 ลบ. เบิกจ่ายถึงเดือน เม.ย.2565 จำนวน 3.326 ลบ คงเหลือ 1.7800 ลบ.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

เลขที่สัญญาจ้าง	๑๑/๒๕๖๔ วงเงิน ๑๔๖,๘๒๕,๑๐๐ บาท งบปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๐,๘๒๕,๑๐๐ บาท
ระยะเวลาดำเนินการ	๕๔๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ผู้รับจ้าง	บริษัท ดีไซน์+วิเวลลอป จำกัด

การดำเนินงาน

๑. งานงวดที่ ๑ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีการเบิกจ่ายแล้วเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๗,๓๔๑,๒๐๐ บาท

๑.๑ แบบแนวความคิดหลัก (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A ๑ จำนวน ๓ ชุด
๑.๒ แบบแนวความคิดหลัก (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A ๑ จำนวน ๑๐ ชุด
๑.๓ แบบแนวความคิดหลัก (ปิดบนกระดาษแข็ง)	ขนาด A ๑ จำนวน ๑ ชุด
๑.๔ แบบแนวความคิดหลัก (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A ๓ จำนวน ๓ ชุด
๑.๕ แบบแนวความคิดหลัก (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A ๓ จำนวน ๑๐ ชุด
๑.๖ รายงานเบื้องต้น (Inception Report) (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A ๓ จำนวน ๓ ชุด
๑.๗ รายงานเบื้องต้น (Inception Report) (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A๓ จำนวน ๑๐ ชุด

๒. งานงวดที่ ๒ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีการเบิกจ่ายแล้วเมื่อกันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๑๔,๖๘๒,๕๑๐ บาท

๒.๑ แบบร่างขั้นต้น (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A๓	จำนวน ๓ ชุด
๒.๒ แบบร่างขั้นต้น (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A๓	จำนวน ๑๐ ชุด

๓. งานงวดที่ ๓ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีการเบิกจ่ายแล้วเมื่อกันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๒๒,๐๒๓,๗๖๕ บาท


๓.๑ แบบร่างขั้นพัฒนา (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A๓	จำนวน ๓ ชุด
๓.๒ แบบร่างขั้นพัฒนา (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A๓	จำนวน ๑๐ ชุด
๓.๓ รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A๔	จำนวน ๕ ชุด
๓.๔ เอกสารแบบรูปรายการและการประมาณราคา เพื่อยื่นของบประมาณ (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A๔	จำนวน ๑ ชุด
๓.๕ เอกสารแบบรูปรายการและการประมาณราคา เพื่อยื่นของบประมาณ (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A๔	จำนวน ๔ ชุด



๔. งานงวดที่ ๔ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีการเบิกจ่ายแล้วเมื่อมิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงินจำนวน ๔๔,๐๔๗,๕๓๐ บาท ประกอบด้วย

๔.๑ แบบรายละเอียดรายการก่อสร้าง

๔.๒ รายละเอียดประกอบแบบ บัญชีงานก่อสร้าง ราคากลาง ครอบคลุมรวมทุกสาขา

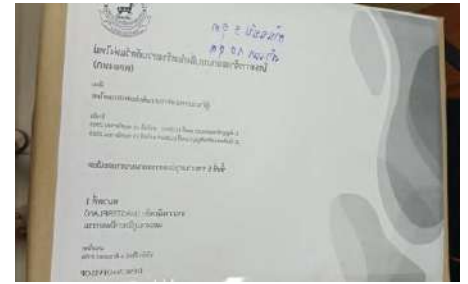

๕. งานงวดที่ ๕ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๕ ประกอบด้วยรายละเอียดประกอบแบบ (Specifications) บัญชีงานก่อสร้าง (Bill of Quantities) และราคากลางครอบคลุมรวมทุกสาขา

การดำเนินงานอยู่ระหว่างการคณะกรรมการตรวจรับงาน

- คณะกรรมการตรวจรับนัดประชุมวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๕

ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจากมีคณะกรรมการ ที่กำกับดูแลหลายชุด และมีความเห็นที่แตกต่างกัน จึงต้องใช้ระยะเวลา ในการสรุปแนวความคิด

แนวทางแก้ไข

เร่งรัดให้คณะกรรมการทุกชุดตรวจสอบและสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินงานรายได้ ค่าใช้จ่าย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่องเดิม

๑. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เสนอแผนปฏิบัติการด้านการเงิน (เงินนอกงบประมาณ) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

๑.๑ ประมาณการรายได้ จำนวน ๒๙๕.๑๘๒๐ ล้านบาท

๑.๒ ประมาณการรายจ่าย จำนวน ๓๙๓.๖๓๗๖ ล้านบาท

๒. ในคราวประชุมคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีมติที่ประชุมดังนี้

๒.๑ อนุมัติแผนปฏิบัติการด้านการเงิน (เงินนอกงบประมาณ) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๒ อนุมัติให้ใช้เงินสะสมองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จำนวน ๑๘๖.๒๙๐๐ ล้านบาท กรณีเพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานในส่วนที่รายได้ (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่าย และกรณีเกิดรายได้ไม่เป็นไปตามแผน จากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-๑๙

ข้อเท็จจริง

๑. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดทำแผนรายได้ และค่าใช้จ่ายแยกเป็นรายเดือน โดยผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้อนุมัติแผนรายได้ และค่าใช้จ่าย เพื่อให้สำนัก สวนสัตว์ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้มีรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านการเงิน

๒. รายงานงบการเงินได้ผ่านการสอบทานจากสำนักตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๕

ผลการดำเนินงาน

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ขอรายงานผลการดำเนินงาน รายได้ ค่าใช้จ่าย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

	แผน	ผล	สูง (ต่ำ) กว่าแผน	หน่วย : ล้านบาท
๑. รายได้	๑๘.๘๕	๒๘.๑๐	๙.๒๕	
๒. รายจ่าย	๖๖.๐๗	๗๓.๙๑	๗.๘๔	
(ค่าใช้จ่าย งบรัฐบาล+องค์การ)				

ข้อเสนอเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานรายได้ ค่าใช้จ่าย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

ส่วนสัตว์	แผน - ผลรายได้	
	แผน	ผล
ส่วนกลาง	2.19	1.03
ส่วนสัตว์เปิดเขาเขียว	5.47	8.99
ส่วนสัตว์เชียงใหม่	2.81	6.54
ส่วนสัตว์นครราชสีมา	4.50	5.35
ส่วนสัตว์สงขลา	1.12	1.44
ส่วนสัตว์อุบลราชธานี	1.11	2.38
ส่วนสัตว์ขอนแก่น	1.27	1.91
โครงการ คชอาณาจักร	0.38	0.25
รวมรายได้	18.85	27.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้พนักงาน		0.09
รายได้บริการกองทุนเพื่อมีแผนค้า		0.12
รวมรายได้ดำเนินงาน (1)	18.85	28.10
รายได้ทางบัญชี - รายได้บริจาค (สิงห์ชัย)		0.94
รวมรายได้งบการเงิน		29.04
ผลต่างจากการขึ้นและจำหน่ายบัญชีสัตว์ (2)		(9.04)
รวมรายได้จากการดำเนินงานทั้งสิ้น (1) + (2)		20.00
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล		57.81
รวมทั้งสิ้น	18.85	77.81

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
รายได้จากการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2565

หน่วย : ล้านบาท

แผน - ผล รายได้ แยกตามส่วนสัตว์ ปี 2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565



แผน - ผลรายได้ภาพรวมองค์การสวนสัตว์ ปี 2565 ประจำเดือน มิถุนายน



รวมรายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 28.10 ล้านบาท
รวมรายได้ทางบัญชี จำนวน 0.94 ล้านบาท
รวมรายได้งบการเงิน จำนวน 29.04 ล้านบาท

แผน - ผลรายได้ภาพรวมองค์การสวนสัตว์ ปี 2565 เดือน 9 เดือน ค.ค. - มิ.ย. 2565



รวมรายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 272.09 ล้านบาท
รวมรายได้ทางบัญชี จำนวน 0.94 ล้านบาท
รวมเป็นรายได้ งบการเงิน จำนวน 281.08 ล้านบาท

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
ค่าใช้จ่าย (รัฐบาล + องค์การ) ประจำเดือน มิถุนายน 2565

หน่วย : ล้านบาท

ส่วนสัตว์	แผน - ผล ค่าใช้จ่าย	
	แผน	ผล
ส่วนกลาง	20.81	23.13
ส่วนสัตว์เปิดเขาเขียว	9.39	12.24
- แผนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9.39	12.24
- แผนส่วนแบ่งผู้ประกอบการ		
ส่วนสัตว์เชียงใหม่	10.44	12.96
- แผนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7.44	9.96
- แผนค่าใช้จ่ายยอควาเรียม	3.00	3.00
ส่วนสัตว์นครราชสีมา	7.24	7.88
ส่วนสัตว์สงขลา	5.85	7.09
ส่วนสัตว์อุบลราชธานี	3.67	3.90
ส่วนสัตว์ขอนแก่น	7.37	5.41
โครงการ คชอาณาจักร	1.30	1.30
รวมทั้งสิ้น	66.07	73.91
ค่าใช้จ่ายทางบัญชี		18.98
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น		92.89

แผน - ผลค่าใช้จ่ายแยกตามส่วนสัตว์ ปี 2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565



หมายเหตุ: ผลการดำเนินงานของ ส่วนสัตว์เชียงใหม่ รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานของควาเรียม จำนวน 2.99 ล้านบาท

แผน - ผล ค่าใช้จ่าย ภาพรวมองค์การสวนสัตว์ ปี 2565 เดือน 9 เดือน (ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565)




สำนักงานเงินและทรัพย์สิน

4.4 รายงานผลการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แบบสะสม 9 เดือน ประจำเดือนตุลาคม 2564 ถึง มิถุนายน 2565

การดำเนินงาน

สวนสัตว์เชียงใหม่ ขอรายงานผลการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบสะสม 9 เดือน ประจำเดือนตุลาคม 2564 ถึง มิถุนายน 2565 สรุปได้ ดังนี้ (ข้อมูลเบื้องต้น)

รายการ	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	รวม
รายได้ดำเนินงาน	1.161	0.891	2.678	2.555	1.513	1.690	2.802	2.534	2.441	18.265
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2.655	2.904	2.908	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999	2.998	26.460
รายได้ สูง-(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	- 1.494	- 2.013	- 0.230	- 0.444	- 1.486	- 1.309	- 0.197	- 0.465	- 0.557	- 8.195
ผู้เข้าชม (คน)	9,896	7,469	22,802	21,698	12,831	14,390	23,867	21,650	20,573	155,176

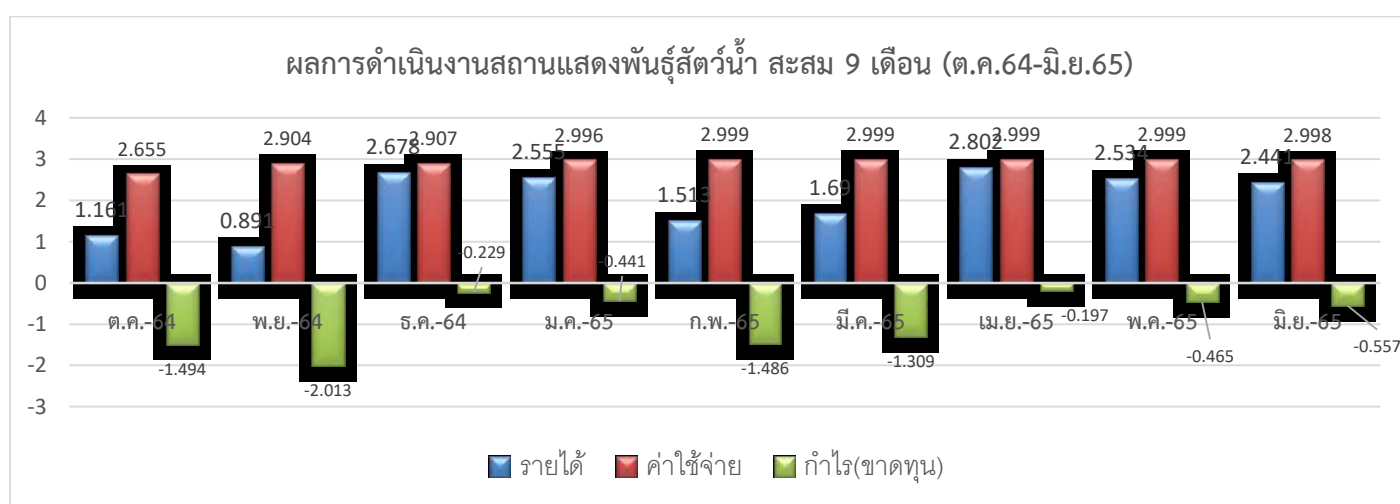

-2-

ผลการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ แบบสะสม 9 เดือน ในภาพรวมมีรายได้ดำเนินงานเกิดขึ้น จำนวน 18.265 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ที่มาจาก การจองบัตรเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานสะสม 9 เดือน เกิดขึ้นจำนวน 26.460 ล้านบาท โดยเฉลี่ยเดือนละ 3 ล้านบาท (36 ล้านบาทต่อปี) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างเหมา 13.482 ล้านบาท ค่าจ้างบริหาร 5.831 ล้านบาท และค่าไฟฟ้า 3.690 ล้านบาท ค่าอาหารสัตว์น้ำ 1.348 ล้านบาท ค่าก๊าซ LPG 1.309 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.800 ล้านบาท

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ ผลการดำเนินงานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบสะสม 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึง มิถุนายน 2565) ข้อมูลเบื้องต้น

มติที่ประชุม

๔.๕ รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่องเดิม

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้รับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับการพิจารณากรอบเงินทั้งสิ้น จำนวน ๗๐๘.๐๒๖๕ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑. งบบุคลากร	๑๘๑.๙๓๗๕	ล้านบาท
๒. งบอุดหนุน	๒๒๓.๙๘๒๐	ล้านบาท
๓. งบลงทุน	๓๐๒.๑๐๗๐	ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	<u>๗๐๘.๐๒๖๕</u>	ล้านบาท

การดำเนินงาน

สำนักงานเงินและทรัพย์สิน ได้ดำเนินการรวบรวมแผน และผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวม ๕๔ รายการ วงเงิน ๓๐๒,๑๐๗,๐๐๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย

- | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|------------------------|
| ๑ | ครุภัณฑ์ | จำนวน ๔๑ รายการ | วงเงิน ๓๓,๔๔๕,๑๐๐ บาท |
| | ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๔๑ รายการ | | |
| ๒ | สิ่งก่อสร้าง | จำนวน ๑๓ รายการ | วงเงิน ๒๖๘,๖๖๑,๙๐๐ บาท |
| | ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๑๓ รายการ | | |
- (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

ข้อเสนอเพื่อทราบ

เพื่อโปรดทราบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหมวดรายจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รายงานสถานภาพตามกระบวนการพัสดุ ของงบลงทุน
รายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2565 จำนวน 13 รายการ



รายงานสถานภาพตามกระบวนการพัสดุ ของงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ ประจำปี 2565 จำนวน 41 รายการ

จัดทำ TOR

อยู่ระหว่างขอซื้อขอจ้าง

รอลงนามในสัญญา

ลงนามสัญญา
41 รายการ

เบิกจ่ายแล้ว
39 รายการ

⇒ เบิกจ่ายรวมเป็นเงิน
26.3011 ลบ.

1. ส่วนกลาง 9 รายการ
2. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 5 รายการ
3. สวนสัตว์เชียงใหม่ 5 รายการ
4. สวนสัตว์สงขลา 6 รายการ
5. สวนสัตว์อุบลราชธานี 4 รายการ
6. สวนสัตว์ขอนแก่น 8 รายการ
7. โครงการคชอาณาจักร 4 รายการ

- 39 รายการ เบิกจ่ายครบเรียบร้อยแล้ว
- 1 รายการ คือ รายการระบบบริหารจัดการสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (Thai Zoo Ark) เบิกแล้ว 2 งวด
- 1 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ
- โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบจำหน่ายบัตร (E-ticket)
เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



รายการ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย /GFMIS	คิดเป็น (%)	คงเหลือ
1. งบอุดหนุน	405.9195	304.3178	74.97	101.6017
2. งบลงทุน	302.1070	116.4297	38.54	185.6773
* ครุภัณฑ์	33.4451	26.3011	78.64	7.1440
* สิ่งก่อสร้าง	268.6619	90.1286	33.55	178.5333
รวมทั้งสิ้น	708.0265	420.7475	59.43	287.2790

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการดำเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ส่วนกลาง)

ครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ลำดับที่ ๑-๗ ดังนี้

๑. กล้องถ่ายภาพระบบ wifi สำหรับกล้องจุลทรรศน์	งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท
๒. ตู้เก็บบล็อกรพาราฟิน ๒ ตู้	งบประมาณ ๑๔๕,๒๐๐.-บาท
๓. ตู้เก็บแผ่นกระจกสไลด์ ๑ ตู้	งบประมาณ ๘๐,๒๕๐.-บาท
๔. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงในไมโครเพลท	งบประมาณ ๔๐๖,๖๐๐.-บาท
๕. เครื่องตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ	งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.-บาท
๖. เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพในสัตว์	งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐.-บาท
๗. ตู้เย็นแช่น้ำยา	งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐.-บาท
๘. โครงการระบบบริหารจัดการสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (Thai Zoo Ark)	งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด เป็นเงินจำนวน ๗๘๐,๐๐๐ บาท	

อยู่ระหว่างรอผลการอุดหนุน ๑ รายการ ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-ticket)
งบประมาณ ๘,๔๔๔,๘๐๐.-บาท ขณะนี้ได้ผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้แก่ บริษัท คลิเน็กซ์ จำกัด
ในวงเงินงบประมาณจำนวน ๖,๙๘๐,๐๐๐ บาท และอยู่ระหว่างรอผลการอุดหนุน ๗ วัน สิ้นสุดในวันที่
๔ มีนาคม ๒๕๖๕

งบประมาณปี ๒๕๖๕

เครื่องปั่นเหวี่ยงฮีมาโตคริต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ๑ เครื่อง

เลขที่สัญญาจ้าง

ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้ขาย

การดำเนินงาน

๓/๒๕๖๕ วงเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

เริ่มสัญญา ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

บริษัท กิ๊ปไทย จำกัด

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว



เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วรอบต่ำ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ๑ เครื่อง

เลขที่สัญญาจ้าง

ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้ขาย

การดำเนินงาน

๒/๒๕๖๕ วงเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

เริ่มสัญญา ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

บริษัท กิ๊ปไทย จำกัด

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว



ตู้แช่แข็ง -๔๐ องศาเซลเซียส สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ๑ เครื่อง

เลขที่สัญญาจ้าง

๑/๒๕๖๕ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มสัญญา ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

ผู้ขาย

บริษัท กิ๊ปไทย จำกัด

การดำเนินงาน

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว



เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบทศนิยม ๓ ตำแหน่ง สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ๑ เครื่อง

เลขที่สัญญาจ้าง

๔/๒๕๖๕ วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ


เริ่มสัญญา ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

ผู้ขาย

บริษัท กิ๊ปไทย จำกัด

การดำเนินงาน

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

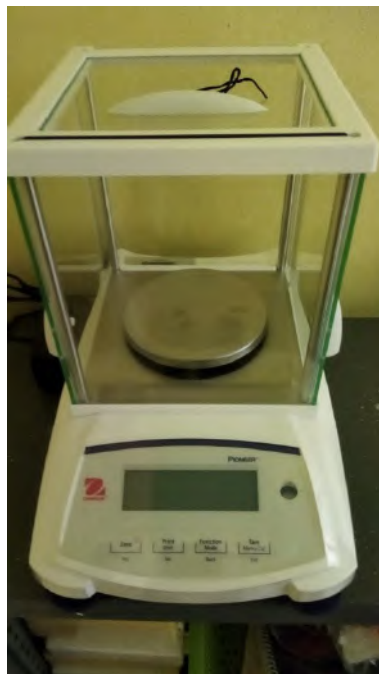

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ สูบ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ

ไม่ต่ำกว่า ๗,๗๐๐ ซีซี กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า แบบกระบะเหล็ก พร้อมติดเครนไฮดรอลิก

เลขที่สัญญาจ้าง ๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงิน ๒,๘๓๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ หดสัญญาจ้าง วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๙๐ วัน ขยายระยะเวลา ๓๐ วัน จากสิ้นสุดวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุด ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ผู้รับจ้าง บริษัท ทวีโชค ทรัค แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด

การดำเนินงาน แบ่งงานออกเป็น ๑ งาน

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) ตรวจรับงานวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๓๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐%

ส่งเบิกเงินเข้าองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ที่ อสส. ๑๑๑๓/๑๐๙ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

รูป

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ สูบ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๗,๗๐๐ ซีซี กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า แบบกระบะเหล็ก พร้อมติดเครนไฮดรอลิก



งบประมาณปี ๒๕๖๕

งานก่อสร้างปรับปรุงถนนแนวรั้ว และสิ่งอำนวยความสะดวก ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

เลขที่สัญญาจ้าง	7/2565 วงเงินก่อสร้าง 29,915,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินการ	เริ่มทำงานวันที่ 30 ธันวาคม 2564 หหมดสัญญาจ้าง วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ระยะเวลา 240 วัน
ผู้รับจ้าง	บริษัท พี.เอ.ไอ ซัพพลาย จำกัด
การดำเนินงาน	แบ่งงานออกเป็น 7 งวด
รายงานตั้งแต่	วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 – 4 มิถุนายน 2565
งวดงานที่ 1	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
งวดงานที่ 2	จำนวนเงิน 5,000,000 บาท กำหนดส่งมอบงาน งวดที่ 2 วันที่ 9 มีนาคม 2565 <u>ณ เดือนมิถุนายน 2565 การดำเนินงานแล้ว 80%</u>

งานติดตั้งเสาเหล็ก+โครงหลังคาพร้อมวัสดุผนังหลังคา (จุดอาคารเอนกประสงค์ จุดที่ 1 และ จุดที่ 2+ห้องน้ำ)



งานติดตั้งเสาเหล็ก+โครงหลังคาพร้อมวัสดุผนังหลังคา (จุดอาคารเอนกประสงค์ 3 และจุดอาคารเอนกประสงค์ 4)



งานทางเดินเชื่อมระหว่าง จุดอาคารเอนกประสงค์



งานงวดที่ 3 จำนวนเงิน 5,500,000 บาท

กำหนดส่งมอบงาน งวดที่ 2 วันที่ 18 เมษายน 2565

งวดที่ 3 การดำเนินงานแล้ว 20%

งานก่ออิฐฉาบผนัง (จุดอาคารเอนกประสงค์ จุดที่ 1 และ จุดที่ 2+ห้องน้ำ)



ปัญหาและอุปสรรค

- 1.งานงวดที่ 2 ดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง เนื่องจากผู้รับจ้างวัสดุ ไม่เข้าหน้างานอย่างต่อเนื่อง
- 2.ฝนตกหนักเกือบทุกวันส่งผลทำให้งานล่าช้า เนื่องจาก ก่อสร้างกลางแจ้ง

แนวทางแก้ไข

- 1.ทางผู้รับจ้างจะดำเนินการจัดหาวัสดุให้เพียงพอต่อหน้างาน
- 2.จะเพิ่มกำลังแรงงานคน
- 3.ดำเนินงาน งวดงาน 5 - 6 ในสัญญาจ้าง ไปพร้อมๆกัน

การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ

จัดทำหนังสือเร่งรัดการทำงานให้แล้วเสร็จตามที่ระบุในสัญญาจ้าง พร้อมนัดประชุมติดตามงานทุก 15 วัน กับ ทางผู้รับจ้าง บริษัท พี.เอ.ไอ ซัพพลาย จำกัด พร้อมให้ทางผู้รับจ้างจัดเอกสารแผนงานแล้วเสร็จ และชี้แจงเหตุผลปัญหาอุปสรรค กรณีที่ไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง พร้อมแนวทางแก้ไข

ปรับปรุงถนนแนวรั้วและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

เอกสารหนังสือเร่งรัดผู้รับเหมา

จำนวน 3 ฉบับ

1. วันที่ 4 เมษายน 2565
2. วันที่ 9 เมษายน 2565
3. วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
4. วันที่ 29 มิถุนายน 2565 อสส. 1113/278

งบประมาณปี ๒๕๖๕

งานก่อสร้างเตาเผาซากสัตว์ปลอดมลพิษพร้อมปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

เลขที่สัญญาจ้าง	๖/๒๕๖๕ วงเงินก่อสร้าง ๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท
ระยะเวลาดำเนินการ	เริ่มทำงานวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ หหมดสัญญาจ้างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๑๕๐ วัน
ผู้รับจ้าง	บริษัท ทีมเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
การดำเนินงาน	แบ่งงานออกเป็น ๒ งวด
รายงานตั้งแต่	วันที่ ๑ - ๗ เมษายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๑ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

งานก่อสร้างเตาเผาซากสัตว์ปลอดมลพิษ ขนาด ๓๐๐ กก. / ๒๔ ชม. (ชนิดแก๊ส)

- งานติดตั้งระบบ Gas station พร้อมตู้ควบคุม เตาเผาซากสัตว์



- งานทดสอบระบบ เตาเผาซากสัตว์





- กรรมการตรวจรับงานงวด ๒ (งวดสุดท้าย) อาคารเตาเผาซากสัตว์



- รูปโดยรวม อาคารเตาเผาซากสัตว์




ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มี

สวนสัตว์เชียงใหม่ งบประมาณปี ๒๕๖๕

งานปรับปรุงอาคารฝ่ายอนุรักษ์และวิจัย พร้อมอาคารอนุบาลลูกสัตว์ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่
ระยะเวลาดำเนินงาน : ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
สถานะการดำเนินงาน : แบ่งงานออกเป็น ๓ งวด ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วทั้ง ๓ งวดงาน

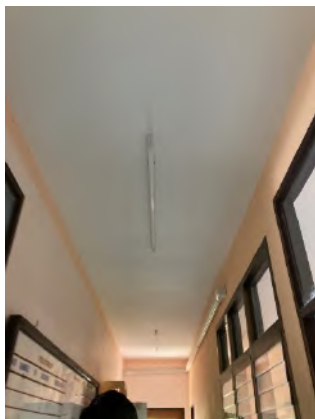

งบประมาณปี ๒๕๖๕
งานก่อสร้างโครงข่ายท่อน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสีย
เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

ระยะเวลาดำเนินงาน : ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

สถานะการดำเนินงาน : แบ่งงานออกเป็น 10 งวด

- งวดที่ 1-3 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- งวดงานที่ 4 อยู่ระหว่างดำเนินงานซึ่งดำเนินการไปแล้ว 35% และขณะนี้การดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 35 ของปริมาณงานทั้งหมด



๒. ครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

๒.๑ ซื้อเครื่องอัลตราซาวด์แบบพกพาสำหรับสัตว์ป่า จำนวน ๑ เครื่อง

วงเงิน/สัญญา (บาท)	งวดงาน (จำนวน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วันที่ เริ่มสัญญา	วันที่ สิ้นสุดสัญญา	สถานะ
๑,๔๕๓,๒๐๐.-	๑ งวด	๑๒๐ วัน	๒๑ ต.ค. ๖๔	๑๘ ก.พ ๖๕	- ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๒.๒ ซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล พร้อมเครื่องเอกซเรย์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง

วงเงิน/สัญญา (บาท)	งวดงาน (จำนวน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วันที่ เริ่มสัญญา	วันที่ สิ้นสุดสัญญา	สถานะ
๑,๗๙๘,๐๐๐.-	๑ งวด	๑๒๐ วัน	๒๙ ต.ค. ๖๔	๒๖ ก.พ ๖๕	- ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๒.๓ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (cab)

วงเงิน/สัญญา (บาท)	งวดงาน (จำนวน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วันที่ เริ่มสัญญา	วันที่ สิ้นสุดสัญญา	สถานะ
๖๔๔,๐๐๐.-	๑ งวด	๖๐ วัน	๑๒ ต.ต ๖๔	๑๑ ธ.ค. ๖๔	- ดำเนินการส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้วและขออนุมัติเบิกเงินไปยัง อสส.



๒.๒ ซื้อถังเก็บน้ำบนดิน โพลีเมอร์ ขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร สวนสัตว์เชียงใหม่ ๑๐ ใบ

วงเงิน/ซื้อ (บาท)	งวดงาน (จำนวน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วันที่ เริ่มสัญญา	วันที่ สิ้นสุดสัญญา	สถานะ
๗๗,๐๐๐.-	๑ งวด	๗ วัน	๗ ต.ต ๖๔	๑๓ ต.ต ๖๔	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว



๒.๓ ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๔๘,๐๐๐ บีทียู สำหรับคอกกักหมีแพนด้า


วงเงิน/ซื้อ (บาท)	งวดงาน (จำนวน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วันที่ เริ่มสัญญา	วันที่ สิ้นสุดสัญญา	สถานะ
๖๕,๒๕๐.-	๑ งวด	๓๐ วัน	๗ ต.ต ๖๔	๓๐ พ.ย. ๖๔	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว



สวนสัตว์เชียงใหม่

2.2 ชื่อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิทัล พร้อมเครื่องเอกซเรย์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง

วงเงิน/สัญญา (บาท)	งวดงาน (จำนวน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วันที่ เริ่มสัญญา	วันที่ สิ้นสุดสัญญา	สถานะ
1,798,000.-	1 งวด	120 วัน	29 ต.ค. 64	26 ก.พ. 65	- ดำเนินการส่งมอบพัสดุและ เบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

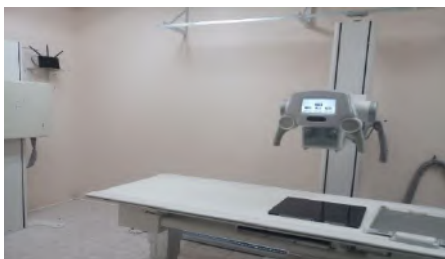

งานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา

๑. งานก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา

ผู้รับจ้าง บริษัท เอส.ยู.แพค. จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ ๐๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วงเงินสัญญาจ้าง จำนวนเงิน ๙,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เริ่มดำเนิน

งาน ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕ งวด จำนวน ๒๔๐ วัน

ผลการดำเนินงาน

งวดที่ ๑ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓. ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๓ กรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุ นัดตรวจรับงานในวันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. และเริ่มดำเนินงานงวดที่ ๔

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ดังรายการต่อไปนี้

๑. งานทางเดินทางเข้าอาคาร Welcome Center แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๒. งานวางท่อระบายน้ำ Dia.๖๐ cm แล้วเสร็จ ๑๐๐%

พร้อมบ่อพักและฝาปิด บริเวณใต้ทางเดินเท้าทางเข้าอาคาร Welcome Center

การดำเนินงานงวดที่ ๔ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๑. งานทางเดินทางเข้าอาคาร Welcome Center	แล้วเสร็จ	๐%
--	-----------	----

๒. งานวางท่อระบายน้ำ Dia.๖๐ cm แล้วเสร็จ ๑๐%

พร้อมบ่อพักและฝาปิด บริเวณใต้ทางเดินเท้าทางเข้าอาคาร Welcome Center

ปัญหาและอุปสรรค

งานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานเนื่องจากแรงงานไม่เพียงพอและเข้าฤดูฝน

แนวทางแก้ไขปัญห

๑. สวนสัตว์นครราชสีมา โดยคณะกรรมการควบคุมงาน,คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและงานพัสดุ ได้

ออกหนังสือเชิญผู้รับจ้างประชุมร่วมปรึกษาหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค จำนวน ๒ ครั้ง

๒. สวนสัตว์นครราชสีมา จัดส่งหนังสือเร่งรัดงานไปแล้ว ๕ ครั้ง

๓. ให้กรรมการควบคุมงานไปดูแลกำกับพื้นที่ก่อสร้างในทุกๆวันอย่างเคร่งครัด

๔. ผู้รับจ้างจะปรับแผนงานในส่วนของการทำงานล่วงเวลาเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

รูปภาพประกอบงานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เขตที่ ๕



งานก่อสร้างอาคารจักรผู้ล่า ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา

ผู้รับจ้าง บริษัท เอส.ยู.แพค. จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วงเงิน สัญญาจ้าง จำนวนเงิน ๒๔,๔๗๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เริ่มดำเนินงาน ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕ งวด จำนวน ๒๔๐ วัน

ผลการดำเนินงาน

๑. งานงวดที่ ๑ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
๒. งานงวดที่ ๒ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
๓. งานงวดที่ ๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๓ กรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นัดตรวจรับงานในวันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งานงวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังรายการต่อไปนี้

๔.๑ งานคูน้ำกั้นสัตว์ส่วนแสดงไฮยีนา	แล้วเสร็จ	๑๐๐%
๔.๒ งานบ่อน้ำ คสล. ส่วนแสดงช้างแอฟริกา	แล้วเสร็จ	๑๐๐%
๔.๓ งานผูกเหล็กคูน้ำกั้นสัตว์ส่วนแสดงไฮยีนา	แล้วเสร็จ	๑๐๐%
๔.๔ งานเทคอนกรีตฐานรากสะพานทางเดินชมสัตว์	แล้วเสร็จ	๑๐๐%
๕.๕ งานเทคอนกรีตฐานพื่นคูน้ำกั้นสัตว์ส่วนแสดงไฮยีนา	แล้วเสร็จ	๑๐๐%

การดำเนินงาน งานที่ ๔ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๔.๑ งานคูน้ำกั้นสัตว์ส่วนแสดงไฮยีนา	แล้วเสร็จ	๒๐%
๔.๒ งานบ่อน้ำ คสล. ส่วนแสดงช้างแอฟริกา	แล้วเสร็จ	๐%
๔.๓ งานผูกเหล็กคูน้ำกั้นสัตว์ส่วนแสดงไฮยีนา	แล้วเสร็จ	๐%
๔.๔ งานเทคอนกรีตฐานรากสะพานทางเดินชมสัตว์	แล้วเสร็จ	๐%
๕.๕ งานเทคอนกรีตฐานพื่นคูน้ำกั้นสัตว์ส่วนแสดงไฮยีนา	แล้วเสร็จ	๐%

ปัญหาและอุปสรรค

ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน เกิดความล่าช้า เนื่องจากแรงงานไม่พอเพียงในการปฏิบัติงาน

แนวทางแก้ไขปัญหา

๑. สวนสัตว์นครราชสีมา โดยคณะกรรมการควบคุมงาน,คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและงานพัสดุได้ทำหนังสือเชิญผู้รับจ้างร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไข จำนวน ๒ ครั้ง
๒. สวนสัตว์นครราชสีมาจัดทำหนังสือเร่งรัดงานครั้งที่ ๒
๓. ผู้รับจ้างจะปรับแผนงานในส่วนของการทำงานล่วงหน้าเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

รูปภาพประกอบงานก่อสร้างส่วนแสดงอาณาจักรผู้ล่า



รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕
สวนสัตว์สงขลา

ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๖ รายการ

ครุภัณฑ์ รายการที่ ๑ รถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

ผู้ขาย บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ครอบคลุมกำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนาม ๑,๓๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. ๑๑๑๕/๑๓๒๓ ลว. ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔



ครุภัณฑ์ รายการที่ ๒ เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพสำหรับสัตว์ จำนวน ๑ เครื่อง

ผู้ขาย ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง สัญญาเลขที่ ๐๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครอบกำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนาม ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. ๑๑๑๕/๖๙ ลว. ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

ครุภัณฑ์ รายการที่ ๓ คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด

ผู้ขายร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง สัญญาเลขที่ ๐๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครอบกำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนาม ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. ๑๑๑๕/๖๘ ลว. ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕



ครุภัณฑ์ รายการที่ ๔ เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า

ผู้ขาย ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง สัญญาเลขที่ ๐๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครอบกำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนาม ๘๙,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. ๑๑๑๕/๗๑ ลว. ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕



ครุภัณฑ์ รายการที่ ๕ เครื่องติดตามและบันทึกค่าคาร์บอนไดออกไซด์ทางเดินหายใจ แบบแมนสตรัม จำนวน ๑ เครื่อง

ผู้ขาย ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง สัญญาเลขที่ ๐๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครบกำหนดส่งมอบ ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนาม ๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. ๑๑๑๕/๗๐ ลว. ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕



ครุภัณฑ์ รายการที่ ๖ เครื่องบันทึกและติดตาม ปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจรสำหรับสัตว์ จำนวน ๑ เครื่อง

ผู้ขาย ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง สัญญาเลขที่ ๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครบกำหนดส่งมอบ ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนาม ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. ๑๑๑๕/๗๒ ลว. ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕



1. งานปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรแสงวิศวกรรม ในวงเงิน 30,367,440.73 บาท (สามสิบล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว กำหนดให้ผู้รับจ้าง เริ่มงานวันที่ 3 ธันวาคม 2564 และครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จในสัญญาวันที่ 29 สิงหาคม 2565 จำนวนงวดงาน 9 งวด

ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มงานวันที่ 3 ธันวาคม 2564 และครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จในสัญญาวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ระยะเวลาดำเนินงาน 270 วัน

จำนวนงวดงาน 9 งวด

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรแสงวิศวกรรม

ผลการดำเนินงาน

1. สวนสัตว์สงขลาได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงวดงานของโครงการปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส.1115/350 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565 และได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ อสส 1105/165 ลงวันที่ 12 เมษายน 2565 ดำเนินการจัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 คณะกรรมการตรวจรับงานเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานงวดที่ 1 ยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญาและรายละเอียดตามแบบก่อสร้าง ตรงตามที่ได้คณะกรรมการควบคุมงานนำเสนอ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์ไม่รับงานจ้าง งวดที่ 1 ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรแสงวิศวกรรม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแจ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรแสงวิศวกรรมให้ดำเนินการงานงวดที่ 1 ให้แล้วเสร็จตามสัญญาและรายละเอียดตามแบบก่อสร้างเมื่อดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการส่งมอบงานปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา งวดที่ 1 อีกครั้ง

งวดที่ 1 ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน (วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2565) ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

1.1 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารเตาเผาซาก **แล้วเสร็จ 78.34 %** ประกอบด้วย

- งานเตรียมการก่อสร้างทั้งหมด ,งานฐานราก , งานเสาตอม่อ ,งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ 1 ,งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ,ชั้นที่ 1 .งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ 1 - ชั้นหลังคา ,งานคานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นระดับหลังคาคอนกรีต + ชั้นวางถังน้ำ ,งานพื้นชั้นระดับหลังคาคอนกรีต + ชั้นวางถังน้ำ และงานฐานรับถังบำบัดน้ำเสีย ,งานโครงสร้างหลังคา

1.2 งานโครงสร้างอาคารพยาบาลสัตว์ป่วย (บน) **แล้วเสร็จ 100 %** ประกอบด้วย

- งานเตรียมการก่อสร้างทั้งหมด + งานรื้อถอน ,งานฐานราก ,งานเสาตอม่อ ,งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ 1 ,งานพื้นชั้นล่าง ,งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นที่ 1 , งานเสาเหล็กรูปพรรณ ชั้นที่ 1 ,งานโครงสร้างหลังคา 1 (ปรับปรุง),งานโครงสร้างหลังคา TRUSS

สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ 1 แล้วเสร็จ 89.17 %

งวดที่ 2 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน (วันที่ 17 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565) ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

2.1 งานสถาปัตยกรรม อาคารชั้นสูตรซากและเตาเผาซาก **แล้วเสร็จ 0 %** ประกอบด้วย

- งานมุงหลังคา ASAPVC , งานก่อฉาบผนัง

2.2 งานสถาปัตยกรรม อาคารพยาบาลสัตว์ป่วย **แล้วเสร็จ 60 %** ประกอบด้วย

- งานวัสดุมุงหลังคา ASAPVC, งานวัสดุผิวพื้น, งานวัสดุผนัง, งานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ,งานทาสีแล้วเสร็จ

2.3 งานโครงสร้างวิศวกรรม อาคารโรงพยาบาลสัตว์และสำนักงานส่วนแยก **แล้วเสร็จ 100 %** ประกอบด้วย

- งานเตรียมการก่อสร้าง (ทั้งหมด), งานรื้อถอนโรงพยาบาล (เดิม), งานฐานราก, งานเสาตอม่อ, งานคานคอดิน, งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 1, งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 1 , งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 1 - ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ

เนื่องจากในช่วงเดือนพฤษภาคม ฝนตกหนักทำให้การดำเนินงานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นระดับหลังคาคอนกรีตในงวดที่ 1 ล่าช้าส่งผลให้การปฏิบัติงานงวดที่ 2 งานสถาปัตยกรรม งานมุงหลังคา ASAPVC , งานก่อฉาบผนังดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานงวด ซึ่งหากดำเนินงานดังกล่าวแล้วเสร็จสามารถส่งมอบงานงวดที่ 2 ได้

สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ 2 แล้วเสร็จ 53.34 %

งวดที่ 3 ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2565) ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

3.1 ระบบไฟฟ้าและสื่อสารอาคารชั้นสุตราชากและเตาเผาซาก **แล้วเสร็จ 0 %** ประกอบด้วย

- งานแผงสวิทช์ไฟฟ้าประธาน (MDB) ,งานสายไฟและท่อ,รางเดินสายไฟฟ้าระบบเมน, วางระบบประปา + สุขาภิบาลและระบบบำบัดน้ำเสีย

3.2 ระบบไฟฟ้าและสื่อสารอาคารพยาบาลสัตว์ป่วย **แล้วเสร็จ 80 %** ประกอบด้วย

- งานแผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ ,งานสายไฟฟ้าและท่อรางเดินสายไฟฟ้า ,ระบบเมนสายไฟฟ้า ,ติดตั้งคอมพิวเตอร์และเดสก์ ,ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด, ระบบประปา + สุขาภิบาลและระบบบำบัดน้ำเสีย และงานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆแล้วเสร็จ

สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ 3 แล้วเสร็จ 40 %

งวดที่ 4 ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน (วันที่ 18 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2565) ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

4.1 งานภูมิทัศน์ อาคารชั้นสุตราชากและเตาเผาซาก **แล้วเสร็จ 0 %** ประกอบด้วย

- งานหลังคาแผงลวดตาข่าย 1 นิ้ว และงานประตู – หน้าต่าง แล้วเสร็จ

4.2 งานโครงสร้างวิศวกรรม (อาคารกักกันโรคสัตว์) **แล้วเสร็จ 90 %** ประกอบด้วย

- งานเตรียมการก่อสร้างรื้อถอน ,งานฐานราก ,งานฐานรากถึงบำบัดน้ำเสีย + ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป + ถังเซต ,งานถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ,งานเสาตอม่อ ,งานคานคอดิน ,งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ 1 ,งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ 1 ,งานกระเบื้องดิน ,งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ 1 ,งานเสาเหล็กรูปพรรณ ชั้นที่ 1 ,งานโครงสร้างหลังคา (ปรับปรุง) ,งานโครงสร้างหลังคา TRUSS A , TRUSS B , TRUSS C , งานทาสีแล้วเสร็จ

สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ 4 แล้วเสร็จ 45 %

งวดที่ 5 ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน (วันที่ 17 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565) ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

5.1 งานสถาปัตยกรรม (อาคารกักกันโรคสัตว์) **แล้วเสร็จ 50 %** ประกอบด้วย

- งานมุงหลังคา ASPVC ,งานผนัง ,งานประตู – หน้าต่าง ,งานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ,งานทาสีผนัง ,งานระบบไฟฟ้าแผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ ,งานเดินสายไฟฟ้าและระบบเมน ระบบกล้องวงจรปิด, ระบบประปา ,ระบบสุขาภิบาล และเบ็ดเตล็ดอื่น ๆแล้วเสร็จ

5.2 งานโครงสร้างวิศวกรรม อาคารโรงพยาบาลสัตว์และสำนักงานส่วนแยก **แล้วเสร็จ 40 %** ประกอบด้วย

- งานฝ้าเพดาน, งานวัสดุผิวพื้น, งานวัสดุผนัง, งานบัวเชิงผนัง, งานประตู – หน้าต่าง, งานรายการสุขภัณฑ์ ขยาย - หญิง

สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ 5 แล้วเสร็จ 45 %

งวดที่ 6 ระยะเวลาดำเนินงาน 40 วัน (วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2565) ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

6.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม อาคารโรงพยาบาลสัตว์และสำนักงานส่วนแยก **แล้วเสร็จ 80 %** ประกอบด้วย

- งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก, งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นหลังคา, งานพื้นชั้นหลังคา

- งานโครงสร้างอาคาร Generator ทั้งหมด

6.2 งานสถาปัตยกรรม อาคารสำนักงานส่วนแยก **แล้วเสร็จ 50 %** ประกอบด้วย

- งานวัสดุผนังหลังคา ASA PVC , งานก่อฉาบผนัง, งานวัสดุผิวพื้น, งานบัวเชิงผนัง, งานวัสดุผนัง ,งานฝ้าเพดาน ,งานประตู – หน้าต่าง ,รายการสุขภัณฑ์ ,งานทาสี ,งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ แล้วเสร็จ

- งานก่อฉาบผนัง, งานวัสดุผิวพื้น, งานประตู – หน้าต่าง อาคาร Generator

สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ 6 แล้วเสร็จ 65 %

งวดที่ 7 ระยะเวลาดำเนินงาน 20 วัน (วันที่ 26 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565) ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

7.1 งานสถาปัตยกรรม อาคารโรงพยาบาลสัตว์เดิม **แล้วเสร็จ 60 %** ประกอบด้วย

- งานหลังคาซีแพค (ซ่อมโครงหลังคาเดิม), งานก่อฉาบผนัง, งานวัสดุพื้น, งานบัวเชิงผนัง, งานวัสดุผนัง, งานฝ้าเพดาน, งานประตู – หน้าต่าง, งานสุขภัณฑ์, งานเบ็ดเตล็ด, งานทาสี แล้วเสร็จ

7.2 งานครุภัณฑ์อาคารชั้นสุตราชากและเตาเผาซาก **แล้วเสร็จ 0 %** ประกอบด้วย

- งานติดตั้งครุภัณฑ์ 5 ตัน, ติดตั้งระบบทำความเย็นสำหรับเก็บซากสัตว์, ติดตั้งเตาเผา, ติดตั้งกล้องวงจรปิดและติดตั้งระบบปรับอากาศ

สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ 7 แล้วเสร็จ 30 %

งวดที่ 8 ระยะเวลาดำเนินงาน 20 วัน (วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2565) ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

8.1 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร อาคารโรงพยาบาลสัตว์เดิม **แล้วเสร็จ 50 %** ประกอบด้วย

- งานแผงสวิทช์ไฟฟ้าประธาน (MDB) (EDB), งานสายไฟฟ้าและท่อ, รังเดินสายไฟฟ้าระบบเมน, ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นที่ 1 ติดตั้งคอมพิวเตอร์และสวิทช์และเต้ารับ, ระบบสื่อสาร (โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์), ระบบกล้องวงจรปิด, ติดตั้งระบบปรับอากาศและเครื่อง Generator

8.2 ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร อาคารสำนักงานแยก **แล้วเสร็จ 50 %** ประกอบด้วย

- งานคอมพิวเตอร์, สวิทช์และเต้ารับ, สายไฟ, ท่อและรังเดินสายไฟ, ระบบสื่อสาร (โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์), ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบกล้องวงจรปิดและติดตั้งระบบปรับอากาศ **แล้วเสร็จ**

8.3 งานภูมิทัศน์ อาคารชั้นสุตรซากและเตาเผาซาก **แล้วเสร็จ 0 %** ประกอบด้วย

- งานถนนทางเข้าอาคารชั้นสุตรซากและเตาเผาซาก พื้นที่โดยประมาณ 412 ตารางเมตร
- งานถนนด้านหน้าทางเข้าอาคารชั้นสุตรซากและเตาเผาซาก พื้นที่โดยประมาณ 115 ตารางเมตร
- งานรั้วโดยรอบอาคารชั้นสุตรซาก **แล้วเสร็จ**

สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ 8 แล้วเสร็จ 33.34 %

งวดที่ 8 ระยะเวลาดำเนินงาน 25 วัน (วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2565) ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

9.1 งานระบบสุขาภิบาล โรงพยาบาลสัตว์ **แล้วเสร็จ 0 %** ประกอบด้วย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบท่อน้ำประปา น้ำทิ้ง โสโครก และท่ออากาศ

9.2 ระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร **แล้วเสร็จ 0 %** ประกอบด้วย

- งานระบบท่อระบายน้ำภายนอกอาคาร และงานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ **แล้วเสร็จ** พร้อมทั้งเก็บกวาดทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยทุกประการพร้อมทั้งทดสอบระบบต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้

สรุปการดำเนินงานปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา ตลอดระยะเวลาเริ่มโครงการจนถึง 24 พฤษภาคม 2565

คิดเป็น 45.45 %

ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- ขาดแคลนแรงงาน แนวทางแก้ไขให้ผู้รับจ้างเพิ่มคนงาน

ภาพการดำเนินงาน

งานปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารเตาเผาซาก



งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารเตาเผาซาก



งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารเตาเผาซาก



งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารเตาเผาซาก



งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารเตาเผาซาก



งานโครงสร้างอาคารพยาบาลสัตว์ป่วย (บน)



งานโครงสร้างอาคารพยาบาลสัตว์ป่วย (บน)



งานโครงสร้างอาคารพยาบาลสัตว์ป่วย (บน)



งานอาคารโรงพยาบาลสัตว์



งานอาคารโรงพยาบาลสัตว์



อาคารส่วนแยก



งานอาคารกักกันโรคสัตว์



งานอาคารกักกันโรคสัตว์



งานปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธุ์สมเสร็จ ภายในสวนสัตว์สงขลา

สัญญาเลขที่	11/2565 ลงวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564
วงเงิน	16,480,000.00 บาท (สิบหกล้านบาทสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินงาน	เริ่มงานวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 และครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จในสัญญาวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ระยะเวลาดำเนินงาน 270 วัน
จำนวนงวดงาน	7 งวด
ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรุ่งก่อสร้าง 2007

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

งวดที่ 1 เบิกเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 1,648,000.00 บาท

งวดที่ 2 เบิกเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 2,142,400.00 บาท

งวดที่ 3 ดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน 40 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2565) สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ 3 แล้วเสร็จ 88.89 %

ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างกำแพง แล้วเสร็จ 80 %
- งานโครงหลังคาเหล็ก อาคารคอกกัก 4 หน่วยและอาคารคอกกัก 3 หน่วย แล้วเสร็จ 100 %
- งานโครงหลังคาเหล็ก ศาลาชมสัตว์ แล้วเสร็จ 100 %
- งานโครงหลังคาเหล็ก ชุมนให้อาหารสัตว์ 4 หลัง แล้วเสร็จ 100 %
- งานโครงหลังคาเหล็กที่หลบแดดหลบฝน 4 หลัง แล้วเสร็จ 100 %
- งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ราวกันตก ด้านหน้าส่วนจัดแสดง แล้วเสร็จ 80 %
- งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กของบังค้ำสัตว์ แล้วเสร็จ 80 %
- งานโครงสร้างรั้ว Wire mash แล้วเสร็จ 80 %
- งานโครงสร้างรั้วหินธรรมชาติ แล้วเสร็จ 80 %

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

- ไม่มี

ภาพการดำเนินการ

โครงการปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธุ์สมเสร็จ ภายในสวนสัตว์สงขลา







รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี 2565

สวนสัตว์อุบลราชธานี

ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 รายการ

ครุภัณฑ์ รายการที่ 1 แผ่นบันทึกภาพเอกซเรย์แบบดิจิทัล 4 แผ่น

ผู้รับจ้าง บริษัท เจ.เอฟ แอดวาน เมด จำกัด สัญญาเลขที่ 1/๒๕๖๕ เริ่ม 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 วงเงินที่ลงนามสัญญา 226,500.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส 1116/1383 ลว. 2 ธันวาคม 2564



ครุภัณฑ์ รายการที่ 2 ชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ๑ ชุด

ผู้รับจ้าง บริษัท เจ.เอฟ แอดวาน เมด จำกัด สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๕ เริ่ม ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนามสัญญา ๑,๖๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์แล้วเสร็จ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส ๑๑๑๖/๑๔๘๘ ลว. ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔



ครุภัณฑ์ รายการที่ ๓ หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ Kva. ๕ เครื่อง

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแม็ค เทคโนโลยี สัญญาเลขที่ ๙/๒๕๖๕ เริ่ม ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนามสัญญา ๗๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์แล้วเสร็จในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

- ขออนุมัติเบิกเงินตามหนังสือเลขที่ ทส๑๑๑๖/๑๔๑๑ ลว. ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔



ครุภัณฑ์ รายการที่ ๔ กล่องวงจรปิดติดตั้ง ๘ จุด ๖๖ ตัว

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีคอมมูนิเคชั่นเซลล์ แอดเซอร์วิส สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๕ เริ่ม ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ วงเงินที่ลงนามสัญญา ๘๕๐,๐๐๐บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์แล้วเสร็จในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส ๑๑๑๖/๑๔๘๘ ลว. ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

ภาพการดำเนินงาน



งานก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วน กรีนเทค เอสโซซิเอท สัญญาจ้างเลขที่ 21/2565 วงเงินสัญญา จำนวนเงิน 53,498,000 บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เริ่มดำเนินการ 6 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุดการดำเนินงาน วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 6 งวด จำนวน 240 วัน

ผลการดำเนินงาน

งวดที่ 1 กำหนดส่งมอบงานวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ดำเนินการได้เป็นไปตามงวดงานและสัญญา

หมวดงานที่ 2 งานปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกา และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ Zone B

2.1 คอกกักในอาลา

2.1.1 งานปรับเคลือบพื้นที่	แล้วเสร็จ 100 %
2.2.2 งานโครงสร้าง ค.ส.ล. (ฐานราก,ตอม่อ,เสา,คานาคอดิน,พื้น)	แล้วเสร็จ 100 %
2.3.3 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (นำวัสดุเข้าหน้างาน)	-

2.2 อาคารบริการ 2

2.2.1 งานปรับเคลือบพื้นที่	แล้วเสร็จ 100 %
2.2.2 งานโครงสร้าง ค.ส.ล. (ฐานราก,ตอม่อ,เสา,คานาคอดิน,พื้น)	แล้วเสร็จ 100 %
2.2.3 งานโครงสร้างหลังคา (นำวัสดุเข้าหน้างาน)	-

2.3 คอกกักวัวเตอร์บัก

2.3.1 งานปรับเคลือบพื้นที่	แล้วเสร็จ 100 %
2.3.2 งานโครงสร้าง ค.ส.ล. (ฐานราก,ตอม่อ,เสา,คานาคอดิน,พื้น)	แล้วเสร็จ 100 %
2.3.3 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (นำวัสดุเข้าหน้างาน)	-

2.4 อาคารชมสัตว์ A จำนวน 2 หลัง

2.4.1 งานปรับเคลือบพื้นที่	แล้วเสร็จ 100 %
2.4.2 งานโครงสร้าง ค.ส.ล. (ฐานราก,ตอม่อ,เสา,คานาคอดิน,พื้น)	แล้วเสร็จ 100 %
2.4.3 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (นำวัสดุเข้าหน้างาน)	-

หมวดงานที่ 3 งานปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกา และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ Zone C

3.1 ส่วนจัดแสดงสัตว์ขนาดเล็ก

3.1.3 งานประกอบตามรูปแบบส่วนแสดงสัตว์	
- แม่พิมพ์ลายพื้น ลาย Random size 45x45 cm. จำนวน 5 ชุด	แล้วเสร็จ 100 %
- แม่พิมพ์ลายพื้น ลาย Blind A size 45x45 cm.จำนวน 5 ชุด	แล้วเสร็จ 100 %
- แม่พิมพ์ลายพื้น ลาย Ashlar size 23"x23" จำนวน 5 ชุด	แล้วเสร็จ 100 %
- แม่พิมพ์ลายพื้น ลาย London size 17"x29" จำนวน 3 ชุด	แล้วเสร็จ 100 %
- แม่พิมพ์ลายพื้น ลาย Granit size 24"x36" จำนวน 2 ชุด	แล้วเสร็จ 100 %

3.2 งาน Landscape ปรับภูมิทัศน์,งานรั้ว,งานป้าย

3.2.1 ภูมิทัศน์ถนน

- งานปรับเคลียทางป่าขุดต่อพื้นที่โครงการ
- งานถมดินปรับพื้นที่ จำนวน 900 ลบ.ม.

แล้วเสร็จ 100 %

แล้วเสร็จ 100 %

3.2.6 รั้วตาข่ายกันสัตว์

3.2.6.1 รั้วตาข่าย A จำนวน 100 แผง/ระยะรวม 300 เมตร ไม่รวมติดตั้ง

แล้วเสร็จ 100 %

3.2.6.4 รั้วตาข่ายกันกวาง(ชั่วคราว)

แล้วเสร็จ 100 %



ครุภัณฑ์ สวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตู้แช่อาหาร ขนาด ๔๕ คิวบิกฟุต
งบประมาณ ๔๖,๐๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



ตู้แช่อาหาร ขนาด ๓๒ คิวบิกฟุต
งบประมาณ ๒๗,๐๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



เครื่องเป่าใบไม้ ๒ จังหวะ ๓ เครื่อง
งบประมาณ ๓๐,๓๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวี ๑ เครื่อง
งบประมาณ ๕๒,๙๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



ครุภัณฑ์ สอนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เครื่องเลเซอร์รักษาแผลสำหรับสัตว์
1 เครื่อง งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ๓ เครื่อง
งบประมาณ ๔๔๔,๒๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า ๒ เครื่อง
งบประมาณ ๗๐,๐๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า สอนสัตว์ขอนแก่น
๒ เครื่อง งบประมาณ ๑๙,๐๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



งานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสัตว์และอาคารประกอบต่างๆ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น

ผู้รับจ้าง บริษัท ขุนพลพัฒนาการ จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ วงเงินสัญญาจ้าง จำนวนเงิน ๗,๙๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เริ่มดำเนินงาน วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดการดำเนินงาน วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ งวด จำนวน ๒๑๐ วัน

ผลการดำเนินงาน

- งวดที่ ๑ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ ๒ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว



งานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

งานก่อสร้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวน้ำ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น

ผู้รับจ้าง บริษัท ขุนพลพัฒนาการ จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ ๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ วงเงินสัญญาจ้าง จำนวนเงิน ๑๔,๕๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เริ่มดำเนินงาน ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔ งวด จำนวน ๒๔๐ วัน

ผลการดำเนินงาน

งวดที่ ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่งเบิกจ่ายไปยัง อสส.เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่งเบิกจ่ายไปยัง อสส.เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายไปยัง อสส.

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จ ๑๐๐% ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายไปยัง อสส.



ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี

แนวทางแก้ไข ไม่มี

งานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

งานก่อสร้างอาคารจักรนักล้า ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น

ผู้รับจ้าง บริษัท ขุนพลพัฒนาการ จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ วงเงินสัญญาจ้าง จำนวนเงิน ๑๔,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เริ่มดำเนินงาน ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔ งวด จำนวน ๒๔๐ วัน

งวดที่ ๑ เบิกจ่ายแล้ว

งวดที่ ๒ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ (๖๐ วัน)

มีเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง กระทบงวด ๒-๔ งวดที่ ๒ อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายมายัง อสส.

๑. งานส่วนจัดแสดงเสือโคร่งขาว

- | | |
|--|-----------------|
| ๑.๑ งานติดตั้งกล้องวงจรปิดและอินเทอร์เน็ต ส่วนจัดแสดงและคอกกัก | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๑.๒ งานรั้วกั้นรอบพื้นที่คอกกัก ความยาว ๙๒ เมตร | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๑.๓ งานประตูล้อเลื่อน | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๑.๔ งานถนน ค.ส.ล. เข้าคอกกัก หนา ๑๕ ซม. พื้นที่ ๗๕ ตร.ม. | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |

๒. งานส่วนจัดแสดงเสือโคร่งอินโดจีน

- | | |
|---|-----------------|
| ๒.๑ งานประตูล้อเลื่อน | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๒.๒ งานถนนทางเข้าคอกกัก ค.ส.ล. หนา ๑๕ ซม. พื้นที่ ๑๕๕ ตร.ม. | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๒.๓ งานรั้วกั้นรอบพื้นที่คอกกัก ยาว ๑๐๐ เมตร | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๒.๔ งานขุ้มบังแดดฝนและลานหินเทียม | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๒.๕ งานอาคารโรงสูบน้ำและระบบกรอง | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๒.๖ งานน้ำตกเลียนแบบธรรมชาติ | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |

๓. งานส่วนจัดแสดงสิงโตขาว

- | | |
|---|-----------------|
| ๓.๑ งานประตูล้อเลื่อน | แล้วเสร็จ ๑๐๐% |
| ๓.๒ งานถนนทางเข้าคอกกัก ค.ส.ล. หนา ๑๕ ซม. พื้นที่ ๙๘๐ ตร.ม. | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๓.๓ งานรั้วกั้นรอบพื้นที่คอกกัก ยาว ๑๓๐ เมตร | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |

๔. งานภูมิทัศน์

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| ๔.๑ งานพรรณไม้ยืนต้น | แล้วเสร็จ ๑๐๐% |
| ๔.๒ งานพรรณไม้พุ่มไม้คลุมดิน | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |

๕. งานจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในงวดงานต่อไปเข้าพื้นที่งานก่อสร้าง

ผลการดำเนินงาน งวดที่ ๓ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ (๖๐ วัน) ทำหนังสือเร่งรัดงวดที่ ๓

๑. งานส่วนจัดแสดงเสือโคร่งขาว

- | | |
|---|-----------------|
| ๑.๑ งานรั้วกั้นรอบพื้นที่คอกกัก ความยาว ๙๒ เมตร | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๑.๒ งานประตูล้อเลื่อน | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |

๒. งานส่วนจัดแสดงเสือโคร่งอินโดจีน

- | | |
|---|-----------------|
| ๒.๑ งานประตูล้อเลื่อน | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๒.๒ งานผนังกระจกสำหรับชมสัตว์ | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๒.๓ งานรั้วกั้นรอบพื้นที่คอกกักยาว ๑๐๐ เมตร | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |

- | | |
|---|------------------|
| ๓. งานส่วนจัดแสดงสิงโตขาว | |
| ๓.๑ งานประติมากรรมล้อเลื่อน | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๓.๒ งานรั้วกันรอบพื้นที่คอกกักยาว ๑๓๐ เมตร | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๓.๓ งานซุ้มบังแดดฝนและลานหินเทียม | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๓.๔ งานเครื่องเล่นไม้จริง สำหรับสัตว์ | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๓.๕ งานบ่อน้ำดื่ม | แล้วเสร็จ ๑๐๐ % |
| ๓.๖ งานกำแพงหินเทียมรอบส่วนจัดแสดงใหม่ ยาว ๗๕ เมตร | แล้วเสร็จ ๘๕ % |
| ๓.๗ งานผนังกระจกสำหรับชมสัตว์ | แล้วเสร็จ ๐.๐๐ % |
| ๔. งานจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในงวดงานต่อไปเข้าพื้นที่งานก่อสร้าง | |

ผลการดำเนินงาน งวดที่ ๔ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ (๖๐ วัน)

- | | |
|--|------------------|
| ๑. งานส่วนจัดแสดงสิงโตขาว | |
| ๑.๑ งานอาคารจุดบริการนักท่องเที่ยว | แล้วเสร็จ ๙๐ % |
| ๑.๒ งานต้นไม้ติดรอกให้อาหาร | แล้วเสร็จ ๘๐ % |
| ๑.๓ งานประตูปล่อยสัตว์เชื่อมสองส่วนจัดแสดง | แล้วเสร็จ ๙๐ % |
| ๑.๔ งานประตูปล่อยสัตว์และประตูเจ้าหน้าที่ | แล้วเสร็จ ๙๐ % |
| ๑.๖ งานของลำเลียงและของบังคับสัตว์ ความยาว ๖๗ เมตร | แล้วเสร็จ ๘๐ % |
| ๑.๗ งานติดตั้งกล้องวงจรปิดและอินเทอร์เน็ต ส่วนจัดแสดงและคอกกัก | แล้วเสร็จ ๐.๐๐ % |
| ๒. งานภูมิทัศน์ | |
| ๒.๑ งานพรรณไม้ยืนต้น | แล้วเสร็จ ๖๐ % |
| ๒.๒ งานพรรณไม้พุ่มไม้คลุมดิน | แล้วเสร็จ ๖๐ % |
| ๒.๓ งานระบบพ่นหมอกแรงดันสูง | แล้วเสร็จ ๖๐ % |
| ๓. งานก่อสร้างต่างๆ ที่มีปรากฏในสัญญาและรูปแบบรายการทั้งหมด | แล้วเสร็จ ๖๐ % |
| ๔. งานทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง | แล้วเสร็จ ๐.๐๐ % |

สรุป การปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ตลอดระยะเวลาเริ่มโครงการจนถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕



ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕


ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

- ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรในปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ



1. กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา ใบสั่งซื้อ 001/2565
บริษัท เบสท์ แล็บ แอนด์ เคมีคอล จำกัด
เบิกจ่าย 100%

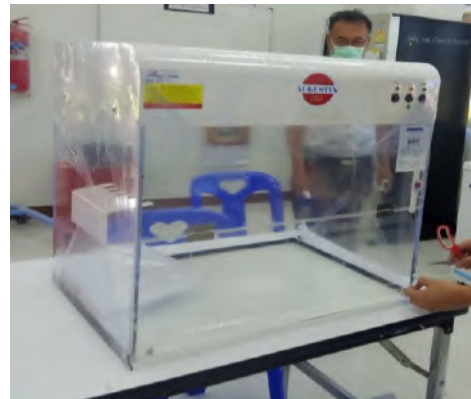

2. เครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมในสภาพจริงแบบเคลื่อนที่ ใบสั่งซื้อ 004/2565
บริษัท อาฟเตอร์ แล็บ จำกัด
เบิกจ่าย 100%

ครุภัณฑ์ รายการที่ ๓ เครื่องมือรักษาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดความเข้มต่ำ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
 ผู้รับจ้าง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๕ เริ่ม ๑๑ ต.ค.๖๕ สิ้นสุดสัญญา ๘ ก.พ. ๖๕
 วงเงินที่ลงนามสัญญา ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (ส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕)



3. เครื่องมือรักษาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดความเข้มต่ำ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
 สัญญาเลขที่ 3/2565 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
 เบิกจ่าย 100%

ครุภัณฑ์ รายการที่ ๔ รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
 ผู้รับจ้าง บริษัทพัชริ เฮฟวี่ แมชชีนเนอรี จำกัด สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๕ เริ่ม ๒๐ พ.ย.๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา ๑๗ ก.พ.
 ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนามสัญญา ๓,๑๙๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
 (ส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)



๔. รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
 สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๕ บริษัทพัชริ เฮฟวี่ แมชชีนเนอรี จำกัด
 เบิกจ่าย ๑๐๐%

งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระการบินไทย ภายในโครงการคชอาณาจักร

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ไทยสงวน สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๕ เริ่มเริ่ม ๑๑ พ.ย..๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา ๘ ก.ค. ๒๕๖๕ วงเงินลงนามสัญญา ๑๑,๙๖๙,๐๐๐.-บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จำนวน ๕ งวด ๒๔๐ วัน (โดยฝ่ายพัสดอค์การสวนสัตว์เป็นผู้ดำเนินการ)

ผลการดำเนินงาน งวดที่ ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่งเบิกจ่ายไปยัง อสส.เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่งเบิกจ่ายไปยัง อสส.เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่งเบิกจ่ายไปยัง อสส.เรียบร้อยแล้ว

อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ ๔

- | | | | |
|---|------------------------|-----------|------|
| - | งานศาลาดูช้าง | แล้วเสร็จ | ๙๐% |
| - | งานศาลาพักผ่อนช้าง | แล้วเสร็จ | ๘๐% |
| - | งานทางเดินช้าง | แล้วเสร็จ | ๑๐๐% |
| - | งานทางเดินเท้า | แล้วเสร็จ | ๑๐๐% |
| - | งานวางระบบรดน้ำต้นไม้ | แล้วเสร็จ | ๑๐๐% |
| - | งานปลูกต้นไม้และจัดสวน | แล้วเสร็จ | ๕๐% |

อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ ๕

- งานปลูกต้นไม้และจัดสวน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งและเดินระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานแก้ไขและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานทดสอบระบบพร้อมใช้งาน แล้วเสร็จ ๘๐% ทั้งหมด

การดำเนินงานงวดที่ ๔ งานศาลาдуช้าง แล้วเสร็จ ๙๐%



งานศาลาพักผ่อนข้าง แล้วเสร็จ ๘๐%



งานวางระบบรดน้ำต้นไม้ แล้วเสร็จ ๑๐๐%



งานปลูกต้นไม้และจัดสวนแล้วเสร็จ ๕๐%



งานปลูกต้นไม้และจัดสวนแล้วเสร็จ ๑๐๐%



งานติดตั้งและเดินระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๑๐๐%



งานแก้ไขและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ แล้วเสร็จ ๑๐๐%



ปัญหา-อุปสรรค

สืบเนื่องจากผู้รับเหมาเข้ามาปฏิบัติงานไม่เต็ม ๑๐๐% จึงทำให้งานก่อสร้างงวด ๔ และงวด ๕ ทำให้งานล่าช้าออกไป จึงเป็นอุปสรรคต่องานก่อสร้างในครั้งนี้ ผู้ควบคุมงานได้เร่งให้ผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินงานงวด ๔ และงวด ๕ ให้เสร็จทันภายใน ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

แนวทางแก้ไข

๑. คณะกรรมการผู้ควบคุมงานได้ออกหนังสือ ทออส๑๑๑๙/๔๘ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่องเร่งรัดการส่งมอบงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระการบินไทย งานงวดที่ ๒ ครั้งที่ ๑ โดยให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ไทยสงวน ทำหนังสือส่งมอบงานงวดที่ ๒ ภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น
๒. คณะกรรมการผู้ควบคุมงานได้ออกหนังสือ ทออส๑๑๑๙/๔๔ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่องเร่งรัดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ งานงวดที่ ๓ โดยให้เข้ามาดำเนิน งานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา ศาลาดูช้าง และงานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา ศาลาพักผ่อน ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น
๓. คณะกรรมการผู้ควบคุมงานได้ออกหนังสือ ทออส๑๑๑๙/๘๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่องเร่งรัดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ งานงวดที่ ๓ ครั้งที่ ๒ โดยให้เข้ามาดำเนินงานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา ศาลาดูช้าง และงานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา ศาลาพักผ่อน ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น
๔. คณะกรรมการผู้ควบคุมงาน ได้ออกหนังสือ ทออส๑๑๑๙/๖๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่องขอเชิญประชุมหารือเรื่องงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระการบินไทย โดยประชุมวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน โดยมีนายภาสกร อรสุญ ผู้จัดการโครงการเป็นประธานในการประชุมครั้ง พร้อมคณะกรรมการผู้ควบคุมและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ไทยสงวน ในการเข้าประชุมหารือครั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าของงานก่อสร้าง งวด ๓ และงวด ๔ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงานงวดที่ ๒
๕. คณะกรรมการผู้ควบคุมงานได้ออกหนังสือ ทออส๑๑๑๙/๑๑๙ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่องเร่งรัดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ งานงวดที่ ๓ ครั้งที่ ๓ โดยให้เข้ามาดำเนินงานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา ศาลาดูช้าง และงานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา ศาลาพักผ่อน ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ และผู้ควบคุมงานได้ออกหนังสือ ทออส๑๑๑๙/๑๑๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่องเร่งรัดงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ งานงวดที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เนื่องจากเลยระยะเวลาส่งมอบงานมาแล้ว ๑๓ วัน จึงได้ดำเนินการทำหนังสือเพื่อเร่งรัด โดยให้เข้ามาดำเนินงานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคาศาลาดูช้าง งานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา ศาลาพักผ่อน งานวางระบบรดน้ำต้นไม้ งานปลูกต้นไม้และจัดสวนให้แล้วเสร็จ
๖. คณะกรรมการผู้ควบคุมงานได้ออกหนังสือ ทออส๑๑๑๙/๕๔ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่องเร่งรัดการส่งมอบงาน งานงวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ และขอสงวนสิทธิ์ปรับตามสัญญา เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นสุดกำหนดเวลาในสัญญา งานอาจไม่เสร็จตามกำหนดสัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๕ จึงได้ดำเนินการทำหนังสือเพื่อเร่งรัดให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ไทยสงวนรีบดำเนินการและส่งมอบงานให้ถูกต้องครบถ้วน
๗. คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๔ งวดที่ ๕ ไม่เกิน วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และตรวจรับไม่เกินวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส่งเบิกไม่เกินวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

มติที่ประชุม
