



ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์
เลขรับที่... ๕๗๑๕/๖๕
วันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๕
เวลา..... ๑๑.๒๓ น.

รองผอ.อส. นางจกณีน แก้วสด
เลขที่รับ.....๒๐๓๖/๖๕.....
วันที่.....๑๐ ต.ค. ๖๕.....
เวลา.....๑๐.๔๑ น.....

สำนักงานเลขาธิการ
ฝ่ายอำนวยการ
รับที่ 6284/2585
วันที่ 6 / ๑๐ / ๖๕
เวลา 16 : 19

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักงานการเงินและทรัพย์สิน

ที่ อสส ๓๓๐๕/๓๐๒๖

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ตามที่ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย อนุมัติให้สำนักงานการเงินและทรัพย์สิน ปรับเปลี่ยน รูปแบบการประชุมเป็นรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบ สำหรับการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานในการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง สำนักงานการเงินและทรัพย์สิน จึงขอรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบตามระเบียบการประชุม คณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เพื่อให้คณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณฯ รับทราบความ คืบหน้าในการดำเนินงานตามระเบียบวาระการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจิตวรณ์ อนันท์)

ผู้อำนวยการสำนักงานการเงินและทรัพย์สิน

คณะทำงานและเลขานุการ

เรียน ผอ.อสส. ผ่าน มช.ผอ.อสส.
เพื่อโปรดนำเสนอผอ.อสส.ทราบ

(นางจิตวรณ์ อนันท์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๗ พ.ค. ๒๕๖๕

(นางจิตวรณ์ อนันท์)
ผอ.อสส.

๗๓๐๕

เรียน ผอ.อสส. ผ่าน รอง ผอ.อสส. (นางจกณีน)
☒ เพื่อโปรดทราบ

(นางจกณีน แก้วสด)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

๗ / ๑๐ / ๖๕

ทราบ

(นายอรุณพร ศรีเจริญ)

ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

๑๑ ต.ค. ๖๕

(นางจกณีน แก้วสด)

รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

๑๐ ต.ค. ๖๕



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณฯ

ที่

วันที่

กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน

ตามที่ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย อนุมัติให้สำนักการเงินและทรัพย์สิน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบ สำหรับการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานในการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบตามระเบียบการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เพื่อให้คณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณฯ รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานตามระเบียบวาระการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอโปรดลงนามในหนังสือตามที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณโกชน)

เจ้าหน้าที่งบประมาณ ๖ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรงบประมาณ

ลงนามแล้ว

5/10/65



การประชุม

คณะกรรมการด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของ
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕

การประชุมเป็นรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงาน
พร้อมภาพประกอบ

ระเบียบวาระการประชุม
คณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
 ๓.๑ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ (สำนักกฎหมาย/สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์)
 ๓.๒ ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่
 (สำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม)
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
 ๔.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 ๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
 ๔.๓ รายงานผลการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ (สวนสัตว์เชียงใหม่)
 ๔.๔ รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานกรรมการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมคณะกรรมการด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
ได้อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบ
ตามหนังสือที่ อสส ๑๑๐๕/๒๓๒๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานผลการดำเนินงานฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

 สำนักการเงินและทรัพย์สิน ได้ส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบตามระเบียบการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ให้คณะทำงานฯ เพื่อรับทราบ โดยสำนัก สถาบันสวนสัตว์ และโครงการ ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว และรายงานผลการดำเนินงาน กลับให้สำนักการเงินและทรัพย์สิน ทาง e-mail และทาง line เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีรายการที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ วงเงินทั้งสิ้น ๗๔.๒๒๑๖ ล้านบาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวถูกพับไปแล้ว	มติที่ประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีสัญญาซื้อขายสัตว์ และงานก่อสร้างปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒ ดำเนินการเก็บรวบรวมเอกสาร กระบวนของงาน และรายละเอียดที่สำคัญของงานทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากรณีมีปัญหาในอนาคต	
ส่วนกลาง ๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ สัญญาที่ ๒๔/๒๕๖๑ วงเงินตามสัญญา ๑๒.๔๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๐๔๐ ล้านบาท คงเหลือ ๘.๓๙๐ ล้านบาท ๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ สัญญาที่ ๒๘/๒๕๖๒ วงเงินตามสัญญา ๑๓.๖๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๙๖๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑๑.๗๓๐ ล้านบาท	๑. สำนักการเงินและทรัพย์สิน ดำเนินการทำหนังสือแจ้งบริษัทฯ ให้เร่งรัดดำเนินการตามสัญญา ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๕๔๓ และ ทส ๑๑๐๑/๕๔๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ของสัญญาที่ ๒๔/๒๕๖๑ และสัญญาที่ ๒๘/๒๕๖๒ ๒. บริษัทฯ ตอบกลับมาให้องค์การสวนสัตว์ฯ มอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นผู้นำสัตว์เข้าเนื่องจากเป็นสัตว์ตาม CITES ตามหนังสือเลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๓. สำนักการเงินและทรัพย์สิน ได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องนำเสนอสำนักกฎหมายเพื่อพิจารณา ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๔/๓๓๙๕ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๔. สำนักกฎหมายอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณา ๕. สำนักการเงินและทรัพย์สิน อยู่ระหว่างการติดตามความคืบหน้าในการพิจารณาของสำนักกฎหมาย ๖.สำนักกฎหมายได้จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้บริษัทฯ เพื่อดำเนินการด้านเอกสารการนำเข้าสัตว์จากต่างประเทศต่อกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามที่ร้องขอแล้ว และให้ สงท.แจ้งคณะกรรมการตรวจรับสัตว์ ปี ๒๕๖๒ พิจารณาเสนอความเห็นตามองค์ประกอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปเสนอ ผอ.อสส.ทราบและสั่งการต่อไป ตามเอกสารที่ ทส ๑๑๐๖/๙๑๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ๗. สำนักการเงินและทรัพย์สินมีหนังสือแจ้งคณะกรรมการตรวจรับ ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๔/๕๑๔๙ ลว.๒๗ ก.ย.๒๕๖๔ พิจารณาเสนอความเห็นตามองค์ประกอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปเสนอ ผอ.อสส ๘. คณะกรรมการตรวจรับเสนอความเห็นต่อ ผอ.อสส. ว่าบริษัทฯ เข้าหลักเกณฑ์ผู้ขายส่งมอบสัตว์ล่าช้าเห็นควรให้มีหนังสือแจ้งสิทธิการปรับและเร่งรัดการส่งสัตว์ให้ผู้ขายทราบ โดย ผอ.อสส.ให้ทางคณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตามหนังสือที่ ทส.๑๑๐๗/๑๗๐๗ ลงวันที่ ๖ ต.ค.๒๕๖๔	๑. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีสัญญาซื้อขายสัตว์ปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อความชัดเจนในการดำเนินงาน ๒. มอบให้สำนักกฎหมายเข้ามาดูรายละเอียดและให้สรุปประเด็นปัญหาและการดำเนินงานให้ชัดเจนแล้วนำเข้าคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อพิจารณา

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	๙. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย มีหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๑๔๓๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ไปยังกรมปศุสัตว์ เพื่อสอบถามการยกเลิกประกาศโรคปากเท้าเปื่อยจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE ในพื้นที่สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในการนำออกจากประเทศต้นทางเพื่อนำกลับมาส่งยังประเทศปลายทาง (ประเทศไทย) ว่าขณะนี้ สามารถดำเนินการได้แล้วหรือไม่ ตามที่บริษัท คาสชิบา (ประเทศไทย) จำกัด ได้อ้างถึงประกาศดังกล่าวเพื่อเป็นการยืนยันจากกรมปศุสัตว์ ๑๐. ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ ๐๖๒๑/๑๖๕ ลว.๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ แจ้งมายังองค์การสวนสัตว์ว่า ว่าปัจจุบันยังมีประกาศชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์กบคู่หรือซากสัตว์กบคู่จากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นเมื่อ ๒๓ ธ.ค.๖๔ ซึ่งมีผลบังคับเป็นเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หากมีการระบาดและยังไม่ได้รับรองสถานะการปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยจากองค์การสุขภาพโลก OIE จะมีการประกาศชะลอการนำเข้าต่อไป ๑๑. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ มีหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๓๙๘ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค.๒๕๖๕ เรื่อง การแจ้งสิทธิเรียกค่าปรับ ถึง กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาสชิบา (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบสัตว์จำนวน ๔ รายการ รวม ๑๘ ตัว องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ จึงขอแจ้งสิทธิเรียกค่าปรับตามสัญญาที่ ๒๘/๒๕๖๒ จำนวน ๕,๙๘๒,๙๘๐ บาท และให้ทางบริษัทฯ ทำหนังสือยินยอมเสียค่าปรับตามสัญญา ๑๒. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ มีหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๘๑ ลงวันที่ ๑๙ เม.ย.๒๕๖๕ เรื่อง บอกละเมิดสัญญาซื้อขายสัตว์ ถึง กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาสชิบา (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบสัตว์จำนวน ๔ รายการ รวม ๑๕ ตัว ตามสัญญาที่ ๒๔/๒๕๖๑ ซึ่งได้ล่วงเลยระยะเวลา ๒ ปี กับ ๓๔๙ วัน (๑๗ มี.ค.๖๒-๒๘ ก.พ.๖๕) แต่บริษัทฯ ยังไม่มีความเคลื่อนไหวหรือความคืบหน้าการเร่งดำเนินการส่งมอบสัตว์แต่อย่างใด จึงแจ้งบอกละเมิดสัญญาซื้อขายสัตว์และดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ๑. ปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์สัตว์ให้เป็นศูนย์พัฒนาเพื่อการวิจัยและอนุรักษ์สัตว์ป่าระดับมาตรฐานภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว - วงเงิน ๒.๔๘๔ ล้านบาท - เบิกจ่ายแล้ว ๑.๓๕๑ ล้านบาท - คงเหลือ ๑.๑๓๓ ล้านบาท โดยกิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ ๖๘๙		

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
๒. ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆภายใต้โครงการความร่วมมือการเพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆร่วมกับภาชีเพื่อรองรับและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร - วงเงิน ๑๘.๘๙๒ ล้านบาท - เบิกจ่ายแล้ว ๔.๗๒๓ ล้านบาท - คงเหลือ ๑๔.๑๖๙ ล้านบาท โดยกิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ ๖๘๙	๑. สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนำส่งรายงานการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์ฯ ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๑๒/๔๕๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒. บริษัทฯ ทำหนังสือขออุทธรณ์การบอกเลิกสัญญา และขอสงวนสิทธิ์หลักประกันสัญญา ตามหนังสือเลขที่ ๓๘/๒๕๖๒.๒๐๒๑๐๔.๐๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๓. สำนักการเงินและทรัพย์สิน มีหนังสือที่ ทส ๑๑๐๔/๓๑๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้สำนักกฎหมายพิจารณาการขออุทธรณ์การบอกเลิกสัญญาและขอสงวนสิทธิ์หลักประกันสัญญา ๔. สำนักกฎหมายพิจารณาให้ยืนยันการรับหลักประกันสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆ โดยองค์การสวนสัตว์ฯ ได้แจ้งให้บริษัทฯ รับทราบการยืนยันการรับหลักประกันตามหนังสือองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ที่ ทส ๑๑๐๑/๗๗๒ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๕. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้รับหลักประกันสัญญาตาม ระเบียบฯ ซึ่งทางธนาคารกรุงไทย ได้นำส่งเงินหลักประกันสัญญาให้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเรียบร้อยแล้ว ๖. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว นำส่งเอกสารประกอบการแจ้งเป็นผู้ทำงานของ กิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ ๖๘๙ มายังองค์การสวนสัตว์ฯ เพื่อจัดส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาเป็นผู้ทำงาน ตามหนังสือเลขที่ ๑๑๑๒/๘๙๗ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๗. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นำส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงการคลัง แจ้งให้ กิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ ๖๘๙ เป็นผู้ทำงานตามหนังสือเลขที่ ทส ๑๑๐๑/๑๐๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ๘. ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลัง ยังไม่มีหนังสือตอบกลับแจ้งให้เป็นผู้ทำงาน ๙. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีหนังสือที่ อสส ๑๑๑๓/ว๓๙๓ ลว.๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ให้กิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ ๖๘๙ ชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนการพิจารณาลงโทษเป็นผู้ทำงาน (ถ้ามี)	๑. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไปควรเช็คประวัติบริษัทผู้รับจ้างและสถานะของบริษัท ๒. กรณีได้รับรับจ้างมาแล้ว คณะกรรมการควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานควรดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่แบ่งตามสัญญา ๓. หากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา ควรเชิญผู้รับจ้างมาร่วมประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกันและควรมีรายงานการประชุมเพื่อให้รับรู้ทั้ง ๒ ฝ่าย ๔. หากยังดำเนินการล่าช้า สวนสัตว์ต้องดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยออกหนังสือเป็นหลักฐานทุกครั้ง

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
สวนสัตว์สงขลา ๑. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณน้ำตกสวนตุล ภายในสวนสัตว์สงขลา - วงเงิน ๓๘.๐๐๐๐ ล้านบาท - โดยบริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด	๑. องค์การสวนสัตว์ฯ ทำหนังสือแจ้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์และบอกเลิกสัญญา ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๑๓ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ๒. บริษัทฯ ได้ขอคัดค้านการบอกเลิกสัญญา ตามหนังสือเลขที่ CHR ๒๕๖๓/๐๑๐๒๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ๓. องค์การสวนสัตว์ฯ ได้ให้บริษัทชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๑๑๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๔. บริษัทฯ ทำหนังสือชี้แจงกลับองค์การฯ ตามหนังสือเลขที่ CHR ๒๕๖๔/๐๒๐๕๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๕. องค์การสวนสัตว์ฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงได้ทำหนังสือแจ้งกระทรวงการคลัง ตามหนังสือที่ ทส ๑๑๐๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัดcv เป็นผู้ทำงาน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากการกระทรวงการคลัง ๖. บริษัทฯ กรุงไทย จำกัด ชำระเงินตามสัญญาค้ำประกันของบริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด ฐานะลูกหนี้ร่วมให้ สวนสัตว์สงขลาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คจำนวน ๑,๙๔๐,๐๐๐ บาท ๗. องค์การสวนสัตว์ฯ มีหนังสือที่ ทส ๑๐๑๑/๑๕๐๘ ลว.๒๘ ธ.ค.๒๕๖๔ สอบถามผลการพิจารณา ให้บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด เป็นผู้ทำงานซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลังยังไม่มีหนังสือตอบกลับแจ้งให้เป็นผู้ทำงาน ๘. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาผู้ทำงานกรมบัญชีกลาง มีหนังสือที่ กค (อทง) ๐๔๐๕.๗/๑๕๒๕๑ ลว. ๒๘ เม.ย.๒๕๖๕ ขอให้พิจารณาค่าชี้แจงของบริษัทฯ และนายเกรียงไกรว่ารับฟังได้หรือไม่ อย่างไร พร้อมเหตุ พร้อมเหตุผลประกอบโดยละเอียดและขอให้รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งให้กรมบัญชีกลาง ๙. องค์การสวนสัตว์ฯ ได้นำส่งหนังสือพิจารณาค่าชี้แจงเหตุผลให้ บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด เป็นผู้ทำงาน ตามหนังสือที่ อสส ๑๑๐๕/๑๓๓๓ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕	๑. ควรมีการสำรวจสภาพพื้นที่ภายในสวนสัตว์ ก่อนการออกแบบและเสนอของบประมาณ ๒. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไปควรใช้คปรวัติบริษัทผู้รับจ้างและสถานะของบริษัท ๓. กรณีได้รับรับจ้างมาแล้ว คณะกรรมการควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานควรดำเนินการให้เป็นไปตามวงงวดงานที่แบ่งตามสัญญา ๔. หากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา ควรเชิญผู้รับจ้างมาร่วมประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกันและควรมีรายงานการประชุมเพื่อให้รับรู้ทั้ง ๒ ฝ่าย ๕. หากยังดำเนินการล่าช้า สวนสัตว์ต้องดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยออกหนังสือเป็นหลักฐานทุกครั้ง

๓.๒ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ มีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๑. ปรับปรุงอาคารสำนักงานสนาม งบประมาณ ๑.๒๐ ล้านบาท	ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว	
๒. ก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ และตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบพร้อมก่อสร้างเรือนเพาะขยายพันธุ์ งบประมาณ ๕.๘๕ ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว	
๓. ก่อสร้างถนนชั่วคราวแล้วรอบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ งบประมาณ ๘.๖๖ ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว	
๔. ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดปทุมธานี ในการสร้างสะพานบริเวณทางเข้าพื้นที่สวนสัตว์แห่งใหม่	อยู่ระหว่างดำเนินการได้ร้อยละ ๙๖ คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	
๕. ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๖.๘๒๕๑ ลบ. จำนวน ๖ งวดงาน - งบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๖.๐๐๐๐ ลบ. - งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๐.๘๒๕๑ ลบ.	๑. เบิกจ่ายงวดที่ ๑-๓ แล้ว จำนวน ๔๔.๐๔๗๕ ลบ. โดยใช้จาก งบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๖.๐๐๐๐ ลบ. งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๘.๐๔๗๕ ลบ. ๒. งานงวดที่ ๔ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยใช้จากงบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔๔.๐๔๗๕ ลบ. ๓. งานงวดที่ ๕ -๖ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานและแก้ไขจากคณะกรรมการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	เร่งรัดให้คณะกรรมการทุกชุดตรวจสอบ และสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ จังหวัดปทุมธานี

๑. ปรับปรุงอาคารสำนักงานสนาม งบประมาณ ๑.๒๐ ล้านบาท (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)



๒. ก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ และตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบพร้อมก่อสร้างเรือนเพาะขยายพันธุ์ งบประมาณ ๕.๘๕ ล้านบาท (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)



๓. งานก่อสร้างถนนชั่วคราวและรั้วรอบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

การดำเนินการ

บริษัท คัพเวอร์เทค จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ก่อสร้างถนนชั่วคราวและรั้วรอบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ เรียบร้อยแล้ว งานรั้วชั่วคราวระยะ ๓,๕๐๐ เมตร วงเงินรวมทั้งสิ้น ๘,๖๖๐,๐๐๐ บาท

ด้านทิศเหนือ



ด้านทิศใต้



ด้านทิศตะวันออก



ด้านทิศตะวันตก



๔. งานที่ได้รับการสนับสนุนจาก จ.ปทุมธานี

- งานก่อสร้างสะพานทางข้าม ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐%



ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่องเดิม

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๘๐๖.๓๑๓๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑. งบอุดหนุน จำนวน ๔๙๑.๖๗๐๓ ล้านบาท
๒. งบลงทุน จำนวน ๓๑๔.๖๔๒๗ ล้านบาท

การดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้เบิกจ่ายงบอุดหนุนรัฐบาล ได้ครบทุกรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับงบลงทุน เบิกจ่ายจำนวน ๑๔๘.๔๑๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๑๗ และได้กักเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑๖๖.๒๓๐๕ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑. ครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือรายการค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ จำนวน ๕.๑๐๖๐ ล้านบาท
๒. สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ ประกอบด้วย
 - ๒.๑ ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ จำนวน ๑๐๒.๗๗๗๖ ล้านบาท
 - ๒.๒ ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมี จำนวน ๑๑.๔๑๒๕ ล้านบาท
ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่
 - ๒.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์และอัตลักษณ์บริเวณส่วน
จัดแสดงสัตว์แอฟริกา ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน ๙.๓๑๕๖ ล้านบาท
 - ๒.๔ ปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว
(Welcome Center) ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน ๖.๒๕๐๐ ล้านบาท
 - ๒.๕ ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัสและส่วน
แสดงจระเข้ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน ๑๗.๓๖๘๘ ล้านบาท
 - ๒.๖ ก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวิน จำนวน ๓.๖๕๐๐ ล้านบาท
ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น
 - ๒.๗ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ
ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน ๑๐.๓๕๐๐ ล้านบาท

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

ข้อเสนอเพื่อทราบ

เพื่อโปรดทราบ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ยังมีรายการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ซึ่งได้แก่ รายการค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ และรายการค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 2564



ข้อมูล ณ 31 ส.ค.65

- ส่วนกลาง**
- 1.ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ สัญญาสิ้นสุด 15 ก.ค. 2565 มี 6 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว 1-4 งวดงาน จำนวน 88.0950 ลบ.
กันเหลื่อมเหลือเบิก งวดที่ 5-6 เป็นเงินจำนวน 58.7300 ลบ.
 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ สัญญาสิ้นสุด 16 ธ.ค.2564 กันเหลื่อมปี จำนวน 5.1060 ลบ.
เบิกจ่ายถึงเดือน เม.ย.2565 จำนวน 3.326 ลบ คงเหลือ 1.7800 ลบ.

ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

เลขที่สัญญาจ้าง	๑๑/๒๕๖๔ วงเงิน ๑๔๖,๘๒๕,๑๐๐ บาท งบปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๐,๘๒๕,๑๐๐ บาท
ระยะเวลาดำเนินการ	๕๔๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ผู้รับจ้าง	บริษัท ดีไซน์+วิเวลลอป จำกัด

การดำเนินงาน

๑. งานงวดที่ ๑ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีการเบิกจ่ายแล้วเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๗,๓๔๑,๒๐๐ บาท

๑.๑ แบบแนวความคิดหลัก (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A ๑ จำนวน ๓ ชุด
๑.๒ แบบแนวความคิดหลัก (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A ๑ จำนวน ๑๐ ชุด
๑.๓ แบบแนวความคิดหลัก (ปิดบนกระดาษแข็ง)	ขนาด A ๑ จำนวน ๑ ชุด
๑.๔ แบบแนวความคิดหลัก (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A ๓ จำนวน ๓ ชุด
๑.๕ แบบแนวความคิดหลัก (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A ๓ จำนวน ๑๐ ชุด
๑.๖ รายงานเบื้องต้น (Inception Report) (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A ๓ จำนวน ๓ ชุด
๑.๗ รายงานเบื้องต้น (Inception Report) (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A๓ จำนวน ๑๐ ชุด

๒. งานงวดที่ ๒ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีการเบิกจ่ายแล้วเมื่อกันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๑๔,๖๘๒,๕๑๐ บาท

๒.๑ แบบร่างขั้นต้น (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A๓	จำนวน ๓ ชุด
๒.๒ แบบร่างขั้นต้น (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A๓	จำนวน ๑๐ ชุด

๓. งานงวดที่ ๓ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีการเบิกจ่ายแล้วเมื่อกันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๒๒,๐๒๓,๗๖๕ บาท



๓.๑ แบบร่างขั้นพัฒนา (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A๓	จำนวน ๓ ชุด
๓.๒ แบบร่างขั้นพัฒนา (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A๓	จำนวน ๑๐ ชุด
๓.๓ รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A๔	จำนวน ๕ ชุด
๓.๔ เอกสารแบบรูปรายการและการประมาณราคา เพื่อยื่นของบประมาณ (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A๔	จำนวน ๑ ชุด
๓.๕ เอกสารแบบรูปรายการและการประมาณราคา เพื่อยื่นของบประมาณ (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A๔	จำนวน ๔ ชุด



๔. งานงวดที่ ๔ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีการเบิกจ่ายแล้วเมื่อมิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงินจำนวน ๔๔,๐๔๗,๕๓๐ บาท ประกอบด้วย

๔.๑ แบบรายละเอียดรายการก่อสร้าง

๔.๒ รายละเอียดประกอบแบบ บัญชีงานก่อสร้าง ราคากลาง ครอบคลุมรวมทุกสาขา



๕. งานงวดที่ ๕ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๕ ประกอบด้วย รายละเอียดประกอบแบบ (Specifications) บัญชีงานก่อสร้าง (Bill of Quantities) และราคากลางครอบคลุมรวมทุกสาขา

๖. งานงวดที่ ๖ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๕ ประกอบด้วย แบบทัศนียภาพจำลองขั้นสุดท้าย (Final ๓D Rendering Image) และภาพเคลื่อนไหวขั้นสุดท้าย (Final Animation) และหุ่นจำลอง (Model)

การดำเนินงานอยู่ระหว่างการคณะกรรมการตรวจรับงาน และแก้ไขงานงวดที่ ๕ -๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕



ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจากมีคณะกรรมการ ที่กำกับดูแลหลายชุด และมีความเห็นที่แตกต่างกัน จึงต้องใช้ระยะเวลา ในการสรุป
แนวความคิด

แนวทางแก้ไข

เร่งรัดให้คณะกรรมการทุกชุดตรวจสอบและสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินงานรายได้ ค่าใช้จ่าย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่องเดิม

๑. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เสนอแผนปฏิบัติการด้านการเงิน (เงินนอกงบประมาณ) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

๑.๑ ประมาณการรายได้ จำนวน ๒๙๕.๑๘๒๐ ล้านบาท

๑.๒ ประมาณการรายจ่าย จำนวน ๓๙๓.๖๓๗๖ ล้านบาท

๒. ในคราวประชุมคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีมติที่ประชุมดังนี้

๒.๑ อนุมัติแผนปฏิบัติการด้านการเงิน (เงินนอกงบประมาณ) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๒ อนุมัติให้ใช้เงินสะสมองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จำนวน ๑๘๖.๒๙๐๐ ล้านบาท กรณีเพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานในส่วนที่รายได้ (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่าย และกรณีเกิดรายได้ไม่เป็นไปตามแผน จากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-๑๙

ข้อเท็จจริง

๑. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดทำแผนรายได้ และค่าใช้จ่ายแยกเป็นรายเดือน โดยผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้อนุมัติแผนรายได้ และค่าใช้จ่าย เพื่อให้สำนัก สวนสัตว์ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้มีรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านการเงิน

๒. รายงานงบการเงินได้ผ่านการสอบทานจากสำนักตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕

ผลการดำเนินงาน

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ขอรายงานผลการดำเนินงาน รายได้ ค่าใช้จ่าย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

	แผน	ผล	สูง (ต่ำ) กว่าแผน	หน่วย : ล้านบาท
๑. รายได้	๒๖.๒๗	๓๗.๐๐	๑๐.๗๓	
๒. รายจ่าย	๗๓.๕๐	๗๒.๗๓	(๐.๗๗)	
(ค่าใช้จ่าย งบรัฐบาล+องค์การ)				

ข้อเสนอเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานรายได้ ค่าใช้จ่าย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม




๔.๔ รายงานผลการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
แบบสะสม ๑๑ เดือน ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง สิงหาคม ๒๕๖๕

การดำเนินงาน

สวนสัตว์เชียงใหม่ ขอรายงานผลการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แบบสะสม ๑๑ เดือน ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง สิงหาคม ๒๕๖๕ สรุปได้ ดังนี้ (ข้อมูลเบื้องต้น)

รายการ	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	รวม
รายได้ดำเนินงาน	1.161	0.891	2.678	2.555	1.513	1.690	2.802	2.534	2.441	4.027	2.980	25.272
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2.655	2.904	2.908	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999	32.459
รายได้ สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	- 1.494	- 2.013	- 0.230	- 0.444	- 1.486	- 1.309	- 0.197	- 0.465	- 0.558	1.028	- 0.019	- 7.187
ผู้เข้าชม (คน)	9,896	7,469	22,802	21,698	12,831	14,480	23,867	21,650	20,573	34,349	25,728	215,343

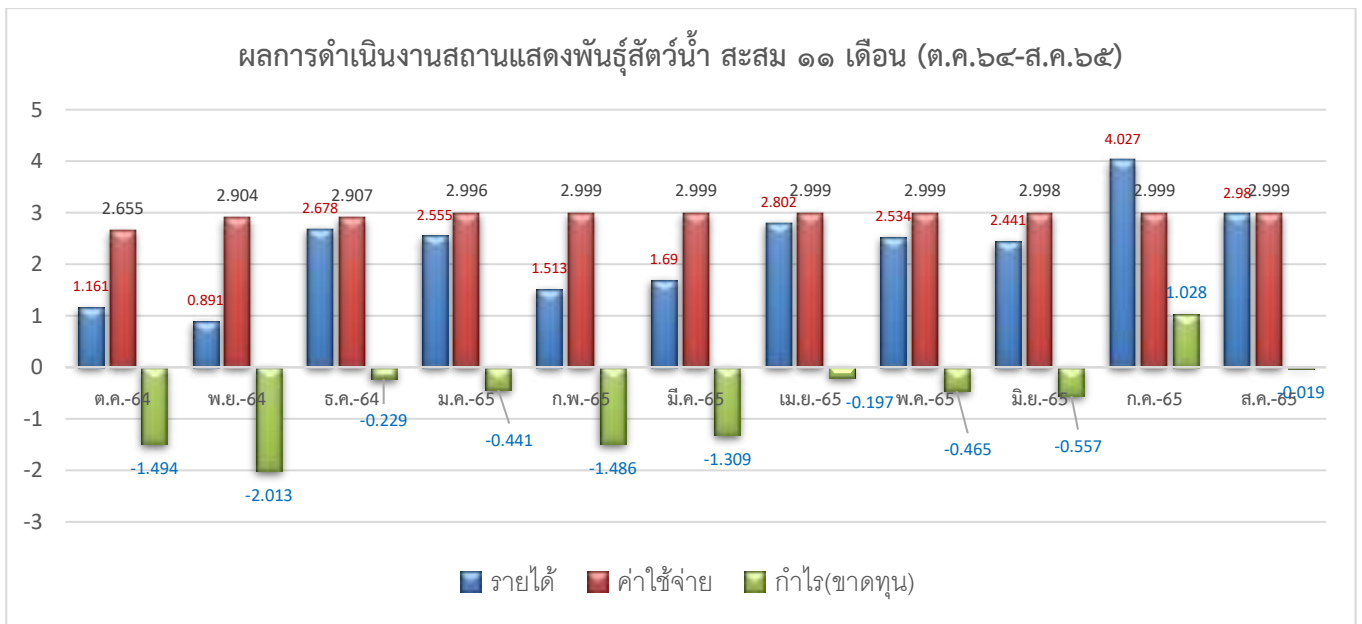

ผลการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ แบบสะสม ๑๑ เดือน ในภาพรวมมีรายได้ดำเนินงานเกิดขึ้น จำนวน ๒๕.๒๗๒ ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ที่มาจาก การจองเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานสะสม ๑๑ เดือน เกิดขึ้นจำนวน ๓๒.๔๕๙ ล้านบาท โดยเฉลี่ยเดือนละ ๓ ล้านบาท (๓๖ ล้านบาทต่อปี) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างเหมา ๑๖.๔๗๘ ล้านบาท ค่าจ้างบริหาร ๗.๖๕๐ ล้านบาท และค่าไฟฟ้า ๔.๕๒๐ ล้านบาท ค่าอาหารสัตว์น้ำ ๑.๙๖๓ ล้านบาท ค่าก๊าซ LPG ๑.๓๐๙ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๐.๕๓๙ ล้านบาท

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ ผลการดำเนินงานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แบบสะสม ๑๑ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง สิงหาคม ๒๕๖๕) ข้อมูลเบื้องต้น

มติที่ประชุม

๔.๕ รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่องเดิม

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้รับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับการพิจารณากรอบเงินทั้งสิ้น จำนวน ๗๐๘.๐๒๖๕ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑. งบบุคลากร	๑๘๑.๙๓๗๕	ล้านบาท
๒. งบอุดหนุน	๒๒๓.๙๘๒๐	ล้านบาท
๓. งบลงทุน	๓๐๒.๑๐๗๐	ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	<u>๗๐๘.๐๒๖๕</u>	ล้านบาท

การดำเนินงาน

สำนักงานเงินและทรัพย์สิน ได้ดำเนินการรวบรวมแผน และผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวม ๕๔ รายการ วงเงิน ๓๐๒,๑๐๗,๐๐๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย

- | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|------------------------|
| ๑ | ครุภัณฑ์ | จำนวน ๔๑ รายการ | วงเงิน ๓๓,๔๔๕,๑๐๐ บาท |
| | ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๔๑ รายการ | | |
| ๒ | สิ่งก่อสร้าง | จำนวน ๑๓ รายการ | วงเงิน ๒๖๘,๖๖๑,๙๐๐ บาท |
| | ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๑๓ รายการ | | |
- (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)


ข้อเสนอเพื่อทราบ

เพื่อโปรดทราบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหมวดรายจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รายงานสถานภาพตามกระบวนการพัสดุ ของงบลงทุน
รายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2565 จำนวน 13 รายการ

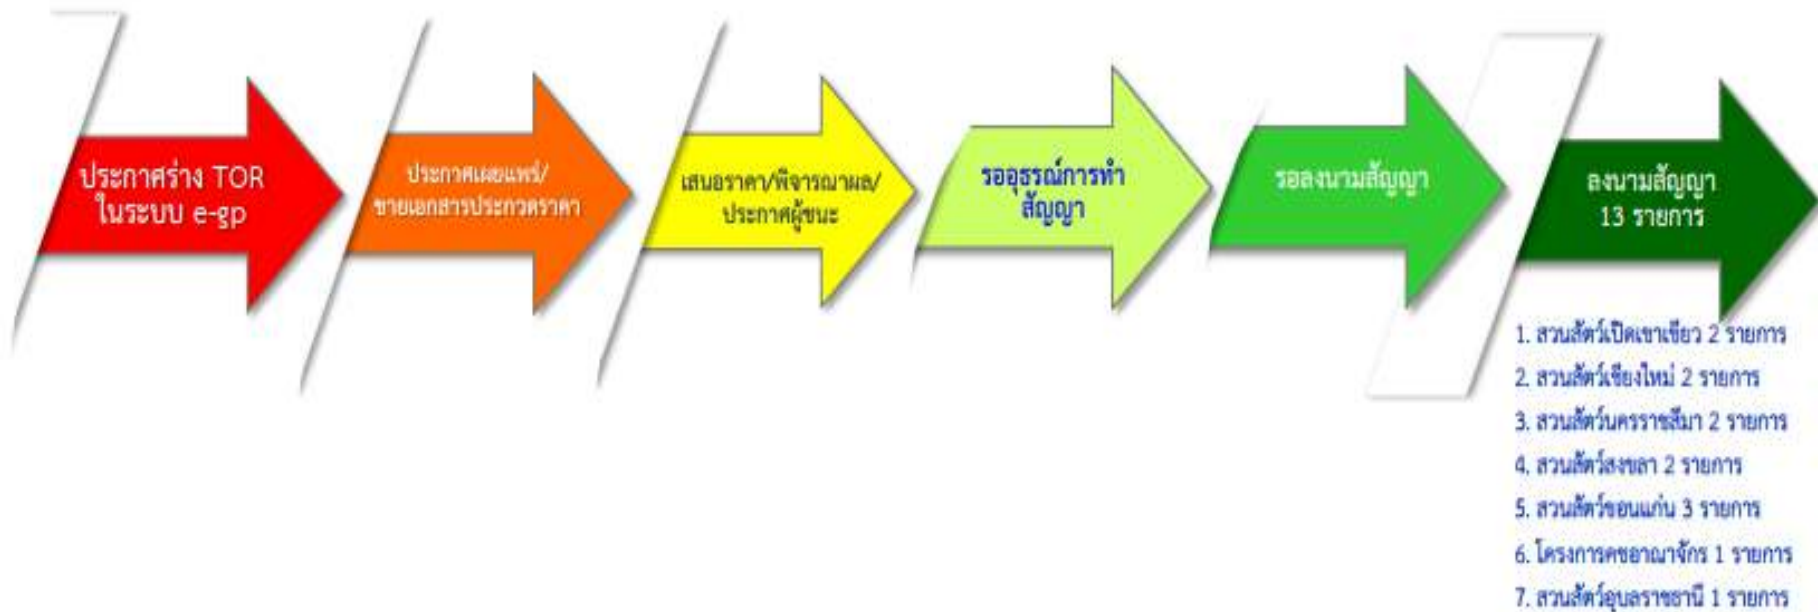

รายงานสถานภาพตามกระบวนการพัสดุ ของงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ ประจำปี 2565 จำนวน 41 รายการ



รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



รายการ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย /GFMS	คิดเป็น (%)	คงเหลือ
1. งบอุดหนุน	405.9195	405.9195	100.00	-
2. งบลงทุน	302.1070	180.0385	59.59	122.0685
* ครุภัณฑ์	33.4451	26.3011	78.64	7.1440
* สิ่งก่อสร้าง	268.6619	153.7374	57.22	114.9245
รวมทั้งสิ้น	708.0265	585.9580	82.76	122.0685

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

ณ 31 สิงหาคม 2565

ที่	โครงการลงทุน	จำนวน (งวดงาน)	เบิกจ่าย แล้ว	ร้อยละ ของงวดงาน	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่ายคิด เป็นร้อยละ
1	เตาเผาซาก สขข.	2	2	100.00	4,750,000	4,750,000.00	100.00
2	อาคาร ฝ.อว.และอนุบาลสัตว์ สขม.	3	3	100.00	1,945,000	1,945,000.00	100.00
3	ส่วนแสดงแนวน้ำ สขก.	4	4	100.00	14,567,000	14,567,000.00	100.00
4	โรงพยาบาลสัตว์ สขก.	3	3	100.00	7,979,000	7,979,000.00	100.00
5	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระฯ สสร.	5	5	100.00	11,969,000	11,969,000.00	100.00
6	โครงข่ายท่อน้ำทิ้งฯ สขม.	10	6	60.00	29,880,000	17,928,000.00	60.00
7	ระบบสาธารณูปโภค สนม.	5	3	60.00	9,950,000	5,500,000.00	55.28
8	อาณาจักรผู้ล่า สนม.	5	3	60.00	24,970,000	13,770,000.00	55.15
9	ส่วนแสดงสมเสร็จฯ สสข.	7	4	57.14	16,480,000	7,910,400.00	48.00
10	ปรับปรุงถนนแนวรั้วฯ สขข.	6	3	50.00	29,915,000	14,700,000.00	49.14
11	อาณาจักรนักล่า สขก.	4	2	50.00	14,990,000	6,933,831.71	46.26
12	ส่วนแสดงสัตว์แอฟริกา สอบ.	6	2	33.33	53,498,000	21,399,200.00	40.00
13	โรงพยาบาลสัตว์ สสข.	9	2	22.22	30,367,441	6,984,511.00	23.00
	ภาพรวมตามงวดงาน			68.67	251,260,441	136,335,942.71	54.26

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการดำเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ส่วนกลาง)

ครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ลำดับที่ ๑-๗ ดังนี้

- | | |
|--|-----------------------|
| ๑. กล้องถ่ายภาพระบบ wifi สำหรับกล้องจุลทรรศน์ | งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท |
| ๒. ตู้เก็บบล็อกลูกพาราฟิน ๒ ตู้ | งบประมาณ ๑๔๕,๒๐๐.-บาท |
| ๓. ตู้เก็บแผ่นกระจกสไลด์ ๑ ตู้ | งบประมาณ ๘๐,๒๕๐.-บาท |
| ๔. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงในไมโครเพลท | งบประมาณ ๔๐๖,๖๐๐.-บาท |
| ๕. เครื่องตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ | งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.-บาท |
| ๖. เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพในสัตว์ | งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐.-บาท |
| ๗. ตู้เย็นแช่น้ำยา | งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐.-บาท |
| ๘. โครงการระบบบริหารจัดการสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (Thai Zoo Ark) งบประมาณ ๓,๙๐๐,๐๐๐.-บาท | |
| สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๕ เริ่ม ๑๐ พ.ย.๖๔ - ๗ ส.ค.๖๕ (มีการขยายเวลาการเบิกจ่ายถึงวันที่ ๑๖ ก.ย.๒๕๖๕)
เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด เป็นเงินจำนวน ๒,๓๔๐,๐๐๐ บาท | |
| ๙. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-ticket) งบประมาณ ๖,๙๘๐,๐๐๐.-บาท | |
| เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด เป็นเงินจำนวน ๑,๓๙๖,๐๐๐ บาท งวดงานที่ ๒ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานจากคณะกรรมการ | |

งบประมาณปี ๒๕๖๕

เครื่องปั่นเหวี่ยงฮีมาโตคริต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ๑ เครื่อง

เลขที่สัญญาจ้าง

๓/๒๕๖๕ วงเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มสัญญา ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

ผู้ขาย

บริษัท กิบทไทย จำกัด

การดำเนินงาน

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว



เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วรอบต่ำ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ๑ เครื่อง

เลขที่สัญญาจ้าง

๒/๒๕๖๕ วงเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มสัญญา ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

ผู้ขาย

บริษัท กิบทไทย จำกัด

การดำเนินงาน

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว



ตู้แช่แข็ง -๔๐ องศาเซลเซียส สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ๑ เครื่อง
เลขที่สัญญาจ้าง ๑/๒๕๖๕ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มสัญญา ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕
ผู้ขาย บริษัท กิ๊ปไทย จำกัด
การดำเนินงาน เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว



เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบทศนิยม ๓ ตำแหน่ง สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ๑ เครื่อง
เลขที่สัญญาจ้าง ๔/๒๕๖๕ วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มสัญญา ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕
ผู้ขาย บริษัท กิ๊ปไทย จำกัด
การดำเนินงาน เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว



สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ สูบ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ

ไม่ต่ำกว่า ๗,๗๐๐ ซีซี กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า แบบกระเบเหล็ก พร้อมติดเครนไฮดรอลิค

เลขที่สัญญาจ้าง	๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงิน ๒,๘๓๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินการ	เริ่มวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ หมดสัญญาจ้าง วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๙๐ วัน ขยายระยะเวลา ๓๐ วัน จากสิ้นสุดวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุด ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ผู้รับจ้าง	บริษัท ทวีโชค ทรัค แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด
การดำเนินงาน	แบ่งงานออกเป็น ๑ งวด งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) ตรวจรับงานวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๓๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐% รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ สูบ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๗,๗๐๐ ซีซี กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า แบบกระเบเหล็ก พร้อมติดเครนไฮดรอลิค



งบประมาณปี 2565

งานก่อสร้างปรับปรุงถนนแนวรั้ว และสิ่งอำนวยความสะดวก ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

เลขที่สัญญาจ้าง 7/2565 วงเงินก่อสร้าง 29,915,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มทำงานวันที่ 30 ธันวาคม 2564 หมดสัญญาจ้าง วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ระยะเวลา 240 วัน
ผู้รับจ้าง บริษัท พี.เอ.ไอ ซัพพลาย จำกัด
การดำเนินงาน แบ่งงานออกเป็น 7 งวด ได้ดำเนินการเบิกเงินเรียบร้อยแล้วสำหรับงานงวดที่ 1-3
รายงานตั้งแต่ วันที่ 1 - 7 กันยายน 2565

งานงวดที่ 4 จำนวนเงิน 5,500,000 บาท

กำหนดส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง งวดที่ 4 วันที่ 2 มิถุนายน 2565

งวดที่ 4 การดำเนินงานแล้ว 85%

งานติดตั้งรั้วเหล็กไวร์เมช ไปแล้ว 1,850 เมตร จากทั้งหมด 2,000 เมตร



งานปรับปรุงพื้นที่+ติดตั้งขอบคันหิน งานพื้นแอสฟัลต์คอนกรีตพิมพ์ลาย ภายนอก ทั้งหมด



งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลภายนอก ทั้งหมด



งานงวดที่ 5 จำนวนเงิน 3,200,000 บาท

กำหนดส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง งวดที่ 5 วันที่ 25 มิถุนายน 2565

งวดที่ 5 การดำเนินงานแล้ว 90%

งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน

งานติดตั้งผนัง



งาน ครุภัณฑ์ สำนักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้



งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ



ปัญหาและอุปสรรค

- 1.วัสดุ ก่อสร้างที่ทางผู้รับจ้างสั่งซื้อต้องรอผลิตของจากทางร้านค้าจัดส่ง
- 2.ฝนตกหนักเกือบทุกวันส่งผลทำให้งานล่าช้า เนื่องจาก ก่อสร้างกลางแจ้ง
- 3.ปัญหาเกิดจากคนงาน และร้านขายวัสดุบางร้านติดเชื้อโควิด-19 ต้องกักตัวตามมาตรการควบคุมโรค
- 4.พื้นที่ก่อสร้าง อยู่ในจุดที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่น จึงมีปัญหา และผลกระทบ ของการใช้เครื่องมือ และเครื่องจักรหนัก ในการทำงาน อย่างระมัดระวัง
- 5.ระบบไฟฟ้าในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ดับบ่อย

แนวทางแก้ไข

- 1.ทางผู้รับจ้างจะดำเนินการจัดหาวัสดุให้เพียงพอต่อหน้างาน
- 2.ผู้รับจ้างเพิ่มกำลังแรงงานคน และทำงานล่วงเวลา โอะที หลัง 17.00 – 22.00 น.
- 3.ดำเนินงาน งานงวด 4 - 6 ในสัญญาจ้าง ไปพร้อมๆกัน

การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ

จัดทำหนังสือเร่งรัดการทำงานให้แล้วเสร็จตามที่ระบุในสัญญาจ้าง พร้อมนัดประชุมติดตามงานทุก 15 วัน กับ ทางผู้รับจ้าง บริษัท พี.เอ.ไอ ซัพพลาย จำกัด พร้อมให้ทางผู้รับจ้างจัดเอกสารแผนงานแล้วเสร็จ และชี้แจงเหตุผลปัญหา อุปสรรค กรณีที่ไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง พร้อมแนวทางแก้ไข

แผนงานทางผู้รับจ้าง นำเสนอ

- งวดที่ 4 จะแล้วเสร็จภายใน วันที่ 21 กันยายน 2565
- งวดที่ 5 จะแล้วเสร็จภายใน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
- งวดที่ 6 จะแล้วเสร็จภายใน วันที่ 7 มกราคม 2566
- งวดที่ 7 (สุดท้าย) จะแล้วเสร็จภายใน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่องดำเนินการคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0

เนื่องด้วยทางบริษัท พี.เอ.ไอ ซัพพลาย จำกัด ได้ทำหนังสือ ขอสงวนสิทธิคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 ตาม หนังสือที่ ว 693 และ ว 645 และทางคณะกรรมการฯตรวจสอบตามเอกสารประกอบว่าบริษัท พี.เอ.ไอ ซัพพลาย จำกัด ได้ สืบหาหลักฐานและเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือคู่สัญญา ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ

ความคิดเห็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรื่องคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาตามและหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว.693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เรื่อง มาตรการให้ความ ช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ซึ่งผู้ประกอบการเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การให้ความช่วยเหลือ ข้อ 1.2.3 สัญญาฯ ที่ได้ลงนามลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่โดยสัญญาฯ ดังกล่าว ครบกำหนดหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงาน งวดเดียวหรือยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากสัญญาฯดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นให้นับจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญาฯแล้ว ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญาฯจนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติและหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 645 ลงวันที่ 21 มิถุนายน ๒๕๖๕เรื่อง มาตรการ

ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค (กวจ) 0405.2/ว. 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 กรณีที่มีการขอขยายระยะเวลาตามสัญญา โดยมีสาเหตุเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 หรือโรคโควิด 19 (COVID -19) ถือเป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งการพิจารณาการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขอขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีระยะเวลาสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ดังนั้น ผู้ประกอบการได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 182 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือคู่สัญญาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 และด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว 645 ข้อ 2 สัญญาที่ลงนามหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563

สรุป ทางบริษัท พี.เอ.ไอ ซัพพลาย จำกัด ได้สิทธิ์คิดค่ารับในอัตราร้อยละ 0 เป็นจำนวน 184 วัน นับตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

งบประมาณปี ๒๕๖๕

งานก่อสร้างเตาเผาซากสัตว์ปลอดมลพิษพร้อมปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

เลขที่สัญญาจ้าง	๖/๒๕๖๕ วงเงินก่อสร้าง ๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท
ระยะเวลาดำเนินการ	เริ่มทำงานวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ หหมดสัญญาจ้างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๑๕๐ วัน
ผู้รับจ้าง	บริษัท ทิมเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
การดำเนินงาน	แบ่งงานออกเป็น ๒ งวด
รายงานตั้งแต่	วันที่ ๑ - ๗ เมษายน ๒๕๖๕
ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐%	
งวดที่ ๑	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย)	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

งานก่อสร้างเตาเผาซากสัตว์ปลอดมลพิษ ขนาด ๓๐๐ กก. / ๒๔ ชม. (ชนิดแก๊ส)

- งานติดตั้งระบบ Gas station พร้อมตู้ควบคุม เตาเผาซากสัตว์



- งานทดสอบระบบ เตาเผาซากสัตว์



สวนสัตว์เชียงใหม่ งบประมาณปี ๒๕๖๕

งานปรับปรุงอาคารฝ่ายอนุรักษ์และวิจัย พร้อมอาคารอนุบาลลูกสัตว์ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่
ระยะเวลาดำเนินงาน : ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
สถานะการดำเนินงาน : แบ่งงานออกเป็น ๓ งวด ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วทั้ง ๓ งวดงาน
ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐%



งบประมาณปี ๒๕๖๕
งานก่อสร้างโครงข่ายท่อน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสีย
เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่
ประจำปีเดือน สิงหาคม 2565

ระยะเวลาดำเนินงาน : 8 กุมภาพันธ์ 2565 – 4 ธันวาคม 2565

สถานะการดำเนินงาน : แบ่งงานออกเป็น 10 งวด งวดที่ 1-5 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 6 และงวดที่ 8 บางส่วน ดังนั้น งานแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 55 ของปริมาณงานทั้งหมด ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังเร่งดำเนินการเปิดหน้างานในส่วนถนนเส้นทางสัญจรหลักท้องเที่ยว เพื่อให้งานแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนปรับแก้ไข

งวดงานที่	จำนวนเงิน	สถานะการเบิกจ่าย
1	2,988,000	☑ เบิกจ่ายแล้ว
2	2,988,000	☑ เบิกจ่ายแล้ว
3	2,988,000	☑ เบิกจ่ายแล้ว
4	2,988,000	☑ ส่งเบิก อสส.แล้ว
5	2,988,000	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
6	2,988,000	
7	2,988,000	
8	2,988,000	
9	2,988,000	
10	2,988,000	
รวม	29,880,000	







ครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

๒.๑ ซื้อเครื่องอัลตราชาวดแบบพกพาสำหรับสัตว์ป่า จำนวน ๑ เครื่อง

วงเงิน/สัญญา (บาท)	งวดงาน (จำนวน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วันที่ เริ่มสัญญา	วันที่ สิ้นสุดสัญญา	สถานะ
๑,๔๕๓,๒๐๐.-	๑ งวด	๑๒๐ วัน	๒๑ ต.ค. ๖๔	๑๘ ก.พ ๖๕	- ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๒.๒ ซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล พร้อมเครื่องเอกซเรย์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง

วงเงิน/สัญญา (บาท)	งวดงาน (จำนวน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วันที่ เริ่มสัญญา	วันที่ สิ้นสุดสัญญา	สถานะ
๑,๗๙๘,๐๐๐.-	๑ งวด	๑๒๐ วัน	๒๙ ต.ค. ๖๔	๒๖ ก.พ ๖๕	- ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๒.๓ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (cab)

วงเงิน/สัญญา (บาท)	งวดงาน (จำนวน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วันที่ เริ่มสัญญา	วันที่ สิ้นสุดสัญญา	สถานะ
๖๔๔,๐๐๐.-	๑ งวด	๖๐ วัน	๑๒ ต.ต ๖๔	๑๑ ธ.ค. ๖๔	- ดำเนินการส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้วและขออนุมัติเบิกเงินไปยัง อสส.



๒.๒ ซื้อถังเก็บน้ำบนดิน โพลีเมอร์ ขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร สวนสัตว์เชียงใหม่ ๑๐ ใบ

วงเงิน/ซื้อ (บาท)	งวดงาน (จำนวน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วันที่ เริ่มสัญญา	วันที่ สิ้นสุดสัญญา	สถานะ
๗๗,๐๐๐.-	๑ งวด	๗ วัน	๗ ต.ต ๖๔	๑๓ ต.ต ๖๔	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว



๒.๓ ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๔๘,๐๐๐ บีทียู สำหรับคอกกักหมัแพนด้า

วงเงิน/ซื้อ (บาท)	งวดงาน (จำนวน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วันที่ เริ่มสัญญา	วันที่ สิ้นสุดสัญญา	สถานะ
๖๕,๒๕๐.-	๑ งวด	๓๐ วัน	๗ ต.ต ๖๔	๓๐ พ.ย. ๖๔	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว



๒.๒ ซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิทัล พร้อมเครื่องเอกซเรย์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง

วงเงิน/สัญญา (บาท)	งวดงาน (จำนวน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วันที่ เริ่มสัญญา	วันที่ สิ้นสุดสัญญา	สถานะ
๑,๗๙๘,๐๐๐.-	๑ งวด	๑๒๐ วัน	๒๙ ต.ค. ๖๔	๒๖ ก.พ ๖๕	- ดำเนินการส่งมอบพัสดุและ เบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



งานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา

๑. งานก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา

ผู้รับจ้าง บริษัท เอส.ยู.แพค. จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ ๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วงเงินสัญญาจ้าง จำนวนเงิน ๙,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เริ่มดำเนินงาน

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕ งวด จำนวน ๒๔๐ วัน

และผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขอลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วง

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาลงมติ

ผลการดำเนินงาน

งวดที่ ๑ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ ๔

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ดังรายการต่อไปนี้

๑. งานทางเดินทางเข้าอาคาร Welcome Center แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๒. งานวางท่อระบายน้ำ Dia.๖๐ cm แล้วเสร็จ ๑๐๐%

พร้อมบ่อพักและฝาปิด บริเวณใต้ทางเดินเท้าทางเข้าอาคาร Welcome Center

การดำเนินงานงวดที่ ๔ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

๑. งานทางเดินทางเข้าอาคาร Welcome Center แล้วเสร็จ ๐%

๒. งานวางท่อระบายน้ำ Dia.๖๐ cm แล้วเสร็จ ๔๐%

พร้อมบ่อพักและฝาปิด บริเวณใต้ทางเดินเท้าทางเข้าอาคาร Welcome Center

ปัญหาและอุปสรรค

งานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานเนื่องจากแรงงานไม่เพียงพอและเข้าฤดูฝน

แนวทางแก้ไขปัญห

๑. สวนสัตว์นครราชสีมา โดยคณะกรรมการควบคุมงาน,คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและงานพัสดุ ได้ออกหนังสือเชิญผู้รับจ้างประชุมร่วมปรึกษาหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค จำนวน ๒ ครั้ง

๒. สวนสัตว์นครราชสีมา จัดส่งหนังสือเร่งรัดงานไปแล้ว ๖ ครั้ง

๓. ให้กรรมการควบคุมงานไปดูแลกำกับพื้นที่ก่อสร้างในทุกๆวันอย่างเคร่งครัด

๔. ผู้รับจ้างจะปรับแผนงานในส่วนของการทำงานล่วงหน้าเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

๕. คาดว่าจะส่งงานงวดที่ ๔ ประมาณวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

รูปภาพประกอบงานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เขตที่ 4





งานก่อสร้างอาคารจักรผู้ล่า ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา

ผู้รับจ้าง บริษัท เอส.ยู.แพค. จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วงเงินสัญญาจ้าง จำนวนเงิน ๒๔,๙๗๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เริ่มดำเนินงาน ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕ งวด จำนวน ๒๔๐ วัน ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขอลดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาขอลด

ผลการดำเนินงาน

1. งานงวดที่ 1 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2. งานงวดที่ 2 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
3. งานงวดที่ 3 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
4. งานงวดที่ 4 อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4
- ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย)

งานงวดที่ 5(งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังรายการต่อไปนี้

5.1 งานปรับปรุงอาคารคอกกักไถ่ขี้เถ้า	แล้วเสร็จ 100%
5.2 งานสะพานทางเดินชมสัตว์ไถ่ขี้เถ้า	แล้วเสร็จ 100%
5.3 งานติดตั้งเครื่องเล่นสำหรับสัตว์	แล้วเสร็จ 100%
5.4 งานระบบ รวบรวมไฟฟ้าและสปริงเกอร์	แล้วเสร็จ 100%
5.5 งานพื้นลานและทางเดิน คสล.พิมพ์ลาย	แล้วเสร็จ 100%
5.6 งานปรับปรุงคอกกักช้างแอฟริกา	แล้วเสร็จ 100%
5.7 งานกำแพงกั้นส่วนแสดงช้างแอฟริกา	แล้วเสร็จ 100%
5.8 งานอื่นๆที่ปรากฏในรูปแบบรายการทั้งหมด	แล้วเสร็จ 100%

ณ วันที่ 7 กันยายน ๒๕๖๕ ดำเนินงานบ้าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

5.1 งานปรับปรุงอาคารคอกกักไหย่น้ำ	แล้วเสร็จ	10%
5.2 งานสะพานทางเดินชมสัตว์ไหย่น้ำ	แล้วเสร็จ	20%
5.3 งานติดตั้งเครื่องเล่นสำหรับสัตว์	แล้วเสร็จ	0%
5.4 งานระบบ รั้วไฟฟ้าและสปริงเกอร์	แล้วเสร็จ	20%
5.5 งานพินดานและทางเดิน คสล.พิมพ์ลาย	แล้วเสร็จ	100%
5.6 งานปรับปรุงคอกกักช้างแอฟริกา	แล้วเสร็จ	20%
5.7 งานกำแพงกันส้วมแสดงช้างแอฟริกา	แล้วเสร็จ	20%
5.8 งานอื่นๆที่ปรากฏในรูปแบบรายการทั้งหมด	แล้วเสร็จ	10%

ปัญหาและอุปสรรค

ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน เกิดความล่าช้า เนื่องจากแรงงานไม่พอเพียงในการปฏิบัติงาน เข้าฤดูฝน

แนวทางแก้ไข้ปัญหา

1. ส่วนสัตว์นครราชสีมา โดยคณะกรรมการควบคุมงาน,คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและงานพัสดุได้ทำหนังสือเชิญผู้รับจ้างร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไข จำนวน 2 ครั้ง
2. ส่วนสัตว์นครราชสีมา จัดทำหนังสือเร่งรัดงานครั้งที่ 3
3. ส่วนสัตว์นครราชสีมา จัดทำหนังสือเร่งรัดงานงวดที่ 4 ไปยังผู้รับจ้าง จำนวน 2 ครั้ง
4. ส่วนสัตว์นครราชสีมา จัดทำหนังสือเร่งรัดงานงวดที่ 5 ไปยังผู้รับจ้าง ครั้งที่ 1
5. ผู้รับจ้างจะปรับแผนงานในส่วนของการทำงานล่วงหน้าเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
6. คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) 26 กันยายน 2565

รูปภาพประกอบงานก่อสร้างส่วนแสดงอาณาจักรผู้ล่า





รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ สวนสัตว์สงขลา


ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๖ รายการ

ครุภัณฑ์ รายการที่ ๑ รถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

ผู้ขาย บริษัท พิชานพาณิชย์ จำกัด สัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ครอบคลุมส่งมอบภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนาม ๑,๓๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. ๑๑๑๕/๑๓๒๓ ลว. ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔



ครุภัณฑ์ รายการที่ ๒ เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพสำหรับสัตว์ จำนวน ๑ เครื่อง

ผู้ขาย ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง สัญญาเลขที่ ๐๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครอบคลุมส่งมอบภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนาม ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. ๑๑๑๕/๖๙ ลว. ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

ครุภัณฑ์ รายการที่ ๓ คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด

ผู้ขายร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง สัญญาเลขที่ ๐๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครอบคลุมส่งมอบภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนาม ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. ๑๑๑๕/๖๘ ลว. ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕



ครุภัณฑ์ รายการที่ ๔ เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า

ผู้ขาย ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง สัญญาเลขที่ ๐๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครอบกำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนาม ๘๘,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. ๑๑๑๕/๗๑ ลว. ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕



ครุภัณฑ์ รายการที่ ๕ เครื่องติดตามและบันทึกค่าคาร์บอนไดออกไซด์ทางเดินหายใจ แบบแมนสตรัม จำนวน ๑ เครื่อง

ผู้ขาย ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง สัญญาเลขที่ ๐๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครอบกำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนาม ๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. ๑๑๑๕/๗๐ ลว. ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕



ครุภัณฑ์ รายการที่ ๖ เครื่องบันทึกและติดตาม ปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจรสำหรับสัตว์
จำนวน ๑ เครื่อง

ผู้ขาย ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง สัญญาเลขที่ ๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครอบกำหนดส่งมอบ
ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนาม ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส. ๑๑๑๕/๗๒ ลว. ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕



รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ สวนสัตว์สงขลา

สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ

๑. งานปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา

สัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

วงเงิน ๓๐,๓๖๗,๔๔๐.๗๓ บาท (สามสิบล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทสามสตางค์)

ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มงานวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ และครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จในสัญญาวันที่

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๗๐ วัน

จำนวนงวดงาน ๙ งวด

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรแสงวิศวกรรม

ผลการดำเนินงาน

งวดที่ ๑ เบิกเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ เบิกเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ เบิกเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

งวดที่ 4 ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน (วันที่ 18 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2565) ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

4.1 งานภูมิทัศน์ อาคารชั้นสูตรซากและเตาเผาซาก **แล้วเสร็จ 0 %** ประกอบด้วย

- งานหัดดาแสงดวงตาข่าย 1 นิ้ว และงานประตู - หน้าต่าง **แล้วเสร็จ**

4.2 งานโครงสร้างวิศวกรรม (อาคารกักกันโรคสัตว์) **แล้วเสร็จ 95 %** ประกอบด้วย

- งานเตรียมการก่อสร้างรื้อถอน, งานฐานราก, งานฐานรากถึงน้ำมีน้ำเสีย + ถึงเก็บน้ำสำเร็จรูป + ถึงเซต, งานถึงเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก, งานเสาตอม่อ, งานคานคอดิน, งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ 1, งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ 1, งานกระเบื้องดิน, งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ 1, งานเสาเหล็กรูปพรรณ ชั้นที่ 1, งานโครงสร้างหลังคา (ปรับปรุง), งานโครงสร้างหลังคา T'RUSS A, T'RUSS B, T'RUSS C, งานทาสีแล้วเสร็จ

สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ 4 แล้วเสร็จ 47.50%

งวดที่ 5 ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน (วันที่ 17 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565) ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

5.1 งานสถาปัตยกรรม (อาคารกักกันโรคสัตว์) **แล้วเสร็จ 65 %** ประกอบด้วย

- งานมุงหลังคา ASAPVC, งานผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ, งานทาสีผนัง, งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเซอร์กิตเบรกเกอร์, งานเดินสายไฟฟ้าและระบบเมน ระบบกล่องวงจรปิด, ระบบประปา, ระบบสุขาภิบาล และเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ แล้วเสร็จ

5.2 งานโครงสร้างวิศวกรรม อาคารโรงพยาบาลสัตว์และสำนักงานส่วนแยก **แล้วเสร็จ 75 %** ประกอบด้วย

- งานฝ้าเพดาน, งานวัสดุผิวพื้น, งานวัสดุผนัง, งานบัวเชิงผนัง, งานประตู - หน้าต่าง, งานรายการสุขภัณฑ์ ช่าง - หญิง

สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ 5 แล้วเสร็จ 70%

งวดที่ 6 ระยะเวลาดำเนินงาน 40 วัน (วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2565) ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

6.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม อาคารโรงพยาบาลสัตว์และสำนักงานส่วนแยก **แล้วเสร็จ 80 %** ประกอบด้วย

- งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก, งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นหลังคา, งานพื้นชั้นหลังคา
- งานโครงสร้างอาคาร Generator ทั้งหมด

6.2 งานสถาปัตยกรรม อาคารสำนักงานส่วนแยก **แล้วเสร็จ 70 %** ประกอบด้วย

- งานวัสดุหลังคา ASAPVC, งานก่อฉาบผนัง, งานวัสดุผิวพื้น, งานบัวเชิงผนัง, งานวัสดุผนัง, งานฝ้าเพดาน, งานประตู - หน้าต่าง, รายการสุขภัณฑ์, งานทาสี, งานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ แล้วเสร็จ
- งานก่อฉาบผนัง, งานวัสดุผิวพื้น, งานประตู - หน้าต่าง อาคาร Generator

สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ 6 แล้วเสร็จ 75%

งวดที่ 7 ระยะเวลาดำเนินงาน 20 วัน (วันที่ 26 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565) ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

7.1 งานสถาปัตยกรรม อาคารโรงพยาบาลสัตว์เดิม **แล้วเสร็จ 75 %** ประกอบด้วย

- งานหลังคาซีแพค (ซ่อมโครงสร้างหลังคาเดิม), งานก่อฉาบผนัง, งานวัสดุผิวพื้น, งานบัวเชิงผนัง, งานวัสดุผนัง, งานฝ้าเพดาน, งานประตู - หน้าต่าง, งานสุขภัณฑ์, งานเบ็ดเตล็ด, งานทาสี แล้วเสร็จ

7.2 งานครุภัณฑ์อาคารชั้นสูทรวงกและเตาเผาซาก **แล้วเสร็จ 0 %** ประกอบด้วย

- งานติดตั้งเครนยก 5 ตัน, ติดตั้งระบบทำความเย็นสำหรับเก็บซากสัตว์, ติดตั้งเตาเผา, ติดตั้งกล่องวงจรปิดและติดตั้งระบบปรับอากาศ

สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ 7 แล้วเสร็จ 37.50%

งวดที่ 8 ระยะเวลาดำเนินงาน 20 วัน (วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2565) ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

8.1 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร อาคารโรงพยาบาลสัตว์เดิม **แล้วเสร็จ 55 %** ประกอบด้วย

- งานแผงสวิทช์ไฟฟ้าประธาน (MDB) (EDB), งานสายไฟฟ้าและท่อ, งานเดินสายไฟฟ้าระบบเมน, ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นที่ 1 ติดตั้งโคมไฟและสวิทช์และเต้ารับ, ระบบสื่อสาร (โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์), ระบบกล่องวงจรปิด, ติดตั้งระบบปรับอากาศและเครื่อง Generator

8.2 ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร อาคารสำนักงานแยก **แล้วเสร็จ 85 %** ประกอบด้วย

- งานโคมไฟ, สวิทช์และเต้ารับ, สายไฟ, ท่อและรางเดินสายไฟ, ระบบสื่อสาร (โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์), ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบกล่องวงจรปิดและติดตั้งระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ

8.3 งานภูมิทัศน์ อาคารชั้นสู่ตรซำกและเตาเฝ้าซำก **แล้วเสร็จ 0 %** ประกอบด้วย

- งานถนนทางเข้าอาคารชั้นสู่ตรซำกและเตาเฝ้าซำก พื้นที่โดยประมาณ 412 ตารางเมตร
- งานถนนด้านหน้าทางเข้าอาคารชั้นสู่ตรซำกและเตาเฝ้าซำก พื้นที่โดยประมาณ 115 ตารางเมตร
- งานรั้วโดยรอบอาคารชั้นสู่ตรซำก **แล้วเสร็จ**

สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ 8 แล้วเสร็จ 46.67%

งวดที่ 9 ระยะเวลาดำเนินงาน 25 วัน (วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2565) ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

9.1 งานระบบสุขาภิบาล โรงพยาบาลสัตว์ **แล้วเสร็จ 55 %** ประกอบด้วย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบท่อน้ำประปา น้ำทิ้ง ไส้โครก และท่ออากาศ

9.2 ระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร **แล้วเสร็จ 30 %** ประกอบด้วย

- งานระบบท่อระบายน้ำภายนอกอาคาร และงานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ **แล้วเสร็จ** พร้อมทั้งเก็บกวาดทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ทุกประการพร้อมทั้งทดสอบระบบต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้

สรุปการปฏิบัติงานงวดที่ 9 แล้วเสร็จ 66.57%

สรุปการดำเนินงานปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในส่วนสัตว์สงขลา ตลอดระยะเวลาเริ่มโครงการจนถึงเดือนมิถุนายน 2565 คิดเป็น 68.80%

ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- ขาดแคลนแรงงาน แนวทางแก้ไขให้ผู้รับจ้างเพิ่มคนงาน ได้มีหนังสือที่ อสส 1116/593 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 แจ้งการเร่งรัดการดำเนินงานปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในส่วนสัตว์สงขลา ครั้งที่ 3

- ไฟฟ้าภายในส่วนสัตว์สงขลาดับบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ

ภาพการดำเนินงานปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในส่วนสัตว์สงขลา

ภาพการดำเนินงาน

อาคารชั้นสู่ตรซำกและเตาเฝ้าซำก





อาคารชั้นสูตรซากและเตาเผาซาก



อาคารพยาบาลสัตว์ป่วย





อาคารพยาบาลสัตว์ป่วย



อาคารพยาบาลสัตว์ป่วย



- งานโครงสร้างอาคาร Generator ๕ ชั้น



สำนักงานส่วนแยก



สำนักงานส่วนแยก



อาคารโรงพยาบาลสัตว์ และส่วนต่อเติม





อาคารโรงพยาบาลสัตว์ และส่วนต่อเติม



อาคารโรงพยาบาลสัตว์ และส่วนต่อเติม



อาคารกักกันโรคสัตว์



อาคารกักกันโรคสัตว์



๒. งานปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธุ์สมเสร็จ ภายในสวนสัตว์สงขลา

สัญญาเลขที่	๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
วงเงิน	๑๖,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบหกล้านบาทสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินงาน	เริ่มงานวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จในสัญญาวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๗๐ วัน
จำนวนงวดงาน	๗ งวด
ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรุ่งก่อสร้าง ๒๐๐๗

ผลการดำเนินงาน

งวดที่ ๑ เบิกเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน ๑,๖๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท

งวดที่ ๒ เบิกเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน ๒,๑๔๒,๔๐๐.๐๐ บาท

งวดที่ ๓ เบิกเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน ๒,๑๔๒,๔๐๐.๐๐ บาท

งวดที่ ๔ เบิกเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน ๑,๙๙๗,๖๐๐.๐๐ บาท

งวดที่ ๕ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

- งานผนัง (W๑), (W๒), (W๓), (W๔), (W๕) แล้วเสร็จ ๗๐%
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๐%
- งานเดินสายระบบไฟฟ้าหรืออื่นๆ (กรณีมีงานเกี่ยวข้องกันระหว่างงาน) แล้วเสร็จ ๐%

สรุปการดำเนินงานในงวดที่ ๓ แล้วเสร็จ ๖๒.๑๕%

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

- ขาดแคลนแรงงาน แนวทางแก้ไขให้ผู้รับจ้างเพิ่มคนงาน สวนสัตว์สงขลาได้มีหนังสือที่ อสส ๑๑๑๖/๕๙๔ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ แจ้งการเร่งรัดการดำเนินงานปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธุ์สมเสร็จ ภายในสวนสัตว์สงขลา ครั้งที่ ๔

ภาพการดำเนินงาน

โครงการปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธุ์สมเสร็จ ภายในสวนสัตว์สงขลา

- งานผนัง W๑ ,W๒ ,W๓ ,W๔ ,W๕ แล้วเสร็จ ๕๐%





โครงการปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธุ์สมเสร็จ ภายในสวนสัตว์สงขลา
งานผนัง W๑ ,W๒ ,W๓ ,W๔ ,W๕ แล้วเสร็จ ๕๐%



รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕

สวนสัตว์อุบลราชธานี


ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ

ครุภัณฑ์ รายการที่ ๑ แผ่นบันทึกภาพเอกซเรย์แบบดิจิทัล ๔ แผ่น

ผู้รับจ้าง บริษัท เจ.เอฟ แอดวาน เมด จำกัด สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๕ เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วงเงินที่ลงนามสัญญา ๒๒๖,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส ๑๑๑๖/๑๓๘๓ ลว. ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔



ครุภัณฑ์ รายการที่ ๒ ชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ๑ ชุด

ผู้รับจ้าง บริษัท เจ.เอฟ แอดวาน เมด จำกัด สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๕ เริ่ม ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนามสัญญา ๑,๖๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์แล้วเสร็จ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส ๑๑๑๖/๑๔๘๘ ลว. ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔



ครุภัณฑ์ รายการที่ ๓ หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ Kva. ๕ เครื่อง

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแม็ค เทคโนโลยี สัญญาเลขที่ ๙/๒๕๖๕ เริ่ม ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินที่ลงนามสัญญา ๗๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์แล้วเสร็จในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

- ขออนุมัติเบิกเงินตามหนังสือเลขที่ ทส๑๑๖/๑๔๑๑ ลว. ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔



ครุภัณฑ์ รายการที่ ๔ กล้องวงจรปิดติดตั้ง ๘ จุด ๖๖ ตัว

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีคอมมูนิเคชั่นเซลล์ แอดเซอร์วิส สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๕ เริ่ม ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ วงเงินที่ลงนามสัญญา ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์แล้วเสร็จในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส ๑๑๖/๑๔๘๘ ลว. ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

ภาพการดำเนินงาน



งานก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วน กรีนเทค เอสโซซิเอท สัญญาจ้างเลขที่ ๒๑/๒๕๖๕ วงเงินสัญญา จำนวนเงิน ๕๓,๔๙๘,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เริ่มดำเนินการ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดการดำเนินงาน วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๖ งวด จำนวน ๒๔๐ วัน

ผลการดำเนินงาน

งวดที่ ๑ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน คิดเป็นเงินร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้างทั้งหมดเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงานให้คณะกรรมการควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมวดงานที่ ๑ งานปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกา และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ Zone A

๑.๓ คอกกักก๊อแลนด์

๑.๓.๑ งานปรับเคลียพื้นที่	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๑.๓.๒ งานโครงสร้าง ค.ส.ล.	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๑.๓.๓ งานโครงเหล็กหลังคา	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๑.๔ คอกกักสคิมิด้า ฮอร์น ออริก แล้วเสร็จ ๘๐ %

๑.๖ อาคารร้านอาหาร แล้วเสร็จ ๙๐ %

หมวดงานที่ ๒ งานปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกา และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ Zone B

๒.๑ คอกกักไนอาลา แล้วเสร็จ ๘๐ %

๒.๒ อาคารบริการ ๒ แล้วเสร็จ ๗๐ %

๒.๓ คอกกักวอเตอร์บัค แล้วเสร็จ ๘๐ %

๒.๔ อาคารชมสัตว์ A จำนวน ๒ หลัง แล้วเสร็จ ๘๐ %

หมวดงานที่ ๓ งานปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกา และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ Zone C

๓.๑ ส่วนจัดแสดงสัตว์ขนาดเล็ก

๓.๑.๑ ส่วนแสดงเมียร์แคต	
- งานรั้วก่อดูอุโมงค์ปูนผสมดิน	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๓.๑.๒ ส่วนแสดงเม่นเผือก แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๓.๑.๓ งานประกอบตามรูปแบบส่วนแสดงสัตว์

- สะพานเชือกและบันได แล้วเสร็จ ๘๐ %

- ทางเดินพื้น Rope ไม้เทียม แล้วเสร็จ ๐ %

๓.๑.๔ ส่วนแสดงเต่าซูคาต้า แล้วเสร็จ ๖๐ %

๓.๑.๗ งานศาลาอุโมงค์ แล้วเสร็จ ๖๐ %

๓.๒ งาน Landscape ปรับภูมิทัศน์,งานรั้ว,งานป้าย

๓.๒.๖ รั้วตาข่ายกั้นสัตว์

๓.๒.๖.๑ รั้วตาข่าย A แล้วเสร็จ ๙๐ %

๓.๒.๖.๒ รั้วตาข่าย B๑-B๒ ยาว ๙๐ เมตร แล้วเสร็จ ๘๐ %

๓.๒.๖.๓ ประตู-เข้าออกเจ้าหน้าที่ แล้วเสร็จ ๐ %

๓.๒.๗ ประตูล้อเลื่อน แล้วเสร็จ ๐ %

ภาพประกอบงานงวดที่ 3

















ครุภัณฑ์ สวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตู้แช่อาหาร ขนาด ๔๕ คิวบิกฟุต
งบประมาณ ๔๖,๐๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



ตู้แช่อาหาร ขนาด ๓๒ คิวบิกฟุต
งบประมาณ ๒๗,๐๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



เครื่องเป่าใบไม้ ๒ จังหวะ ๓ เครื่อง
งบประมาณ ๓๐,๓๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวี ๑ เครื่อง
งบประมาณ ๕๒,๙๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



ครุภัณฑ์ สวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เครื่องเลเซอร์รักษาแผลสำหรับสัตว์
1 เครื่อง งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ๓ เครื่อง
งบประมาณ ๔๔๔,๒๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า ๒ เครื่อง
งบประมาณ ๗๐,๐๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า สวนสัตว์ขอนแก่น
๒ เครื่อง งบประมาณ ๑๙,๐๐๐.-บาท
เบิกจ่าย ๑๐๐% ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว



งานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสัตว์และอาคารประกอบต่างๆ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น

ผู้รับจ้าง บริษัท ชุนพลพัฒนาการ จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ วงเงินสัญญาจ้าง
จำนวนเงิน ๗,๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เริ่มดำเนินงาน วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
สิ้นสุดการดำเนินงาน วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ งวด จำนวน ๒๑๐ วัน

ผลการดำเนินงาน

- | | |
|----------|---|
| งวดที่ ๑ | ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |
| งวดที่ ๒ | ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |
| งวดที่ ๓ | (งวดสุดท้าย) ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |



งานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

งานก่อสร้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวน้ำ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น

ผู้รับจ้าง บริษัท ชุนพลพัฒนาการ จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ ๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ วงเงินสัญญาจ้าง จำนวนเงิน ๑๔,๕๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เริ่มดำเนินงาน ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔ งวด จำนวน ๒๔๐ วัน

ผลการดำเนินงาน

งวดที่ ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่งเบิกจ่ายไปยัง อสส.เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่งเบิกจ่ายไปยัง อสส.เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่งเบิกจ่ายไปยัง อสส.เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จ ๑๐๐%



ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
แนวทางแก้ไข ไม่มี

งานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
งานก่อสร้างอาคารจักรนักล้า ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น

ผู้รับจ้าง บริษัท ขุนพลพัฒนาการ จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ วงเงินสัญญาจ้าง จำนวนเงิน ๑๔,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เริ่มดำเนินงาน ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔ งวด จำนวน ๒๔๐ วัน

ผลการดำเนินงาน	งวดที่ ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่งเบิกจ่ายไปยัง อสส.เรียบร้อยแล้ว
	งวดที่ ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่งเบิกจ่ายไปยัง อสส.เรียบร้อยแล้ว
	งวดที่ ๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่งเบิกจ่ายไปยัง อสส.เรียบร้อยแล้ว
	งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จ ๑๐๐% อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน




ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
แนวทางแก้ไข ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

- ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรในปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ

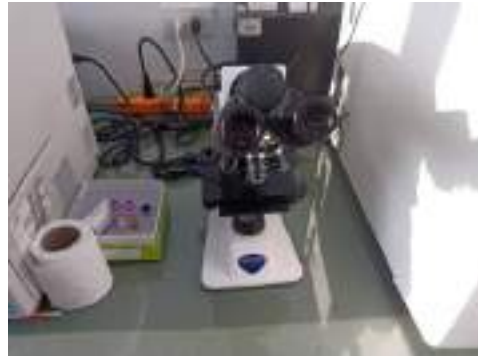

1. กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา ใบสั่งซื้อ 001/2565
บริษัท เบสท์ แล็บ แอนด์ เคมีคอล จำกัด
เบิกจ่าย 100%



2. เครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมในสภาพจริงแบบเคลื่อนที่ ใบสั่งซื้อ 004/2565
บริษัท อาฟเตอร์ แล็บ จำกัด
เบิกจ่าย 100%

ครุภัณฑ์ รายการที่ ๓ เครื่องมือรักษาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดความเข้มต่ำ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
 ผู้รับจ้าง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๕ เริ่ม ๑๑ ต.ค.๖๔ สิ้นสุดสัญญา ๘ ก.พ. ๖๕
 วงเงินที่ลงนามสัญญา ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (ส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔)



3. เครื่องมือรักษาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดความเข้มต่ำ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
 สัญญาเลขที่ 3/2565 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
 เบิกจ่าย 100%

ครุภัณฑ์ รายการที่ ๔ รถดั๊กหน้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
 ผู้รับจ้าง บริษัทพัชริ เฮฟวี่ แมชชีนเนอรี่ จำกัด สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๕ เริ่ม ๒๐ พ.ย.๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๕
 วงเงินที่ลงนามสัญญา ๓,๑๙๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
 (ส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)



๔. รถักหน้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ สัญญาเลขที่ ๕/
๒๕๖๕ บริษัทพีซี เอฟอี แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด
เรื่อง - - - - -

งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระการบินไทย ภายในโครงการคชอาณาจักร

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ไทยสงวน สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๕ เริ่มเริ่ม ๑๑ พ.ย..๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา ๘ ก.ค. ๒๕๖๕ วงเงินลงนามสัญญา ๑๑,๙๖๙,๐๐๐.-บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จำนวน ๕ งาน ๒๔๐ วัน (โดยฝ่ายพัสดุดงค์การสวนสัตว์เป็นผู้ดำเนินการ)

ผลการดำเนินงาน งานที่ ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่งเบิกจ่ายไปยัง อสส.เรียบร้อยแล้ว
 งานที่ ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่งเบิกจ่ายไปยัง อสส.เรียบร้อยแล้ว
 งานที่ ๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่งเบิกจ่ายไปยัง อสส.เรียบร้อยแล้ว

อยู่ระหว่างการดำเนินงานงานที่ ๔

- งานศาลาดูช้าง แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานศาลาพักผ่อนช้าง แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานทางเดินช้าง แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานทางเดินเท้า แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานวางระบอบรดน้ำต้นไม้ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานปลูกต้นไม้และจัดสวน แล้วเสร็จ ๕๐%

อยู่ระหว่างการดำเนินงานงานที่ ๕

- งานปลูกต้นไม้และจัดสวน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งและเดินระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานแก้ไขและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานทดสอบระบบพร้อมใช้งาน แล้วเสร็จ ๘๐% ทั้งหมด

การดำเนินงานงานที่ ๔ งานศาลาดูช้าง แล้วเสร็จ ๙๐%



งานศาลาพักผ่อนข้าง แล้วเสร็จ ๘๐%



งานวางระบบรดน้ำต้นไม้ แล้วเสร็จ ๑๐๐%



งานปลูกต้นไม้และจัดสวนแล้วเสร็จ ๕๐%



การดำเนินงานงวดที่ ๕ งานปลูกต้นไม้และจัดสวนแล้วเสร็จ ๑๐๐%



งานติดตั้งและเดินระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๑๐๐%



งานแก้ไขและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ แล้วเสร็จ ๑๐๐%



ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

มติที่ประชุม
