

สรุปการใช้จ่ายเงินลงทุน ปี 2566
ณ 31 ธันวาคม 2566

(ล้านบาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ	งบประมาณ ปี 2566	มกราคม - ธันวาคม 2566				ธันวาคม 2566			
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2566		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
			วงเงิน	%			วงเงิน	%	
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	73,951.080	24,014.577	21,615.931	90.0	(2,398.646)	3,822.212	3,452.985	90.3	(369.227)
- รายปี	27,301.733	11,560.051	10,511.665	90.9	(1,048.386)	1,739.291	1,311.291	75.4	(428.000)
- ระยะยาว	46,649.347	12,454.526	11,104.266	89.2	(1,350.260)	2,082.921	2,141.694	102.8	58.773
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	571.335	103.024	115.490	112.1	12.466	19.012	4.549	23.9	(14.463)
งบลงทุนที่เป็นโครงการ	49,889.371	18,608.998	19,499.748	104.8	890.750	2,404.806	4,611.856	191.8	2,207.050
รวมทั้งสิ้น	124,411.786	42,726.599	41,231.169	96.5	(1,495.430)	6,246.030	8,069.390	129.2	1,823.360

หมายเหตุ

- 1) มติ ครม. 20 กันยายน 2565 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2566 วงเงิน 118,329.323 ล้านบาท และ 42,726.599 ล้านบาท ตามลำดับ
- 2) การเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ สศช.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ทำให้วงเงินงบประมาณเป็น 124,411.786 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็น 42,726.599 ล้านบาท

เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินลงทุนรายไตรมาส ตามเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ปี 2566

(ล้านบาท)


แผนงาน/งาน/โครงการ	ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.)					ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.)				ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.)			
	เป้าหมาย ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)	จ่ายจริง (ม.ค.-มี.ค.)		สูง(ต่ำ) กว่า เป้าหมาย ไตรมาส 1	เป้าหมาย ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.)	จ่ายจริง (เม.ย.-มิ.ย.)		สูง(ต่ำ) กว่า เป้าหมาย ไตรมาส 2	เป้าหมาย ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.)	จ่ายจริง (ก.ค.-ก.ย.)		สูง(ต่ำ) กว่า เป้าหมาย ไตรมาส 3	เป้าหมาย ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.)	จ่ายจริง (ต.ค.-ธ.ค.)		สูง(ต่ำ) กว่า เป้าหมาย ไตรมาส 4
		วงเงิน	%			วงเงิน	%			วงเงิน	%					
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	2,622.885	2,692.492	102.7	69.607	5,421.148	4,984.596	91.9	(436.552)	7,267.575	6,706.793	92.3	(567.899)	8,702.969	7,232.050	83.1	(1,473.047)
- รายปี	1,218.457	1,356.796	111.4	138.339	2,948.036	2,940.439	99.7	(7.597)	3,473.743	3,026.888	87.1	(446.855)	3,919.815	3,187.542	81.3	(732.273)
- ระยะยาว	1,404.428	1,335.696	95.1	(68.732)	2,473.112	2,044.157	82.7	(428.955)	3,793.832	3,679.905	96.997	(113.927)	4,783.154	4,044.508	84.557	(738.646)
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	18.000	33.722	187.3	15.722	19.000	24.989	131.5	5.989	33.012	25.895	78.4	(7.117)	33.012	30.884	93.6	(2.128)
งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ	2,242.525	2,157.197	96.2	(85.328)	3,705.215	4,135.778	111.6	430.563	4,807.534	5,375.433	111.8	567.899	7,853.724	7,831.340	99.7	(22.384)
รวมทั้งสิ้น	4,883.410	4,883.411	100.0	0.001	9,145.363	9,145.363	100.0	-	12,108.121	12,108.121	100.0	0.000	16,589.705	15,094.274	91.0	(1,495.431)

ปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่าย ปี 2566

รายการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
เป้าหมายเบิกจ่าย	4,883.410	9,145.363	12,108.121	16,589.705	42,726.599
หัก Cost Saving	40.500	120.456	346.054	2,046.591	2,553.601
คงเหลือเป้าหมายเบิกจ่าย	4,842.910	9,024.907	11,762.067	14,543.114	40,172.998
ผลการเบิกจ่าย	4,883.411	9,145.363	12,108.121	15,094.274	41,231.169
% การเบิกจ่าย	100.8%	101.3%	102.9%	103.8%	102.6%

ล้านบาท

เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงิน ปี 2565-2566

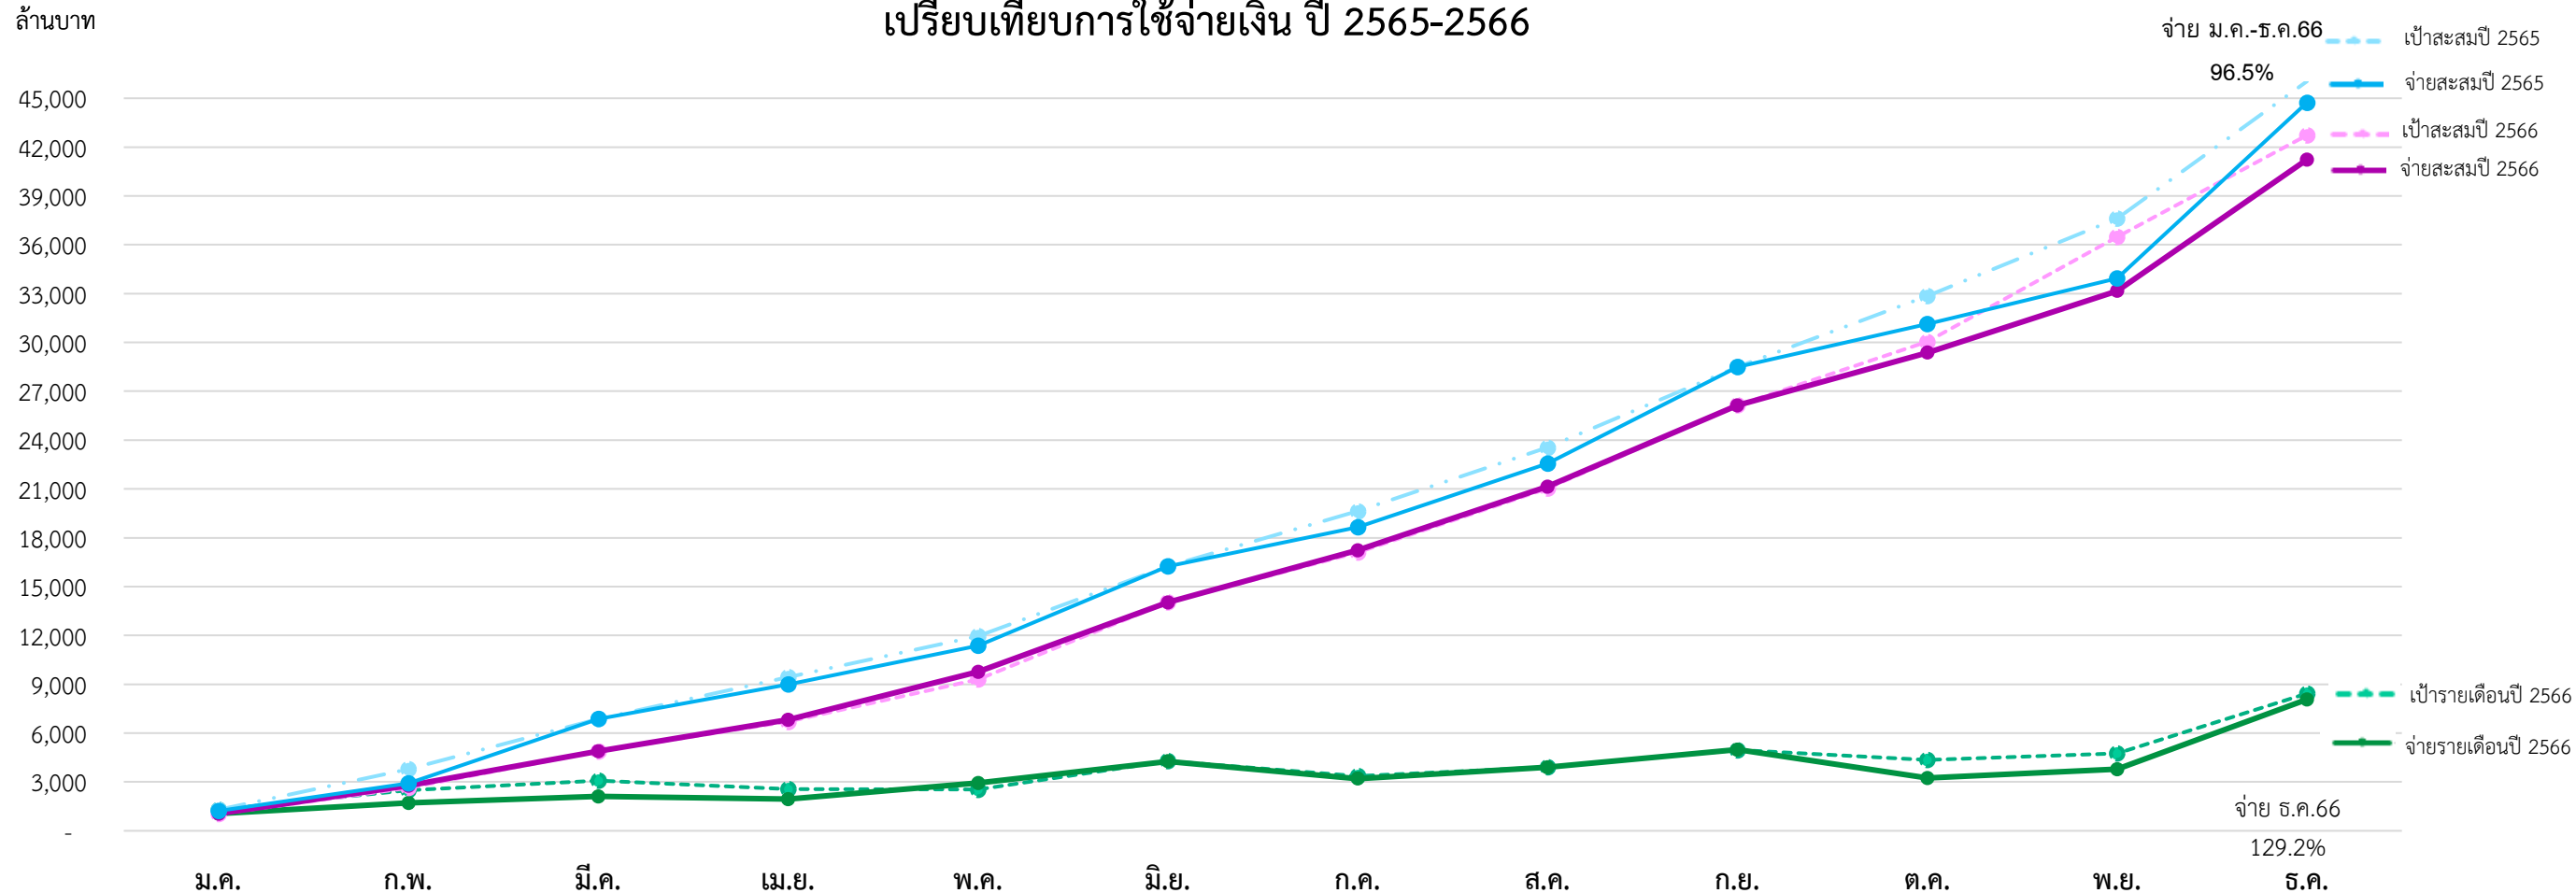

(ล้านบาท)

		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.-ธ.ค.
ปี 2565	- เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,297	2,485	3,090	2,563	2,528	4,293	3,372	3,910	4,954	4,359	4,755	8,432	46,038
	- จ่ายจริง	1,223	1,693	3,956	2,123	2,372	4,889	2,388	3,915	5,933	2,638	2,808	10,795	44,733
	% จ่าย : เป้าหมายรายเดือน	94.3	68.1	128.0	82.8	93.8	113.9	70.8	100.1	119.8	60.5	59.1	128.0	1,119
ปี 2566	- เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,039	1,590	2,255	1,816	2,597	4,732	3,075	3,927	5,106	3,902	6,442	6,246	42,727
	- จ่ายจริง	1,058	1,715	2,111	1,943	2,939	4,263	3,210	3,908	4,990	3,236	3,789	8,069	41,231
	สูง / (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	19	125	(144)	127	342	(469)	135	(19)	(116)	(666)	(2,653)	1,823	(1,496)
	% จ่าย : เป้าหมายรายเดือน	101.8	107.9	93.6	107.0	113.2	90.1	104.4	99.5	97.7	82.9	58.8	129.2	96.5
	- เป้าหมายสะสม	1,039	2,629	4,884	6,700	9,297	14,029	17,104	21,031	26,137	30,039	36,481	42,727	
	- จ่ายจริงสะสม	1,058	2,773	4,884	6,827	9,766	14,029	17,239	21,147	26,137	29,373	33,162	41,231	
	% จ่าย : เป้าหมายสะสม	101.8	105.5	100.0	101.9	105.0	100.0	100.8	100.6	100.0	97.8	90.9	96.5	
	% จ่ายสะสม:เป้าหมายรวม	2.5	6.5	11.4	16.0	22.9	32.8	40.3	49.5	61.2	68.7	77.6	96.5	

การใช้จ่ายเงินลงทุน ปี 2566

ณ 31 ธันวาคม 2566

(ล้านบาท)									
แผนงาน/งาน/โครงการ	งบประมาณ ปี 2566	มกราคม - ธันวาคม 2566				ธันวาคม 2566			
		เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2566		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
			วงเงิน	%			วงเงิน	%	
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ									
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	27,301.733	11,560.051	10,511.665	90.9	(1,048.386)	1,739.291	1,311.291	75.4	(428.000)
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	46,649.347	12,454.526	11,104.266	89.2	(1,350.260)	2,082.921	2,141.694	102.8	58.773
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	73,951.080	24,014.577	21,615.931	90.0	(2,398.646)	3,822.212	3,452.985	90.3	(369.227)
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก									
งานเช่าที่ดิน - อาคาร	424.543	79.000	115.490	146.2	36.490	7.000	4.549	65.0	(2.451)
งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ	146.792	24.024	-	-	(24.024)	12.012	-	-	(12.012)
รวมสัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	571.335	103.024	115.490	112.1	12.466	19.012	4.549	23.9	(14.463)
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ					-				
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.1	95.828	18.819	19.069	101.3	0.250	-	-	-	-
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	242.390	202.711	180.001	88.8	(22.710)	0.350	34.189	9,768.3	33.839
3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	505.413	204.000	185.099	90.7	(18.901)	47.693	64.928	136.1	17.235
4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	979.814	500.000	452.487	90.5	(47.513)	92.035	39.341	42.7	(52.694)
5. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	503.305	81.519	45.273	55.5	(36.246)	30.071	18.109	60.2	(11.962)
6. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3	185.769	35.976	45.725	127.1	9.749	-	5.315	-	5.315
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	966.393	672.857	688.040	102.3	15.183	6.181	386.645	6,255.4	380.464
8. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี	20.875	2.500	2.101	84.0	(0.399)	-	0.001	-	0.001
9. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	293.278	10.223	24.705	241.7	14.482	0.050	2.143	4,286.0	2.093
10. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	9,993.727	2,400.000	3,020.965	125.9	620.965	392.772	657.150	167.3	264.378
11. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)	30.606	20.618	15.289	74.2	(5.329)	-	0.021	-	0.021
12. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (คพญ.1)	3,253.412	844.251	1,392.782	165.0	548.531	364.456	591.978	162.4	227.522
13. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	681.782	152.579	192.353	126.1	39.774	49.000	68.244	139.3	19.244
14. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2)	1,275.741	1,000.000	736.577	73.7	(263.423)	106.613	53.524	50.2	(53.089)
15. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยัง เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)	2,102.179	-	-	-	-	-	-	-	-
16. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.)	1,626.490	139.416	414.916	297.6	275.500	-	276.624	-	276.624
17. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.)	73.572	25.124	1.877	7.5	(23.247)	-	-	-	-
18. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	25,309.142	10,795.576	11,942.015	110.6	1,146.439	1,286.589	2,385.961	185.4	1,099.372
19. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.)	1,609.068	1,414.980	51.879	3.7	(1,363.101)	1.670	2.193	131.3	0.523
20. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพื้นที่ เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี (คลพ.)	140.587	87.849	88.595	100.8	0.746	27.326	25.490	93.3	(1.836)
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	49,889.371	18,608.998	19,499.748	104.8	890.750	2,404.806	4,611.856	191.8	2,207.050
รวมทั้งสิ้น	124,411.786	42,726.599	41,231.169	96.5	(1,495.430)	6,246.030	8,069.390	129.2	1,823.360

การใช้จ่ายเงินลงทุน ปี 2566

ณ 31 ธันวาคม 2566

(ล้านบาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2566	มกราคม - ธันวาคม 2566				ธันวาคม 2566			
			เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2566		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
				วงเงิน	%			วงเงิน	%	
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ										
งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี										
1. หมวดสิ่งก่อสร้าง										
1.1 งานขยายเขตรบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ	ผวศ.	3,501.295	1,300.000	1,989.881	153.1	689.881	188.344	130.496	69.3	(57.848)
1.2 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราวคลองหนึ่ง และสถานีไฟฟ้าชั่วคราวท่ามะกา 2	ผวห.	0.516	0.516	-	-	(0.516)	-	-	-	-
1.3 งานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้า	ผวห.	30.178	30.178	30.178	100.0	-	-	-	-	-
1.4 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว โพธิ์แจ้, โคกกรวด2 และ นครราชสีมา7	ผวห.	0.781	0.636	0.413	64.9	(0.223)	-	-	-	-
1.5 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราวบางเลน 2, ท่าม่วง 2, หนองปรือ และสทิงพระ	ผบก.2 กจค.2(บก1) / ผวห.	1.074	0.568	0.526	92.6	(0.042)	-	-	-	-
1.6 งานปรับปรุงสายเคเบิลใต้น้ำระบบ 22 เควี วงจร อ.ศรีราชา-เกาะสีชัง	ผบร. กบร.	759.340	75.934	75.680	99.7	(0.254)	75.934	75.680	99.7	(0.254)
1.7 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายได้สายส่ง 115 เควี	ผบก.2 กจค.1(บก2) / ผวห.	84.659	36.837	43.184	117.2	6.347	-	-	-	-
1.8 งานก่อสร้างเพิ่มเบย์และสายส่งที่สถานีไฟฟ้าโพธาราม2 จ.ราชบุรี (วงจรที่ 2) และสถานีไฟฟ้าหนองปลาหมอ จ.ราชบุรี (วงจรที่ 3)	ผบก.2 กจค.2(บก2)	2.905	0.800	0.795	99.4	(0.005)	-	-	-	-
1.9 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	ผบก.1 กจค.4(บก1)	3.000	0.700	1.189	169.9	0.489	-	0.255	-	0.255
1.10 งานจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	ผปฟ. ศปฟ.	349.619	286.517	88.986	31.1	(197.531)	16.760	62.835	374.9	46.075
1.11 งานปรับปรุงอาคาร งานระบบ และภูมิทัศน์ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง	ผพบ. ศผฟ.	189.000	27.600	-	-	(27.600)	4.551	-	-	(4.551)
1.12 งานพัฒนาอาคารสำนักงาน กฟผ. ที่ได้รับรองมาตรฐาน Green Office ให้เป็นอาคารที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) ระยะที่ 1 (มติ 64)	ผสอ. กสพ.	28.963	23.677	23.862	100.8	0.185	-	-	-	-
1.13 งานปรับปรุงสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าขอนแก่น 4 (ลานไก)- สถานีไฟฟ้าหนองเรือ-สถานีไฟฟ้าขอนแก่น 3 (มติ 65)	กฟผ.1	77.559	64.466	57.363	89.0	(7.103)	40.661	25.044	61.6	(15.617)
1.14 งานรื้อย้าย ปรับปรุง และก่อสร้างระบบไฟฟ้าของ กฟผ. เพื่อรองรับการก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) (มติ 65)	ผบก.1 กจค.1(บก1)	427.696	301.061	188.182	62.5	(112.879)	20.230	16.158	79.9	(4.072)
1.15 งานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร (มติ 65)	ผบก.1 กจค.2(บก1) / ผวห.	242.416	200.000	122.924	61.5	(77.076)	-	3.971	-	3.971
1.16 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าตาพระยา (ชั่วคราว) จ.สระแก้ว (มติ ครม. 66)	กกฟ.1 / กฟภ.1	189.341	156.262	63.579	40.7	(92.683)	47.787	18.691	39.1	(29.096)
1.17 งานปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่าย พร้อมตู้ควบคุมใน 12 เขตพื้นที่ (มติ ครม. 66)	ผปฟ. กทข.	142.447	13.948	-	-	(13.948)	-	-	-	-
1.18 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย หม้อแปลงจำหน่าย และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปี 2566 (เพิ่มเติม ปี 66)	ผบก.1 กจค.3(บก1)	1,284.722	1,284.722	785.675	61.2	(499.047)	40.000	173.913	434.8	133.913
1.19 งานพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่บริเวณชลชนแดนการไฟฟ้านครหลวง ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม ปี 66)	กบป.(ก1-ก3), กวว.(ก1-ก3)	290.499	211.383	170.698	80.8	(40.685)	101.112	71.457	70.7	(29.655)
1.20 งานขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ปี 2566 (เพิ่มเติม ปี 66)	ผบก.1 กจค.2(บก1)	250.000	250.000	93.629	37.5	(156.371)	16.750	13.770	82.2	(2.980)
1.21 งานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ปี 2566 (เพิ่มเติม ปี 66)	ผบก.1 กจค.2(บก1)	500.000	500.000	289.771	58.0	(210.229)	33.500	49.363	147.4	15.863
รวมหมวดสิ่งก่อสร้าง		8,356.010	4,765.805	4,026.515	84.5	(739.290)	585.629	641.633	109.6	56.004
2. หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์										
2.1 งานจัดหามอเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย (ติดตั้งใหม่และชำรุด)	ผวห. / ผมจ. กมต.	6,394.968	1,737.939	1,576.748	90.7	(161.191)	157.866	319.706	202.5	161.840
2.2 งานจัดหาหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย	ผวห. / ผมจ. กมต.	905.698	571.999	241.256	42.2	(330.743)	21.596	8.335	38.6	(13.261)
2.3 งานจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังทดแทนชำรุดไม่คุ้มค่าซ่อม และที่มีอายุการใช้งานสูงเสี่ยงต่อการระเบิดชำรุด	ผวห. กจพ.2	0.160	0.080	0.080	100.0	-	-	0.080	-	0.080
2.4 งานจัดหาหม้อแปลง AVR ทดแทนที่เสื่อมสภาพเนื่องจากอายุการใช้งานสูงเสี่ยงต่อการระเบิดชำรุด	กบษ.ต.1	2.000	1.873	1.018	54.4	(0.855)	-	-	-	-
2.5 งานเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง	ผวห. กจพ.2	0.260	0.260	-	-	(0.260)	-	-	-	-
2.6 งานจัดหา Smart Meter และอุปกรณ์ประกอบเพื่อสับเปลี่ยนมิเตอร์จานหมุนเดิมในพื้นที่การไฟฟ้าเมืองพัทยา	ผวร. กรอ.	232.000	151.285	-	-	(151.285)	60.536	-	-	(60.536)
2.7 งานติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า	ผจห. กจพ.1	17.962	13.962	13.923	99.7	(0.039)	-	-	-	-

การใช้จ่ายเงินลงทุน ปี 2566

ณ 31 ธันวาคม 2566

(ล้านบาท)										
แผนงาน/งาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2566	มกราคม - ธันวาคม 2566				ธันวาคม 2566			
			เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2566		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
				วงเงิน	%			วงเงิน	%	
2.8 งานจัดหายานพาหนะของ กฟภ.	ฟวท.	2.000	2.000	-	-	(2.000)	-	-	-	-
2.9 งานจัดหาพร้อมติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระยะที่ 2 (มติ 65)	ผบก.2 กจค.2(บก2)	597.396	596.505	487.588	81.7	(108.917)	62.602	255.884	408.7	193.282
2.10 งานจัดหาเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าโมบายล์ ขนาด 500 กว. (มติ 66)	ฟวท. กจพ.1	78.075	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11 งานจัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบบริหารจัดการหม้อแปลงในระบบจำหน่าย (Distribution Transformer Management System (DTMS) (มติ 66)	ผมจ. กมป.	151.000	109.900	-	-	(109.900)	109.900	-	-	(109.900)
2.12 งานจัดหาหม้อแปลง AVR ทดแทนที่เสื่อมสภาพ (มติ 66)	ผมจ. กมป.	258.000	-	-	-		-	-	-	-
รวมหมวดเครื่องจักรอุปกรณ์		8,639.519	3,185.803	2,320.613	72.8	(865.190)	412.500	584.005	141.6	171.505
3. หมวดเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก										
3.1 งานจัดทำระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบป้องกันอัคคีภัย ที่อาคาร LED สำนักงานใหญ่	ผบบ. กปภ.	111.236	56.402	-	-	(56.402)	-	-	-	-
3.2 งาน Customer Relationship Management (CRM) (การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า)	ผลพ. กสธ.	105.039	6.000	8.150	135.8	2.150	-	4.890	-	4.890
3.3 งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการอาคาร สำหรับสถานีไฟฟ้าแบบ Unmanned Substation	ผปฟ. ศปฟ.	23.495	20.617	21.606	104.8	0.989	-	-	-	-
3.4 งานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller) อาคารสำนักงานและอาคารศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า (SCADA)	ผสอ. กสพ.	135.810	126.588	126.388	99.8	(0.200)	-	-	-	-
3.5 งานจัดหาแบบเหล็กผลิตและเครื่องมือ-อุปกรณ์ ที่แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต พระนครศรีอยุธยา	ผกร. กผก.	125.938	125.031	43.342	34.7	(81.689)	77.400	41.869	54.1	(35.531)
3.6 งานจัดหาซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการสินทรัพย์องค์กร (Enterprise Asset Management Software : EAM-Software) (มติ 65)	ผบร. กบร.	300.000	15.000	-	-	(15.000)	-	-	-	-
3.7 งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิทยุสื่อสาร (พื้นที่ กฟภ.1 - กฟภ.3) (งานเพิ่มเติม ปี 65)	ผรส. กวส.	102.779	82.580	85.235	103.2	2.655	-	-	-	-
3.8 งานปรับปรุงระบบกระจายเสียงตามสายแบบดิจิทัล (Digital Public Address System) สำหรับสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (มติ 66)	ผรส. กบอ.	35.000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9 งานปรับปรุง ก่อสร้างอาคาร และจัดหาเครื่องมือ เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบมิเตอร์ (เพิ่มเติม ปี 66)	กงบ. (กฟข. 12 เขต)	147.422	105.175	30.140	28.7	(75.035)	18.382	8.048	43.8	(10.334)
รวมหมวดเครื่องใช้สำนักงาน/เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก		1,086.719	537.393	314.861	58.6	(222.532)	95.782	54.807	57.2	(40.975)
4. หมวดวิจัยและพัฒนา										
4.1 งานส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์/ส่งเสริม วิจัยและพัฒนา สิ่งประดิษฐ์เพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากล	ผวน. กนว.	31.914	31.135	31.135	100.0	-	-	-	-	-
4.2 งานจัดซื้อนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของ กฟภ.	ผวน. กนว.	50.480	23.586	43.074	182.6	19.488	-	-	-	-
รวมหมวดวิจัยและพัฒนา		82.394	54.721	74.209	135.6	19.488	-	-	-	-
5. หมวดลงทุนอื่นๆ										
5.1 เพิ่มทุนให้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	รผก.(ย)	2,059.662	1,750.000	1,100.000	62.9	(650.000)	500.000	-	-	(500.000)
รวมหมวดลงทุนอื่นๆ		2,059.662	1,750.000	1,100.000	62.9	(650.000)	500.000	-	-	(500.000)
6. หมวดสำรองราคา	ผงป. กปง.	337.665	-		-	-	-	-	-	-
7. หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	ผงป. กปง.	6,739.764	1,266.329	2,675.467	211.3	1,409.138	145.380	30.846	21.2	(114.534)
รวมงบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี		27,301.733	11,560.051	10,511.665	90.9	(1,048.386)	1,739.291	1,311.291	75.4	(428.000)

การใช้จ่ายเงินลงทุน ปี 2566

ณ 31 ธันวาคม 2566

(ล้านบาท)										
แผนงาน/งาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2566	มกราคม - ธันวาคม 2566				ธันวาคม 2566			
			เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2566		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
				วงเงิน	%			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว										
8. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 3										
8.1 หมวดสิ่งก่อสร้าง	รผก.(วว) ฝยธ.	577.331	113.792	163.772	143.9	49.980	14.028	23.517	167.6	9.489
8.2 สัารองค่าปรับราคา		217.301	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 3		794.632	113.792	163.772	143.9	49.980	14.028	23.517	167.6	9.489
9. แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 3	ฝปด. กปจ.	1,136.159	397.024	423.781	106.7	26.757	-	1.216	-	1.216
10. แผนงานจัดตั้งศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 2 (ศฝพ.)	ฝพบ. ศฝพ.	124.896	18.775	-	-	(18.775)	-	-	-	-
11. แผนงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า	ฝวท./ ฝบส. กบส.	2.756	2.756	2.756	100.0	-	-	-	-	-
12. แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3	ฝวร. กผร.	261.896	15.480	-	-	(15.480)	15.480	-	-	(15.480)
13. แผนงานเข่ายานพาหนะ ปี 2559 - 2564	รผก.(ล) / กจย.	4.972	4.972	4.972	100.0	-	-	-	-	-
14. แผนงานรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์และระบบสื่อสารสำหรับ FRTU	ฝปฟ. ศปฟ.	210.864	147.639	153.162	103.7	5.523	-	117.472	-	117.472
ตามแผนจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ของ กสทช.										
15. แผนงานพัฒนาและก่อสร้างศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery Center)	ฝสท. กสท.	13.711	12.302	12.302	100.0	-	-	-	-	-
ของ กฟภ.										
16. แผนงานปรับปรุงพัฒนาและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า	ฝวท./ ฝบส. กบส.	181.907	47.950	44.844	93.5	(3.106)	-	36.744	-	36.744
17. แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า	ฝบส. กบส.	8.658	5.658	5.658	100.0	-	-	-	-	-
18. แผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนสำหรับการจัดการทรัพย์สิน	ฝวท.	555.473	263.198	77.699	29.5	(185.499)	38.715	18.180	47.0	(20.535)
ระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า										
19. แผนงานเข่ายานพาหนะ ปี 2560 - 2565	รผก.(ล) / กจย.	9.973	9.973	9.973	100.0	-	-	-	-	-
20. แผนงานจัดหามอเตอร์สับเปลี่ยนตามวาระ ระยะที่ 2	ฝวท. กจพ.1	90.900	76.664	76.664	100.0	-	-	-	-	-
21. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4										
21.1 หมวดที่ดิน	รผก.(วว) ฝยธ.	451.388	55.000	14.150	25.7	(40.850)	55.000	-	-	(55.000)
21.2 หมวดสิ่งก่อสร้าง	รผก.(วว) ฝยธ.	1,669.092	347.447	515.357	148.3	167.910	38.994	112.397	288.2	73.403
21.3 หมวดยานพาหนะ	รผก.(ล) ฝวท.	1,199.798	245.004	222.744	90.9	(22.260)	222.744	-	-	(222.744)
21.4 หมวดเครื่องมือ-เครื่องใช้	รผก.(วว) ฝยธ.	262.098	8.110	1.228	15.1	(6.882)	3.610	-	-	(3.610)
21.5 สัารองค่าปรับราคา		87.193	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4		3,669.569	655.561	753.479	114.9	97.918	320.348	112.397	35.1	(207.951)
22 แผนงานการบริหารจัดการด้านระบบรักษาความปลอดภัยของคลังพัสดุ	ฝจล. 12 เขตดำเนินการ	29.384	6.882	7.289	105.9	0.407	-	-	-	-
23. แผนงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและ	ฝวท. / ฝบร. กบร.	83.305	43.491	66.209	152.2	22.718	-	-	-	-
สายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง										
24. แผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และสั่งการแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง	กฟต.2	3.273	2.273	2.571	113.1	0.298	-	1.738	-	1.738
25. แผนงานเข่ายานพาหนะ ปี 2561 - 2566	รผก.(ล) / กจย.	142.307	84.586	84.587	100.0	0.001	2.915	-	-	(2.915)
26. แผนงานก่อสร้างศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 3	ฝพบ. ศฝพ.	40.227	5.364	1.025	19.1	(4.339)	-	1.025	-	1.025
27. แผนงาน Renovate อุปกรณ์สถานีไฟฟ้าเสื่อมสภาพ	ฝบร. กบส./ 12 เขตดำเนินการ	172.473	34.080	19.549	57.4	(14.531)	-	-	-	-
28. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและระบบป้องกันสถานีไฟฟ้า	ฝบส. กบส.	189.459	41.153	38.798	94.3	(2.355)	0.500	27.819	5,563.8	27.319
ตามมาตรฐาน IEC61850 เพื่อรองรับงานเปลี่ยนทดแทน Switchgear ระบบ 22 KV								-		
29. แผนงานจัดหาระบบสื่อสารแบบหลอมรวม	ฝรส. กบอ.	10.121	5.121	5.121	100.0	-	-	-	-	-

การใช้จ่ายเงินลงทุน ปี 2566

ณ 31 ธันวาคม 2566

(ล้านบาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2566	มกราคม - ธันวาคม 2566				ธันวาคม 2566			
			เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2566		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
				วงเงิน	%			วงเงิน	%	
30. แผนงานขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านในโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อ ความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ผวบ.(น.1)	22.223	8.625	8.580	99.5	(0.045)	-	0.011	-	0.011
31. แผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงาน ตามภารกิจหลักของ กฟภ.	รผก.(ป) / ผวห.	1,225.311	369.441	460.091	124.5	90.650	-	174.185	-	174.185
32. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ กฟภ.	ผสท. กสท.	17.366	17.366	8.266	47.6	(9.100)	-	-	-	-
33. แผนงานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร 1 และก่อสร้างทางเชื่อมอาคาร สำนักงานใหญ่ กฟภ. เพื่อขอรับการประเมินและการรับรอง ตามมาตรฐาน LEED	ผยธ. กจก.	230.345	126.122	134.844	106.9	8.722	-	-	-	-
34. แผนงานพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ระยะที่ 1	ผบก.2 กจค.2(บก2)	206.270	155.538	160.045	102.9	4.507	1.780	29.004	1,629.4	27.224
35. แผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน	ผบก.1 กจค.4(บก1)	680.502	228.234	188.097	82.4	(40.137)	40.745	58.790	144.3	18.045
36. แผนงานเช่ายานพาหนะปี 2562-2567	รผก.(ล) / กยย.	189.877	112.258	112.258	100.0	-	9.598	-	-	(9.598)
37. แผนงานขยายผลระบบบริหารพัสดุคงคลังโดยใช้เทคโนโลยี RFID และ Barcode เพื่อพัฒนาคลังพัสดุให้เป็นแบบ Modern Warehouse	รผก.(ล) / ผจล.	305.503	7.621	46.619	611.7	38.998	-	3.721	-	3.721
38. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพกำลังผลิตสำรองจ่ายไฟฟ้า (มติ 63)	ผบร. กบผ.	20.243	10.122	4.991	49.3	(5.131)	-	4.991	-	4.991
39. แผนงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีไฟฟ้า (มติ 63)	ผปฟ. กทข. / ผบส. กปค.	348.582	171.347	186.583	108.9	15.236	10.827	31.271	288.8	20.444
40. แผนงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและ สายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ปี 2563-2570	ผวห. / ผบร. กบร.	4,063.503	1,942.107	2,431.096	125.2	488.989	116.909	18.978	16.2	(97.931)
41. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม (มติ 63)	ผชก.(ทส) ผสท. ผปด.	625.112	212.043	128.203	60.5	(83.840)	0.273	82.429	30,193.8	82.156
42. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคมของ กฟภ. ปี 2563 (มติ 63)	ผรส. กวส.	29.389	8.500	8.500	100.0	-	-	-	-	-
43. แผนงานการใช้พื้นที่สำนักงานใหญ่ กฟภ. ดำเนินการตามแผนแม่บท Phase B (มติ 63)	ผพบ. / ผยธ.	669.978	138.832	68.682	49.5	(70.150)	17.713	5.440	30.7	(12.273)
44. แผนงานเช่ายานพาหนะปี 2563-2568 (มติ 63)	รผก.(ล) / กยย.	311.608	121.903	121.903	100.0	-	10.231	-	-	(10.231)
45. แผนงานเช่ายานพาหนะปี 2564-2569 (มติ 64)	รผก.(ล) / กยย.	443.086	125.910	125.910	100.0	-	10.579	-	-	(10.579)
46. แผนงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีไฟฟ้า ปี 2564 (มติ 64)	ผวห. / ผบร. / ผบส. / ผปฟ.	1,831.160	568.798	464.241	81.6	(104.557)	95.240	301.626	316.7	206.386
47. แผนงานปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่าย ระยะที่ 1 (มติ 64)	ผปฟ. กทข.	107.313	55.236	52.283	94.7	(2.953)	13.776	5.165	37.5	(8.611)
48. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคมของ กฟภ. ปี 2564	ผรส. กวส.	5.540	3.927	2.844	72.4	(1.083)	-	0.053	-	0.053
49. แผนงานจัดหายานพาหนะของ กฟภ. ปี 2564-2566 (มติ 64)	รผก.(ล) / กยย.	622.057	242.313	242.313	100.0	-	-	-	-	-
50. แผนงานจัดหามอเตอร์ Electronic สับเปลี่ยนทดแทนมอเตอร์จานหมุน (มติ 64)	ผวห. / ผมจ. / ผบร.	3,312.578	802.000	298.222	37.2	(503.778)	407.152	43.875	10.8	(363.277)
51. แผนงานจัดหาอุปกรณ์/ป้องกัน/ตัดตอน/อุปกรณ์ประกอบในระบบจำหน่าย และสายส่งไฟฟ้า และอุปกรณ์สำรองสำหรับสายเคเบิลใต้ดิน/ใต้น้ำ	ผวห. / ผบร. กบร.	1,114.171	540.086	353.130	65.4	(186.956)	74.694	10.174	13.6	(64.520)
52. แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ	ผบก.1 กจค.4(บก1)	2,318.164	785.900	976.849	124.3	190.949	64.070	164.455	256.7	100.385
53. แผนงานระยะยาวในการจัดหาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) บนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	ผวร. กรอ.	2,280.000	-	-	-	-	-	-	-	-
54. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 5 (มติ 65)										
54.1 หมวดที่ดิน	รผก.(วว) ผยธ.	115.510	48.002	14.612	30.4	(33.390)	48.002	-	-	(48.002)
54.2 หมวดสิ่งก่อสร้าง	รผก.(วว) ผยธ.	1,488.263	280.794	156.794	55.8	(124.000)	46.447	28.301	60.9	(18.146)
54.3 หมวดยานพาหนะ	ผวห.	2,769.611	81.275	561.201	690.5	479.926	46.000	93.023	202.2	47.023
54.4 หมวดเครื่องมือ -เครื่องใช้	รผก.(วว) ผยธ.	778.831	250.000	337.781	135.1	87.781	27.592	48.808	176.9	21.216
54.5 สำนักรงราคา		222.169	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 5		5,374.384	660.071	1,070.388	162.2	410.317	168.041	170.132	101.2	2,091

การใช้จ่ายเงินลงทุน ปี 2566

ณ 31 ธันวาคม 2566

(ล้านบาท)										
แผนงาน/งาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2566	มกราคม - ธันวาคม 2566				ธันวาคม 2566			
			เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2566		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
				วงเงิน	%			วงเงิน	%	
55. แผนงานระยะยาวงานปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้า (มติ 65)	ฝบส. กปค.	850.692	510.415	60.264	11.8	(450.151)	247.725	10.275	4.1	(237.450)
56. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคมของ กฟผ. ปี 2565 (มติ 65)	ฝรส.	501.835	496.376	498.915	100.5	2.539	152.036	238.385	156.8	86.349
57. แผนงาน Big Data Platform (มติ 65)	ฝปด. กปจ.	120.000	30.000	-	-	(30.000)	-	-	-	-
58. แผนงานเข่ายานพาหนะปี 2565-2570 (มติ 65)	รผก.(ล) / กจย.	1,107.817	98.495	172.600	175.2	74.105	8.317	-	-	(8.317)
59. แผนงานจัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรองค์กรและระบบสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าของ กฟผ. (มติ 65)	ฝปด. กปจ.	4,998.470	748.081	-	-	(748.081)	-	-	-	-
60. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคม ของ กฟผ. ปี 2566 (มติ 66)	ฝรส. กวส. กบข.	401.332	277.293	298.538	107.7	21.245	8.537	56.756	664.8	48.219
61. แผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน ระยะที่ 2 (มติ 66)	ฝบก.1 กจค.4 (บก1)	2,050.000	241.850	80.387	33.2	(161.463)	67.650	80.387	118.8	12.737
62. แผนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 2 และผังบริเวณ กฟผ. สำนักงานใหญ่ เพื่อขอรับการประเมินและการรับรองมาตรฐาน LEED (มติ 66)	ฝยธ. กจก.	403.969	35.850	-	-	(35.850)	35.850	-	-	(35.850)
63. แผนงานเข่ายานพาหนะปี 2566-2571 (มติ 66)	รผก.(ล) / กจย.	1,076.635	32.628	27.555	84.5	(5.073)	7.124	0.068	1.0	(7.056)
64. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 2 (มติ 66)	ฝปฟ. กทข.	286.339	28.170	28.081	99.7	(0.089)	-	28.081	-	28.081
65. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม (มติ 66)	ฝสท.	761.078	546.374	328.777	60.2	(217.597)	122.068	283.334	232.1	161.266
รวมแผนงานระยะยาว		46,649.347	12,454.526	11,104.266	89.2	(1,350.260)	2,082.921	2,141.694	102.8	58.773
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ		73,951.080	24,014.577	21,615.931	90.0	(2,398.646)	3,822.212	3,452.985	90.3	(369.227)
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก										
งานเช่าที่ดิน - อาคาร	ฝงป. กปง.	424.543	79.000	115.490	146.2	36.490	7.000	4.549	65.0	(2.451)
งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ	ฝสท. กอส.	146.792	24.024	-	-	(24.024)	12.012	-	-	(12.012)
รวมสัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก		571.335	103.024	115.490	112.1	12.466	19.012	4.549	23.9	(14.463)

การใช้จ่ายเงินลงทุน ปี 2566

ณ 31 ธันวาคม 2566

(ล้านบาท)										
แผนงาน/งาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2566	มกราคม - ธันวาคม 2566				ธันวาคม 2566			
			เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริงปี 2566		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	เป้าหมาย เบิกจ่าย	จ่ายจริง		สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
				วงเงิน	%			วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ										
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.1	ฝบก.2 กจค.3 (บก2)	95.828	18.819	19.069	101.3	0.250	-	-	-	-
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	ฝบก.1 กจค.2(บก1)	242.390	202.711	180.001	88.8	(22.710)	0.350	34.189	9,768.3	33.839
3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	ฝบก.2 กจค.3(บก2)	505.413	204.000	185.099	90.7	(18.901)	47.693	64.928	136.1	17.235
4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	ผชก.(ป-กส) ฝบก.1 กจค.3(บก1)	979.814	500.000	452.487	90.5	(47.513)	92.035	39.341	42.7	(52.694)
5. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	ฝบก.2 กจค.4(บก2)	503.305	81.519	45.273	55.5	(36.246)	30.071	18.109	60.2	(11.962)
6. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3	ฝบก.2 กจค.2(บก2)	185.769	35.976	45.725	127.1	9.749	-	5.315	-	5.315
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	รผก.(ป) ฝปฟ. ศปฟ.	966.393	672.857	688.040	102.3	15.183	6.181	386.645	6,255.4	380.464
8. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี	รผก.(วว), กรอ.	20.875	2.500	2.101	84.0	(0.399)	-	0.001	-	0.001
9. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	ฝบก.1 กจค.2(บก1)	293.278	10.223	24.705	241.7	14.482	0.050	2.143	4,286.0	2.093
10. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	รผก.(ป) ฝบก.2 กจค.1 (บก2)	9,993.727	2,400.000	3,020.965	125.9	620.965	392.772	657.150	167.3	264.378
11. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)	รผก.(วว), กรอ.	30.606	20.618	15.289	74.2	(5.329)	-	0.021	-	0.021
12. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (คพญ.1)	ผชก.(ป-กส) ฝบก.1 กจค.1(บก1)	3,253.412	844.251	1,392.782	165.0	548.531	364.456	591.978	162.4	227.522
13. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	ผชก.(ป-กส) ฝบก.1 กจค.2(บก1)	681.782	152.579	192.353	126.1	39.774	49.000	68.244	139.3	19.244
14. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2)	รผก.(ป) ฝบก.1 กจค.2 (บก1)	1,275.741	1,000.000	736.577	73.7	(263.423)	106.613	53.524	50.2	(53.089)
15. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยัง เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)	ผชก.(ป-กส) ฝบก.1 กจค.4(บก1)	2,102.179	-	-	-	-	-	-	-	-
16. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.)	ฝมจ. กจว.	1,626.490	139.416	414.916	297.6	275.500	-	276.624	-	276.624
17. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.)	ฝบก.2 กจค.4(บก2)	73.572	25.124	1.877	7.5	(23.247)	-	-	-	-
18. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	รผก.(ป) ฝบก.1 กจค.3 (บก1)	25,309.142	10,795.576	11,942.015	110.6	1,146.439	1,286.589	2,385.961	185.4	1,099.372
19. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.)	ผชก.(ป-กส) ฝบก.2 กจค.4(บก2)	1,609.068	1,414.980	51.879	3.7	(1,363.101)	1.670	2.193	131.3	0.523
20. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพื้นที่ เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี (คลพ.)	ฝบก.2 , กจค.2(บก2)	140.587	87.849	88.595	100.8	0.746	27.326	25.490	93.3	(1.836)
รวมงานโครงการ		49,889.371	18,608.998	19,499.748	104.8	890.750	2,404.806	4,611.856	191.8	2,207.050
รวมทั้งสิ้น		124,411.786	42,726.599	41,231.169	96.5	(1,495.430)	6,246.030	8,069.390	129.2	1,823.360
