



ที่ สท ๐๐๐๓ /ว ๒๕

สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย

ถนนนิกรเกษม สท ๖๔๐๐๐

๑/๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

เรียน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสุโขทัย ค่วนที่สุด ที่ สท ๐๐๐๓/ว ๑๔๕๗ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบรับรองรายงานการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่อ้างถึง จังหวัดสุโขทัยได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
และการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗
เพื่อติดตาม กำกับ เร่งรัดและรับทราบปัญหา อุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายงบประมาณ
ได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) เพื่อให้ส่วนราชการที่เข้าร่วม
การประชุมฯ ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) โดยแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย
ทราบภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมฯ
ได้ที่ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางประภาวดี สุคันธมาลัย)

คลังจังหวัดสุโขทัย

QR Code รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗



กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร.๐ ๕๕๖๑ ๓๓๖๓ ต่อ ๓๑๖

โทรสาร ๐ ๕๕๖๑ ๒๐๔๓

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ sti@cgd.go.th

บัญชีแนบท้าย

- ๑) ปลัดจังหวัดสุโขทัย
- ๒) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย
- ๓) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
- ๔) ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
- ๕) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย
- ๖) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย
- ๗) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔
- ๘) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย
- ๙) ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย
- ๑๐) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
- ๑๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
- ๑๒) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒
- ๑๓) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
- ๑๔) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย
- ๑๕) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
- ๑๖) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย
- ๑๗) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
- ๑๘) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุโขทัย
- ๑๙) ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย
- ๒๐) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
- ๒๑) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
- ๒๒) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
- ๒๓) นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
- ๒๔) นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย
- ๒๕) นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก
- ๒๖) ผู้อำนวยการงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
- ๒๗) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
- ๒๘) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย

แบบรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศิริมาศ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

หน่วยงาน

- ☐ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข
- ☐ รับรองรายงานการประชุม โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

- หมายเหตุ: ๑) โปรดส่งแบบตอบรับรายงานการประชุมมายัง สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ทางระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ Smart office จังหวัดสุโขทัย หรือ ระบบ E-mail : sti@cgd.go.th หรือ โทรสาร ๐๕๕-๖๑๒๐๔๓
- ๒) ผู้ประสานงาน นางสาวณัฐพร กันจ้อย ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๓๓๖๓ ต่อ ๓๑๖

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศิริมาศ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวน มะเสนา	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร เอ็มโอด	ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	กรรมการ
๓. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี จันทมา	แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุโขทัย	กรรมการ
๔. นางสมจิตร อำทอง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ ๔	กรรมการ
๕. นางสาวดารุง ทองอำไพ	แทน ปลัดจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๖. นางสาวนิตย สุริยะ	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย	กรรมการ
๗. นางอรรณณ เชาว์ชำนาญ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๘. นางสาวโสภภาพรรณ วงศ์ศรี	แทน ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๙. นางสุนิศา สลึงค์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย	กรรมการ
๑๐. นางสาวรุ่งกานต์ ธงชัย	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	กรรมการ
๑๑. นางสาวพิมชนก ขำประเสริฐ	แทน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย	กรรมการ
๑๒. นางสาวเพ็ญจันทร์ มั่นคง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุโขทัย	กรรมการ
๑๓. นายวีระ พุ่มไม้	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑	กรรมการ
๑๔. นายจักรี บุญสา	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒	กรรมการ
๑๕. นางภัทราวดี โตอุ่นเพชร	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๑๖. นางเกววัลย์ รากคำ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย	กรรมการ
๑๗. นางสาวโสภา หล้าวงศ์สาย	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสวรรค์สุโขทัย	กรรมการ
๑๘. นางอรุณศรี บรรณสีเขียว	แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย	กรรมการ
๑๙. นายนฤชา ลิ้มภูษิตเจริญ	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีสุโขทัย	กรรมการ
๒๐. นายสรพงษ์ ปานบุตร	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง	กรรมการ
๒๑. นายธนสร กลิ่นมาลี	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย	กรรมการ
๒๒. นายดนัยลักษณ์ ไชยประเสริฐ	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๒๓. นางปาง สาทเทศ	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๒๔. นางอรกัญญา กิตติภณ	แทน นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี	กรรมการ
๒๕. นางจกมล สนศิริ	แทน นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย	กรรมการ
๒๖. นางณปรีศา ม่วงหมี่	แทน นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก	กรรมการ

๒๗. นางประภาวดี สุคันธมาลัย
๒๘. นางสาวรัตนฐาภัทร พรหมพร

คลังจังหวัดสุโขทัย
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานจังหวัดสุโขทัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. พ.ต.อ.กำลาภ โตทองสุข
๒. นางสาวอาภา จันทรศิริไพบูลย์
๓. นางสาวนพเก้า พวงดอกไม้
๔. พ.ต.ท.ณัฐดนัย พุ่มมาก
๕. ส.ต.ท.สหรัฐ สุริวงศ์
๖. นางสาวณัฐพร กันจ้อย
๗. นายอภิรักษ์ สุคันธมาลา

แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
แทน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย
เจ้าพนักงานธุรการ แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย
สารวัตรฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
ผู้บังคับการหมู่สืบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งเสลี่ยม
นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นายสุชาติ ทีคะสุข) ตัดราชการอื่น
จึงมอบหมายให้มาเป็นประธานการประชุมฯ แทน โดยกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงิน
ภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เวียนแจ้งรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ที่
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ที่ สท ๐๐๐๓/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม
๒๕๖๗ จำนวน ๒๘ หน้า โดยให้ตรวจสอบและแก้ไขภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เบื้องต้นไม่มีหน่วยงานใด
ขอแก้ไข หากมีกรรมการท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมมีส่วนใดที่ไม่ถูกต้องตามมติที่ประชุม ขอให้แจ้ง
ต่อที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

จึงนำเสนอเพื่อขอมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗



QR รายงานการประชุม
เร่งรัดเบิกจ่าย ๑/๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการดำเนินงานตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เลขานุการฯ นำเสนอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน) ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ ดังนี้
งบจังหวัด

งบประจำ ภาพรวม ได้รับจัดสรร ๓๕.๓๖๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๓.๓๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙๐ ใช้จ่าย ๒๓.๓๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙๙ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ -๓๔.๐๑

งบจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินจัดสรร	ผลการก่อหนี้ (PO)+ สำรองเงินมีหนี้		เบิกจ่าย		รวมใช้จ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		คงเหลือ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย Q ๓	+/- เป้าหมาย	
- งบประจำ	๓๕.๓๖๔	๐.๐๓๓	๐.๐๙	๒๓.๓๐๓	๖๕.๙๐	๒๓.๓๓๖	๖๕.๙๙	๑๐๐.๐๐	-๓๔.๐๑	๑๒.๐๒๘
- งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐	-	-
- ภาพรวม	๓๕.๓๖๔	๐.๐๓๓	๐.๐๙	๒๓.๓๐๓	๖๕.๙๐	๒๓.๓๓๖	๖๕.๙๙	๑๐๐.๐๐	-๓๔.๐๑	๑๒.๐๒๘

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประจำ ได้รับจัดสรร ๑,๓๖๓.๖๘๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๒๕๓.๐๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๙ ใช้จ่าย ๑,๒๕๘.๑๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๖ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ -๗.๗๔

งบลงทุน ได้รับจัดสรร ๕๕๓.๓๔๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๐๐.๓๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๓๔ ใช้จ่าย ๕๐๑.๒๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๘ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ -๙.๔๒

ภาพรวม ได้รับจัดสรร ๑,๙๑๗.๐๓๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๖๕๓.๓๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๔ ใช้จ่าย ๑,๗๕๙.๔๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๘ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ -๘.๒๒

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินจัดสรร	ผลการก่อหนี้ (PO)+ สำรองเงินมีหนี้		เบิกจ่าย		รวมใช้จ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		คงเหลือ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย Q ๓	+/- เป้าหมาย	
- งบประจำ	๑,๓๖๓.๖๘๖	๕.๑๕๗	๐.๓๘	๑,๒๕๓.๐๓๙	๙๑.๘๙	๑,๒๕๘.๑๙๖	๙๒.๒๖	๑๐๐.๐๐	-๗.๗๔	๑๐๕.๔๙๐
- งบลงทุน	๕๕๓.๓๔๙	๑๐๐.๙๓๖	๑๘.๒๔	๔๐๐.๓๐๖	๗๒.๓๔	๕๐๑.๒๔๒	๙๐.๕๘	๑๐๐.๐๐	-๙.๔๒	๕๒.๑๐๗
- ภาพรวม	๑,๙๑๗.๐๓๕	๑๐๖.๐๙๓	๕.๕๓	๑,๖๕๓.๓๔๕	๘๖.๒๔	๑,๗๕๙.๔๓๘	๙๑.๗๘	๑๐๐.๐๐	-๘.๒๒	๑๕๗.๕๙๖

ลำดับผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่าย ระดับประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

งบประมาณ ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๑๗ ของประเทศและผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๑๖ ของประเทศ เทียบกับสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๖ ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๒ และผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๒

งบลงทุน ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๑๐ ของประเทศและผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๑๘ ของประเทศ เทียบกับสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๖ ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๒ และผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๔

ภาพรวม ผลการเบิกจ่ายภาพรวมได้เป็นลำดับที่ ๓๗ ของประเทศและผลการใช้จ่ายภาพรวมได้เป็นลำดับที่ ๑๓ ของประเทศ เทียบกับสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๖ ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๓ และผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๑

ผลการจัดลำดับ (Ranking) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่าย

ระดับประเทศ / คลังในเขต ๖ (๙ จังหวัด) / กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ (๕ จังหวัด)

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

รายการ	ประเทศ		คลังจังหวัดในเขต ๖ (๙ จังหวัด)		กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ (๕ จังหวัด)	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
งบประมาณ	๑๗	๑๖	๒	๒	๑	๑
งบลงทุน	๑๐	๑๘	๒	๔	๑	๒
ภาพรวม	๓๗	๑๓	๓	๑	๑	๑

หมายเหตุ > ๙ คลังจังหวัดในเขต ๖ ประกอบด้วย พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี

> ๕ จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์

ประธาน

ให้ข้อสังเกตในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. งบประมาณจังหวัด หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจะสามารถเร่งดำเนินการก่อนนี้ ผู้กักกันได้ทันในไตรมาสที่ ๓ หรือไม่
๒. มติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายและใช้จ่าย งบประมาณ งบลงทุน โดยให้ก่อนนี้ผู้กักกันในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ หน่วยไหนบ้าง ที่จะก่อนนี้ผู้กักกันได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่งจะติดตามในวาระถัดไป
๓. การลงพื้นที่ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่าย ภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่า หน่วยรับงบประมาณในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ระยะเวลาเร่งรัดการก่อนนี้ผู้กักพัน การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗

เลขานุการฯ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ ดังนี้
 งบ Function กันเงินเหลื่อมปี ๕๓๕.๔๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๒๖.๘๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๐๔ คงเหลือ ๒๐๘.๕๙๐ ล้านบาท
 งบพัฒนาจังหวัด กันเงินเหลื่อมปี ๗๕.๓๐๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๙.๕๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๘๔ คงเหลือ ๒๕.๗๒๓ ล้านบาท
 รวมกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๖ กันเงินเหลื่อมปี ๖๑๐.๗๐๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๗๖.๓๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๓ คงเหลือ ๒๓๔.๓๑๓ ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย		คงเหลือ
		จำนวน	ร้อยละ	
งบ Function	๕๓๕.๔๐๐	๓๒๖.๘๑๐	๖๑.๐๔	๒๐๘.๕๙๐
- สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	๑๒๘.๑๖๒	๑๑๔.๓๔๐	๘๙.๒๒	๑๓.๘๒๒
งบพัฒนาจังหวัด	๗๕.๓๐๓	๔๙.๕๘๐	๖๕.๘๔	๒๕.๗๒๓
รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๖	๖๑๐.๗๐๓	๓๗๖.๓๙๐	๖๑.๖๓	๒๓๔.๓๑๓

ประธาน สอบถามฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบเพิ่มขึ้น/ลดลงกับเดือนที่ผ่านมาหรือไม่ หรือมีหน่วยงานเจ้าของงบประมาณสามารถให้ข้อมูลกับที่ประชุมได้หรือไม่

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการขยายระยะเวลาดำเนินการ ๗ โครงการ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้มีการดำเนินการตามสัญญาและทยอยส่งเบิกจ่ายเงิน ทำให้มีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น

ประธาน ผากฝ่ายเลขานุการฯ และหน่วยรับงบประมาณที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบการดำเนินงานกับเดือนที่ผ่านมาและปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานที่ประชุมทราบทุกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๘๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เลขานุการฯ นำเสนอมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๘๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

สำนักงบประมาณ ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การหักงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร ในระหว่างที่ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยรับงบประมาณสามารถจ่ายเงินหรือก่อกองหนี้ผูกพันได้ทันที เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้บังคับ ดังนี้

๑. การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๑.๑ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของแต่ละแผนงาน เต็มจำนวนวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา เป็นรายเดือนและรายไตรมาส

๑.๒ ให้หน่วยรับงบประมาณนำผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลาทกอน ในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ มากำหนดเป็นแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ สำหรับไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ ให้หน่วยรับงบประมาณกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าเป้าหมาย ในภาพรวมของประเทศ ดังนี้

แผนฯ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
ภาพรวม	ร้อยละ ๒๘	ร้อยละ ๔๗	ร้อยละ ๘๒	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๓๓	ร้อยละ ๕๓	ร้อยละ ๘๒	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๑๑	ร้อยละ ๒๔	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐

๒. การอนุมัติเงินจัดสรร

๒.๑ สำนักงบประมาณจะอนุมัติเงินจัดสรรแต่ละแผนงานตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ให้แก่หน่วยรับงบประมาณ โดยไม่ต้องยื่นขอรับอนุมัติเงินจัดสรรต่อสำนักงบประมาณ แต่หน่วยรับงบประมาณจะใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้บังคับแล้ว

๒.๒ เมื่อได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว กรณีเป็นงบประมาณรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคโดยเร็วอย่างช้าภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยรับงบประมาณให้ความสำคัญกับการพิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้น เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ สำหรับรายการผูกพันใหม่ควรดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ กรณีที่คาดว่าจะมีรายการงบประมาณที่จะไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอให้แจ้งสำนักงบประมาณ เป็นรายกรณีในโอกาสแรก เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขต่อไป

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ (กระทรวงการคลัง) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยอ้างอิงจากแผนและเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของสำนักงบประมาณตาม ว ๘๔ ให้หน่วยรับงบประมาณ ดำเนินการดังนี้

๑. ให้เร่งเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลืออมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. กำหนดระยะเวลาส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้น และเบิกจ่ายตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓. ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน โดยเร่งรัดหรือปรับแผนการดำเนินงานและใช้จ่ายภายในไตรมาสที่ ๒
๔. กำหนดระยะเวลาการก่องหนี้ผูกพัน
 - ✓ รายการลงทุนปีเดียวให้ก่องหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗
 - ✓ รายการผูกพันใหม่ให้ก่องหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗
๕. ให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณกำกับดูแล บริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการ เพื่อให้สามารถก่องหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๖. กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	๕๑	๘๒	๙๓	๑๐๐
รายจ่ายประจำ	๕๘	๘๒	๙๘	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๒๑	๘๐	๗๕	๑๐๐

ประธาน

ประเด็นข้อสั่งการ

๑. ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้าตามหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ว ๔๑ ที่ลดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการ ไม่ต้องรอการอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ โดยให้เร่งดำเนินการหาผู้รับจ้างไว้รอ กรณีที่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณหน่วยงานสามารถลงนามสัญญาได้ทันทีเมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศใช้
๒. ขอให้หน่วยงานรับงบประมาณ เมื่อได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณแล้ว ให้เร่งดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานย่อยในสังกัดและเร่งรัดให้ดำเนินการโดยเร็วอย่างช้าภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร

มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติตามที่ประธานสั่งการ

๓.๔ ระบบติดตามสถานะการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านกลุ่มไลน์ “เร่งรัดเบิกจ่าย-สุโขทัย”

เลขานุการฯ นำเสนอระบบติดตามสถานะการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดสุโขทัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านกลุ่มไลน์ “เร่งรัดเบิกจ่าย-สุโขทัย”

ขอให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ
สแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์
“เร่งรัดเบิกจ่าย-สุโขทัย”



QR เข้ากลุ่มไลน์
เร่งรัดเบิกจ่าย-สุโขทัย


ระบบติดตามสถานะการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เป็นเครื่องมือ
อำนวยความสะดวก สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้า
ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการกำกับ ติดตามสถานการณ์เบิกจ่ายและ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายโครงการ โดยสามารถติดตามผ่านมือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

โดยสำนักงานคลังจังหวัดได้จัดทำระบบติดตามสถานะการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อสนับสนุนข้อมูลงบประมาณ/โครงการ แยกหมวด
ตามประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบภาพรวมจังหวัดสุโขทัย งบรายจ่ายลงทุน งบรายจ่าย
ประจำ งบยุทธศาสตร์จังหวัด งบอุดหนุนเฉพาะกิจเงินกันไว้เบิกเหลือปี ซึ่งเป็นข้อมูลจาก
ระบบ New GFMS Thai และมีการ Update ทุกสัปดาห์ โดยส่วนราชการสามารถ
ตรวจสอบงบประมาณโครงการของหน่วยงานตนเองได้เป็นรายโครงการมีผลการบันทึก PO
ผลการเบิกจ่าย ผลการใช้จ่าย เทียบเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด สำหรับงบอุดหนุนเฉพาะกิจ
สามารถตรวจสอบได้ในระดับรายอำเภอรายเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล


วิธีการติดตามสถานะ ผลการ Update ข้อมูลในกลุ่มไลน์ ผ่านช่องทาง

> เร่งรัดเบิกจ่าย-สุโขทัย > คลิก โน้ต: > คลิก ดูโน้ต

คลิก <https://lookerstudio.google.com/reporting/dbe5๕๓๐๔-e๖๗e-๔๗๔f-aa๗๗-c๘db๙๔๓๘๙๖๖๓>

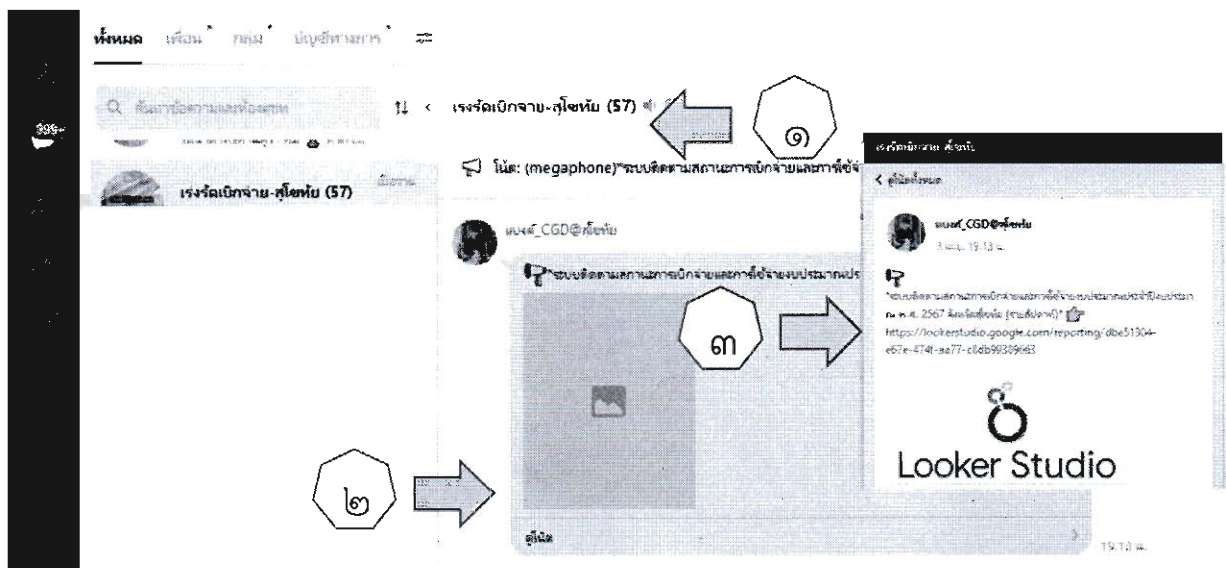

ระบบติดตามสถานะการเบิกจ่าย-สุโขทัย

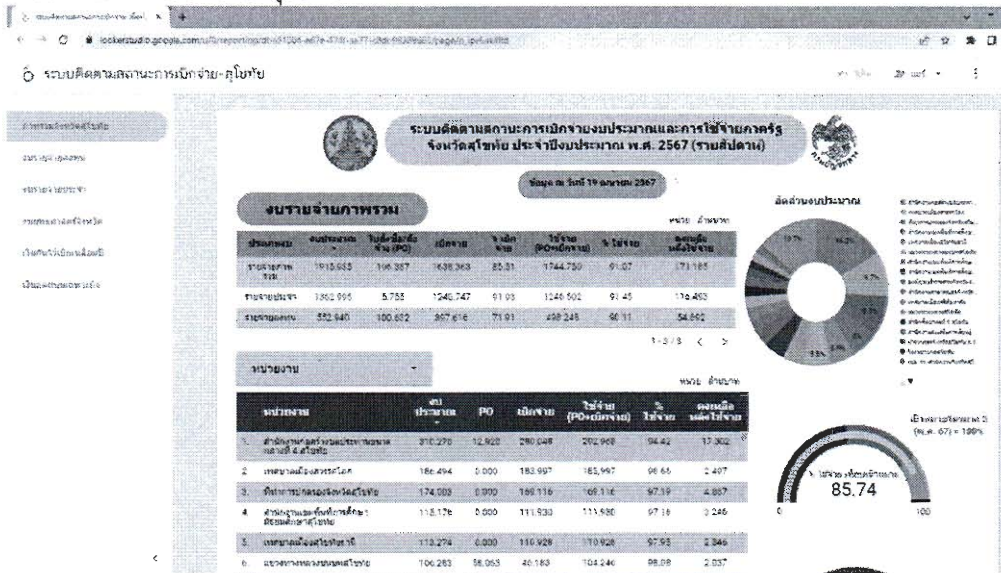

ประธาน

ระบบติดตามสถานะการเบิกจ่าย-สุโขทัย เป็นเครื่องมือที่สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย สร้างขึ้นมา จึงอยากให้ทุกหน่วยงานใช้ระบบนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ ให้ผู้บริหารที่สามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการปัญหาอุปสรรคของทุกหน่วยงาน ที่ได้รับ งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบพัฒนาจังหวัด และงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือปี ที่ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการ โดยสำนักงานคลังจังหวัดจะสรุปข้อมูลภาพรวมให้ผู้บริหารได้ทราบทุกวันศุกร์ โดยจะให้อำเภอทุกอำเภอที่ได้รับงบประมาณงบพัฒนาจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรอกรายความคืบหน้าของโครงการ ทุกวันที่ ๑๐ วันที่ ๒๐ และ ทุกสิ้นเดือน และอยากให้สำนักงานคลังจังหวัดนำเสนอเป็นโครงการที่เป็นนวัตกรรมของ PMQA โดยจะให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่อง PMQA ของสำนักงานจังหวัดมาดูแลเพื่อจะได้พัฒนาซึ่งเป็น นโยบายในการกำกับดูแลของภาครัฐตรงกับวัตถุประสงค์และภารกิจของจังหวัด

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายรายจ่ายงบลงทุนหน่วยงาน ที่มีโครงการโดยใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน จำนวน ๙ หน่วยงาน

เลขานุการฯ

ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายรายจ่ายงบลงทุน หน่วยงานที่มีโครงการ โดยใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน จำนวน ๙ หน่วยงาน ตามลำดับ ดังนี้

๑. โครงการชลประทานสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท งบประมาณ ๖.๕๒๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕.๙๒๒ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๖๐๒ ล้านบาท งานดำเนินการเอง ๖ โครงการ งานบำรุงแหล่งน้ำ กำจัดวัชพืชด้วยแรงงานคนและเครื่องจักร ค่าจ้างลูกจ้าง ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง สิ้นสุดสัญญาเดือนกันยายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนและ เบิกจ่ายทุกเดือน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

/๒. บำรุง...

๒. บำรุงรักษาโครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑๓.๓๘๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๙.๕๐๗ ล้านบาท คงเหลือ ๓.๘๘๐ ล้านบาท งานดำเนินการเอง งานบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ค่าจ้างลูกจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

เลขานุการฯ จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนที่โครงการและดำเนินการถึงขั้นตอนใด งานดำเนินการเองก็โครงการ และจัดซื้อจัดจ้างก็โครงการ

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย โครงการชลประทาน งบ Function จำนวน ๓๔ โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รายละเอียดงานดำเนินการเองและโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการจะแจ้งให้สำนักงานคลังจังหวัดทราบต่อไป

ประธาน มีโครงการของงบบุทธศาสตร์จังหวัด ๒ โครงการ ได้เตรียมดำเนินการถึงขั้นตอนใด คาดว่าจะประกาศผู้ชนะได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ หรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย โครงการของงบบุทธศาสตร์จังหวัด ๒ โครงการ อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางตรวจสอบเอกสารราคากลาง ซึ่งโครงการมีการปรับเปลี่ยนปริมาณงานต้องเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) และยังไม่ได้นำเสนอเข้าที่ประชุม กบจ.

ประธาน โครงการชลประทานและสำนักงานจังหวัดเร่งดำเนินการโครงการงบบุทธศาสตร์จังหวัด กรณีหากมีการปรับเปลี่ยนปริมาณงานให้เร่งเสนอเข้าที่ประชุม กบจ. หากเข้าที่ประชุม กบจ. แล้ว ก็จะมีผลต่อการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ให้สำนักงานจังหวัดตรวจสอบโครงการงบบุทธศาสตร์จังหวัดที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนปริมาณงาน แก้ไขแบบรูปรายการ ที่ต้องนำเข้าที่ประชุม กบจ. มีจำนวนกี่โครงการ

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย สำนักงานจังหวัดได้สำรวจโครงการงบบุทธศาสตร์จังหวัดที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนปริมาณงาน แก้ไขแบบรูปรายการ จำนวน ๗ โครงการ แยกตามหลวงชนบท ๑ โครงการ โครงการชลประทาน ๑ โครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอศรีนคร ๓ โครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง ๑ โครงการ และที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชฌาย์ ๑ โครงการ ซึ่งสำนักงานจังหวัดกำหนดการประชุม กบจ. งบประมาณวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ประธาน โครงการงบบุทธศาสตร์จังหวัดที่สำนักงานจังหวัดกล่าว ส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ และโครงการถนน ซึ่งต้องดำเนินการก่อนช่วงฤดูฝน ให้เร่งดำเนินการทำรายละเอียดเสนอเข้าที่ประชุม กบจ.

๒. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการทำนบดินห้วยนางพร้อมอาคารประกอบ ความจุ ๑๑.๘๘ ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร งบประมาณ ๖๗.๕๐๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕๖.๐๗ ล้านบาท คงเหลือ ๑๑.๔๓๖ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเองอยู่ระหว่างดำเนินการ พบปัญหา

/อุปสรรค...

อุปสรรคที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากเครื่องมือเครื่องจักรที่ขอรับการสนับสนุนจากโครงการส่วนเครื่องจักรกลพิษณุโลกติดภารกิจปฏิบัติงานหน้างานจำนวนมาก แต่ก็เร่งดำเนินการขอรับการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรและดำเนินการให้เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ประธาน

เสนอแนะในงบประมาณถัดไปให้ขอโครงการในลักษณะจัดซื้อจัดจ้างซึ่งจะสามารถดำเนินการได้เร็วกว่างานดำเนินการเองที่ต้องพบปัญหาอุปสรรคขาดแคลนเครื่องมือเครื่องจักร

๓. สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท งบประมาณ ๐.๐๐๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๐๐๑ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๐๒ ล้านบาท ค่าควบคุมงานอยู่ระหว่างเบิกจ่าย (เบียดเบียน)
๒. ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท งบประมาณ ๐.๐๑๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๐๐๖ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๐๘ ล้านบาท จะเบิกจ่ายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำ
๓. ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท งบประมาณ ๐.๗๘๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๐๘๔ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๖๙๖ ล้านบาท ผู้รับจ้างขอหยุดงานเนื่องจากพื้นที่การดำเนินการของเกษตรกรติดผลผลิตทางการเกษตร คาดว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยจะเร่งให้ผู้รับจ้างดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗
๔. ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก งบประมาณ ๑.๒๙๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๓๓๙ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๙๕๗ ล้านบาท งานดำเนินการเอง เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน ค่าอำนวยการ ค่าเบียดเบียน ค่าจ้าง ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗
๕. ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม (เดิมเพื่อแจกจ่าย) งบประมาณ ๐.๖๐๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๓๐๔ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๓๐๒ ล้านบาท งานดำเนินการเอง เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน ค่าอำนวยการ ค่าเบียดเบียน ค่าจ้าง ระยะเวลาดำเนินการ ๑๖๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๖. จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน งบประมาณ ๑.๔๘๘ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างดำเนินการโดยมีความคืบหน้าโครงการ ๑๒ %
๗. จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร งบประมาณ ๐.๕๒๗ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างดำเนินการโดยมีความคืบหน้าโครงการ ๒๐ %
๘. ค่าควบคุมงานระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน งบประมาณ ๐.๐๒๖ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย จะเบิกจ่ายควบคู่กับโครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน โดยจะเร่งให้เขียนค่าเบียดเบียน
๙. ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร งบประมาณ ๐.๐๐๙ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย จะเบิกจ่ายควบคู่กับโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร โดยจะเร่งให้เขียนค่าเบียดเบียน

๔. แนวทางหลวงสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการแนวทางหลวงสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน งบประมาณ ๒.๔๘๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๐๖๔ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๔๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
๒. ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท งบประมาณ ๔๐.๕๓๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๔.๐๙๑ ล้านบาท คงเหลือ ๖.๔๔๕ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๕. แนวทางหลวงชนบทสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการแนวทางหลวงชนบทสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท งบประมาณ ๓๓.๗๘๓ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ๔ โครงการ
๒. ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท งบประมาณ ๘.๙๘๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๒๓๙ ล้านบาท คงเหลือ ๗.๗๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
๓. ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท งบประมาณ ๒.๖๘๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
๔. ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท งบประมาณ ๓๖.๑๙๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๐.๙๖๕ ล้านบาท คงเหลือ ๑๕.๒๒๙ ล้านบาท จัดซื้อจัดจ้าง ๔ โครงการเป็นเงิน ๒๒.๘๗๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างลงนามสัญญา และเป็นงบดำเนินการเอง ๑๒.๑๒๙๖ ล้านบาท คาดว่าสิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จะเบิกจ่ายได้เพิ่มจำนวน ๘.๐๕๒ ล้านบาท
๕. ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท งบประมาณ ๑๙.๗๖๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๙.๕๕๓ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๒๐๙ ล้านบาท เป็นงานจ้างเหมา ๑๐ โครงการ เป็นเงิน ๑๘.๖๓๔ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และงานดำเนินการเอง เป็นเงิน ๑.๑๒๙ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๖. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณ ๐.๒๐๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย เป็นงานดำเนินการเอง อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย
๒. ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน งบประมาณ ๐.๑๔๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๑๔๓ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๐๓ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ
๓. การสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ งบประมาณ ๐.๐๔๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๐๐๖ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๓๔ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง อยู่ระหว่างแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปส่วนจังหวัด

๔. การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการผังเมืองในพื้นที่ระดับจังหวัด งบประมาณ ๐.๐๙๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๐๖๕ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายลักษณะดำเนินการเอง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ
๕. การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน งบประมาณ ๐.๐๕๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างจัดทำเล่มรายงานผังเมืองชุมชนบ้านด่านลานหอย เพื่อประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง
๖. โครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัด และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน งบประมาณ ๐.๑๔๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๑๒๒ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายลักษณะดำเนินการเอง ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๗. สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท งบประมาณ ๒๙.๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๓.๕๔๙ ล้านบาท คงเหลือ ๑๕.๔๕๑ ล้านบาท งานดำเนินการเอง ๒ โครงการ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จำนวน ๑๘ ล้านบาท อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จำนวน ๑๑ ล้านบาท
๒. ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท งบประมาณ ๐.๓๖๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๒๘๗ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๗๙ ล้านบาท สำรวจออกแบบกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ๒๓๐,๐๐๐ บาท สำรวจแหล่งโบราณสถาน กลุ่มโบราณคดี ๑๐๐,๐๐๐ บาท สำรวจและขึ้นทะเบียนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง ๒๑,๐๐๐ บาท และสำรวจและขึ้นทะเบียนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรคพรนายก ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งมีการเบิกจ่ายทุกเดือน
๓. ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท งบประมาณ ๘.๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๐๖๘ ล้านบาท คงเหลือ ๕.๙๓๒ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง ๕ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายทุกเดือน และงานจ้างเหมาโครงการบูรณะวัดวังทองวราราม จังหวัดพิษณุโลก เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานในงวดที่ ๒ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้กลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๘. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๓๘๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (งบผูกพันข้ามปี) งบประมาณ ๑.๖๕๒ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๘-๙ ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ และตรวจรับงานวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ปัญหาอุปสรรคผู้รับเข้าดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มล่าช้าประมาณ ๖ เดือน เนื่องจากขาดแคลนแรงงานและวัสดุ
๒. อาคารผู้ป่วยนอก ๖ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๘๕ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสวรรคโลก ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย (งบผูกพันข้ามปี) เบิกจ่ายงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๒ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากการแก้ไขแบบท้ายสัญญา

๓. ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบคลองวนเวียน ขนาดรองรับ ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน
โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดสุโขทัย
(งบผูกพันข้ามปี) เบิกจ่ายงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๒ แล้ว
และคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๓ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พบปัญหา
อุปสรรคในการสำรวจวางท่อซึ่งผู้รับจ้างไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ ซึ่งทาง สสจ.
ได้ติดตามและเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามกำหนดสัญญา

ประธาน อาคารผู้ป่วยนอก ๖ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๘๕
ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสวรรค์โลก เบิกจ่ายเงินได้เพียง
๑ งวด ล่าช้าเพราะอะไร ขอให้เร่งรัดผู้รับจ้างเรื่องการบริหารสัญญา ให้เป็นไปตามแผน
เนื่องจากเป็นปัญหาความต้องการ เรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชน

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ล่าช้าเพราะพบปัญหาการคืบคานเสาเข็ม แก้ไขแบบท้ายสัญญา
ซึ่งปี ๒๕๖๖ มี ๗ งวดงาน ปี ๒๕๖๗ ๘ งวดงาน รวม ๑๖ งวดงาน เบิกจ่ายได้ ๑ งวด
ความคืบหน้าของงาน ล่าช้าในการเปลี่ยนรูปแบบรายการและแก้ไขสัญญาซึ่งดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว

ประธาน ขอให้เร่งรัดผู้รับจ้างเรื่องการบริหารสัญญา ให้เป็นไปตามแผน เนื่องจากเป็นปัญหา
ความต้องการ เรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔. โรงพยาบาลสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๗๒ ยูนิต เป็นอาคาร
คสล.๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๐๗๕ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (งบผูกพันข้ามปี)
งบประมาณ ๑๔.๙๔๕ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างดำเนินการของปีงบประมาณ
๒๕๖๖ ซึ่งเบิกจ่ายงวดที่ ๒ แล้ว ๘.๓๓๐ ล้านบาท และคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๓
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ ปัญหาอุปสรรค ๑) ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการล่าช้า กรณีเลือก
บริษัทดำเนินการเรื่องเสาเข็ม ๒) งานฐานรากพบปัญหาฝนตกจึงไม่สามารถดำเนินการ
ได้ ๓) ผู้รับจ้างนำวัสดุเข้าหน้างานล่าช้า ๔) ผู้รับจ้าง ขาดแคลนแรงงาน ทั้งนี้ได้เรียก
ผู้รับจ้างเข้ามาประชุม ปรับแผนการดำเนินงาน เนื่องจากดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน

ประธาน กรณีที่โรงพยาบาลสุโขทัยได้เรียกผู้รับจ้างเข้ามาประชุมและให้โอกาสผู้รับจ้าง
ในการทำงานต่อ ถ้ายังไม่มี ความคืบหน้าก็ขอให้หน่วยงานบริหารสัญญาซึ่งกฎหมาย
ให้อำนาจหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐในการบริหารสัญญา

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๔.๒ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการฯ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ตามลำดับ ดังนี้

๑. โครงการชลประทานสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ปรับปรุงประตูระบายน้ำ กม.๒ คลองระบายน้ำแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑๖.๔๐๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๙๕๔ ล้านบาท คงเหลือ ๑๓.๔๔๘ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๕๐.๖๙ % จะดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ % ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗
๒. ปรับปรุงฝายยางเกาะวังษีเกียรติ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๗๘.๕๑๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๖๘๕ ล้านบาท คงเหลือ ๗๗.๘๓๓ ล้านบาท ปัจจุบันแล้วเสร็จ ๑๐๐ % อยู่ระหว่างขอลดค่าปรับ
๓. เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่ งบประมาณ ๔๑.๗๙๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๕.๘๑๑ ล้านบาท คงเหลือ ๕.๙๘๒ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๙๖ % คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๒. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. เชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร งบประมาณ ๑๘.๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘.๔๔๑ ล้านบาท คงเหลือ ๙.๕๕๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง แผนงาน ๖๗.๒๓ % ความก้าวหน้าของงาน ๖๘.๙๗ % เร็วกว่าแผนงาน ๑.๗๔ %
๒. ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑.๐๙๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๓๙๔ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๖๙๖ ล้านบาท พบว่าผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง คณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีการประชุมและมีมติยกเลิกสัญญา แต่ผู้รับจ้างขอเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ผู้รับจ้างดำเนินการถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถ้ายังดำเนินการไม่แล้วเสร็จจะยกเลิกสัญญา
๓. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเชื่อมป้องกันตลิ่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณ ๙.๕๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๒๔๘ ล้านบาท คงเหลือ ๘.๒๕๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง แผนงาน ๖๕.๔๙ % ความก้าวหน้าของงาน ๗๒.๐๒ % เร็วกว่าแผนงาน ๖.๕๓ % ผู้ควบคุมแจ้งว่าประมาณต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จะสามารถตรวจสอบงวดงานที่จะส่งมอบงานได้

๓. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคลองเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอศรีมาศ งบประมาณ ๑.๙๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๖๖๕ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๒๓๕ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้าง ๕๐ % เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ จำนวน ๖๖๕,๐๐๐ บาท คงเหลือส่งมอบงาน ๒ งวดงาน ปัญหาอุปสรรคผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาเนื่องจากน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง

๒. รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง งบประมาณ ๑.๐๐๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๐๐๐ ล้านบาท เดิมติดปัญหาหนังสือการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งได้รับการตอบกลับแล้ว และลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบพัสดุได้ทัน
๓. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองเสาเดียวใต้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไกรใน องค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ งบประมาณ ๓.๒๕๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๑๐๑ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๑๕๘ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างได้ ๕๐% เบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว มีการแก้ไขสัญญาแนบท้ายปรับลดปริมาณงานและจะเร่งส่งมอบงานงวดที่ ๒-๓
๔. ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย งบประมาณ ๖.๒๘๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๖๒๙ ล้านบาท คงเหลือ ๕.๖๕๙ ล้านบาท มีการแก้ไขสัญญาปรับลดปริมาณงานซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ และเร่งให้ผู้จ้างเข้าดำเนินการต่อในงวดงานที่ ๒ ซึ่งมีทั้งหมด ๕ งวดงาน ได้สอบถามผู้รับจ้างแล้วสามารถดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาเบิกจ่ายเงินกัน
๕. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เมืองบางขลัง โดยก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง งบประมาณ ๑.๔๐๐ ล้านบาท พบปัญหาอุปสรรค หน่วยงานได้ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จำนวน ๒ ครั้ง และวิธีคัดเลือก ๑ แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา เนื่องจากราคากลางสูงกว่าเงินงบประมาณ หน่วยงานจึงเปลี่ยนเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ผู้รับจ้างแล้วลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ แบ่งงวดงาน ๔ งวดงาน ผู้รับจ้างดำเนินการแล้ว ๑๐ %
๖. เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย งบประมาณ ๓๙.๐๗๙ ล้านบาท คงเหลือ ๕.๘๓๒ ล้านบาท กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี ๑๗ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๖ โครงการ คงเหลือ ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายท่าเตือ ซอย ๘ เชื่อมท่าเตือ ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

ประธาน	ฝากคลังจังหวัดติดตามเรื่องผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
เลขานุการฯ	หากมีหน่วยงานที่รอแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ให้แจ้งสำนักงานคลังจังหวัดทราบ

๔. สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. บำรุงและปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบราณสถานด้านทิศตะวันตก (เขตรัญญิก) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย งบประมาณ ๖.๗๒๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔.๓๖๘ ล้านบาท คงเหลือ ๔.๗๐๔ ล้านบาท จำนวน ๘ งาน ส่งมอบงาน ๕ งาน เหลือส่งมอบงานงวดที่ ๖-๘
๒. บำรุงและปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบราณสถานเขาพระบาทใหญ่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย งบประมาณ ๒.๖๙๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๐๗๖ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๖๑๔ ล้านบาท ตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้ว และคาดว่าจะตรวจรับงานงวดที่ ๒ กลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
๓. บำรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวโบราณสถานวัดโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร งบประมาณ ๘.๘๐๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ตรวจรับงานแล้ว ๑ งาน จะสามารถส่งมอบงานงวดที่ ๒ กลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

ประธาน ทั้ง ๓ โครงการมีค่าปรับเกิดขึ้นหรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ ทั้ง ๓ โครงการได้มีการขยายระยะเวลา ๑) โครงการบำรุงและปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบราณสถานด้านทิศตะวันตก (เขตรัญญิก) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย ขยายระยะเวลาดังวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๒) โครงการบำรุงและปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบราณสถานเขาพระบาทใหญ่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย ขยายระยะเวลาดังวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๓) โครงการบำรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวโบราณสถานวัดโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ขยายระยะเวลาดังวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

ประธาน เร่งรัดติดตามให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่ขยายสัญญา

๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒ รายงานผลการดำเนินงาน โตะเก้าอี้นักเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒ จำนวน ๒๔ โครงการ งบประมาณรวม ๐.๘๒๔ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding แบ่งจำนวน ๕ กลุ่ม จัดทำสัญญาแล้ว ๓ กลุ่ม มีผู้ขอเสนอผลการประกาศผู้ชนะ ๒ กลุ่ม อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน โดยจะแจ้งให้สำนักงานคลังจังหวัดช่วยติดตาม

ประธาน ผูกคลังจังหวัดติดตามเรื่องผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน จำนวน ๒ กลุ่ม และเร่งหน่วยงานแจ้งผู้ขายส่งมอบพัสดุให้ทันภายในกำหนดเพื่อให้ทันกับโรงเรียนเปิดเทอม

๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โรงอาหาร แบบ ๑๐๑ ล./๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) โรงเรียนพบพระวิทยาคม ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก งบประมาณ ๑๒.๗๕๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗.๖๑๖ ล้านบาท คงเหลือ ๕.๑๓๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ ๕-๖ ปัญหาอุปสรรคเนื่องจากบริเวณก่อสร้างชั้นดินมีคุณสมบัติหลายลักษณะ ต้องมีวิศวกรทำการตรวจสอบและให้ความเห็นในการกำหนดฐานรากให้ต้องรอคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้ไม่สามารถก่อสร้างได้ จึงได้มีการขยายสัญญาถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒. บ้านพักครู ๘ ครอบครัว โรงเรียนถนนอมราษฎรบำรุง ตำบลหัวเดียด อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก งบประมาณ ๓.๗๒๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๒๔๑ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๔๘๑ ล้านบาท ส่งมอบงานงวดที่ ๕ อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้าง และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ ๕-๖
๓. อาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕-ข ในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนตากพิทยาคม ตำบลระแหง อำเภอเมืองจังหวัดตาก งบประมาณ ๔.๔๗๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓.๐๘๔ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๓๘๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดสุดท้าย งวดที่ ๔ โดยจะเบิกจ่ายกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

ประธาน เร่งรัดติดตามงานในส่วนที่ขยายสัญญาให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ขยายสัญญา

๗. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงานค่าปรับปรุงอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑.๖๕๘ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ซึ่งได้สิ้นสุดสัญญาแล้วตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าปรับ ปัญหาอุปสรรคเนื่องจากผู้รับจ้างเข้าดำเนินการล่าช้า หน่วยงานได้มีหนังสือเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๑

ประธาน ปริมาณงานประกอบด้วยอะไรบ้าง เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาแล้ว ฝากหน่วยงานเร่งรัดและบริหารสัญญาให้ค่าปรับไม่เกิน ๑๐ %

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย ปริมาณงานประกอบด้วยปรับปรุงอาคารและรีโนเวส

๘. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิณพาทย์ ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก งบประมาณ ๑.๑๓๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๒๖๗ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๘๗๑ ล้านบาท เบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว และคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๒ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

๒. บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลศิริราช ตาบลดอนด อำเภอกีรีมาศ งบประมาณ ๒,๒๖๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๓๑๖ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๙๔๔ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างแก้ไขแนบท้ายสัญญาและมีค่าปรับ ๖๔ วัน วันละ ๒,๒๖๐ บาท เป็นเงิน ๑๔๔,๖๔๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเร่งรัดให้ผู้รับจ้างรีบดำเนินการ
๓. อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๓๘๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีษะนาถ ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอกีรีมาศ งบประมาณ ๑๔.๐๙๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๐.๗๗๗ ล้านบาท คงเหลือ ๓.๓๒๒ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๘-๙ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการตรวจรับงานวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗
๔. อาคารผู้ป่วยนอก ๖ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๘๕ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสวรรคโลก ตาบลดในเมือง อำเภอสวรรคโลก งบประมาณ ๑๗.๒๗๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๖๐๓ ล้านบาท คงเหลือ ๑๕.๖๗๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขแนบท้ายสัญญาครั้งที่ ๒ ในส่วนของฟังก์ชันภายในอาคาร คาดว่า จะส่งมอบงวดงานที่ ๒ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗

๙. โรงพยาบาลสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๗๒ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๐๗๕ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุโขทัย งบประมาณ ๑๙.๕๔๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘.๓๓๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑๑.๒๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๒ งวดงาน และอยู่ระหว่างดำเนินการ งานงวดที่ ๓

ประธาน ให้หน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้าง บริหารสัญญาให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

๑๐. ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน แห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.สุโขทัย ตาบลดธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑๒.๖๗๗ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายเงิน และอยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดงานที่ ๒ งานล่าช้ากว่าแผน ๔ % เนื่องจาก ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน และขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแก้ไขสัญญาแนบท้ายคาดว่าจะ ดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลา

๑๑. งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. รายการงบประจำ งบดำเนินงาน งบประมาณ ๓.๑๒๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย โครงการเกษตรแปรรูปของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายไม่ถูกต้องและหารือกับสำนักงบประมาณ
๒. ปรับปรุงหนองห้วยส้มคันใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านปากพระ ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย งบประมาณ ๒.๘๔๘ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย แจ้งผู้รับจ้าง ให้เข้างานแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๓. ปรับปรุงคลองเพชรหึง (กัว้วดำ) ตำบลน้ำพุ อำเภอศรีมศก งบประมาณ ๕.๒๖๗ ล้านบาท
ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
๔. ขุดลอกคลองตลุกน้ำ (คลองเปลือย) ตำบลน้ำพุ อำเภอศรีมศก งบประมาณ ๓.๔๑๖ ล้านบาท
ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
๕. รายการงบประจำ งบดำเนินงาน งบประมาณ ๕.๖๔๔ ล้านบาท คงเหลือ ๕.๒๕๐
ล้านบาท ค่าประชาสัมพันธ์งานลอยกระทง ปี ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
๖. งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่ งบประมาณ ๑๒.๙๕๒ ล้านบาท
คงเหลือ ๑๒.๒๙๕ ล้านบาท จำนวน ๘ โครงการซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอทองไทรลาด
เบิกจ่ายแล้ว ๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ โครงการ ล่าช้าเนื่องจากปัญหาน้ำ
ในพื้นที่มีปริมาณมากและชาวบ้านขอใช้น้ำก่อน

ประธาน โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอรายละเอียดให้ชัดเจนว่าอยู่ขั้นตอนใด

ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ได้ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ พบว่า โครงการได้เริ่มดำเนินการแล้ว
แต่ก็ยังติดปัญหาตามที่รายงานเบื้องต้น

ประธาน รายการงบดำเนินงานค่าประชาสัมพันธ์งานลอยกระทงปี ๒๕๖๖ เร่งให้ดำเนินการเบิกจ่าย
ตามเนื้องานที่ผู้รับจ้างดำเนินการตามปริมาณงาน

๑๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก
คอนกรีตสายบ้านวังลึก-บ้านลานกระบือ อำเภอบ้านด่านลานหอย รหัสสายทาง สท.ถ
๑-๐๐๒๕ งบประมาณ ๕.๘๕๒ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย เดิมโครงการนี้อยู่ระหว่าง
รอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนและได้รับ
แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์แล้วเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ และได้ลงนามสัญญาแล้ว แต่
งบประมาณถูกพับ เนื่องจากไม่ได้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีขณะนี้
หน่วยงานอยู่ระหว่างพิจารณาเงินงบประมาณที่จะเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้าง และผู้รับจ้าง
ยังไม่ได้เข้าดำเนินการ

ประธาน ให้หน่วยงานศึกษาทำความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้มากขึ้นและกรณีจังหวัดเชิญประชุมขอให้เข้าร่วมประชุมทุกครั้งเพื่อรับทราบแนวทาง
ปฏิบัติต่าง ๆ

เลขานุการฯ กรณีงบประมาณถูกพับไปและผู้รับจ้างยังไม่ได้ดำเนินการไม่มีผลเสียหายเกิดขึ้น
แต่กรณีผู้รับจ้างดำเนินการแล้วและต้องมีการเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างหน่วยงานจะต้อง
พิจารณางบประมาณของหน่วยงานตามข้อกฎหมายของหน่วยงาน ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุโขทัยและเทศบาลเมืองศรีสขนาลัยเข้าใช้งานระบบ New GFMS Thai
ได้หลายปีแล้ว หน่วยงานต้องทราบแนวทางการปฏิบัติการเงินไว้เบิกเหลือมปี ซึ่งทาง
สำนักงานคลังจังหวัด ได้แจ้งเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานกรณีการเงินไว้เบิกเหลือมปีให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีแนวโน้มที่จะใช้
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย โครงการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ จึงขอเร่ง
ให้หน่วยงานเร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน

ประธาน ผ่าทุกหน่วยงานให้เป็นกรณีศึกษาในการขยายระยะเวลาเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยหารือกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำคำของบประมาณในปี ๒๕๖๘ เพื่อเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างได้หรือไม่

๑๓. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างรางระบายน้ำและประตูเปิด-ปิดคลองระบายน้ำสาธารณะ หมู่ ๑๒ ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย งบประมาณ ๑.๒๘๕ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย โครงการนี้งบประมาณถูกพับ เนื่องจากไม่ได้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

ประธาน โครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้วหรือยัง

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงานแต่ได้ดำเนินการใกล้แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

ประธาน ให้หน่วยงานปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถขออนุมัติใช้เงินสะสม เงินเหลื่อมจ่ายได้หรือไม่ และให้ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดแจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยและเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย งบประมาณถูกพับไปในช่วงระยะเวลาให้ดำเนินการขยายระยะเวลาเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการขยายระยะเวลาเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในระบบ New GFMS Thai ในส่วนของข้อกฎหมายให้หน่วยงานพิจารณางบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน เงินสะสม และเงินจ่ายขาดที่จะต้องขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด

ประธาน สอบถามเลขานุการฯ สามารถอุทธรณ์ได้หรือไม่

เลขานุการฯ ไม่สามารถอุทธรณ์ได้

ประธาน ให้หน่วยงานขออนุมัติจ่ายขาดกับผู้ว่าราชการจังหวัดโดยจะต้องชี้แจงเหตุผลพอสมควร และฝากให้ทุกหน่วยงานเป็นบทเรียนอย่าละเลยหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานในระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบ GFMS กรณีที่ไม่เข้าใจขั้นตอนปฏิบัติงานสามารถสอบถามปรึกษาสำนักงานคลังจังหวัด

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

การมอบเกียรติบัตรอำเภอดีเด่นด้านการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

เลขานุการฯ นำเสนอการมอบเกียรติบัตรอำเภอดีเด่นด้านการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ตามมติที่ประชุมคณะที่ปรึกษาคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ระดับอำเภอ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย เห็นชอบให้มีการมอบเกียรติบัตรอำเภอดีเด่นด้านการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในฐานะคณะทำงานติดตามเร่งรัดฯ ระดับอำเภอที่สามารถติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพันหรือใช้จ่ายภาครัฐได้ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เช่นเดียวกับการมอบเกียรติบัตร ให้กับหน่วยเบิกจ่ายระดับจังหวัด ซึ่งมีการมอบในเดือนตุลาคม ของทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัด เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยจะนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบและแจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์ให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบต่อไป

/ ประธาน...

ประธาน เป็นกิจกรรมที่คณะที่ปรึกษาคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ระดับอำเภอ ได้เห็นชอบกิจกรรมนี้เพื่อเป็นเครื่องมือยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น

เลขานุการฯ จากการติดตามผลการดำเนินโครงการที่มีการดำเนินการบ้างแล้ว ซึ่งกรมบัญชีกลางแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยให้หน่วยงานกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ และปฏิบัติตามแนวทางการติดตามและเร่งรัดการทำงาน และแนวทางปฏิบัติประเมินผลการทำงานและการบอกเลิกสัญญา ฝากทุกหน่วยงานปฏิบัติตามหนังสือเวียนดังกล่าว

ประธาน หน่วยงานสามารถค้นหาหนังสือเวียนได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัด และให้หน่วยงานพิจารณาการกำหนดทุนจดทะเบียนในขั้นตอนของการพิจารณาผลเพื่อป้องกันผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องในการทำงาน และศึกษาทำความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบให้มากขึ้น

เลขานุการฯ ขณะนี้กรมบัญชีกลางมีนโยบายให้คลังเขต คลังจังหวัดเข้าร่วมการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งจะทำให้การพิจารณาอุทธรณ์รวดเร็วขึ้น หากหน่วยงานใดอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ สามารถแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดติดตามว่าอยู่ในขั้นตอนใด โดยให้สำเนาหนังสือส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดเพื่อติดตามต่อไป

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๑๕ น.

ลงชื่อ.....ผู้จดยางงานการประชุม
(นางสาวณัฐพร กันจ้อย)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวรัตนฐาภัทร พรหมพร)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
