



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง โทร 032 - 697286 ต่อ 203
ที่ ปช 53103 / 445 วันที่ 13 สิงหาคม 2567
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลร่อนทอง ประจำปีงบประมาณ 2567
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลร่อนทอง

1.เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลร่อนทอง ได้อนุมัติงบประมาณที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระบบ e-LAAS โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นั้น

2.ข้อเท็จจริง

กองช่างขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567) ที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลร่อนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลร่อนทอง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

3.ข้อกฎหมาย

3.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขจนถึงปัจจุบัน

3.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

3.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

4.ข้อพิจารณา

4.1 เห็นควรพิจารณา ตามข้อ 2 และรายละเอียดแนบท้าย เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

4.2 เห็นควรสำเนาแจ้งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ความเห็น info/นครราชสีมา

(นายวรณันท์ บุศราวิช)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่ง

อนนท์

(นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลร่อนทอง

(นายปรีดา วิชาสวัชรโยธิน)

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนทอง

รายงานการดำเนินโครงการ (ปีงบประมาณ 2567)

1.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างท่อถังประปา, ฐานถังกรองน้ำและงานย้ายท่อถังเหล็กพร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ชุมชนป่าร้อน ตำบลร้อนทอง

ประเภทกิจกรรม : ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

งบประมาณ 342,900.-บาท

งบตามเทศบัญญัติ 342,900.-บาท (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

1.ผู้ประสานงานโครงการ :

นายวรกันต์ บุศราวิช โทรศัพท์ 032 - 697286 ต่อ 7

2.รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล : เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค ของประชาชนในพื้นที่

เป้าหมายเชิงผลผลิต : ก่อสร้างฐานท่อถังประปา ก่อสร้างฐานถังกรองน้ำ ย้ายท่อถังเหล็ก ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 -100 เมตร) ตามแบบที่เทศบาลตำบลร้อนทองกำหนด

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ : เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค ประชาชนมีน้ำอุปโภคอย่างเพียงพอ

ผลที่คาดว่าจะเกิด : ประชาชน จำนวน 171 ครอบครัว มีน้ำสำหรับอุปโภคอย่างเพียงพอ

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ : ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ : ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลร้อนทอง

3.ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่เริ่มต้น : 26 มิถุนายน 2567

วันที่สิ้นสุด : 9 สิงหาคม 2567

4.การเบิกจ่ายงบประมาณ :

งบประมาณที่ตั้งไว้ 342,900.-บาท เบิกจ่าย 342,900.-บาท คงเหลือ 0.-บาท

5.สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการดำเนินงาน : -

6.ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งกลไกในเชิงยุทธศาสตร์ กลไกตามภารกิจ และกลไกในเชิงพื้นที่ ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่พัฒนาขึ้นใหม่รวมทั้งการเสริมความร่วมมือและการสร้างการมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วนในสังคม

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น

เป็นประตูกำหนดการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค โดยเน้นการขับเคลื่อนและขยายผลในพื้นที่ ให้ได้ครอบคลุม ในมิติด้านเศรษฐกิจ ผ่านการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ บนฐานความหลากหลายในมิติทางสังคม

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อย

เทศบาล ภาคท้องถิ่น มีการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วน มองเห็นปัญหา ความก้าวหน้า และช่องทางการพัฒนาที่ตรงกัน สร้างการรับรู้และเข้าใจต่อการพัฒนาและให้คนรู้สึกมีส่วนร่วม ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทในการขับเคลื่อน ตามสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของพลเมือง

7.พิกัด ที่ตั้งโครงการ

เส้นรุ้ง(ละติจูด)

เส้นแวง(ลองจิจูด)

8.สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ

โครงการก่อสร้างห้องประทับปา,ฐานถังกรองน้ำและงานย้ายห้องเหล็กพร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล

ณ ชุมชนปาร่อน ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามสัญญาจ้างเลขที่ 13/2567 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2567

☒ ก่อนดำเนินการ ☐ ขณะดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ



ทราบ.....ประธานกรรมการ

(นายวรกันต์ บุศราวิช)

ทราบ.....กรรมการ

(นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์)

ทราบ.....กรรมการ

(นางสาววิภาดา น้อยสะอาด)

โครงการก่อสร้างห้องถังประปา,ฐานถังกรองน้ำและงานย้ายห้องเหล็กพร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล

ณ ชุมชนปาร่อน ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามสัญญาจ้างเลขที่ 13/2567 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2567

☐ ก่อนดำเนินการ ☒ ขณะดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ



ทราบ.....ประธานกรรมการ

(นายวรณันท์ บุศราวิช)

ทราบ.....กรรมการ

(นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์)

ทราบ.....กรรมการ


(นางสาววิภาดา น้อยสะอาด)

โครงการก่อสร้างท่อส่งประปา,ฐานถังกรองน้ำและงานย้ายท่อส่งเหล็กพร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล

ณ ชุมชนป้าร้อน ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามสัญญาจ้างเลขที่ 13/2567 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2567

☐ ก่อนดำเนินการ ☒ ขณะดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

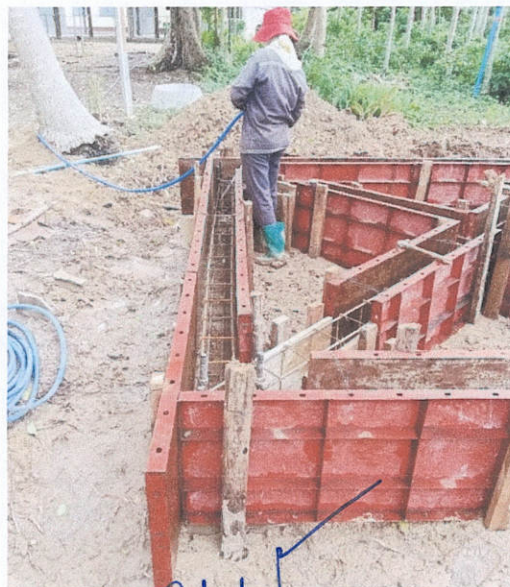

ทราบ.....ประธานกรรมการ

(นายวรกันต์ บุศราวิช)

ทราบ.....กรรมการ

(นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์)

ทราบ.....กรรมการ

(นางสาววิภาดา น้อยสะอาด)

โครงการก่อสร้างท่อถังประปา,ฐานถังกรองน้ำและงานย้ายท่อถังเหล็กพร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล

ณ ชุมชนปาร้อน ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามสัญญาจ้างเลขที่ 13/2567 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2567

☐ ก่อนดำเนินการ ☒ ขณะดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ



ทราบ.....ประธานกรรมการ
(นายวรกันต์ บุศราวิช)
ทราบ.....กรรมการ (นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์)
ทราบ.....กรรมการ (นางสาววิภาดา น้อยสะอาด)

โครงการก่อสร้างท่อถึงประปา,ฐานถังกรองน้ำและงานย้ายท่อถึงเหล็กพร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล

ณ ชุมชนปาร้อน ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามสัญญาจ้างเลขที่ 13/2567 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2567

☐ ก่อนดำเนินการ ☒ ขณะดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ



ทราบ.....ประธานกรรมการ

(นายวรณันท์ บุศราวิช)

ทราบ.....กรรมการ

(นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์)

ทราบ.....กรรมการ

(นางสาววิภาดา น้อยสะอาด)

โครงการก่อสร้างท่อถึงประปา,ฐานถังกรองน้ำและงานย้ายท่อถึงเหล็กพร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล

ณ ชุมชนป่าร้อน ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามสัญญาจ้างเลขที่ 13/2567 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2567

☐ ก่อนดำเนินการ ☒ ขณะดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ




ทราบ.....ประธานกรรมการ
(นายวรกันต์ บุศราวิช)
ทราบ.....กรรมการ
(นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์)
ทราบ.....กรรมการ
(นางสาววิภาดา น้อยสะอาด)

โครงการก่อสร้างหอดังประปา,ฐานถังกรองน้ำและงานย้ายหอดังเหล็กพร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล

ณ ชุมชนปาร่อน ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามสัญญาจ้างเลขที่ 13/2567 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2567

☐ ก่อนดำเนินการ ☐ ขณะดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ

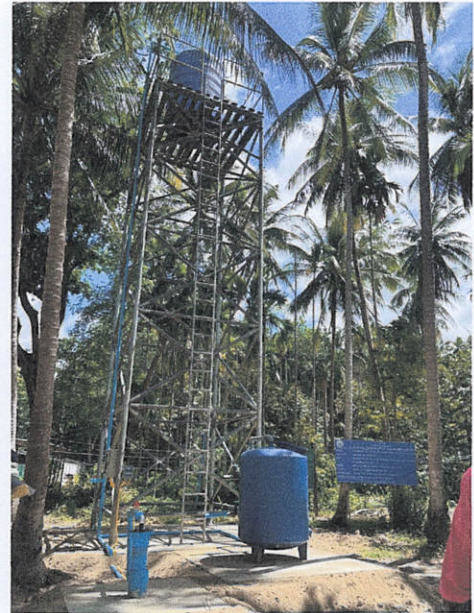

ทราบ.....ประธานกรรมการ

(นายวรณันท์ บุศราวิช)

ทราบ.....กรรมการ

(นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์)

ทราบ.....กรรมการ

(นางสาววิภาดา น้อยสะอาด)
