

รายงานการดำเนินโครงการ (ปีงบประมาณ 2567)

1.ชื่อโครงการ : โครงการติดตั้งป้ายชอยภายในเขตเทศบาลตำบลร่อนทอง

ประเภทกิจกรรม : ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

งบตามแผน 431,000.-บาท

งบตามเทศบัญญัติ 431,000.-บาท

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

1.ผู้ประสานงานโครงการ :

นายวรกันต์ บุศราวิช โทรศัพท์ 032 - 697286 ต่อ 7

2.รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล : เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมของประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับความสะดวก ในการเดินทาง

เป้าหมายเชิงผลผลิต : ติดตั้งป้ายชอยภายในเขตเทศบาลตำบลร่อนทอง จำนวน 35 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลตำบลร่อนทองกำหนด

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ : เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคม ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

ผลที่คาดว่าจะเกิด : ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป – มา

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ : ประชาชนได้รับความสะดวก ในการเดินทาง เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ : ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลร่อนทอง

3.ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่เริ่มต้น : 5 พฤศจิกายน 2567

วันที่สิ้นสุด : 4 ธันวาคม 2567

4.การเบิกจ่ายงบประมาณ :

งบประมาณที่ตั้งไว้ 431,000.-บาท เบิกจ่าย 430,000.-บาท คงเหลือ 1,000 บาท

5.สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการดำเนินงาน : จากการต่อรองราคา

6.ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งกลไกในเชิงยุทธศาสตร์ กลไกตามภารกิจ และกลไกในเชิงพื้นที่ ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่พัฒนาขึ้นใหม่รวมทั้งการเสริมความร่วมมือและการสร้างการมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วนในสังคม

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น

เป็นประตูก้าการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค โดยเน้นการขับเคลื่อนและขยายผลในพื้นที่ ให้ได้ครอบคลุม ในมิติด้านเศรษฐกิจ ผ่านการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ บนฐานความหลากหลายในมิติทางสังคม

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อย

เทศบาล ภาคทองที่ มีการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วน มองเห็นปัญหา ความก้าวหน้า และช่องทางการพัฒนาที่ตรงกัน สร้างการรับรู้และเข้าใจต่อการพัฒนาและให้คนรู้สึกมีส่วนร่วม ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทในการขับเคลื่อน ตามสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของพลเมือง

7.พิกัด ที่ตั้งโครงการ

เส้นรุ้ง(ละติจูด)

เส้นแวง(ลองจิจูด)

8.สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง

โทร 032 - 697286 ต่อ 203

ที่ ปช 53103 / 1044

วันที่ 6 ธันวาคม 2567

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลร่อนทอง ประจำปีงบประมาณ 2567

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลร่อนทอง

1.เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลร่อนทอง ได้อนุมัติงบประมาณที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระบบ e-LAAS โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นั้น

2.ขอเท็จจริง

กองช่างขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2567) ที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลร่อนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลร่อนทอง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

3.ข้อกฎหมาย

3.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขจนถึงปัจจุบัน

3.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

3.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

4.ข้อพิจารณา

4.1 เห็นควรพิจารณา ตามข้อ 2 และรายละเอียดแนบท้าย เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

4.2 เห็นควรสำเนาแจ้งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวรณันท์ บุศราวิช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่ง

อนึ่ง

ความเห็น

(นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลร่อนทอง

(นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน)

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนทอง

โครงการติดตั้งป้ายชอยภายในเขตเทศบาลตำบลร้อนทอง
ตามสัญญาจ้างเลขที่ 3/2568 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

☒ ก่อนดำเนินการ ☐ ขณะดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ




ทราบ.....ประธานกรรมการ
(นายวรกันต์ บุศราวิช)

ทราบ.....กรรมการ
(นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์)

ทราบ.....กรรมการ
(นายกิตติ จิตจำนง)

โครงการติดตั้งป้ายชอยภายในเขตเทศบาลตำบลร้อนทอง
ตามสัญญาจ้างเลขที่ 3/2568 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

☐ ก่อนดำเนินการ ☒ ขณะดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ

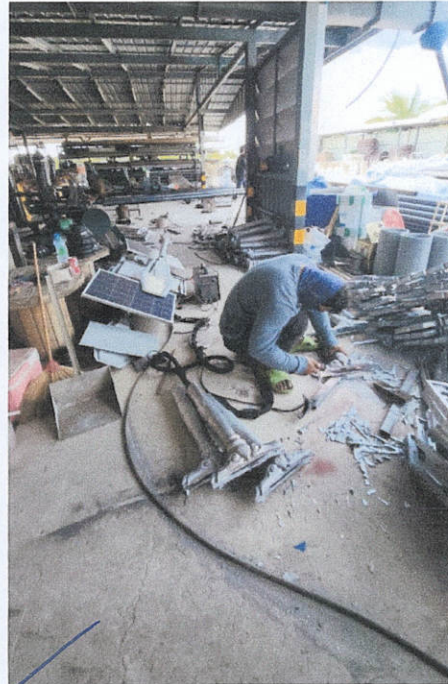

ทราบ.....ประธานกรรมการ
(นายวรกันต์ บุศราวิช)
ทราบ.....กรรมการ
(นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์)

ทราบ.....กรรมการ
(นายกิตติ จิตจำนง)

โครงการติดตั้งป้ายชอยภายในเขตเทศบาลตำบลร่อนทอง
ตามสัญญาจ้างเลขที่ 3/2568 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

☐ ก่อนดำเนินการ ☒ ขณะดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ



ทราบ.....ประธานกรรมการ
(นายวรณัน บุศราวิช)
ทราบ.....กรรมการ
(นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์)

ทราบ.....กรรมการ
(นายกิตติ จิตจำนง)

โครงการติดตั้งป้ายชอยภายในเขตเทศบาลตำบลร้อนทอง
ตามสัญญาจ้างเลขที่ 3/2568 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

☐ ก่อนดำเนินการ ☒ ขณะดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ



ทราบ.....ประธานกรรมการ

(นายวรณันท์ บุศราวิช)

ทราบ.....กรรมการ

(นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์)

ทราบ.....กรรมการ

(นายกิตติ จิตจำนง)

โครงการติดตั้งป้ายชอยภายในเขตเทศบาลตำบลร่อนทอง
ตามสัญญาจ้างเลขที่ 3/2568 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

☐ ก่อนดำเนินการ ☐ ขณะดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ



ทราบ.....ประธานกรรมการ
(นายวรกันต์ บุศราวิช)
ทราบ.....กรรมการ
(นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์)

ทราบ.....กรรมการ
(นายกิตติ จิตจำนง)
