

รายงานสถานภาพตามกระบวนการพัสดุ ของงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2565 จำนวน 13 รายการ



1. ปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์ (สอบ)

- วันที่ 9 15 ตค. 64 คณะกรรมการพิจารณาผล
- วันที่ 16 ตค. 64 ประกาศผู้ชนะ
- วันที่ 17 27 ตค. 64 ระยะเวลารับการอุทธรณ์
- วันที่ 28 ตค. 64 ทำหนังสือเชิญบริษัทฯ ลงนามสัญญา
- วันที่ 30 ตค. 64 ลงนามสัญญา

2. ปรับปรุงถนนแนวรั้วและสิ่งอำนวยความสะดวก (สขช.) 3. ก่อสร้างเตาเผาซากสัตว์ปลอดมลพิษพร้อมปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการ (สขช.)

- (ข้อ 2 และ ข้อ 3)
- วันที่ 13 ตค. 64 ประกาศผู้ชนะ
 - วันที่ 14 24 ตค. 64 ระยะเวลารับการอุทธรณ์
 - วันที่ 22 28 ตค. 64 ทำหนังสือเชิญบริษัทฯ ลงนามสัญญา
 - วันที่ 30 ตค. 64 ลงนามสัญญา

1. ก่อสร้างโครงข่าย ท่อน้ำทิ้งและระบบ บำบัดน้ำเสีย เพื่อรองรับ การตรวจประเมิน คุณภาพการจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม (สนม.)

ประธานกรรมบัญชีกลาง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
จะพิจารณาภายในสัปดาห์ที่ 3
ของเดือน ธันวาคม 2564


1. ปรับปรุงส่วนจัดแสดง อาณาจักรนักษัตร (สขก.)

- สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์
วันที่ 16 ตค. 2564
- ทำหนังสือแจ้งบริษัทฯ
เข้ามาทำสัญญา 17 ตค. 2564
- คาดว่าจะลงนามสัญญา
วันที่ 22 ตค. 2564

1. ก่อสร้างส่วนจัดแสดงสัตว์ อาณาจักรผู้ล่า (สนม.) (ลงนามสัญญาวันที่ 16 ตค 64)

- ปรับปรุงอาคารฝ่ายอนุรักษ์และวิจัย
พร้อมอาคารอนุบาลลูกสัตว์ (สนม.)
- ปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวน้ำ (สขก.)
- ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสัตว์และ
อาคารประกอบต่างๆ (สขก.)
- ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระการบินไทย
(สสร.)
- ปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วน
ขยายพันธุ์สมเสร็จ (สขช.)
- ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (สนม.)
- ปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ (สขช.)

รายงานสถานภาพตามกระบวนการพัสดุ ของงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ ประจำปี 2565 จำนวน 41 รายการ

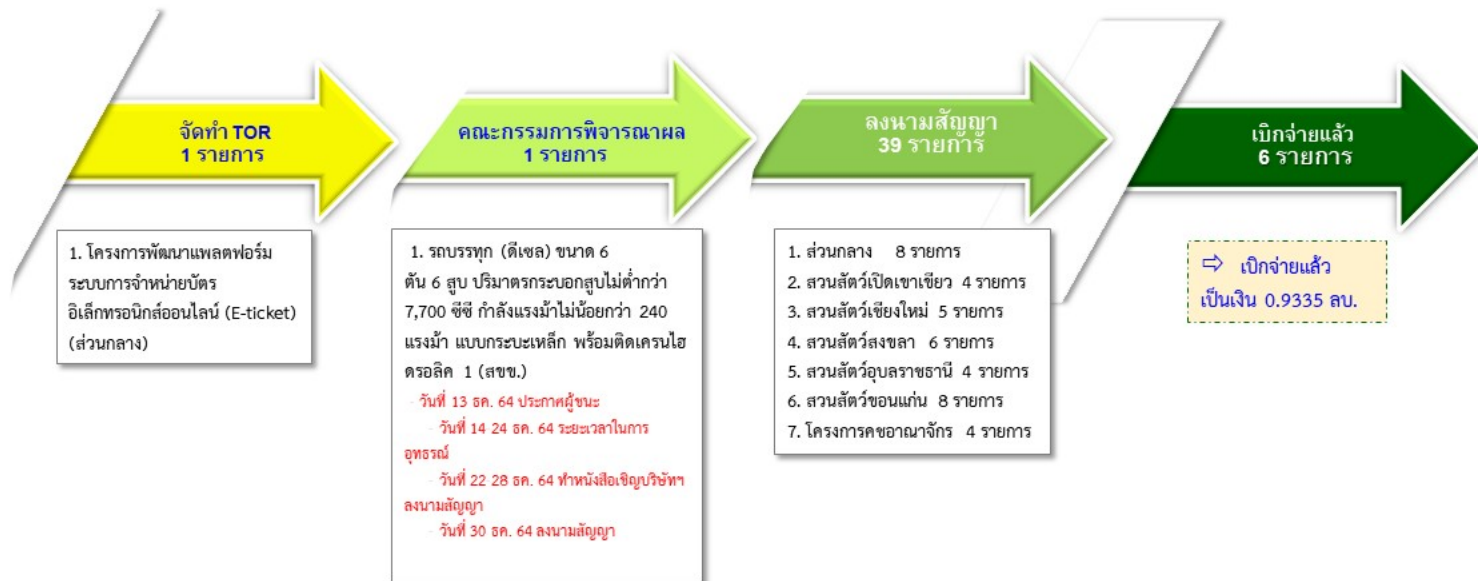

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564



ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธ.ค. 64

รายการ		งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คิดเป็น (%)	คงเหลือ
1. งบอุดหนุน		405.9195	202.9580	50.00	202.9615
2. งบลงทุน		302.1070	0.9335	0.31	301.1735
* ครุภัณฑ์		33.4451	0.9335	2.79	32.5116
* สิ่งก่อสร้าง		268.6619	-	-	268.6619
รวมทั้งสิ้น		708.0265	203.8915	28.80	504.1350

๕.๑.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่องเดิม	๑. ตาม ร่าง บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร) ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ เรื่อง ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นการดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ทั้งในส่วนของงบลงทุน เพื่อดำเนินงานปกติและงบลงทุนตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ๒. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้รับอนุมัติให้กู้เงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๖.๒๓๐๕ ล้านบาท จำนวน ๘ รายการ ประกอบด้วย ๒.๑ รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๕.๑๐๖๐ ล้านบาท ๒.๒ รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๑๖๑.๑๒๔๕ ล้านบาท ๓. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้รับงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๓๐๒.๑๐๗๐ ล้านบาท รวม ๕๔ รายการ ประกอบด้วย ๓.๑ รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๔๑ รายการ เป็นเงิน ๓๓.๔๔๕๑ ล้านบาท ๓.๒ รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ เป็นเงิน ๒๖๘.๖๖๑๙ ล้านบาท																																																
การดำเนินงาน	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย มีผลการดำเนินงานงบลงทุน ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สรุปดังนี้ ๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กู้เงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี จำนวน ๘ รายการ <table><thead><tr><th>รายการ</th><th>เงินกู้เหลื่อมปี (ล้านบาท)</th><th>ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)</th><th>คงเหลือ (ล้านบาท)</th></tr></thead><tbody><tr><td>รวมทั้งสิ้น</td><td>๑๖๖.๒๓๐๕</td><td>๒๘.๒๗๙๑</td><td>๑๓๗.๙๕๑๔</td></tr><tr><td>ครุภัณฑ์</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์</td><td>๕.๑๐๖๐</td><td>๒.๑๑๖๐</td><td>๒.๙๙๐๐</td></tr><tr><td>สิ่งก่อสร้าง</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>๑. ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่</td><td>๑๐๒.๗๗๗๖</td><td></td><td>๑๐๒.๗๗๗๖</td></tr><tr><td>๒. ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมี ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่</td><td>๑๑.๔๑๒๕</td><td>-</td><td>๑๑.๔๑๒๕</td></tr><tr><td>๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์และอัตลักษณ์บริเวณส่วนจัดแสดงสัตว์ สัตว์แอฟริกา ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา</td><td>๙.๓๑๕๖</td><td>๙.๓๑๕๖</td><td>-</td></tr><tr><td>๔. ปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center) ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี</td><td>๖.๒๕๐๐</td><td>๖.๒๕๐๐</td><td>-</td></tr><tr><td>๕. ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปแตมัสและส่วนแสดงจระเข้ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี</td><td>๑๗.๓๖๘๘</td><td>๖.๙๔๗๕</td><td>๑๐.๔๒๑๓</td></tr><tr><td>๖. ก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวิน ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น</td><td>๓.๖๕๐๐</td><td>๓.๖๕๐๐</td><td>-</td></tr><tr><td>๗. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ภายในสวนสัตว์ ขอนแก่น</td><td>๑๐.๓๕๐๐</td><td>-</td><td>๑๐.๓๕๐๐</td></tr></tbody></table>	รายการ	เงินกู้เหลื่อมปี (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	รวมทั้งสิ้น	๑๖๖.๒๓๐๕	๒๘.๒๗๙๑	๑๓๗.๙๕๑๔	ครุภัณฑ์				๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์	๕.๑๐๖๐	๒.๑๑๖๐	๒.๙๙๐๐	สิ่งก่อสร้าง				๑. ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่	๑๐๒.๗๗๗๖		๑๐๒.๗๗๗๖	๒. ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมี ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่	๑๑.๔๑๒๕	-	๑๑.๔๑๒๕	๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์และอัตลักษณ์บริเวณส่วนจัดแสดงสัตว์ สัตว์แอฟริกา ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	๙.๓๑๕๖	๙.๓๑๕๖	-	๔. ปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center) ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี	๖.๒๕๐๐	๖.๒๕๐๐	-	๕. ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปแตมัสและส่วนแสดงจระเข้ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี	๑๗.๓๖๘๘	๖.๙๔๗๕	๑๐.๔๒๑๓	๖. ก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวิน ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น	๓.๖๕๐๐	๓.๖๕๐๐	-	๗. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ภายในสวนสัตว์ ขอนแก่น	๑๐.๓๕๐๐	-	๑๐.๓๕๐๐
รายการ	เงินกู้เหลื่อมปี (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)																																														
รวมทั้งสิ้น	๑๖๖.๒๓๐๕	๒๘.๒๗๙๑	๑๓๗.๙๕๑๔																																														
ครุภัณฑ์																																																	
๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์	๕.๑๐๖๐	๒.๑๑๖๐	๒.๙๙๐๐																																														
สิ่งก่อสร้าง																																																	
๑. ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่	๑๐๒.๗๗๗๖		๑๐๒.๗๗๗๖																																														
๒. ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมี ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่	๑๑.๔๑๒๕	-	๑๑.๔๑๒๕																																														
๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์และอัตลักษณ์บริเวณส่วนจัดแสดงสัตว์ สัตว์แอฟริกา ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	๙.๓๑๕๖	๙.๓๑๕๖	-																																														
๔. ปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center) ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี	๖.๒๕๐๐	๖.๒๕๐๐	-																																														
๕. ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปแตมัสและส่วนแสดงจระเข้ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี	๑๗.๓๖๘๘	๖.๙๔๗๕	๑๐.๔๒๑๓																																														
๖. ก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวิน ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น	๓.๖๕๐๐	๓.๖๕๐๐	-																																														
๗. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ภายในสวนสัตว์ ขอนแก่น	๑๐.๓๕๐๐	-	๑๐.๓๕๐๐																																														

๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๔ รายการ

รายการ	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น	๕๔	๓๐๒.๑๐๗๐	๐.๙๓๓๕	๐.๓๑	
๑. ครุภัณฑ์	๔๑	๓๓.๔๔๕๑		-	
- จัดทำ TOR	๑	๘.๔๔๙๘			๑.พัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-ticket)
- คณะกรรมการพิจารณาผล	๑	๒.๘๘๒๖			๒. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ สูบ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๗,๗๐๐ ซีซี กำลัง แรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า แบบกระบะเหล็ก พร้อมติด เครื่องไฮดรอลิค ๑ คัน
- ลงนามสัญญา	๓๙	๒๐.๙๗๓๖			
- เงินเหลือจ่าย		๑.๑๓๙๑			
ผลเบิกจ่ายครุภัณฑ์	๖		๐.๙๓๓๕	๒.๗๙	
๒. สิ่งก่อสร้าง	๑๓	๒๖๘.๖๖๑๙		-	
- คณะกรรมการพิจารณาผล	๓	๙๖.๕๖๗๙			
- อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ส่ง กรมบัญชีกลาง	๑	๓๐.๐๐๐๐			- อยู่ระหว่างการส่งผลการอุทธรณ์ให้กรมบัญชีกลางเพื่อ
- รออุทธรณ์การทำสัญญา	๑	๑๕.๐๑๖๐			
- รอลงนามสัญญา	๑	๒๕.๐๐๐๐			
- ลงนามสัญญา	๗	๙๓.๒๕๗๔			
- เงินเหลือจ่าย		๘.๘๒๐๖			
ผลเบิกจ่ายสิ่งก่อสร้าง		-			

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
รายการงบประมาณปี 2564 ที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี
ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	สัญญา เลขที่/บริษัท	ลงนามสัญญา			รวมเบิกจ่ายใน ปี 2564	เงินกันเหลือในปี	ผลเบิกจ่าย ในปี 2565	คงเหลือ	หมายเหตุ
				เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินที่ลงนาม					
	ลงทุน	277,789,000	-	-	-	249,028,800	76,548,280	166,230,520	28,279,100	137,951,420	
	ครุภัณฑ์	18,000,000	-	-	-	12,736,000	7,630,000	5,106,000	2,116,000	2,990,000	
	สิ่งก่อสร้าง	259,789,000	-	-	-	236,292,800	68,918,280	161,124,520	26,163,100	134,961,420	
	ครุภัณฑ์	18,000,000	-	-	-	12,736,000	7,630,000	5,106,000	2,116,000	2,990,000	
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ องค์การสวนสัตว์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	18,000,000	บริษัท เซีย-เท็ค บิสซิเนส จำกัด	8 มิ.ย.64	6 ต.ค.64	12,736,000	7,630,000	5,106,000	2,116,000	2,990,000	1. อยู่ระหว่างการกักโรคสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 30 วัน ของ สวนสัตว์ขอนแก่น จะสิ้นสุด 12 ธันวาคม 2564 2. รายการเสือด้า - เสือดาว 3 ตัว อยู่ระหว่างขอขยายเวลาอีก 90 วัน
	สิ่งก่อสร้าง	259,789,000				236,292,800	68,918,280	161,124,520	26,163,100	134,961,420	
1	<u>ส่วนกลาง</u> คำออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง ปี 2563 = 36,000,000 บาท ปี 2564 = 110,825,100 บาท วงเงินสัญญา 146,825,100 บาท	114,000,000	ส.11/2564 บริษัท ดีไซน์ + ดีเวลลอป จำกัด 6 งวดงาน	1 ธ.ค.63	24 พ.ค.65	110,825,100	8,047,530	102,777,570	-	102,777,570	- อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 4
2	<u>สวนสัตว์เชียงใหม่</u> ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมี ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	25,000,000	ส.10/2564 ห้างหุ้นส่วน จำกัด กรีนเทค 6 งวดงาน	24 ก.พ.64	20 พ.ย.64	20,750,000	9,337,500	11,412,500	-	11,412,500	1. อยู่ระหว่างการขออนุมัติเบิกจ่าย งวดที่ 4-5 เสนอ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ 2. อยู่ระหว่างการดำเนินงาน งวดที่ 6

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	สัญญา เลขที่/บริษัท	ลงนามสัญญา			รวมเบิกจ่ายใน ปี 2564	เงินกันเหลือในปี	ผลเบิกจ่าย ในปี 2565	คงเหลือ	หมายเหตุ
				เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินที่ลงนาม					
4	สวนสัตว์นครราชสีมา ปรับปรุงภูมิทัศน์และอัตลักษณ์บริเวณ ส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา ภายในสวนสัตว์ นครราชสีมา ตำบลไข่มวงคล อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	29,650,000	ส.20/2564 บริษัท เอส.ยู.แพค จำกัด 5 งวดงาน	31 ธค.63	27 สค.64	22,180,000	12,864,400	9,315,600	9,315,600	-	- เบิกจ่ายครบแล้ว
5	สวนสัตว์อุบลราชธานี ปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center) ภายในสวนสัตว์ อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	15,000,000	ส.12/2564 บริษัท ไรท์แมน จำกัด 5 งวดงาน	19 เมย.64	25 กย.64	12,500,000	6,250,000	6,250,000	6,250,000	-	- เบิกจ่ายครบแล้ว
6	ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปแตมัสและ ส่วนแสดงจระเข้ ภายในสวนสัตว์ อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	36,955,000	ส.16/2564 ห้างหุ้นส่วน จำกัด กรีนเทค เอสโซซิเอท 5 งวดงาน	4 มิย.64	23 ธค.64	34,737,700	17,368,850	17,368,850	6,947,500	10,421,350	1. เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด 2. งานงวดที่ 4 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งมาเบิกจ่าย 3. อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ 5
7	สวนสัตว์ขอนแก่น ก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวิน ภายใน สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	15,000,000	ส.22/2564 บริษัท ขุนพล พัฒนาการ จำกัด 4 งวดงาน	19 มค.64	15 กย.64	14,600,000	10,950,000	3,650,000	3,650,000	-	- เบิกจ่ายครบแล้ว

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	สัญญา เลขที่/บริษัท	ลงนามสัญญา			รวมเบิกจ่ายใน ปี 2564	เงินกันหล่อมปี	ผลเบิกจ่าย ในปี 2565	คงเหลือ	หมายเหตุ
				เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินที่ลงนาม					
8	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	24,184,000	ส.23/2564 บริษัท ขุนพล พัฒนาการ จำกัด 4 งวดงาน	19 มค.64	15 กย.64	20,700,000	10,350,000	10,350,000	-	10,350,000	- อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ 3 มีการขยายเวลาออกไป 90 วัน ซึ่งจะสามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564)

ลำดับ	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ		ครุภัณฑ์ จำนวน 41 รายการ	
		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	หมายเหตุ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	หมายเหตุ
	รวม	13 รายการ		40 รายการ	
1	ขออนุมัติแบบ ,จัดทำ TOR และราคากลาง -แก้ไขแบบและขออนุมัติที่ อสส -จัดทำ TOR และราคากลาง			1 รายการ	1. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-ticket)
2	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 2.1 หาผู้ประกอบการ SME (อย่างน้อย 6ราย)	5 รายการ		รายการ	
	2.2 รายงานขอซื้อขอจ้าง				
	2.3 ประกาศร่าง TOR (ถ้ามี)				
	2.4 ประกาศ TOR (ในระบบ e-gp)				
	2.5 จัดทำหนังสือเชิญชวน (คัดเลือก)				
	2.6 ยื่นข้อเสนอราคา				
	2.7 คณะกรรมการพิจารณาผล	3	1. ปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์ (สวนสัตว์อุบลราชธานี) 2. ปรับปรุงถนนแนวรั้วและสิ่งอำนวยความสะดวก (สวนสัตว์เปิดเขาเขียว) 3. ก่อสร้างเตาเผาซากสัตว์ปลอดมลพิษ พร้อมปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการ (สวนสัตว์เปิดเขาเขียว)	1	1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 สูบ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ลำดับ	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ		ครุภัณฑ์ จำนวน 41 รายการ	
		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	หมายเหตุ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	หมายเหตุ
	2.8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา				
	2.9 ระยะเวลาอุทธรณ์	1	1. ปรับปรุงส่วนจัดแสดงอาณาจักรณ์กล้า (สวนสัตว์ขอนแก่น)		
	2.10 แจ้งลงนามในสัญญา	1	1. ก่อสร้างส่วนจัดแสดงสัตว์อาณาจักรผู้ล่า (สวนสัตว์นครราชสีมา)		
3	ลงนามสัญญา	7 รายการ	จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว 1. สวนสัตว์เชียงใหม่ 1 รายการ 2. สวนสัตว์ขอนแก่น 2 รายการ 3.โครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์ 1 รายการ 4. สวนสัตว์สงขลา 2 รายการ 5. สวนสัตว์นครราชสีมา 1 รายการ	39 รายการ	จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว 1. ส่วนกลาง 8 รายการ 2. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 4 รายการ 3. สวนสัตว์เชียงใหม่ 5 รายการ 4. สวนสัตว์สงขลา 6 รายการ 5. สวนสัตว์อุบลราชธานี 4 รายการ 6. สวนสัตว์ขอนแก่น 8 รายการ 7. โครงการคชอาณาจักร 4 รายการ
4	ปัญหา อื่น ๆ -มีการอุทธรณ์ ส่งกรมบัญชีกลางพิจารณาผล	1 รายการ	ก่อสร้างโครงข่ายท่อน้ำทิ้งและระบบบำบัด น้ำเสีย (สวนสัตว์เชียงใหม่) อยู่ระหว่างส่งผล การอุทธรณ์ให้กรมบัญชีกลางพิจารณา		

แผน - ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (วันที่ 8 ธันวาคม 2564)

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ	รายงานขอซื้อขอจ้าง		แผนพร่ำร่างเอกสารประกวดราคา/ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคา (ถ้ามี)		อนุมัติและลงนามประกาศเชิญชวน		เสนอราคาและพิจารณาผล		ขออนุมัติรับราคา/ประกาศผู้ชนะ		ระยะเวลาอุทธรณ์		หนังสือแจ้งลงนามในสัญญา		ลงนามในสัญญา		วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	หมายเหตุ
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
	ก่อสร้าง 13 รายการ		268,661,900																		
1	ปรับปรุงอาคารฝ่ายอนุรักษ์และวิจัย พร้อมอาคารอนุบาลลูกสัตว์	สวนสัตว์เชียงใหม่	2,500,000	10ส.ค. 64	10ส.ค. 64	-	ไม่มี	9 ส.ค. 64	10ส.ค. 64	20 ส.ค. 64	19-24 ส.ค.64	25 ส.ค. 64	25 ส.ค. 64	26 ส.ค. -3 ก.ย. 64	26 ส.ค. - 7 ก.ย. 64	1 ต.ค. 64	4 ตค 64	15 ต.ค. 64	-	e-bidding	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
2	ปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวน้ำ	สวนสัตว์ขอนแก่น	16,278,000	11 ส.ค. 64	18 ส.ค. 64	18 ส.ค. 64	17-20 ส.ค. 64	26 ส.ค. 64	25 ส.ค. 64	16 ก.ย.64	14 ก.ย. 64	20 ก.ย.64	16 ก.ย. 64	21-29 ก.ย.64	17-27 ก.ย .64	30 ก.ย.64	4 ต.ค. 64	8 ต.ค.64	-	e-bidding	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
3	ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสัตว์และอาคารประกอบต่างๆ	สวนสัตว์ขอนแก่น	9,000,000	11 ส.ค. 64	18 ส.ค. 64	18 ส.ค. 64	18-23ส.ค. 64	26 ส.ค. 64	25 ส.ค. 64	16 ก.ย.64	14 ก.ย. 64	20 ก.ย.64	16 ก.ย. 64	21-29 ก.ย.64	17-27 ก.ย .64	30 ก.ย.64	4 .ต.ค64	8 ต.ค.64	-	e-bidding	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
4	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระการบินไทย	โครงการคชอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์	12,000,000	23 ส.ค. 64	14 ก.ย. 64	27 ส.ค.64	16 - 21 ก.ย. 64 ประกาศจริง 22 กย 64-8 ตค 64	3-20 ก.ย. 64	22 ก.ย. 64	21-24 ก.ย. 64	30 ก.ย. 64	30 ก.ย. 64	20 ต.ค. 64	1-11 ต.ค.64	20 ตค- 2พ.ย. 64	14 ต.ค. 64	3 พ.ย.64	25 ต.ค. 64	10 พ.ย.64	e-bidding	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
5	ปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธุ์ลมเสร็จภายในสวนสัตว์สงขลา	สวนสัตว์สงขลา	16,500,000	23 ส.ค. 64	23 ส.ค. 64	24 ส.ค. 64	24 ส.ค. 64	30 ส.ค. 64	11-24 ตค 64 25 ตค 64 ยื่นซอง	17 ก.ย.64	25 ต.ค. 64	21 ก.ย.64	28 ต.ค.64	22 ก.ย. 64 - 29 ก.ย.64	28 ต.ค. - 5 พ.ย.64	1 ต.ค.64	9 พ.ย. 64	6 ต.ค.64	-	e-bidding เป็นวิธีคัดเลือกตาม ว 845	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
6	ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	สวนสัตว์นครราชสีมา	10,000,000	6 ก.ย.64	14 ตค 64	6 ก.ย.64		10 ก.ย.64	18 ต.ค. 64	29 ก.ย.64	2 พ.ย.64	9 ต.ค.64	3 พ.ย.64	9-17 ต.ค.64	-	20 ต.ค.64	4 พ.ย.64	1 พ.ย.64	-	วิธีคัดเลือก	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
7	ปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์	สวนสัตว์สงขลา	35,800,000	30 ส.ค. 64	7 ต.ค. 64	31 ส.ค. 64	8-12 ต.ค 64	6 ก.ย. 64	14 ต.ค.-2 พ.ย.64	24 ก.ย.64	3 พ.ย. 64	28 ก.ย.64	9 พ.ย.64	29 ก.ย. 64 - 6 ต.ค.64	9 พ.ย. 64 - 17 พ.ย. 64	7 ต.ค.64	-	12 ต.ค.64	-	e-bidding เป็นวิธีคัดเลือกตาม ว 845	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
8	ปรับปรุงถนนแนวรั้วและลิ้งอำนวยความสะดวก	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	29,945,900	23 ส.ค. 64	25 ตค 64	23 ส.ค. 64	-	24 ส.ค. 64	-	10 ก.ย.64	-	16 ก.ย.64	-	13-22 ต.ค.64	-	24 ต.ค.64	-	1 พ.ย.64	-	วิธีคัดเลือก	ใช้วิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างหาผู้ประกอบการ SME ว845 โดยทำหนังสือเชิญเข้ายื่นเสนอราคา 26 พ.ย.-13 ธค.64อยู่ระหว่าง คณะกรรมการพิจารณาผล คาดว่าจะลงนาม 30 ธค.64
9	ก่อสร้างเตาเผาซากสัตว์ปลอดมลพิษพร้อมปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการ	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	4,774,000	23 ส.ค. 64	-	23 ส.ค. 64	-	24 ส.ค. 64	-	10 ก.ย.64	-	16 ก.ย.64	-	13-22 ต.ค.64	-	24 ต.ค.64	-	1 พ.ย.64	-	วิธีคัดเลือก	ใช้วิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างหาผู้ประกอบการ SME ว845 โดยทำหนังสือเชิญเข้ายื่นเสนอราคา 26 พ.ย.-13 ธค.64อยู่ระหว่าง คณะกรรมการพิจารณาผล คาดว่าจะลงนาม 30 ธค.64
10	ปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์	สวนสัตว์อุบลราชธานี	61,848,000	15 ก.ย. 64	-	18 ก.ย. 64	2-5 พ.ย.64	18 ต.ค. 64	8 พย 64 - 7 ธ.ค. 64	22 ต.ค. 64	-	26 ต.ค. 64	-	27 ต.ค. 64 - 4 พ.ย. 64	-	5 พ.ย. 64	-	10 พ.ย. 64	-	e-bidding	อยู่ระหว่างประกาศขายซองตามระเบียบฯ เกิน 50 ล้านบาท ไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ ขายซอง 8 พ.ย. 64 - 7 ธ.ค. 64 อยู่ระหว่าง คณะกรรมการพิจารณาผล คาดว่าจะลงนาม 30 ธค.64
11	ก่อสร้างส่วนจัดแสดงสัตว์อาณาจักรผู้ล่า	สวนสัตว์นครราชสีมา	25,000,000	6 ก.ย.64	5 .ตค 64	6 ก.ย.64	5-8 ต.ค. 64	10 ก.ย.64	-	5 ต.ค.64	-	15 ต.ค.64	-	15-23 ต.ค.64	-	28 ต.ค.64	-	5 พ.ย.64	-	วิธีคัดเลือก	ใช้วิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างหาผู้ประกอบการ SME ว845 โดยทำหนังสือเชิญเข้ายื่นเสนอราคา 25 พ.ย-3 ธค.64 ทำหนังสือแจ้งบริษัทเข้ามาลงนามสัญญา วันที่ 16 ธค. 2564
12	ปรับปรุงส่วนจัดแสดงอาณาจักรนกกินปลา	สวนสัตว์ขอนแก่น	15,016,000	11 ส.ค. 64	25 ตค 64	18 ส.ค. 64	-	26 ส.ค. 64	-	16 ก.ย.64	-	20 ก.ย.64	-	21-29 ก.ย.64	-	30 ก.ย.64	-	8 ต.ค.64	-	วิธีคัดเลือก	ใช้วิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างหาผู้ประกอบการ SME ว845 โดยกำหนดวันยื่นเสนอราคา 26 พ.ย.64 พิจารณาผล 29 พ.ย.64 อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์ 16 ธค. 64 และ คาดว่าจะลงนาม 22 ธค.64
13	ก่อสร้างโครงข่ายท่อน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	สวนสัตว์เชียงใหม่	30,000,000	13 ส.ค. 64	1 ก.ย. 64	19 ส.ค. 64	2-6 ก.ย. 64	13 ส.ค. 64	13 ก.ย. 64	8 ก.ย.64	4-6 ต.ค. 64	13 ก.ย.64	7 .ตค64	14 - 22 ก.ย. 64	7-18 ตค 64	1 ต.ค. 64	-	11 ต.ค. 64	-	e-bidding	มีการอุทธรณ์ผู้ชนะ และอยู่ระหว่างรายงานความเห็นการอุทธรณ์พร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (กรมบัญชีกลาง) โดยมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ครั้งที่ 1 แล้ว และการนำเสนอบริษัทคณะกรรมการฯ อีกครั้งที่ 21 ธค.64

แผน - ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (วันที่ 8 ธันวาคม 2564)

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ	เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคา/ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคา (ถ้ามี)		อนุมัติและลงนามประกาศเชิญชวน		เสนอราคาและพิจารณาผล		ขออนุมัติรับราคา/ประกาศผู้ชนะ		ระยะเวลาอุทธรณ์		หนังสือแจ้งลงนามในสัญญา		ลงนามในสัญญา		เบิกจ่ายงานงวดสุดท้าย		วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	หมายเหตุ
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
	ครุภัณฑ์ จำนวน 41 รายการ		33,445,100		-		-		-		-		-		-		-		-		
1	กล้องถ่ายภาพระบบ wifi สำหรับกล้องจุลทรรศน์ 1 เครื่อง	ส่วนกลาง	120,000	-	-	-	28 ก.ย. 64	15 ก.ย. 64	30 ก.ย. 64	30 ก.ย. 64	5 ต.ค. 64	-	-	10 ต.ค.64	6 ต.ค. 64	15 ต.ค.64	6 ต.ค.64	14 ม.ค. 64	4 ม.ค. 65	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
2	ตู้เก็บเปลือกหทาราฟิน 2 ตู้	ส่วนกลาง	150,000	-	-	-	23 ก.ย. 64	15 ก.ย. 64	28 ก.ย. 64	30 ก.ย. 64	29 ก.ย. 64	-	-	10 ต.ค.64	30 ก.ย. 64	15 ต.ค.64	2 ต.ค. 64	15 ธ.ค.64	29 ธ.ค.64	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
3	ตู้เก็บแผ่นกระจกสไลด์ 1 ตู้	ส่วนกลาง	82,500	-	-	-	-	15 ก.ย. 64	-	30 ก.ย. 64	-	-	-	10 ต.ค.64	-	15 ต.ค.64	-	15 ธ.ค.64	14 ธ.ค.64	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
4	เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงไมโครเพลท 1 เครื่อง	ส่วนกลาง	406,600	-	-	-	15 ก.ย. 64	15 ก.ย. 64	27 ก.ย. 64	30 ก.ย. 64	2 ต.ค. 64	-	-	10 ต.ค.64	2.ต.ค 64	15 ต.ค.64	11 ต.ค. 64	15มี.ค.64	9 ม.ค. 65	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
5	ตู้เย็นแช่น้ำยา 1 ตู้	ส่วนกลาง	142,000	-	-	-	-	15 ก.ย. 64	-	30 ก.ย. 64	-	-	-	10 ต.ค.64	-	15 ต.ค.64	-	13 ก.พ. 64	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
6	เครื่องตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ 1 เครื่อง	ส่วนกลาง	250,000	-	-	-	-	15 ก.ย. 64	-	30 ก.ย. 64	-	-	-	10 ต.ค.64	-	15 ต.ค.64	20 ต.ค64	13 ก.พ. 64	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
7	เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพในสัตว์ 1 เครื่อง	ส่วนกลาง	300,000	-	-	-	-	15 ก.ย. 64	-	30 ก.ย. 64	-	-	-	10 ต.ค.64	-	15 ต.ค.64	20 ต.ค64	13 ก.พ. 64	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
8	ตู้แช่แข็ง -40 องศาเซลเซียส 1 ตู้	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	150,000	-	-	-	16 ส.ค. 64	6 ก.ย. 64	18 ส.ค. 64	8 ส.ค. 64	23 ส.ค. 64	-	-	16 ต.ค.64	4 ตค 64	1 พ.ย. 64	-	29 ม.ค. 65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
9	เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วรอบต่ำ 1 เครื่อง	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	170,000	-	-	-	6 สค 64	18 ส.ค. 64	18 สค 64	-	23 ส.ค. 64	-	-	-	2 ต.ค.64	-	-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
10	เครื่องปั่นเหวี่ยงฮีมาโตคริต 1 เครื่อง	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	130,000	-	-	-	6 สค 64	18 ส.ค. 64	18 สค 64	-	23 ส.ค. 64	-	-	-	2 ต.ค.64	-	-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
11	เครื่องซิงโฟฟ้านแบบทศนิยม 3 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	80,000	-	-	-	6 สค 64	18 ส.ค. 64	18 สค 64	-	23 ส.ค. 64	-	-	-	2 ต.ค.64	-	-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
12	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู สำหรับคอกกักหมีแพนด้า	สวนสัตว์เชียงใหม่	65,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 ก.ย. 64	-	30 พ.ย. 64	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
13	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) สวนสัตว์เชียงใหม่ 1 คัน	สวนสัตว์เชียงใหม่	715,000	-	-	2 ส.ค. 64	2 ส.ค. 64	10 ส.ค. 64	10-13 ส.ค. 64	16 ส.ค. 64	13 ส.ค. 64	17-25 ส.ค. 64	-	1 ต.ค.64	4 ต.ค. 64	8 ต.ค. 64	-	30 ธ.ค. 64	-	e-bidding	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
14	ถังเก็บน้ำบนดิน โพลีเมอร์ ขนาด 3,000 ลิตร 10 ใบ	สวนสัตว์เชียงใหม่	77,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 ก.ย. 64	-	30 พ.ย. 64	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
15	เครื่องอัลตราซาวด์แบบพกพาสำหรับสัตว์ป่า 1 เครื่อง	สวนสัตว์เชียงใหม่	1,455,200	-	-	2 ก.ย. 64	2 ก.ย.64	-	30 กย64-5 ตค64	6 ตค64	6 ตค64	-	-	12 ตค 64	12 ตค 64	21 ต.ค. 64	21 ต.ค.64	-	-	e-bidding	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
16	เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิทัล พร้อมเครื่องเอกซเรย์แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	สวนสัตว์เชียงใหม่	1,800,000	-	-	11 ส.ค. 64	22 ก.ย. 64	23 ส.ค. 64	30 ก.ย. 64 - 6ต.ค. 64	26 ส.ค. 64	7 ตค 64	-	7-18 ตค64	1 ต.ค. 64	19 ตค.64	20 ต.ค. 64	-	28 ก.พ. 65	-	e-bidding	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
17	เครื่องชี้ห้ามเลือด และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า 1 เครื่อง	สวนสัตว์สงขลา	89,500	-	-	-	-	8 ก.ย.64	-	13 ก.ย.64	-	-	-	1.ต.ค.64	-	6ต.ค.64	-	3 ก.พ. 65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
18	เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพในสัตว์ 1 เครื่อง	สวนสัตว์สงขลา	265,000	-	-	-	-	8 ก.ย.64	-	13 ก.ย.64	-	-	-	1.ต.ค.64	-	6ต.ค.64	26 ต.ค.64	3 ก.พ. 65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
19	เครื่องบันทึกและติดตามปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจรสำหรับสัตว์ 1 เครื่อง	สวนสัตว์สงขลา	18,000	-	-	-	-	8 ก.ย.64	-	13 ก.ย.64	-	-	-	1.ต.ค.64	-	6ต.ค.64	26 ต.ค.64	3 ก.พ. 65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
20	เครื่องติดตามและบันทึกค่าคาร์บอนไดออกไซด์ทางเดินหายใจแบบแมนสตริม 1 เครื่อง	สวนสัตว์สงขลา	56,000	-	-	-	-	8 ก.ย.64	-	13 ก.ย.64	-	-	-	1.ต.ค.64	-	6ต.ค.64	26 ต.ค.64	3 ก.พ. 65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ	เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคา/ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคา (ถ้ามี)		อนุมัติและลงนามประกาศเชิญชวน		เสนอราคาและพิจารณาผล		ขออนุมัติรับราคา/ประกาศผู้ชนะ		ระยะเวลาอุทธรณ์		หนังสือแจ้งลงนามในสัญญา		ลงนามในสัญญา		เบิกจ่ายงานงวดสุดท้าย		วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	หมายเหตุ
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
21	โคมไฟผัดตัด 1 ชุด	สวนสัตว์สงขลา	28,000	-	-	-	-	8 ก.ย.64	-	13 ก.ย.64	-	-	-	1 ต.ค.64	-	6ต.ค.64	26 ต.ค.64	3 ก.พ. 65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
22	แผ่นบันทึกภาพเอกซเรย์แบบดิจิทัล 4 แผ่น	สวนสัตว์อุบลราชธานี	228,000	-	-	27 ก.ค. 64	27 ก.ค. 64	30 ก.ค. 64	30 ก.ค. 64	30 ก.ค. 64	30 ก.ค. 64	-		10 ต.ค. 64	30 ก.ย. 64	17 ต.ค. 64		30 ธ.ค. 64		วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
23	ชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล 1 ชุด	สวนสัตว์อุบลราชธานี	1,650,000	28 ส.ค. 64	2-7 กย 64	5 ก.ย. 64	8-15 ก.ย.64	8 ก.ย. 67	21 ก.ย. 64	8 ก.ย. 67	21 ก.ย. 64	11-20 ก.ย. 64	-	21 ต.ค. 64	30 ก.ย. 64	27 ต.ค. 64	-	30 ธ.ค. 64	-	e-bidding	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
24	กล้องวงจรปิดติดตั้ง 8 จุด 66 ตัว	สวนสัตว์อุบลราชธานี	873,800	28 ส.ค. 64	7-9กย64	5 ก.ย. 64	9 ก.ย. 64	8 ก.ย. 67	28 ก.ย. 64	8 ก.ย. 67	28 ก.ย. 64	11-20 ก.ย. 64	-	21 ต.ค. 64	-	27 ต.ค. 64	-	15 มี.ค. 65	-	e-bidding	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
25	หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 Kva สวนสัตว์อุบลราชธานี 5 เครื่อง	สวนสัตว์อุบลราชธานี	839,500	28 ส.ค. 64	21-27 ก.ย. 64	5 ก.ย. 64	28 ก.ย. - 5ต.ค 64	8 ก.ย. 67	6 ต.ค. 64	8 ก.ย. 67	29 ก.ย.64	11-20 ก.ย. 64	19-28 ตค 64	21 ต.ค. 64	-	27 ต.ค. 64	-	15 ก.พ. 65	-	e-bidding	ทำใบสั่งซื้อ เริบร้อยแล้ว
26	เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวี 1 เครื่อง	สวนสัตว์ขอนแก่น	52,900	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 64	-	-	-	18 ต.ค. 64	-	27 ต.ค. 64	-	23 ก.พ. 65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำใบสั่งซื้อ เริบร้อยแล้ว
27	เครื่องเลเซอร์รักษาแผลสำหรับสัตว์ 1 เครื่อง	สวนสัตว์ขอนแก่น	850,000	25 ส.ค. 64	-	26 ส.ค. 64	13 ก.ย. 64	14-16 ก.ย. 64	30 ก.ย. 64	20 ก.ย. 64	7 ต.ค. 64	21 - 29 ก.ย. 64	-	30 ก.ย. 64	-	8 ต.ค. 64	-	4 ก.พ. 65	-	e-bidding	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
28	เครื่องควบคุมรั่วไฟฟ้า 2 เครื่อง	สวนสัตว์ขอนแก่น	70,000	28 ส.ค. 64	-	5 ก.ย. 64	-	8 ก.ย. 67	-	8 ก.ย. 67	-	11-20 ก.ย. 64	-	21 ต.ค. 64	-	27 ต.ค. 64	-	30 ธ.ค. 64	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำใบสั่งซื้อ เริบร้อยแล้ว
29	เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า 2 เครื่อง	สวนสัตว์ขอนแก่น	19,000	28 ส.ค. 64	-	5 ก.ย. 64	-	8 ก.ย. 67	-	8 ก.ย. 67	-	11-20 ก.ย. 64	-	21 ต.ค. 64	-	27 ต.ค. 64	-	30 ธ.ค. 64	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำใบสั่งซื้อ เริบร้อยแล้ว
30	ตู้แช่อาหาร ขนาด 32 คิวบิกฟุต 1 ตู้	สวนสัตว์ขอนแก่น	27,000	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 64	-	-	-	18 ต.ค.64	-	27 ต.ค.64	-	23 ก.พ. 65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำใบสั่งซื้อ เริบร้อยแล้ว
31	ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต 1 ตู้	สวนสัตว์ขอนแก่น	46,000	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 64	-	-	-	18 ต.ค.64	-	27 ต.ค.64	-	23 ก.พ. 65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำใบสั่งซื้อ เริบร้อยแล้ว
32	เครื่องมือรักษาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดความเข้มต่ำ 1 เครื่อง	โครงการคช อาณาจักร จ. สุรินทร์	850,000	31 ส.ค. 64	30 ส.ค. 64	3 ก.ย.64	1 ก.ย. 64	15 ก.ย.64	10 ก.ย. 64	1 ต.ค.64	16 ก.ย. 64	4-12 ต.ค.64	-	22 ต.ค.64	1 ตค 64	8 พ.ย. 64	-	28ก.พ.65	-	e-bidding	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
33	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 1 เครื่อง	โครงการคช อาณาจักร จ. สุรินทร์	30,700	-	-	20 ส.ค. 64	-	25 ส.ค. 64	23 ส.ค.64	27 ส.ค. 64	31 ส.ค. 64	-	-	1 ก.ย.64	8 ก.ย.64	29 ต.ค. 64	-	28 ม.ค. 65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
34	เครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมในสภาพจริงแบบเคลื่อนที่ 1เครื่อง	โครงการคช อาณาจักร จ. สุรินทร์	480,000	-	-	20 ส.ค. 64	-	25 ส.ค. 64	20 ส.ค.64	27 ส.ค. 64	25 ส.ค.64	-	-	1 ก.ย. 64	8 ก.ย.64	29 ต.ค. 64	-	28ม.ค.65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
35	โครงการระบบบริหารจัดการสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (Thai Zoo Ark)	ส่วนกลาง	4,412,600	3 ก.ย. 64	-	15 ก.ย. 64	14 -22 ตค.64 กำหนดยื่นของ 25 ต.ค.64	21 ก.ย. 64	26 ต.ค.64	28 ก.ย. 64	28 ต.ค. 64	9 ก.ย.64 -5 ต.ค.64	28 ต.ค. 64-5 พ.ย. 64	7 ต.ค. 64	1 พ.ย.64	15 ต.ค. 64	9 พ.ย. 64	31 ส.ค. 65	-	e-bidding	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
36	เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ 3 เครื่อง	สวนสัตว์ขอนแก่น	444,200	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 64	-	-	-	18 ต.ค. 64	-	27 ต.ค. 64	-	23 ก.พ. 65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว
37	รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	สวนสัตว์สงขลา	1,358,000	31 ส.ค. 64	-	6 ก.ย. 64	10 ก.ย. 64	16 ก.ย.64	25 ต.ค. 64	21 ก.ย.64	28-ต.ค.-64	20 - 29 ก.ย. 64	ต.ค. 64-5 พ.ย. 64	1 ต.ค.64	9-พ.ย.-64	6 ต.ค.64	16 พ.ย.64	3 ก.พ. 65	-	e-bidding	ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว
38	รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน	โครงการคช อาณาจักร จ. สุรินทร์	3,300,000	31 ส.ค.64	28 ก.ย. 64	3 ก.ย.64	1 ต.ค.64	15 ก.ย.64	12 ต.ค. 64	1 ต.ค.64	14 ต.ค. 64	4-12 ต.ค.64	1-9 พย 64	22 ต.ค.64	11 พ.ย. 64	8 พ.ย. 64	19 พ.ย.64	6 ก.พ.65	-	e-bidding	ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ	เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคา/ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคา (ถ้ามี)		อนุมัติและลงนามประกาศเชิญชวน		เสนอราคาและพิจารณาผล		ขออนุมัติรับราคา/ประกาศผู้ชนะ		ระยะเวลาอุทธรณ์		หนังสือแจ้งลงนามในสัญญา		ลงนามในสัญญา		เบิกจ่ายงานงวดสุดท้าย		วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	หมายเหตุ
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
39	เครื่องเป่าใบไม้ 2 จังหวะ 3 เครื่อง	สวนสัตว์ขอนแก่น	30,300	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 64	-	-	-	18 ต.ค.64	-	27 ต.ค.64	-	23 ก.พ. 65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ออกไปสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว
40	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า 7,700 ซีซี กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า แบบกระบะเหล็ก พร้อมติดเครนไฮดรอลิค 1 คัน	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	2,882,600	3 ส.ค. 64	3-5 ส.ค. 64	11 ส.ค. 64	10 ก.ย. 64 ยกเลิกผู้ชนะ 14 ต.ค. 64	27 ส.ค. 64		2 ก.ย.64	-	8-16 ก.ย.64	-	1ต.ค.64	-	15 ต.ค.64	-	29 ม.ค. 65	-	e-bidding	ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงตาม TOR และได้มีการปรับปรุง TOR เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการขึ้นประกาศร่าง TOR วันที่ 26 พย.- 1 ธค.64
41	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-ticket)	ส่วนกลาง	8,449,800	15 ก.ย. 64	-	22 ก.ย. 64	-	8 ต.ค.64	-	15 ต.ค.64	-	15-23 พ.ย.64	-	24พ.ย.64	-	30 พ.ย.64	-	29 พ.ค. 65	-	e-bidding	คณะกรรมการส่ง TOR วันที่25 ต.ค. 64 อยู่ระหว่างการพิจารณา TOR วันที่ 28 ต.ค. 64
