

รายงานสถานภาพตามกระบวนการพัสดุ ของงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2565 จำนวน 13 รายการ



รายงานสถานภาพตามกระบวนการพัสดุ ของงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ ประจำปี 2565 จำนวน 41 รายการ

จัดทำ TOR

อยู่ระหว่างขอซื้อขอจ้าง

รอลงนามในสัญญา

ลงนามสัญญา
41 รายการ


เบิกจ่ายแล้ว
38 รายการ

⇒ เบิกจ่ายรวมเป็นเงิน
18.7073 ลบ.

1. ส่วนกลาง 9 รายการ
2. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 5 รายการ
3. สวนสัตว์เชียงใหม่ 5 รายการ
4. สวนสัตว์สงขลา 6 รายการ
5. สวนสัตว์อุบลราชธานี 4 รายการ
6. สวนสัตว์ขอนแก่น 8 รายการ
7. โครงการคชอาณาจักร 4 รายการ

- 37 รายการ เบิกจ่ายครบเรียบร้อยแล้ว
- 1 รายการ คือ รายการระบบบริหารจัดการสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (Thai Zoo Ark) เบิกแล้ว 2 งวด
- 3 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ
 - โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบจำหน่ายบัตร (E-ticket)
 - รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 สูบ (เขาเขียว)
 - เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล (เชียงใหม่)

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

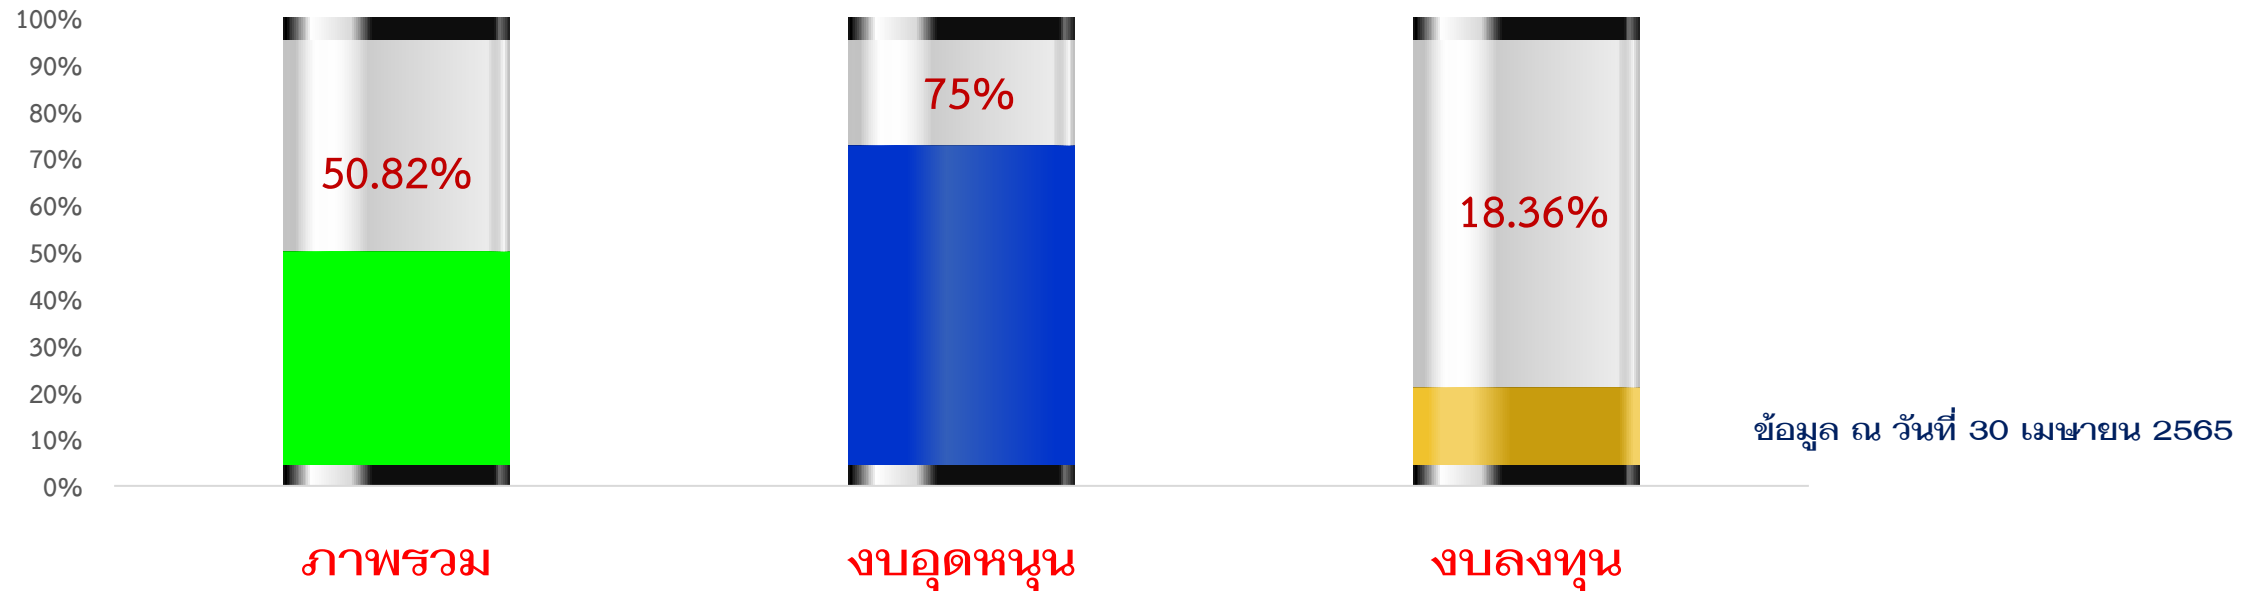

รายการ		งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย /GFMIS	คิดเป็น (%)	คงเหลือ
1. งบอุดหนุน		405.9195	304.3178	74.97	101.6017
2. งบลงทุน		302.1070	55.4792	18.36	246.6278
* ครุภัณฑ์		33.4451	18.8073	56.23	14.6378
* สิ่งก่อสร้าง		268.6619	36.6719	13.65	231.9900
รวมทั้งสิ้น		708.0265	359.7970	50.82	348.2295

หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ตรงกับระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่องเดิม	๑. ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร) ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ เรื่อง ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นการดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ทั้งในส่วนของงบลงทุน เพื่อดำเนินงานปกติและงบลงทุนตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ๒. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้รับงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๓๐๒.๑๐๗๐ ล้านบาท รวม ๕๔ รายการ ประกอบด้วย ๓.๑ รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๔๑ รายการ เป็นเงิน ๓๓.๔๔๕๑ ล้านบาท ๓.๒ รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ เป็นเงิน ๒๖๘.๖๖๑๙ ล้านบาท ๓. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๖.๒๓๐๕ ล้านบาท จำนวน ๘ รายการ ประกอบด้วย ๒.๑ รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๕.๑๐๖๐ ล้านบาท ๒.๒ รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๑๖๑.๑๒๔๕ ล้านบาท																																																																		
การดำเนินงาน	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย มีผลการดำเนินงานงบลงทุน ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ สรุปดังนี้																																																																		
	๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๔ รายการ <table><tr><th>รายการ</th><th>จำนวน (รายการ)</th><th>วงเงิน (ล้านบาท)</th><th>เบิกจ่าย (ล้านบาท)</th><th>ร้อยละ</th><th>หมายเหตุ</th></tr><tr><td>รวมทั้งสิ้น</td><td>๕๔</td><td>๓๐๒.๑๐๗๐</td><td>๕๕.๔๗๙๒</td><td>๑๘.๓๖</td><td></td></tr><tr><td>๑. ครุภัณฑ์</td><td>๔๑</td><td>๓๓.๔๔๕๑</td><td></td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>- ลงนามสัญญา</td><td>๔๑</td><td>๓๐.๙๒๘๙</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- เงินเหลือจ่าย</td><td></td><td>๒.๕๑๖๒</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ผลเบิกจ่ายครุภัณฑ์</td><td>๓๘</td><td></td><td>๑๘.๘๐๗๓</td><td>๕๖.๒๓</td><td></td></tr><tr><td>๒. สิ่งก่อสร้าง</td><td>๑๓</td><td>๒๖๘.๖๖๑๙</td><td></td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>- รอลงนามสัญญา</td><td>๑</td><td>๖๑.๘๔๘๐</td><td></td><td></td><td>ปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสัตว์อุบลราชธานี</td></tr><tr><td>- ลงนามสัญญา</td><td>๑๒</td><td>๑๙๗.๗๖๒๔</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- เงินเหลือจ่าย</td><td></td><td>๙.๐๕๑๕</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ผลเบิกจ่ายสิ่งก่อสร้าง</td><td></td><td></td><td>๓๖.๖๗๑๙</td><td>๑๓.๖๕</td><td></td></tr></table>	รายการ	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	หมายเหตุ	รวมทั้งสิ้น	๕๔	๓๐๒.๑๐๗๐	๕๕.๔๗๙๒	๑๘.๓๖		๑. ครุภัณฑ์	๔๑	๓๓.๔๔๕๑		-		- ลงนามสัญญา	๔๑	๓๐.๙๒๘๙				- เงินเหลือจ่าย		๒.๕๑๖๒				ผลเบิกจ่ายครุภัณฑ์	๓๘		๑๘.๘๐๗๓	๕๖.๒๓		๒. สิ่งก่อสร้าง	๑๓	๒๖๘.๖๖๑๙		-		- รอลงนามสัญญา	๑	๖๑.๘๔๘๐			ปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสัตว์อุบลราชธานี	- ลงนามสัญญา	๑๒	๑๙๗.๗๖๒๔				- เงินเหลือจ่าย		๙.๐๕๑๕				ผลเบิกจ่ายสิ่งก่อสร้าง			๓๖.๖๗๑๙	๑๓.๖๕	
รายการ	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	หมายเหตุ																																																														
รวมทั้งสิ้น	๕๔	๓๐๒.๑๐๗๐	๕๕.๔๗๙๒	๑๘.๓๖																																																															
๑. ครุภัณฑ์	๔๑	๓๓.๔๔๕๑		-																																																															
- ลงนามสัญญา	๔๑	๓๐.๙๒๘๙																																																																	
- เงินเหลือจ่าย		๒.๕๑๖๒																																																																	
ผลเบิกจ่ายครุภัณฑ์	๓๘		๑๘.๘๐๗๓	๕๖.๒๓																																																															
๒. สิ่งก่อสร้าง	๑๓	๒๖๘.๖๖๑๙		-																																																															
- รอลงนามสัญญา	๑	๖๑.๘๔๘๐			ปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสัตว์อุบลราชธานี																																																														
- ลงนามสัญญา	๑๒	๑๙๗.๗๖๒๔																																																																	
- เงินเหลือจ่าย		๙.๐๕๑๕																																																																	
ผลเบิกจ่ายสิ่งก่อสร้าง			๓๖.๖๗๑๙	๑๓.๖๕																																																															

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี จำนวน ๘ รายการ

รายการ	เงินกันเหลือมปี (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)
รวมทั้งสิ้น	๑๖๖.๒๓๐๕	๖๑.๖๗๒๙	๑๐๔.๕๕๗๖
ครุภัณฑ์			
๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์	๕.๑๐๖๐	๓.๓๒๖๐	๑.๗๘๐๐
สิ่งก่อสร้าง			
๑. ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่	๑๐๒.๗๗๗๖		๑๐๒.๗๗๗๖
๒. ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมี ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่	๑๑.๔๑๒๕	๑๑.๔๑๒๕	-
๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์และอัตลักษณ์บริเวณส่วนจัดแสดงสัตว์ สัตว์แอฟริกา ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	๙.๓๑๕๖	๙.๓๑๕๖	-
๔. ปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center) ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี	๖.๒๕๐๐	๖.๒๕๐๐	-
๕. ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัสและส่วนแสดงจระเข้ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี	๑๗.๓๖๘๘	๑๗.๓๖๘๘	-
๖. ก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวิน ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น	๓.๖๕๐๐	๓.๖๕๐๐	-
๗. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ภายในสวนสัตว์ ขอนแก่น	๑๐.๓๕๐๐	๑๐.๓๕๐๐	-

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
รายการสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565

ลำดับ	สวนสัตว์	รายการ	งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน
		<u>สิ่งก่อสร้าง</u>		
1	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	ปรับปรุงถนนแนวรั้วและสิ่งอำนวยความสะดวก สัญญาที่ 7/2565 บจก.พี.เอ.ไอ ซัพพลาย จำนวน 6 งาน เริ่มต้น 30 ธันวาคม 2564 สิ้นสุด 26 สิงหาคม 2565 - งานที่ 2 กำหนดแล้วเสร็จ 9 มีนาคม 2565 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) - งานที่ 3 กำหนดแล้วเสร็จ 18 เมษายน 2565	29,915,000	- เบิกจ่ายงวด 1 เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการงวด 2 เนื่องจากบริเวณก่อสร้างอยู่ใกล้แนวไฟฟ้าแรงสูงเดิมที่ยังใช้งานอยู่ เมื่อขุดดินลงฐานราก จึงต้องมีความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสียหาย ประกอบ กันวัสดุในการก่อสร้าง เช่น แผงแนวรั้ว ทางผู้ผลิตไม่สามารถส่งของได้ เนื่องจากพนักงานติดโควิดจึงทำให้งานก่อสร้างล่าช้า - วันที่ 21 เม.ย. 65 คณะกรรมการได้ติดตามและเร่งรัดบริษัทฯ แล้ว - ได้รับการยืนยันจากสวนสัตว์ฯ ว่าบริษัทฯ จะสามารถส่งงานได้ภายใน พค.65
2	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	ก่อสร้างเตาเผาซากสัตว์ปลอดมลพิษพร้อมปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการ สัญญาที่ 6/2565 บจก.ทีเอ็มที แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำนวน 2 งาน เริ่มต้น 27 ธันวาคม 2564 สิ้นสุด 26 พฤษภาคม 2565	4,750,000	- เบิกจ่ายงวด 1 เรียบร้อยแล้ว - งานงวดที่ 2 (สุดท้าย) คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 เม.ย.65 และอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารส่งเบิกจ่าย
3	สวนสัตว์เชียงใหม่	ปรับปรุงอาคารฝ่ายอนุรักษ์ วิจัยฯ พร้อมอาคารอนุบาลลูกสัตว์ สัญญาที่ 9/2565 บจก.อันนา เทรดิง จำนวน 3 งาน เริ่มต้น 17 ธันวาคม 2564 สิ้นสุด 29 เมษายน 2565	1,945,000	- เบิกจ่ายเงินงวด 1 เรียบร้อยแล้ว - เบิกจ่ายเงินงวด 2 เรียบร้อยแล้ว - งานงวดที่ 3 บริษัทฯ ส่งมอบงานแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจรับ จากคณะกรรมการฯ

ลำดับ	สวนสัตว์	รายการ	งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน
4	สวนสัตว์เชียงใหม่	ก่อสร้างโครงข่ายท่อน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สัญญาที่ 18/2565 หจก.กรีนเทค เอสโซซิเอท จำนวน 10 งวดงาน เริ่มต้น 8 กุมภาพันธ์ 2565 สิ้นสุด 4 ธันวาคม 2565 - งวดที่ 1 กำหนดส่งมอบงาน 9 มีนาคม 2565 (ยังไม่ส่งมอบงาน) - งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบงาน 8 เมษายน 2565 (ยังไม่ส่งมอบงาน) - งวดที่ 3 กำหนดส่งมอบงาน 8 พฤษภาคม 2565	29,880,000	- งานงวด 1 อยู่ระหว่างดำเนินงาน เนื่องจากท่อน้ำทิ้งต้องใช้เวลาในการผลิตเป็นเดือน จึงทำให้การจัดส่งล่าช้า และส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้าตามไปด้วย - ได้รับการแจ้งจากสวนสัตว์ว่า หจก. จะส่งมอบงานงวดที่ 1-3 ภายในสิ้นเดือนเมษายน 2565 แต่ปัจจุบันได้รับแจ้งว่าหจก. ยังไม่ได้ส่งมอบงาน เนื่องจากยังขาดท่อน้ำทิ้งซึ่งอยู่ระหว่างการจัดส่งวัสดุ โดยวัสดุดังกล่าวจะส่งเข้ามาเพื่อติดตั้งได้ภายในวันที่ 18 พค.65 และจะเบิกจ่ายได้ 30 พค.65 - ในการก่อสร้างดังกล่าวมีจำนวน 10 งวดงาน โดยงวดงานที่ 8-10 กำหนดส่งมอบงานในปี 2566 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) - สวนสัตว์ฯ ยืนยันจะเร่งดำเนินการงานงวดที่ 8 ให้สามารถเบิกจ่ายได้ภายในสิ้นเดือนกันยายน 2565 ดังนั้น รายการนี้จะถูกกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปี จำนวน 2 งวดงาน คือ งวดที่ 9-10 คิดเป็นร้อยละ 2.22 ของภาพรวมรายการสิ่งก่อสร้าง
5	สวนสัตว์นครราชสีมา	ขยายพื้นที่ส่วนจัดแสดงสัตว์อาณาจักรผู้ล่า สัญญาที่ 10/2565 บจก.เอส.ยู.แพค จำนวน 5 งวดงาน เริ่มต้นวันที่ 17 ธันวาคม 2564 สิ้นสุด 13 สิงหาคม 2565 - งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบงาน 22 มีนาคม 2565	24,970,000	- เบิกจ่ายเงินงวด 1 เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวด 2 สาเหตุการล่าช้า เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยงานที่ยังไม่แล้วเสร็จคืองานเทคอลลกริต ซึ่งบริษัทฯ แจ้งว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 25-26 เมย.65 - ปัจจุบันบริษัทฯ ส่งมอบงานแล้ว และอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับฯ คาดว่าจะส่งเรื่องเข้ามาเบิกจ่ายภายในวัน 9 พค.65
6	สวนสัตว์นครราชสีมา	ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สัญญาเลขที่ 7/2565 บริษัท เอส.ยู.แพค จำกัด จำนวน 5 งวดงาน เริ่มต้นวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุด 23 กรกฎาคม 2565	9,950,000	- เบิกจ่ายเงินงวด 1 เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวด 2 สาเหตุการล่าช้าเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงการสั่งผลิตท่อระบายน้ำ ซึ่งเป็นท่อน้ำ

ลำดับ	สวนสัตว์	รายการ	งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน
		- งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบงาน 1 มีนาคม 2565 - งวดที่ 3 กำหนดส่งมอบงาน 18 เมษายน 2565		เหลี่ยมที่มีขนาดใหญ่ต้องสั่งทำและจะได้ของภายในสิ้นเดือนเมษายน - งานงวดที่ 2 ดำเนินการแล้ว 100% อยู่ระหว่างการส่งมอบงาน คาดว่าจะส่งเรื่องเข้ามาเบิกจ่ายภายในวัน 12 พค.65
7	สวนสัตว์สงขลา	ปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ สัญญาเลขที่ 12/2565 หจก.มิตรแสงวิศวกรรม จำนวน 9 งวดงาน เริ่มต้นวันที่ 3 ธันวาคม 2564 สิ้นสุด 29 สิงหาคม 2565 - งวดที่ 1 กำหนดส่งมอบงาน 16 มกราคม 2565 - งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบงาน 15 กุมภาพันธ์ 2565 - งวดที่ 3 กำหนดส่งมอบงาน 17 มีนาคม 2565 - งวดที่ 4 กำหนดส่งมอบงาน 16 เมษายน 2565	30,367,441	- งานงวดที่ 1 บริษัทฯ ส่งมอบงานวันที่ 30 มีค.65 - คณะกรรมการตรวจรับวันที่ 8 เมย.65 พบว่างานแล้วเสร็จเพียง 72% จึงแจ้งให้บริษัทฯ เร่งดำเนินการ ซึ่งบริษัทฯ แจ้งว่าดำเนินการและส่งมอบได้ภายในวันที่ 5 พค.65 - สวนสัตว์ฯ ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงวดงาน ตั้งแต่งวดที่ 2 ซึ่งสวนสัตว์ได้ดำเนินงานงวดที่ 2 แล้ว 33% เนื่องจากติดปัญหาฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ - สวนสัตว์ฯ ยืนยันว่าจะเบิกจ่ายงานงวดที่ 2 ภายใน พค.65
8	สวนสัตว์สงขลา	ปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธุ์สมเสร็จ สวนสัตว์สงขลา สัญญาที่ 11/2565 หจก.ชัยรุ่งก่อสร้าง 2007 จำนวน 7 งวดงาน เริ่มต้น 23 พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุด 19 สิงหาคม 2565 - งวดที่ 3 กำหนดส่งมอบงาน 16 มีนาคม 2565 - งวดที่ 4 กำหนดส่งมอบงาน 25 เมษายน 2565	16,480,000	- เบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว - เบิกจ่ายงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว - งานงวดที่ 3 บริษัทฯ ดำเนินการได้เพียง 40% ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่เข้ามาดำเนินการต่อ - คณะกรรมการฯ ได้ทำหนังสือแจ้งให้บริษัทฯ เข้ามาดำเนินงานแล้วจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้เข้ามาดำเนินการเมื่อวันที่ 11 เมย.65
9	สวนสัตว์ขอนแก่น	ปรับปรุงส่วนจัดแสดงอาณาจักรนกเค้า สวนสัตว์ขอนแก่น สัญญาที่ 18/2565 บจก.ขุนพลพัฒนาการ จำนวน 4 งวดงาน เริ่มต้น วันที่ 24 ธันวาคม 2564 สิ้นสุด 20 สิงหาคม 2565 - งวดที่ 1 กำหนดส่งมอบงาน 21 มีนาคม 2565 - งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบงาน 22 เมษายน 2565	14,990,000	- งานงวดที่ 1 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารเข้ามาเบิกจ่ายที่ส่วนกลาง (หนังสือที่ ทส 1118/92 ลว. 21 เมย.65) - งานงวดที่ 2 ดำเนินการแล้ว 90% แต่เนื่องจากมีบางรายการต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังนั้น จึงอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายการ คาดว่าจะสามารถส่งเบิกจ่ายได้ภายใน พค.65 - สำหรับงานงวดที่ 3 ดำเนินการแล้ว 50%

ลำดับ	สวนสัตว์	รายการ	งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน
10	สวนสัตว์ขอนแก่น	ปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวน้ำ สัญญาที่ 11/2565 บจก.ขุนพลพัฒนาการ จำนวน 4 งาน เริ่มต้น วันที่ 15 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 11 มิถุนายน 2565 - งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบงาน 14 มีนาคม 2565 - งวดที่ 3 กำหนดส่งมอบงาน 28 เมษายน 2565	14,567,000	- เบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว - งานงวดที่ 2 บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานแล้ว แต่เนื่องจากงานยังไม่ครบ ยังขาดในส่วนของเก้าอี้ และกันสาด คณะกรรมการจึงไม่ตรวจรับและแจ้ง ให้บริษัทฯ เร่งดำเนินการ ซึ่งบริษัทฯ แจ้งว่ารายการที่ยังขาดจะได้รับ คือเก้าอี้ 700 ตัว ซึ่งขอได้รับเมื่อวันที่ 25 เม.ย.65 และเริ่มติดตั้งวันที่ 6-9 พค.65 ซึ่งบริษัทจะส่งมอบงานงวดที่ 2 ภายในวันที่ 13 พค.65 - งานงวดที่ 3 ดำเนินการโครงสร้างแล้ว 100% คงเหลือโซล่าเซลล์ ซึ่งคาดว่าจะส่งมอบงานได้ภายใน 16 พค.65 - สวนสัตว์ยืนยันงวดที่ 2-3 จะส่งเบิกจ่ายภายในกลางเดือน พค.65
11	สวนสัตว์ขอนแก่น	ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสัตว์และอาคารประกอบต่างๆ สัญญาที่ 10/2565 บจก.ขุนพลพัฒนาการ จำนวน 3 งาน เริ่มต้น วันที่ 15 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด วันที่ 12 พฤษภาคม 2565	7,979,000	- เบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว - เบิกจ่ายงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวด 3 - สวนสัตว์ฯ ยืนยันว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามสัญญา
12	โครงการคชอาณาจักร	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระการบินไทย โครงการคชอาณาจักร สุรินทร์ สัญญาที่ 5/2565 หจก.สุรินทร์ไทยสงวน จำนวน 5 งาน เริ่มต้น วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 - งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบงาน 23 กุมภาพันธ์ 2565 - งวดที่ 3 กำหนดส่งมอบงาน 9 เมษายน 2565	11,969,000	- เบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว - งวดที่ 2 อยู่ระหว่างบริษัทฯ ส่งมอบงาน - งวดที่ 3 อยู่ระหว่างดำเนินการ 50% - สวนสัตว์ฯ ยืนยันว่าจะเบิกจ่ายงวด 2-3 ภายในเดือน พค.65
13	สวนสัตว์อุบลราชธานี	ปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม สวนสัตว์อุบลราชธานี	61,848,000	- ดำเนินการเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) ครั้งที่ 2 ซึ่งมีกำหนดเคาะราคา วันที่ 19-20 เม.ย.65 - วันที่ 21 เม.ย.65 มีผู้มายื่นเสนอราคา 4 ราย

ลำดับ	สวนสัตว์	รายการ	งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน
				- วันที่ 22 เมย.65 พิจารณาผล วันที่ 25 เมย.65 สวนสัตว์ฯ จะประกาศผลผู้ชนะ 26 เมย.65 รอการอุทธรณ์อีก 7 วันนับจากวันประกาศ ซึ่งพ้นกำหนดการอุทธรณ์ วันที่ 4 พค.65 และจะสามารถลงนามสัญญา ในวันที่ 6 พค.65

งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[illegible]

งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[illegible]

งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[illegible]

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[illegible]

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	วงเงินที่ลงนาม	ส่งเรื่องเบิกจ่ายแล้ว			ส่วนกลาง	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์
			คีย์ GFMS แล้ว	รอคีย์ GFMS	รวม		เปิดเขาเขียว	เชียงใหม่	นครราชสีมา	สงขลา	อุบลราชธานี	ขอนแก่น	ขอนแก่นจักร
	ครุภัณฑ์	19,320,905	18,807,300	-	18,807,300								
1	โครงการระบบบริหารจัดการสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (Thai Zoo Ark) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร	3,900,000	2,340,000		2,340,000								
2	กล้องถ่ายภาพระบบ wifi สำหรับกล้องจุลทรรศน์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	120,000	120,000		120,000	GFMS							
3	ตู้เก็บเปลือกพาราฟิน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	145,520	145,520		145,520	GFMS							
4	ตู้เก็บแผ่นกระจกสไลด์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	80,250	80,250		80,250	GFMS							
5	เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงในไมโครเพลท องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	406,600	406,600		406,600	GFMS							
6	เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพในสัตว์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	220,000	220,000		220,000	GFMS							
7	ตู้เย็นแช่น้ำยา องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	140,000	140,000		140,000	GFMS							
8	เครื่องตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	250,000	250,000		250,000	GFMS							
9	เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วรอบต่ำ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	170,000	170,000		170,000	GFMS							
10	เครื่องปั่นเหวี่ยงฮีมาโตคริต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	130,000	130,000		130,000	GFMS							

ลำดับ	รายการ	วงเงินที่ลงนาม	ส่งเรื่องเบิกจ่ายแล้ว			ส่วนกลาง	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์
			คีย์ GFMS แล้ว	รอคีย์ GFMS	รวม		เปิดเขาเขียว	เชียงใหม่	นครราชสีมา	สงขลา	อุบลราชธานี	ขอนแก่น	ขอนแก่นจักร
11	เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบทศนิยม 3 ตำแหน่ง สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	80,000	80,000		80,000	GFMS							
12	ตู้แช่แข็ง -40 องศาเซลเซียส สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ตู้	150,000	150,000		150,000	GFMS							
13	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (cab) สวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	644,000	644,000		644,000			GFMS					
14	ถังเก็บน้ำบนดิน โพลีเมอร์ ขนาด 3,000 ลิตร สวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 10 ใบ	77,000	77,000		77,000			GFMS					
15	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู สวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	65,250	65,250		65,250			GFMS					
16	รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,358,000	1,358,000		1,358,000					GFMS			
17	เครื่องจี้ห้ามเลือด และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	89,500	89,500		89,500					GFMS			
18	เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพในสัตว์ สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	160,000	160,000		160,000					GFMS			
19	เครื่องบันทึกและติดตามปริมาณความอึดตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจรสำหรับสัตว์ สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	18,000	18,000		18,000					GFMS			
20	เครื่องติดตามและบันทึกค่าคาร์บอนไดออกไซด์ทางเดินหายใจแบบแมนสตรัม สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	56,000	56,000		56,000					GFMS			

ลำดับ	รายการ	วงเงินที่ลงนาม	ส่งเรื่องเบิกจ่ายแล้ว			ส่วนกลาง	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์
			คีย์ GFMS แล้ว	รอคีย์ GFMS	รวม		เปิดเขาเขียว	เชียงใหม่	นครราชสีมา	สงขลา	อุบลราชธานี	ขอนแก่น	คชอาณาจักร
21	โคมไฟฟ้าตัด สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	28,000	28,000		28,000					GFMS			
22	ชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล สวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,640,000	1,640,000		1,640,000						GFMS		
23	แผ่นบันทึกภาพเอกซเรย์แบบดิจิทัล สวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	226,500	226,500		226,500						GFMS		
24	หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 Kva สวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 5 เครื่อง	792,000	792,000		792,000						GFMS		
25	กล่องวงจรปิดจำนวน 8 จุด สวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 66 ตัว	850,000	850,000		850,000						GFMS		
26	เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวี สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	52,900	52,900		52,900							GFMS	
27	เครื่องเลเซอร์รักษาแผลสำหรับสัตว์ สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	840,000	840,000		840,000							GFMS	
28	เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 3 เครื่อง	439,200	439,200		439,200							GFMS	
29	เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า รั้วไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้า สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 2 เครื่อง	70,000	70,000		70,000							GFMS	
30	เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 2 เครื่อง	18,000	18,000		18,000							GFMS	

[illegible]

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	สวนสัตว์	วงเงิน ลงนามสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	การดำเนินงาน	ส่วนกลาง	สวนสัตว์เปิด เขาเขียว	สวนสัตว์ เชียงใหม่	สวนสัตว์ นครราชสีมา	สวนสัตว์ สงขลา	สวนสัตว์ อุบลราชธานี	สวนสัตว์ ขอนแก่น	โครงการคช อาณาจักร
	ครุภัณฑ์ ทั้งสิ้น 41 รายการ	33,445,100.00	30,928,900.00										
	- เบิกจ่ายแล้ว 38 รายการ			18,807,300									
	- ยังไม่เบิกจ่าย 3 รายการ			11,608,000									
	ครุภัณฑ์												
1	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-ticket) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร	ส่วนกลาง วงเงิน งบประมาณ 8,449,800	6,980,000		ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 14 มีค 2565								
2	รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 สูบ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 7,700 ซีซี มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้าแบบกระบะบรรทุกทุกแบบกระบะเหล็ก พร้อมติดเครนไฮดรอลิก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน	สวนสัตว์เปิดเขา เขียว	2,830,000				5 เมย 65						
3	เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิทัล พร้อมเครื่องเอกซเรย์แบบตั้งโต๊ะ สวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	สวนสัตว์เชียงใหม่	1,798,000					26 กพ 65					

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
 รายการงบประมาณปี 2564 ที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี
 ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	สัญญา เลขที่/บริษัท	ลงนามสัญญา			รวมเบิกจ่ายใน ปี 2564	เงินกันเหลือในปี	ผลเบิกจ่าย ในปี 2565	คงเหลือ	หมายเหตุ
				เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินที่ลงนาม					
	ลงทุน	277,789,000	-	-	-	249,028,800	76,548,280	166,230,520	61,672,950	104,557,570	
	ครุภัณฑ์	18,000,000	-	-	-	12,736,000	7,630,000	5,106,000	3,326,000	1,780,000	
	สิ่งก่อสร้าง	259,789,000	-	-	-	236,292,800	68,918,280	161,124,520	58,346,950	102,777,570	
	ครุภัณฑ์	18,000,000	-	-	-	12,736,000	7,630,000	5,106,000	3,326,000	1,780,000	
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ องค์การสวนสัตว์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	18,000,000	บริษัท เซีย-เท็ค บิสซิเนส จำกัด	8 มิ.ย.64	6 ต.ค.64	12,736,000	7,630,000	5,106,000	3,326,000	1,780,000	- คงเหลือรายการเสือด้า เสือดาว
	สิ่งก่อสร้าง	259,789,000				236,292,800	68,918,280	161,124,520	58,346,950	102,777,570	
1	<u>ส่วนกลาง</u> ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง ปี 2563 = 36,000,000 บาท ปี 2564 = 110,825,100 บาท วงเงินสัญญา 146,825,100 บาท	114,000,000	ส.11/2564 บริษัท ดีไซน์ + ดีเวลลอป จำกัด 6 งาน	1 ธ.ค.63	24 พ.ค.65	110,825,100	8,047,530	102,777,570	-	102,777,570	- อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 4
