


รายงานสถานภาพตามกระบวนการพัสดุ ของงบลงทุน
รายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2565 จำนวน 13 รายการ

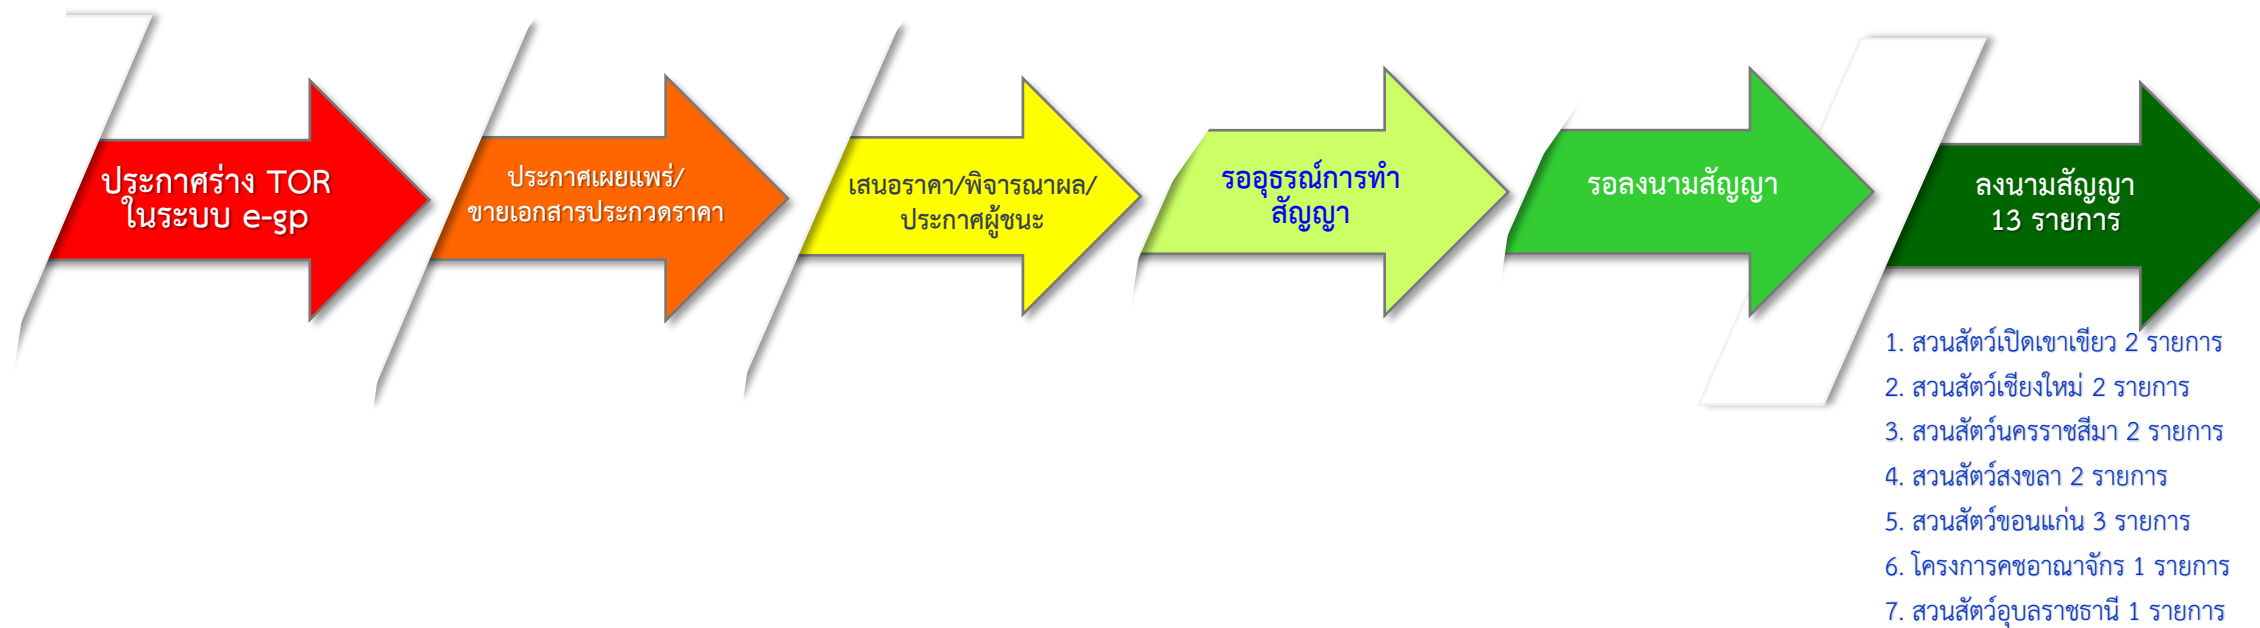

รายงานสถานภาพตามกระบวนการพัสดุ ของงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ ประจำปี 2565 จำนวน 41 รายการ

จัดทำ TOR

อยู่ระหว่างขอซื้อขोज้าง

รอลงนามในสัญญา

ลงนามสัญญา
41 รายการ

เบิกจ่ายแล้ว
39 รายการ




⇒ เบิกจ่ายรวมเป็นเงิน
26.3011 ลบ.

1. ส่วนกลาง 9 รายการ
2. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 5 รายการ
3. สวนสัตว์เชียงใหม่ 5 รายการ
4. สวนสัตว์สงขลา 6 รายการ
5. สวนสัตว์อุบลราชธานี 4 รายการ
6. สวนสัตว์ขอนแก่น 8 รายการ
7. โครงการคชอาณาจักร 4 รายการ

- 39 รายการ เบิกจ่ายครบเรียบร้อยแล้ว
- 1 รายการ คือ รายการระบบบริหารจัดการสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (Thai Zoo Ark) เบิกแล้ว 2 งวด
- 1 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ
 - โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบจำหน่ายบัตร (E-ticket) เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%



ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ภาพรวม

งบอุดหนุน

งบลงทุน

รายการ		งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย /GFMIS	คิดเป็น (%)	คงเหลือ
1. งบอุดหนุน		405.9195	304.3178	74.97	101.6017
2. งบลงทุน		302.1070	116.4297	38.54	185.6773
* ครุภัณฑ์		33.4451	26.3011	78.64	7.1440
* สิ่งก่อสร้าง		268.6619	90.1286	33.55	178.5333
รวมทั้งสิ้น		708.0265	420.7475	59.43	287.2790

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่องเดิม	๑. ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร) ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ เรื่อง ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นการดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ทั้งในส่วนของงบลงทุน เพื่อดำเนินงานปกติและงบลงทุนตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ๒. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้รับงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๓๐๒.๑๐๗๐ ล้านบาท รวม ๕๔ รายการ ประกอบด้วย ๒.๑ รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๔๑ รายการ เป็นเงิน ๓๓.๔๔๕๑ ล้านบาท ๒.๒ รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ เป็นเงิน ๒๖๘.๖๖๑๙ ล้านบาท ๓. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๖.๒๓๐๕ ล้านบาท จำนวน ๘ รายการ ประกอบด้วย ๓.๑ รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๕.๑๐๖๐ ล้านบาท ๓.๒ รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๑๖๑.๑๒๔๕ ล้านบาท																																																																		
การดำเนินงาน	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย มีผลการดำเนินงานงบลงทุน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ สรุปดังนี้																																																																		
	๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๔ รายการ <table><tr><th>รายการ</th><th>จำนวน (รายการ)</th><th>วงเงิน (ล้านบาท)</th><th>เบิกจ่าย (ล้านบาท)</th><th>ร้อยละ</th><th>หมายเหตุ</th></tr><tr><td>รวมทั้งสิ้น</td><td>๕๔</td><td>๓๐๒.๑๐๗๐</td><td>๑๑๖.๔๒๙๗</td><td>๓๘.๕๔</td><td></td></tr><tr><td>๑. ครุภัณฑ์</td><td>๔๑</td><td>๓๓.๔๔๕๑</td><td></td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>- ลงนามสัญญา</td><td>๔๑</td><td>๓๐.๙๒๘๙</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- เงินเหลือจ่าย</td><td></td><td>๒.๕๑๖๒</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ผลเบิกจ่ายครุภัณฑ์</td><td>๓๘</td><td></td><td>๒๖.๓๐๑๑</td><td>๗๘.๖๔</td><td></td></tr><tr><td>๒. สิ่งก่อสร้าง</td><td>๑๓</td><td>๒๖๘.๖๖๑๙</td><td></td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>- รอลงนามสัญญา</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- ลงนามสัญญา</td><td>๑๓</td><td>๒๕๑.๒๖๐๔</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- เงินเหลือจ่าย</td><td></td><td>๑๗.๔๐๑๕</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ผลเบิกจ่ายสิ่งก่อสร้าง</td><td></td><td></td><td>๙๐.๑๒๘๖</td><td>๓๓.๕๕</td><td></td></tr></table>	รายการ	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	หมายเหตุ	รวมทั้งสิ้น	๕๔	๓๐๒.๑๐๗๐	๑๑๖.๔๒๙๗	๓๘.๕๔		๑. ครุภัณฑ์	๔๑	๓๓.๔๔๕๑		-		- ลงนามสัญญา	๔๑	๓๐.๙๒๘๙				- เงินเหลือจ่าย		๒.๕๑๖๒				ผลเบิกจ่ายครุภัณฑ์	๓๘		๒๖.๓๐๑๑	๗๘.๖๔		๒. สิ่งก่อสร้าง	๑๓	๒๖๘.๖๖๑๙		-		- รอลงนามสัญญา						- ลงนามสัญญา	๑๓	๒๕๑.๒๖๐๔				- เงินเหลือจ่าย		๑๗.๔๐๑๕				ผลเบิกจ่ายสิ่งก่อสร้าง			๙๐.๑๒๘๖	๓๓.๕๕	
รายการ	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	หมายเหตุ																																																														
รวมทั้งสิ้น	๕๔	๓๐๒.๑๐๗๐	๑๑๖.๔๒๙๗	๓๘.๕๔																																																															
๑. ครุภัณฑ์	๔๑	๓๓.๔๔๕๑		-																																																															
- ลงนามสัญญา	๔๑	๓๐.๙๒๘๙																																																																	
- เงินเหลือจ่าย		๒.๕๑๖๒																																																																	
ผลเบิกจ่ายครุภัณฑ์	๓๘		๒๖.๓๐๑๑	๗๘.๖๔																																																															
๒. สิ่งก่อสร้าง	๑๓	๒๖๘.๖๖๑๙		-																																																															
- รอลงนามสัญญา																																																																			
- ลงนามสัญญา	๑๓	๒๕๑.๒๖๐๔																																																																	
- เงินเหลือจ่าย		๑๗.๔๐๑๕																																																																	
ผลเบิกจ่ายสิ่งก่อสร้าง			๙๐.๑๒๘๖	๓๓.๕๕																																																															

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี จำนวน ๘ รายการ

รายการ	เงินกันเหลือมปี (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)
รวมทั้งสิ้น	๑๖๖.๒๓๐๕	๑๐๕.๗๒๐๔	๖๐.๕๑๐๑
ครุภัณฑ์			
๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์	๕.๑๐๖๐	๓.๓๒๖๐	๑.๗๘๐๐
สิ่งก่อสร้าง			
๑. ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่	๑๐๒.๗๗๗๖	๔๔.๐๔๗๕	๕๘.๗๓๐๑
๒. ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมี ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่	๑๑.๔๑๒๕	๑๑.๔๑๒๕	-
๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์และอัตลักษณ์บริเวณส่วนจัดแสดงสัตว์ สัตว์แอฟริกา ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	๙.๓๑๕๖	๙.๓๑๕๖	-
๔. ปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center) ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี	๖.๒๕๐๐	๖.๒๕๐๐	-
๕. ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัสและส่วนแสดงจระเข้ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี	๑๗.๓๖๘๘	๑๗.๓๖๘๘	-
๖. ก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวิน ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น	๓.๖๕๐๐	๓.๖๕๐๐	-
๗. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ภายในสวนสัตว์ ขอนแก่น	๑๐.๓๕๐๐	๑๐.๓๕๐๐	-

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
 รายการสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2565

ลำดับ	สวนสัตว์	รายการ	งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน
		<u>สิ่งก่อสร้าง</u>		
1	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	ปรับปรุงถนนแนวรั้วและสิ่งอำนวยความสะดวก สัญญาที่ 7/2565 บจก.พี.เอ.ไอ ซัพพลาย จำนวน 6 งวดงาน เริ่มต้น 30 ธันวาคม 2564 สิ้นสุด 26 สิงหาคม 2565 - งวดที่ 2 กำหนดแล้วเสร็จ 9 มีนาคม 2565 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) - งวดที่ 3 กำหนดแล้วเสร็จ 18 เมษายน 2565 - งวดที่ 4 กำหนดแล้วเสร็จ 2 มิถุนายน 2565	29,915,000	- เบิกจ่ายงวด 1 เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวด 2 เนื่องจากบริเวณก่อสร้างอยู่ใกล้แนวไฟฟ้าแรงสูงเดิมที่ยังใช้งานอยู่ เมื่อขุดดิน ลงฐานราก จึงต้องมีความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสียหาย ประกอบกับวัสดุในการ ก่อสร้าง เช่น แผงแนวรั้ว ทางผู้ผลิตไม่สามารถส่งของได้ เนื่องจากพนักงานติดโควิด จึงทำให้งานก่อสร้างล่าช้า - วันที่ 4 เม.ย.65 คณะกรรมการได้ติดตามและเร่งรัดบริษัทฯ งวดที่ 2 ครั้งที่1 - วันที่ 9 เม.ย.65 คณะกรรมการได้ติดตามและเร่งรัดบริษัทฯ งวดที่ 2 ครั้งที่2 - วันที่ 18 พ.ค.65 คณะกรรมการได้ติดตามและเร่งรัดบริษัทฯ งวดที่ 2 และ งวดที่ 3 ครั้งที่ 3 - วันที่ 19 พ.ค. 65 คณะกรรมการได้เชิญบริษัทฯ เข้ามาคุย เพื่อหาแนวทางการ เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน - บริษัทฯ ส่งงานงวดที่ 2 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 - คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง มีหนังสือแจ้งวันที่ 24 มิ.ย.65 ไม่สามารถ ตรวจรับงานได้เนื่องจากงานก่อสร้างในงวดงานที่ 2 ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ซึ่งดำเนินการ 2 ได้เพียง 80% ยังคงเหลืองานขึ้นโครงหลังคาและมุงหลังคา ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเนื่องจากวัสดุไม่เข้าหน้างานอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับฝนตกหนักเกือบทุกวันส่งผลทำให้งานล่าช้า ซึ่งทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว - สวนสัตว์ยืนยันว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 2 ได้ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565

ลำดับ	สวนสัตว์	รายการ	งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน
2	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	ก่อสร้างเตาเผาซากสัตว์ปลอดมลพิษพร้อมปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการ สัญญาที่ 6/2565 บจก.ทีมเท็ค แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำนวน 2 งวดงาน เริ่มต้น 27 ธันวาคม 2564 สิ้นสุด 26 พฤษภาคม 2565	4,750,000	- เบิกจ่ายครบเรียบร้อยแล้ว
3	สวนสัตว์เชียงใหม่	ปรับปรุงอาคารฝ่ายอนุรักษ์ วิจัยฯ พร้อมอาคารอนุบาลลูกสัตว์ สัญญาที่ 9/2565 บจก.อันนา เทรดิง จำนวน 3 งวดงาน เริ่มต้น 17 ธันวาคม 2564 สิ้นสุด 29 เมษายน 2565	1,945,000	- เบิกจ่ายครบเรียบร้อยแล้ว
4	สวนสัตว์เชียงใหม่	ก่อสร้างโครงข่ายท่อน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรองรับการตรวจ ประเมินคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สัญญาที่ 18/2565 หจก.กรีนเทค เอสโซซิเอท จำนวน 10 งวดงาน เริ่มต้น 8 กุมภาพันธ์ 2565 สิ้นสุด 4 ธันวาคม 2565 - งวดที่ 4 กำหนดส่งมอบงาน 7 มิถุนายน 2565 - งวดที่ 5 กำหนดส่งมอบงาน 7 กรกฎาคม 2565	29,880,000	- เบิกจ่ายงวดที่ 1-3 เรียบร้อยแล้ว - งานงวด 4 ดำเนินงานแล้วเสร็จ 70% คาดว่าจะเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งขณะนี้ช้ากว่าแผนตามสัญญาจ้าง และหารือร่วมกับผู้รับจ้างหาแนวทางแก้ไข โดยเพิ่มกำลังแรงงานก่อสร้างเพื่อเร่งงานก่อสร้าง - ในการก่อสร้างดังกล่าวมีจำนวน 10 งวดงาน โดยงวดงานที่ 8-10 กำหนดส่งมอบงานในปี 2566 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) - สวนสัตว์ฯ ยืนยันจะเร่งดำเนินการงานงวดที่ 8 ให้สามารถเบิกจ่ายได้ภายใน สิ้นเดือนกันยายน 2565 ดังนั้น รายการนี้จะถูกกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี จำนวน 2 งวดงาน คือ งวดที่ 9-10 คิดเป็นร้อยละ 2.22 ของภาพรวมงานก่อสร้าง
5	สวนสัตว์นครราชสีมา	ขยายพื้นที่ส่วนจัดแสดงสัตว์อาณาจักรผู้ล่า สัญญาที่ 10/2565 บจก.เอส.ยู.แพค จำนวน 5 งวดงาน เริ่มต้นวันที่ 17 ธันวาคม 2564 สิ้นสุด 13 สิงหาคม 2565 - งวดที่ 3 กำหนดส่งมอบงาน 9 พฤษภาคม 2565 - งวดที่ 4 กำหนดส่งมอบงาน 26 มิถุนายน 2565	24,970,000	- เบิกจ่ายเงินงวด 1 เรียบร้อยแล้ว - เบิกจ่ายเงินงวด 2 เรียบร้อยแล้ว - สาเหตุการล่าช้า เนื่องจากปัญหาการสั่งซื้อวัสดุล่าช้า มีวันหยุดยาวในช่วง เทศกาลสงกรานต์ทำให้แรงงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงทำให้เกิดความล่าช้า - โดยงานงวดที่ 3 ดำเนินการได้ทั้งสิ้น 87% คงเหลืองานงานคอกกักสิงโต อีก 13% ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 - สวนสัตว์นครราชสีมาจัดทำหนังสือเร่งรัดงานครั้งที่ 2 - ผู้รับจ้างจะดำเนินการปรับแผนงานในส่วนของการทำงานล่วงเวลา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

ลำดับ	สวนสัตว์	รายการ	งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน
6	สวนสัตว์นครราชสีมา	ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สัญญาเลขที่ 7/2565 บริษัท เอส.ยู.แพค จำกัด จำนวน 5 งวดงาน เริ่มต้นวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุด 23 กรกฎาคม 2565 - งวดที่ 3 กำหนดส่งมอบงาน 18 เมษายน 2565 - งวดที่ 4 กำหนดส่งมอบงาน 5 มิถุนายน 2565 - งวดที่ 5 กำหนดส่งมอบงาน 23 กรกฎาคม 2565	9,950,000	- เบิกจ่ายเงินงวด 1 เรียบร้อยแล้ว - งวดงานที่ 2 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย - อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวด 3 งานวางท่อระบายน้ำ Dia.60 cm พร้อมบ่อพักและฝาปิด บริเวณส่วนจัดแสดงช้างแอฟริกาถึงส่วนแสดงลิงชิมแปนซี ดำเนินการแล้วเสร็จ งานวางท่อรางดักน้ำหน้าส่วนแสดงอีแลนด์ และงานวางท่อบริเวณส่วนจัดแสดงช้างแอฟริกาถึงส่วนแสดงลิงชิมแปนซี ได้ดำเนินการแล้ว ในภาพรวมงวดที่ 3 ดำเนินการได้แล้วเสร็จ 60% คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ซึ่งในขณะนี้วัสดุอุปกรณ์มีพร้อมทุกอย่างและหากผู้รับจ้างเร่งการดำเนินงาน จะสามารถเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด - คณะกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้นัดประชุมร่วมกับผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 และมีหนังสือเร่งรัดงานครั้งที่ 5 ไปยังบริษัท เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และงานพัสดุได้นัดผู้รับจ้างนัดคุย เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เพื่อหาแนวทางแก้ไข ซึ่งสวนสัตว์ได้ออกหนังสือเร่งรัดไปแล้ว 5 ครั้ง
7	สวนสัตว์สงขลา	ปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ สัญญาเลขที่ 12/2565 หจก.มิตรแสงวิศวกรรม จำนวน 9 งวดงาน เริ่มต้นวันที่ 3 ธันวาคม 2564 สิ้นสุด 29 สิงหาคม 2565 - งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบงาน 15 กุมภาพันธ์ 2565 - งวดที่ 3 กำหนดส่งมอบงาน 17 มีนาคม 2565 - งวดที่ 4 กำหนดส่งมอบงาน 16 เมษายน 2565 - งวดที่ 5 กำหนดส่งมอบงาน 16 พฤษภาคม 2565 - งวดที่ 6 กำหนดส่งมอบงาน 25 มิถุนายน 2565	30,367,441	- เบิกจ่ายเงินงวด 1 เรียบร้อยแล้ว - งานงวดที่ 2 ดำเนินการแล้ว 75% เนื่องจากติดปัญหาฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้คานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นระดับหลังคาคอนกรีตในงวดที่ 1 ล่าช้าส่งผลให้การปฏิบัติ งานงวดที่ 2 ล่าช้าไปด้วย งานสถาปัตยกรรม อาคารชั้นสูตรซากและเตาเผาซาก คงเหลือปริมาณงานอีก 50% และงานสถาปัตยกรรม อาคารพยาบาลสัตว์ป่วย คงเหลือปริมาณงานอีก 25% คาดว่าจะส่งมอบงานได้ภายในวันที่ 15 ก.ค.2565 สาเหตุการล่าช้าเนื่องจากขาดแคลนแรงงาน - งวดที่ 3 ภาพรวมดำเนินการแล้วเสร็จ 45% งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารอาคาร พยาบาลสัตว์ป่วยแล้วเสร็จ 90% คงเหลือระบบไฟฟ้าและสื่อสารอาคารชั้นสูตรซาก

ลำดับ	สวนสัตว์	รายการ	งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน
		- งวดที่ 7 กำหนดส่งมอบงาน 15 กรกฎาคม 2565		และเตาเผาซากที่ยังไม่ดำเนินการ คาดจะส่งมอบงานได้ปลายเดือน มิ.ย.65 - งวดงานที่ 4 ดำเนินการได้ 45% ได้ดำเนินงานโครงสร้างวิศวกรรมอาคารคอกกักโรคสัตว์แล้วเสร็จ 90% ยังคงเหลืองานภูมิทัศน์อาคารชั้นสุตรซากและเตาเผา - งวดงานที่ 5 ดำเนินการได้ 47.5% งานอาคารกักโรคสัตว์ งานโครงสร้างวิศวกรรม อาคารโรงพยาบาลสัตว์และสำนักงานส่วนแยก คาดว่าส่งมอบงานได้ปลายเดือน ก.ค.65 - งวดงานที่ 6 ดำเนินการได้ 65% - งวดงานที่ 7 ดำเนินการได้ 30% - งวดงานที่ 8 ดำเนินการได้ 33.34% - งวดงานที่ 9 ดำเนินการได้ 10%
8	สวนสัตว์สงขลา	ปรับปรุงส่วนจัดแสดงและสวนขยายพันธุ์สมเสร็จ สวนสัตว์สงขลา สัญญาที่ 11/2565 หจก.ชัยรุ่งก่อสร้าง 2007 จำนวน 7 งวดงาน เริ่มต้น 23 พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุด 19 สิงหาคม 2565 - งวดที่ 4 กำหนดส่งมอบงาน 25 เมษายน 2565 - งวดที่ 5 กำหนดส่งมอบงาน 30 พฤษภาคม 2565 - งวดที่ 6 กำหนดส่งมอบงาน 9 กรกฎาคม 2565	16,480,000	- เบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว - เบิกจ่ายงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว - เบิกจ่ายงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว - งวดงานที่ 4 งานมุงหลังคา แผ่น ASAPVC พร้อมครอบสัน, อาคารคอกกักอาคารคอกกัก ศาลาชมสัตว์, ซุ้มให้อาหารสัตว์ ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลืองานฉาบก่อผนัง, งานพื้นและผิวพื้น ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 4 ได้ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ซึ่งได้ทำการเร่งรัด และเชิญผู้รับจำเข้ามาพูดคุยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565
9	สวนสัตว์ขอนแก่น	ปรับปรุงส่วนจัดแสดงอาณาจักรนกกล่า สวนสัตว์ขอนแก่น สัญญาที่ 18/2565 บจก.ขุนพลพัฒนาการ จำนวน 4 งวดงาน เริ่มต้น วันที่ 24 ธันวาคม 2564 สิ้นสุด 20 สิงหาคม 2565 - งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบงาน 22 เมษายน 2565 - งวดที่ 3 กำหนดส่งมอบงาน 21 มิถุนายน 2565	14,990,000	- เบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว - งวดที่ 2 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายมายังองค์การสวนสัตว์ฯ - สำหรับงานงวดที่ 3 จะส่งมอบงานได้วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 - สำหรับงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) คงเหลืองานภูมิทัศน์และงานครุภัณฑ์ คาดว่าจะดำเนินการได้ตามสัญญาในงวดสุดท้ายคือเดือนสิงหาคม 2565

ลำดับ	สวนสัตว์	รายการ	งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน
10	สวนสัตว์ขอนแก่น	ปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวน้ำ สัญญาที่ 11/2565 บจก.ขุนพลพัฒนาการ จำนวน 4 งาน เริ่มต้น วันที่ 15 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 11 มิถุนายน 2565 - งวดที่ 3 กำหนดส่งมอบงาน 28 เมษายน 2565 - งวดที่ 4 (สุดท้าย) กำหนดส่งมอบงาน 12 มิถุนายน 2565	14,567,000	- เบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว - เบิกจ่ายงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว - งวดที่ 3-4 (สุดท้าย) ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร เบิกจ่ายมายังองค์การสวนสัตว์ฯ
11	สวนสัตว์ขอนแก่น	ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสัตว์และอาคารประกอบต่างๆ สัญญาที่ 10/2565 บจก.ขุนพลพัฒนาการ จำนวน 3 งาน เริ่มต้น วันที่ 15 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด วันที่ 12 พฤษภาคม 2565	7,979,000	- เบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว - เบิกจ่ายงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว - เบิกจ่ายงวดที่ 3 (สุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว
12	โครงการคชอาณาจักร	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระการบินไทย โครงการคชอาณาจักร สุรินทร์ สัญญาที่ 5/2565 หจก.สุรินทร์ไทยสงวน จำนวน 5 งาน เริ่มต้น วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 - งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบงาน 23 กุมภาพันธ์ 2565 - งวดที่ 3 กำหนดส่งมอบงาน 9 เมษายน 2565 - งวดที่ 4 กำหนดส่งมอบงาน 24 พฤษภาคม 2565 - งวดที่ 5 กำหนดส่งมอบงาน 8 กรกฎาคม 2565 (สุดท้าย)	11,969,000	- เบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว - งวดที่ 2-3 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน - งวดที่ 4 ดำเนินการแล้ว 60% คงเหลืองานปลูกต้นไม้และจัดสวน งานศาลาดูช้าง งานศาลาพักผ่อนช้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 - งวดที่ 5 สุดท้าย ดำเนินการแล้ว 80% คงเหลืองานทดสอบระบบ
13	สวนสัตว์อุบลราชธานี	ปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม สวนสัตว์ สัญญาที่ 21/2565 หจก.กรีนเทค เอสโซซิเอท จำนวน 6 งาน สัญญาเริ่ม 6 พ.ค. - 31 ธ.ค.65 จำนวน 240 วัน - งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบ 9 กรกฎาคม 2565	61,848,000	- เบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว - งวดที่ 2 อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ 2 คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดระยะเวลาตามสัญญา

งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[illegible]

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	สวนสัตว์	แผน/ผล	จำนวน จัดงาน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	
4	ก่อสร้างโครงข่ายท่อน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	สวนสัตว์เชียงใหม่	แผนส่งงาน							2,988,000	2,988,000	2,988,000	2,988,000	2,988,000	2,988,000	2,988,000	
			ส่งมอบงาน														
			ตรวจรับ														
			เบิกจ่าย									8,964,000.00					
												งวด 1-3 : 31/5/65					
5	ขยายพื้นที่ส่วนจัดแสดงสัตว์อานาจักรผู้ล่า ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง สัญญาที่ 10/2565 บจก.เอส.ยู.แพค เริ่มต้นวันที่ 17 ธันวาคม 2564 สิ้นสุด 13 สิงหาคม 2565	สวนสัตว์นครราชสีมา	แผนส่งงาน	5					3,770,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000		6,200,000.00		
								2/2/65	22/3/65		9/5/65	26/6/65		13/8/65			
			ส่งมอบงาน														
			ตรวจรับ														
			เบิกจ่าย						3,770,000		5,000,000						
									งวด 1 : 30/3/65		งวด 2 : 12/5/65						
6	ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในสวนสัตว์นครราชสีมาตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง สัญญาเลขที่ 7/2565	สวนสัตว์นครราชสีมา	แผนส่งงาน	5				1,500,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,450,000			
							12/1/65		1/3/65	18/4/65		5/6/65	23/7/65				
			ส่งมอบงาน				28/12/64										
			ตรวจรับ				17/1/65										
			เบิกจ่าย				1,500,000										
							27/1/65										
7	ปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง สัญญาเลขที่ 12/2565 หจก.มิตรแสงวิศวกรรม เริ่มต้นวันที่ 3 ธันวาคม 2564 สิ้นสุด 29 สิงหาคม 2565	สวนสัตว์สงขลา	แผนส่งงาน	9				3,947,767	3,036,744	2,429,395	3,036,744	2,429,395	3,036,744	3,036,744	9,413,907.73		
							16/1/65	15/2/65	17/3/65	16/4/65	16/5/65	25/6/65	15/7/65	4 , 29/8/65			
			ส่งมอบงาน														
			ตรวจรับ														
			เบิกจ่าย										3,947,767				
													งวด 1 : 29.6.65				

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[illegible]

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[illegible]

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	วงเงินที่ลงนาม	ส่งเรื่องเบิกจ่ายแล้ว			ส่วนกลาง	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์	โครงการ
			คีย์ GFMIS แล้ว	รอคีย์ GFMIS	รวม		เปิดเขาเขียว	เชียงใหม่	นครราชสีมา	สงขลา	อุบลราชธานี	ขอนแก่น	
	ครุภัณฑ์	30,928,905	23,784,905	-	23,784,905								
1	โครงการระบบบริหารจัดการสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (Thai Zoo Ark) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร	3,900,000	2,340,000		2,340,000	GFMIS							
2	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-ticket) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร	6,980,000	1,396,000		1,396,000	GFMIS							
3	กล้องถ่ายภาพระบบ wifi สำหรับกล้องจุลทรรศน์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	120,000	120,000		120,000	GFMIS							
4	ตู้เก็บเปลือกพาราฟิน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	145,520	145,520		145,520	GFMIS							
5	ตู้เก็บแผ่นกระจกสไลด์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	80,250	80,250		80,250	GFMIS							
6	เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงในไมโครเพลท องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	406,600	406,600		406,600	GFMIS							
7	เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพในสัตว์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	220,000	220,000		220,000	GFMIS							
8	ตู้เย็นแช่น้ำยา องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	140,000	140,000		140,000	GFMIS							
9	เครื่องตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	250,000	250,000		250,000	GFMIS							
10	เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วรอบต่ำ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	170,000	170,000		170,000	GFMIS							
11	เครื่องปั่นเหวี่ยงฮิวมาโตคริต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	130,000	130,000		130,000	GFMIS							

ลำดับ	รายการ	วงเงินที่ลงนาม	ส่งเรื่องเบิกจ่ายแล้ว			ส่วนกลาง	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์	โครงการ
			คีย์ GFMS แล้ว	รอคีย์ GFMS	รวม		เปิดเขาเขียว	เชียงใหม่	นครราชสีมา	สงขลา	อุบลราชธานี	ขอนแก่น	
12	เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบทศนิยม 3 ตำแหน่ง สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	80,000	80,000		80,000	GFMS							
13	ตู้แช่แข็ง -40 องศาเซลเซียส สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ตู้	150,000	150,000		150,000	GFMS							
14	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (cab) สวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	644,000	644,000		644,000			GFMS					
15	ถังเก็บน้ำบนดิน โพลีเมอร์ ขนาด 3,000 ลิตร สวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 10 ใบ	77,000	77,000		77,000			GFMS					
16	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู สวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	65,250	65,250		65,250			GFMS					
17	รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,358,000	1,358,000		1,358,000					GFMS			
18	เครื่องจำหน่ายเลือด และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	89,500	89,500		89,500					GFMS			
19	เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพในสัตว์ สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	160,000	160,000		160,000					GFMS			
20	เครื่องบันทึกและติดตามปริมาณความอึดตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจรสำหรับสัตว์ สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	18,000	18,000		18,000					GFMS			
21	เครื่องติดตามและบันทึกค่าคาร์บอนไดออกไซด์ทางเดินหายใจแบบแมนสตรัม สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	56,000	56,000		56,000					GFMS			

ลำดับ	รายการ	วงเงินที่ลงนาม	ส่งเรื่องเบิกจ่ายแล้ว			ส่วนกลาง	สวนสัตว์ เปิดเขาเขียว	สวนสัตว์ เชียงใหม่	สวนสัตว์ นครราชสีมา	สวนสัตว์ สงขลา	สวนสัตว์ อุบลราชธานี	สวนสัตว์ ขอนแก่น	โครงการ คชอาณาจักร
			คีย์ GFMS แล้ว	รอคีย์ GFMS	รวม								
22	โคมไฟฟ้าตัด สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	28,000	28,000		28,000					GFMS			
23	ชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล สวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,640,000	1,640,000		1,640,000						GFMS		
24	แผ่นบันทึกภาพเอกซเรย์แบบดิจิทัล สวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	226,500	226,500		226,500						GFMS		
25	หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 Kva สวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 5 เครื่อง	792,000	792,000		792,000						GFMS		
26	กล่องวงจรปิดจำนวน 8 จุด สวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 66 ตัว	850,000	850,000		850,000						GFMS		
27	เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวี สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	52,900	52,900		52,900							GFMS	
28	เครื่องเลเซอร์รักษาแผลสำหรับสัตว์ สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	840,000	840,000		840,000							GFMS	
29	เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 3 เครื่อง	439,200	439,200		439,200							GFMS	
30	เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า รั้วไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้า สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 2 เครื่อง	70,000	70,000		70,000							GFMS	
31	เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 2 เครื่อง	18,000	18,000		18,000							GFMS	

ลำดับ	รายการ	วงเงินที่ลงนาม	ส่งเรื่องเบิกจ่ายแล้ว			ส่วนกลาง	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์	สวนสัตว์	โครงการ
			คีย์ GFMS แล้ว	รอคีย์ GFMS	รวม		เปิดเขาเขียว	เชียงใหม่	นครราชสีมา	สงขลา	อุบลราชธานี	ขอนแก่น	
32	ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 ตู้	46,000	46,000		46,000							GFMS	
33	ตู้แช่อาหาร ขนาด 32 คิวบิกฟุต สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 ตู้	27,000	27,000		27,000							GFMS	
34	เครื่องเป่าใบไม้ 2 จังหวะ 3.8 แรงม้า จำนวน 6 เครื่อง สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 3 เครื่อง	27,285	27,285		27,285							GFMS	
35	เครื่องมือรักษาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดความเข้มต่ำ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	850,000	850,000		850,000								GFMS
36	เครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมในสภาพจริงแบบเคลื่อนที่ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	480,000	480,000		480,000								GFMS
37	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	30,700	30,700		30,700								GFMS
38	รถตักหน้าขุดหลัง ล้อยาง เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) มีกำลังไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน 2200 รอบต่อนาที โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน	3,190,000	3,190,000		3,190,000								GFMS
39	เครื่องอัลตราซาวด์แบบพกพาสำหรับสัตว์ป่า สวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,453,200	1,453,200		1,453,200			GFMS					
40	รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 สูบ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่น้อยกว่า 7,700 ซีซี มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้าแบบกระบะบรรทุกแบบกระบะเหล็ก พร้อมติดเครนไฮดรอลิก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน	2,830,000	2,830,000		2,830,000		GFMS						
41	เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิทัล พร้อมเครื่องเอกซเรย์แบบตั้งโต๊ะ สวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,798,000	1,798,000		1,798,000			GFMS					

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[illegible]
