

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๒

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวสุธีรา	กิจนาบุรณ์	แทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าคณะกรรมการ	
๒. นายกฤษดา	ธีระชาลวงค์	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท	คณะกรรมการ
		กาฬสินธุ์	
๓. นางวนิดา ไชยภู		แทน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๔. นางสาวศิริรัตน์	ศรีสงคราม	แทน ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๕. นายอรรถพงษ์	ศิริสุวรรณ	แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๖. นางวัชร	มณีก้อน	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๗. นายณัฐกฤษณ์	โพธิ์ศรี	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๘. นางสาวกัญญา	โพธิ์สะอาด	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๙. นายจำลอง	ศรีนามล	แทน นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๑๐. นางศิริลักษณ์	ยาสมร	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๑๑. นางอรุณศรี	เหมือนวงษ์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๖	คณะกรรมการ
๑๒. นายจิตติกร	ภูมิชิน	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๑๓. นางพรหมภัสสร	ภูมิสวัสดิ์	แทน พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๑๔. นางสุภาภรณ์	พรมแสง	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๑๕. นายศิริพงษ์	ครองอุดม	แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์	คณะกรรมการ
๑๖. นางปราณี	ระคาน	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่	คณะกรรมการ
		การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์	
๑๗. นายอดิศักดิ์	ทวยลี	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่	คณะกรรมการ
		การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓	
๑๘. นางสาวสุธีรา	กิจนาบุรณ์	คลังจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะกรรมการและ
			เลขานุการ
๑๙. นายชวรินทร์	ตรีเนตร	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์	คณะกรรมการและ
			เลขานุการร่วม
๒๐. นางวนิดา	ไชยภู	ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินและบัญชี	คณะกรรมการและ
		สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ผู้ช่วยเลขานุการ
		จังหวัดกาฬสินธุ์	
๒๑. นายสาโรจน์	เกศนิบุตร	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	คณะกรรมการและ
		สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์	ผู้ช่วยเลขานุการ

/ผู้ไม่มา...

ผู้ไม่มาร่วมประชุม

๑. นายธวัชชัย	รอดงาม	รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์	ติดราชการ
๒. นายสุริยะ	ใจวงษ์	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑	ติดราชการ
๓. นายสุรเชษฐ์	พละเอิน	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒	ติดราชการ
๔. นายธนเสฏฐ์	ชัยสงครามชนทัต	นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์	ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางธิดาพร	เมืองแวง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๒. นายแสงสุรีย์	นันททรัพย์	เจ้าหน้าที่พัสดุ
๓. นายตริงใจ	ศิลาโรจน์	นักวิชาการสาธารณสุข
๔. นางสาววิไลวรรณ	ศรีคำ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๕. นางสาวเพ็ญประภา	ขรรค์แก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๖. นางสาวสุกัญญา	หันจรัส	นักวิชาการคลังชำนาญการ
๗. นางสาวจุไรรัตน์	บุตรศาสตร์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
๘. นางสาวจิราภรณ์	เหลื่องวิเศษ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๙. นางนิมนวล	ภักดีแก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๑๐. นางสาววนิดา	ไชยสถิตย์	เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
๑๑. นางสาวจุฑามาศ	อุดรศรี	นักบัญชี
๑๒. นางพรรณชนก	คนอยู่	นักวิชาการคลัง

เริ่มประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ด้วยหัวหน้าคณะทำงาน นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ติดราชการด่วน จึงมอบหมายให้คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ประธาน

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดส่งรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมนี้ขอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ และหากท่านใดมีข้อแก้ไข/เพิ่มเติมสามารถแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ต่อไป

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

/ระเบียบ...


ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ


รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕)

ประธาน

สถิติการใช้จ่ายงบลงทุนเปรียบเทียบกับระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕)

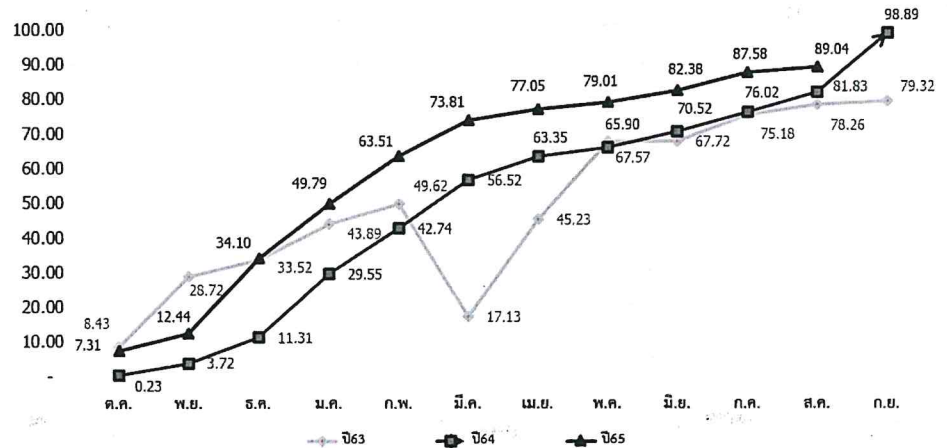


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕)

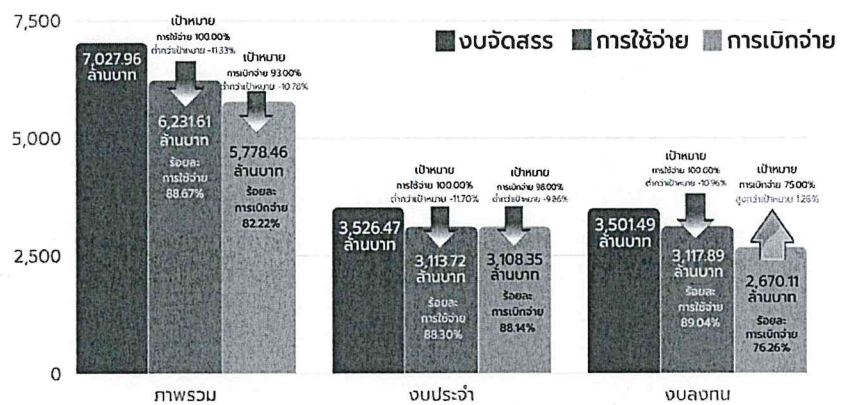

ผลการใช้จ่ายงบลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ(งบลงทุน)

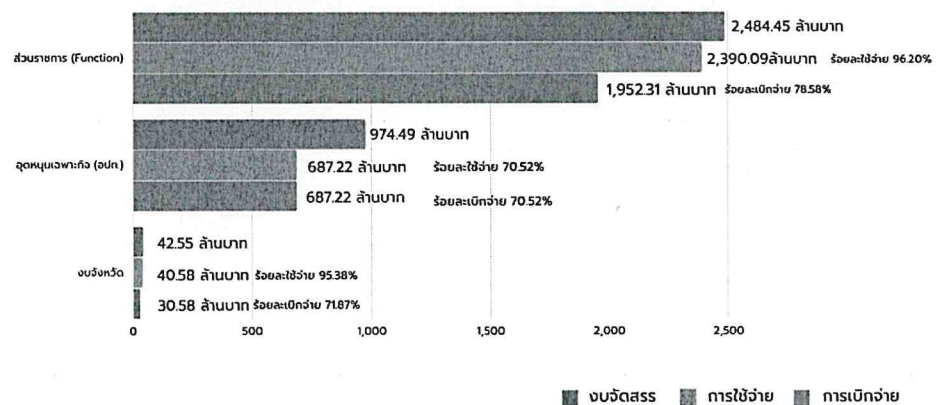

/ประธาน...

ประธาน

ลำดับผลการใช้จ่ายของจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับผลการใช้จ่าย

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย (ร้อยละ)	ลำดับผลการใช้จ่าย		
			ประเทศ	กลุ่มจังหวัด	12 จังหวัด
งบประจำ	3,113.72	88.30	54	3	8
งบลงทุน	3,117.89	89.04	42	3	7
ภาพรวม	6,231.61	88.67	45	2	5

ลำดับผลการเบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ลำดับผลการเบิกจ่าย		
			ประเทศ	กลุ่มจังหวัด	12 จังหวัด
งบประจำ	3,108.35	88.14	46	3	8
งบลงทุน	2,670.11	76.26	4	1	3
ภาพรวม	5,778.46	82.22	5	2	3

ลำดับผลการใช้จ่าย งบจังหวัด (กรมจังหวัด) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

รายจ่าย	ไตรมาสที่ 4 เป้าหมาย ใช้จ่าย (ร้อยละ)	ผลการ ใช้จ่าย (ร้อยละ)	ลำดับ ประเทศ	ลำดับ กลุ่ม จังหวัด	ลำดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัด (ตอนบนและ ตอนกลาง)	ไตรมาสที่ 4 เป้าหมาย เบิกจ่าย (ร้อยละ)	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
ประจำ	100.00	56.04	65	4	11	98.00	55.87
ลงทุน	100.00	95.38	39	2	7	75.00	71.88
ภาพรวม	100.00	78.68	65	2	10	93.00	65.09

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๑ งบส่วนราชการ (Function)

รายการ/ โครงการ	หน่วย งาน	จำนวนโครงการ		วงเงิน (ล้านบาท)			ร้อยละ	
		ก่อนนี้	ยังไม่ก่อนนี้	จัดสรร	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
1,402	51	1,177	225	2,484.45	1,952.31	2,390.09	78.58	96.20

สถานะผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ งบส่วนราชการ
(Function) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑. สถานะไฟเขียว

ที่	หน่วยงาน	รายจ่ายลงทุน (ล้านบาท)				
		ได้รับ จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	สถานะ
1	วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์	46.23	29.16	46.23	100.00	
2	โรงพยาบาลกาฬสินธุ์	41.95	10.35	41.95	100.00	
3	วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์	36.17	27.38	36.17	100.00	
4	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์	15.93	1.33	15.93	100.00	
5	ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์	10.99	10.99	10.99	100.00	
6	เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์	9.32	8.85	9.32	100.00	
7	วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง	9.13	6.25	9.13	100.00	
8	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาฬสินธุ์	8.89	6.10	8.89	100.00	

/ประธาน

ประธาน

ที่	หน่วยงาน	รายจ่ายลงทุน (ล้านบาท)				
		ได้รับ จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	สถานะ
9	สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์	6.92	0.00	6.92	100.00	
10	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์	4.28	0.00	4.28	100.00	
11	สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์	3.20	0.00	3.20	100.00	
12	สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6	3.13	0.27	3.13	100.00	
13	โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล	3.05	2.57	3.05	100.00	
14	วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง	2.97	0.00	2.97	100.00	
15	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์	2.66	0.00	2.66	100.00	
16	วิทยาลัยเทคนิคเขาวง	1.99	0.00	1.99	100.00	
17	วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์	1.99	0.00	1.99	100.00	
18	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์	1.71	0.00	1.71	100.00	
19	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์	1.23	0.00	1.23	100.00	
20	สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์	1.21	0.00	1.21	100.00	
21	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์	1.13	0.00	1.13	100.00	
22	สำนักงานที่ดินจังหวัด กาฬสินธุ์	1.08	0.00	1.08	100.00	
23	สำนักงานประมงจังหวัด	1.00	0.65	1.00	100.00	
24	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์	0.96	0.00	0.96	100.00	
25	นิคมสร้างตนเองลำปาว	0.50	0.00	0.50	100.00	
26	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์	0.48	0.00	0.48	100.00	
27	สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์	0.37	0.00	0.37	100.00	
28	โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์	0.25	0.00	0.25	100.00	
29	โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร	0.25	0.00	0.25	100.00	
30	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์	0.24	0.00	0.24	100.00	
31	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์	0.16	0.00	0.16	100.00	
32	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดกาฬสินธุ์	0.09	0.00	0.09	100.00	
33	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์	0.04	0.00	0.04	100.00	
34	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	0.04	0.00	0.04	100.00	
35	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	39.99	0.00	39.95	99.90	
36	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	93.99	12.22	93.87	99.88	
37	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	9.90	0.00	9.88	99.80	
38	สถานีพัฒนาที่ดิน กาฬสินธุ์	37.88	3.27	37.79	99.76	
39	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	86.76	36.87	86.45	99.65	
40	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 อำเภอห้วยเม็ก	37.69	11.33	37.51	99.51	
41	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)	550.09	27.42	545.09	99.09	

ประธาน

ที่	หน่วยงาน	รายจ่ายลงทุน (ล้านบาท)				
		ได้รับ จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	สถานะ
42	แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์	448.99	139.06	443.93	98.87	
43	แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์	387.85	44.03	377.66	97.37	
44	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์	6.68	3.67	6.38	95.49	

๒. สถานะไฟเหลือง

ที่	หน่วยงาน	รายจ่ายลงทุน (ล้านบาท)				
		ได้รับ จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	สถานะ
1	โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	413.73	12.14	387.30	93.61	
2	เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์	2.50	1.17	2.32	92.81	
3	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	0.48	0.00	0.45	92.06	

๓. สถานะไฟแดง

ที่	หน่วยงาน	รายจ่ายลงทุน (ล้านบาท)				
		ได้รับ จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	สถานะ
1	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์	41.07	21.59	36.00	87.65	
2	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 อำเภอห้วยผึ้ง	28.15	3.50	23.38	83.08	
3	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์	34.60	4.61	27.21	78.63	
4	สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์	11.51	3.53	5.93	51.55	


๓.๒ งบกรมจังหวัด

ผู้แทน หัวหน้าสำนักงาน
จังหวัดกาฬสินธุ์

สำหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ งบกรม
จังหวัด โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน
๔๒.๕๕ ล้านบาท ซึ่งมีการใช้จ่ายจำนวน ๔๐.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๙๕.๓๘ และมีการเบิกจ่ายจำนวน ๓๐.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๗
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

/ผู้แทน...

ผู้แทน หัวหน้าสำนักงาน
จังหวัดกาฬสินธุ์

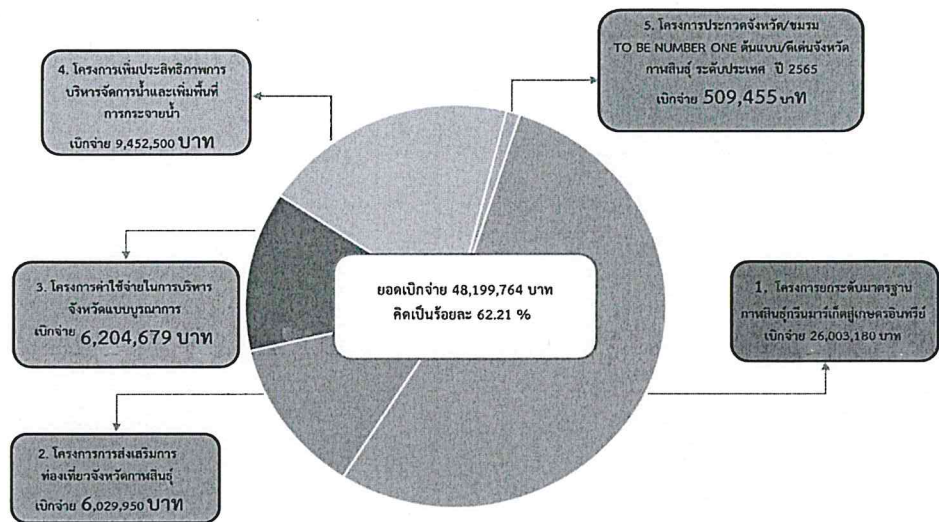

รายงานผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

แผนงาน-ผลผลิต/ โครงการ-กิจกรรม	งบประมาณ				โอน เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ
	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น	รวม					
งบรายจ่าย - รายการ					บวก (ลบ)	(หลังโอน เปลี่ยนแปลง)			
จังหวัดกาฬสินธุ์	40,000,000.00	23,911,500.00	10,000,000.00	73,911,500.00	-	73,911,500.00	48,199,764.00	25,711,736.00	65.21
1. โครงการยกระดับ มาตรฐานกาฬสินธุ์ สู่ระดับมาตรฐานสากล	30,000,000.00	14,757,300.00	-	44,757,300.00	-	44,757,300.00	26,003,180.00	18,754,120.00	58.10
1.1 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการ ผลิตข้าวอินทรีย์		11,013,300.00		11,013,300.00		11,013,300.00	4,742,780.00	6,270,520.00	43.06
1.2 กิจกรรมหลัก : พัฒนาการผลิตผัก ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม	25,000,000.00			25,000,000.00	(10,000.00)	24,990,000.00	14,994,000.00	9,996,000.00	60.00
1.3 กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ไม้ผล	5,000,000.00	3,744,000.00		8,744,000.00	(150,000.00)	8,594,000.00	6,235,400.00	2,358,600.00	72.56
1.4 กิจกรรมหลัก : ผลิตสินค้าประมงปลอดภัย ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง (Y2)					160,000.00	160,000.00	31,000.00	129,000.00	19.38

แผนงาน-ผลผลิต/ โครงการ-กิจกรรม	งบประมาณ				โอน เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ทั้งสิ้น	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ
	งบรายจ่าย - รายการ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน งบรายจ่าย อื่น	รวม	บวก (ลบ)	(หลังโอน เปลี่ยนแปลง)			
5. โครงการประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ/ ดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับประเทศ ปี 2565		763,000.00		763,000.00		763,000.00	327,830.00	435,170.00	42.97
กิจกรรมหลัก : ประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ/ ดีเด่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับประเทศ ปี 2565		763,000.00		763,000.00		763,000.00	327,830.00	435,170.00	42.97

ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ๓.๓ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ (อปท.)

ผลการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรจำนวน ๑,๐๐๘ โครงการ จำนวนเงิน ๙๐๐.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๙๙๑ โครงการ จำนวนเงิน ๘๑๒.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๐ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทรายการ	รวม		อยู่ระหว่างดำเนินการ		เบิกจ่ายแล้ว		คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ		
1	งบกลาง (เศรษฐกิจฐานราก)	612	374,554,174.40	6	6,457,077.70	606	368,097,096.70	98.28%	
2	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2564	396	525,580,573.63	11	80,866,259.33	385	444,714,314.30	84.61%	
รวมทั้งหมด		1,008	900,134,748.03	17	87,323,337.03	991	812,811,411.00	90.30%	

สำหรับภาพรวมโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. ที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน ๓๖๘ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๐๓๗.๐๕ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ ๒๘๔ โครงการ จำนวนเงิน ๖๙๔.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๖๘ และสามารถก่องหนผู้กพนได้ จำนวน ๓๔๔ โครงการ จำนวนเงิน ๙๐๘.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๖ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	จำนวน	(บาท)	ส่งคืนคงเหลือ		ร้อยละ
			จำนวน	(บาท)	
ได้รับการจัดสรร	368	1,037,048,100.00	16	11,446,600.00	100.00
ก่องหนผู้กพน (PO)	344	908,302,983.10			88.56
อยู่ระหว่างประกาศหา ผู้รับจ้าง/กำหนดราคา กลาง/แก้ไขเปลี่ยนแปลง	7	34,019,900.00			3.32
เบิกจ่ายแล้ว	284	694,191,598.22			68.68

ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	ได้รับจัดสรร		ส่งคืนโครงการ		เหลือ		อยู่ระหว่างดำเนินการ						อยู่ระหว่าง		กึ่งปีสุดท้าย		เบิกจ่ายแล้ว		คิดเป็นร้อยละ
		จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง		ระหว่างกำหนด		ประกาศแล้ว		การอุดหนุน		จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท					
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	2	879,200			2	879,200.00									2	871,769.80	2	871,769.80	100
2	การก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ	4	23,913,600			4	23,913,600.00					1	7,959,000			3	15,580,900.00	0		0
3	ครุภัณฑ์บรรณารักษะ	8	18,919,000			8	18,919,000.00									8	18,842,000.00	5	11,668,000.00	61.93
4	ถนน	197	696,778,800	4	3,756,600.00	193	693,022,200.00									193	628,713,216.00	175	559,140,365.12	82.11
5	ธนาคารน้ำใต้ดิน	9	3,566,900			9	3,566,900.00									9	3,557,000.00	9	3,557,000.00	100
6	ประปาหมู่บ้าน	39	101,054,600	1	615,000.00	38	99,824,600.00					2	1,780,000			36	95,301,788.00	26	51,116,288.00	50.92
7	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	9	39,671,000			9	39,671,000.00			2	11,417,000					6	23,557,000.00	3	5,020,000.00	12.67
8	ลานกีฬา	18	31,001,400			18	31,001,400.00									18	29,912,826.30	15	17,567,926.30	57.46
9	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	5	14,800,500			5	14,800,500.00									5	10,087,963.00	3	3,239,829.00	21.5
10	สถานเด็กเล่นสร้างปัญญา	16	2,720,000	6	1,020,000.00	10	1,700,000.00									10	1,699,910.00	6	1,019,910.00	60
11	แหล่งกักเก็บน้ำ	47	70,812,400	5	6,055,000.00	42	64,757,400.00			1	9,900,000					41	51,055,910.00	34	31,186,810.00	49.66
12	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	14	32,930,700			14	32,930,700.00					1	2,963,900			13	29,120,700.00	6	9,803,700.00	29.88
รวม		368	1,037,048,100	16	11,446,600.00	352	1,025,601,500.00			3	21,517,000	4	12,702,900			344	908,302,983.10	284	694,191,598.22	68.68

ประธาน

ขอขอบคุณท้องถิ่นจังหวัดที่ให้ความร่วมมือในการเร่งรัดให้ อปท.ที่ได้รับผิดชอบดำเนินการก่อนและเบิกจ่ายเงินได้เป็นไปตามเป้าหมาย

ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ รับทราบ และจะเร่งรัดให้ อปท.ดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันตามระยะเวลาของสัญญาและเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการและงบประมาณที่เหลือต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

รายงานการดำเนินงานของส่วนราชการที่ยังไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายของไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธาน

จากผลการดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งฝ่ายเลขาคณะทำงาน ได้สรุปปัญหา และจัดหมวดหมู่ของสาเหตุที่ยังไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันและดำเนินการจองเงินในระบบ New GFMS Thai (PO) สามารถแบ่งออกเป็น ๖ ประเภท ดังนี้

ผลการดำเนินงานรายการค่าใช้จ่ายงบลงทุน (กรณียังไม่ PO)

ที่	รายการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	หมายเหตุ
1	เป็นเงินเหลือจ่ายอยู่ระหว่างคืน	1	0.001	
2	ขอคืนงบประมาณ	1	0.500	
3	ขอใช้เงินเหลือจ่าย	6	0.160	
4	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	215	27.584	
5	ได้รับจัดสรรงบประมาณใหม่	4	2.240	
6	ค่าใช้จ่ายประเภทที่ต้องจ่ายตามภารกิจและเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส	52	442.794	สามารถเบิกจ่ายได้หมดภายใน ก.ย.2565

/ประธาน...

ประธาน

๑. เป็นเงินเหลือจ่ายอยู่ระหว่างคืน

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เป็นเงินเหลือจ่ายอยู่ระหว่างคืน	1	1,000	
	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	1	1,000	ไม่ขอใช้เงินเหลือจ่าย แต่ยังไม่ดำเนินการ ส่งคืน

๒. ขอคืนงบประมาณ

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
2	ขอคืนงบประมาณ	1	500,000	
	สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์	1	500,000	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า เพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค บ้านศรี สมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ ยกเลิกโครงการ เนื่องจากราคาวัสดุ - อุปกรณ์ สูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร ได้ดำเนินการ คืนงบประมาณแล้วตามหนังสือ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด่วนที่สุด ที่ กส 0017.2/12255 ลงวันที่ 16 ส.ค. 65

๓. ขอใช้เงินเหลือจ่าย

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
3	ขอใช้เงินเหลือจ่าย	6	160,100	
	1. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	1	100,100	อยู่ระหว่างโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
	2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์	4	40,000	ปรับโอนยอดเงินในระบบแล้ว
	3. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	1	20,000	ส่งหนังสือขอใช้เงินเมื่อ 1 มิ.ย 65

ประธาน

๔. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
4	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	215	27,584,600	
	1. สนง.เขตพื้นที่การศึกษา เขต 1	79	5,408,400	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา อยู่ระหว่างพิจารณาคุณสมบัติของ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา
	2. สนง.เขตพื้นที่การศึกษา เขต 3	73	3,184,700	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจาก คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
	3. สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาฬสินธุ์	54	4,582,900	แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1. ประเภทเครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์ ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ 16 ส.ค.65 อยู่ระหว่างรอระยะเวลากฎหมาย 2. ประเภทครุภัณฑ์ โต๊ะเก้าอี้ประกาศ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e -bidding ประเภท โต๊ะเก้าอี้ วันที่ 16 ส.ค. 65 สามารถเสนอ ราคาได้ในวันที่ 23 ส.ค. 65 3. ประเภทครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ จะดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธี e -bidding ภายในสิ้นเดือน ส.ค.65 4. ประเภทงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ลงนามในสัญญา ในวันที่ 17 ส.ค.65
	4. สำนักงานเทศบาลเมืองภูผามาศ	1	8,850,000	งานเสริมผิวถนนแอลฟัลติกคอนกรีต สายกุดสนรายณ์เชื่อมลำห้วยค้อ หมู่ที่ 2 บ้านบัวขาว ต.บัวขาว อ.ภูผามาศ จ.กาฬสินธุ์ กำหนดงวดงานทั้งหมด 4 งวดงานอยู่ระหว่างดำเนินการ งวดงานที่ 1 (ตอกเสาเข็ม)

/ประธาน...

ประธาน

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	5. สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์	8	5,558,600	
	โครงการขุดลอกลำห้วยโปกน้ำเหมน บ้านน้อยนาเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	699,800	อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารเพื่อบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai
	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นลำห้วยค้อ ดอนบน หมู่ที่ 12 บ้านบัวขาว ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	500,000	อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารเพื่อบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai
	โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองเหล่าพ่อจันทร์ พร้อมวางระบบท่อ ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 2,500 วัตต์ พร้อมถังเก็บน้ำ คสล. บ้านกุดเชื่อมโยง - บ้านสองห้อง หมู่ที่ 5 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	500,000	อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารเพื่อบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai
	โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมวางระบบท่อ ติดตั้งแผงเซลล์ แสงอาทิตย์ 2,500 วัตต์ พร้อมถังเก็บน้ำ คสล. บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	500,000	อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารเพื่อบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก วัดป่าสันติธรรม บ้านค้อพัฒนา หมู่ 12 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	432,800	อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารเพื่อบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 11 ไปหนองเล็งเปื้อน ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	498,000	อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารเพื่อบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai
	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) บ้านนาบอน หมู่ที่ 1 ตำบลนาบอน อำเภอก้ามวง จังหวัดกาฬสินธุ์	1	1,450,000	อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารเพื่อบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai
	ขุดลอกคลองส่งน้ำสาธารณะห้วย สายบาตร บ้านชัยศรี หมู่ที่ 3 ตำบลคำใหญ่ อำเภอยายแม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	1	978,000	อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารเพื่อบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai

ประธาน

๕. ได้รับจัดสรรงบประมาณใหม่

ที่	รายการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
5	ได้รับจัดสรรงบประมาณใหม่	4	2,240,800	
	1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	37,800	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1/กาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 65
	2. โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	3	2,203,000	
	ซ่อมแซมบานระบายฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์	1	693,000	ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 8 ก.ค.65 งานดำเนินการเอง
	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 4L-7R-RMC กม. 0+000 - 0+895 บางส่วน ความยาว 0.895 กม. ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์	1	710,000	ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 12 ก.ค.65 งานดำเนินการเอง
	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L3-RMC กม. 2+000 - 3+000 บางส่วน ความยาว 1.000 กม. ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์	1	800,000	ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 8 ก.ค.65 งานดำเนินการเอง

๖. ค่าใช้จ่ายประเภทที่ต้องจ่ายตามภารกิจและเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส

ที่	รายการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
6	ค่าใช้จ่ายประเภทที่ต้องจ่ายตามภารกิจและเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส	52	442,794,999.56	สามารถเบิกจ่ายได้หมดภายใน ก.ย.2565
	1. โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	32	313,980,859.86	- งานดำเนินการเอง - ค่าแรง - ค่าล่วงเวลา
	2. แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์	3	51,777,579.70	
	3. แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์	8	47,651,146	
	4. สนง.ทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)	9	29,385,414	

/ประธาน...

ประธาน

ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายต่ำ

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุน วิชาการ 6	1	269,000	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุน วิชาการ 6 อยู่ระหว่างส่งมอบ – ตรวจรับงาน
2	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์	1	440,000	ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินวันที่ 9 ส.ค. 65
3	สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์	2	4,003,050	1. ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ระหว่าง เบิกจ่ายเงินที่เหลือคาดว่าจะครบ 100% ภายในสิงหาคม 2565
4	สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์	1	1,000,000	โครงการชุดลอกลำห้วยม่วง บ้านหนองบัวใน ม.2 ม.4 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงนามวันที่ 11 ส.ค.65 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสาร เพื่อเบิกจ่ายเงิน
5	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์	1	1,325,500	ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (ที่ทำการปกครองจังหวัด กาฬสินธุ์) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดวงงาน ทั้งหมด 8 วงงาน ส่งมอบ- ตรวจรับ งานงวดที่ 1-4 แล้ว แต่ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย รอเบิกจ่าย ด้วยกันทั้งหมด 8 วงงาน
6	โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล	1	2,571,000	ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนกาฬสินธุ์ ปัญญานุกูล ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดวงงานทั้งหมด 3 วงงาน มีการส่งมอบงานงวดที่ 1 และ 2 แล้ว แต่มีการแก้ไขเนื่องจากไม่เป็นไป ตามสัญญา

/ประธาน...

ประธาน

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
7	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา เขต 1	79	5,408,400	โครงการจัดซื้อวัสดุทางการศึกษาให้กับโรงเรียน ภายใต้การกำกับดูแลของ สพป.เขต 1 ดังนี้ 1. จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว กำหนดพิจารณาผลฯ ในวันจันทร์ที่ 22 ส.ค. 65 2. จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา โฆษณา ประกาศ ร่างขอบเขตของงานแล้ว อยู่ระหว่าง รอรับฟังคำวิจารณ์ 3 วันทำการ 3. จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ครุภัณฑ์ (Shopping List) อยู่ระหว่างรอประกาศ ร่างขอบเขตของงาน
8	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา เขต 2	5	16,182,700	
	ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน	1	797,400	ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารตรวจรับ จากโรงเรียนภายใต้การกำกับดูแล คาดว่า จะเบิกจ่ายทั้งหมด ภายใน ก.ย.65
	อาคารเรียน สปช.105/29ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง โรงเรียนห้วยเตยวิทยา ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์	1	2,929,000	สัญญาสิ้นสุด วันที่ 7 ก.ย. 65 คาดว่าจะเบิกจ่าย ทันภายใน ก.ย.65
	อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน โรงเรียนห้วยเม็ก ราษฎร์นุกูล ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	1	4,150,300	กำหนดวงงาน จำนวน 8 วงด เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4 วงด สัญญาสิ้นสุด 20 พ.ย.65
	อาคารเรียน สปช.2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน โรงเรียน ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	1	7,920,000	กำหนดวงงาน จำนวน 6 วงด เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2 วงด สัญญาสิ้นสุด 15 ธ.ค. 65
	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	1	386,000	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมด ภายใน ก.ย.65
9	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา เขต 3	73	3,184,700	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา อยู่ระหว่าง รอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

ประธาน

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
10	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาภาพลื่นรุ	54	4,582,900	แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1. ประเภทครุภัณฑ์เครื่องมือวัดมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ประกาศผู้ชนะ เมื่อวันที่ 16 ส.ค.65 อยู่ระหว่าง รอระยะเวลาอุทธรณ์ 2. ประเภท โต๊ะ - เก้าอี้ อยู่ระหว่างประกาศ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding โต๊ะ - เก้าอี้ สามารถเสนอราคาได้ในวันที่ 23 ส.ค. 65 3. ประเภทครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ จะดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ภายในสิ้นเดือน ส.ค.65 4. ประเภทงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารลงนาม ในสัญญา เมื่อวันที่ 17 ส.ค.65
11	เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์	1	1,525,200	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ กำหนดวงงาน จำนวน 5 วงด เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1 วงด ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ส่งมอบงานวงดที่ 2 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 ธ.ค. 65
12	สำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัด กาฬสินธุ์	4	6,538,530	เป็นงานจ้างเหมาบริการ ค่าล่วงเวลา ค่าวัสดุ สำนักงาน (งานดำเนินการเอง)
13	วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์	1	45,501,700	ก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขนละคร 4 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนด วงดงาน จำนวน 15 วงด เบิกจ่ายแล้วจำนวน 10 วงด คาดว่าภายใน ก.ย. 65 จะดำเนินการ เบิกจ่ายจำนวน 2 วงด
14	สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์	1	1,000,000	รั้วคอนกรีต ยาว 261 เมตร ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนด วงดงาน จำนวน 3 วงด เบิกจ่ายแล้วจำนวน 2 วงด คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดภายใน ก.ย.65
15	วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง		6,250,000	อาคารโรงฝึกงานแบบจั่วคู่ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,040 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ สัญญาสิ้นสุดวันที่ 17 ต.ค. 65 เบิกจ่ายแล้วจำนวน 3 วงด สรก.จะเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการให้เสร็จ ภายใน ก.ย. 65 คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดภายใน ก.ย. 65

/ประธาน...

ประธาน

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
16	สำนักงานพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	8,893,800	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ 4 ชั้น 12 ยูนิต สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดวงงาน จำนวน 14 งวด เบิกจ่ายแล้วจำนวน 6 งวด สัญญาสิ้นสุดวันที่ 19 ก.ย. 65 อยู่ระหว่างขอ ขยายระยะเวลาสัญญา
17	วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์	1	32,990,000	อาคารเรียนและปฏิบัติการสาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการโรงแรมวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดวงงาน จำนวน 14 งวดงาน เบิกจ่ายแล้วจำนวน 2 งวดงาน ปัจจุบัน อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 3 สัญญาสิ้นสุด วันที่ 5 ก.ย. 66
18	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์	6	74,030,593.27	
	อาคารสถานีนอนมัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลบึงนาเรียง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	3,067,289.54	เบิกจ่ายงวดที่ 2 สิ้นสุดสัญญาจ้าง 25 ต.ค.65 (มี 5 งวดงาน) จะสามารถเบิกจ่ายได้ ตามสัญญา
	อาคารสถานีนอนมัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขมิ้น ตำบลผาเสวย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด กาฬสินธุ์	1	3,745,947.36	เบิกจ่ายงวดที่ 3 สิ้นสุดสัญญาจ้าง 25 ต.ค.65 (มี 5 งวดงาน) จะสามารถเบิกจ่ายได้ ตามสัญญา
	อาคารสถานีนอนมัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนศิลาเลิง ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดกาฬสินธุ์	1	4,072,000	เบิกจ่ายงวดที่ 2 สิ้นสุดสัญญาจ้าง 26 มิ.ย. 65 (มี 4 งวดงาน) จะสามารถเบิกจ่ายได้ภายใน ก.ย.65
	อาคารสถานบริการสาธารณสุข ชุมชน (ชายแดน) แบบ ก เป็น อาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 72 ตารางเมตร โรงพยาบาลนามน ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	1	1,631,941.86	เบิกจ่ายงวดที่ 2 สิ้นสุดสัญญาจ้าง 27 มิ.ย. 65 (มี 3 งวดงาน) จะสามารถเบิกจ่ายได้ ภายใน ก.ย.65

ประธาน

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก โรงพยาบาลสมเด็จพระตำบลดม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	3,193,414.51	เบิกจ่ายงานงวดที่ 9 ดำเนินการงานงวดที่ 10 จาก งาน 15 งวด (สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 3 ม.ค.66) จะสามารถเบิกจ่ายได้ตามสัญญา
	อาคารสนับสนุนบริการ ประกอบด้วยระบบซักกรีด ระบบงานครัว ระบบพัสดุ ระบบหน่วยจ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตรโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชภูผินารายณ์ ตำบลบัวขาว อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	58,320,000	เบิกจ่ายงวดที่ 2 สิ้นสุดสัญญาจ้าง 25 ต.ค. 65 (มี 5 งวดงาน) จะสามารถเบิกจ่ายได้ ตามสัญญา
19	โรงพยาบาลกาฬสินธุ์	1	10,347,800 (งบปี 65) (ปีงบฯ 64 ได้รับ จัดสรรงบประมาณ จำนวน 14,792,200 บาท มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 14,355,000 คงเหลือ 437,200 บาท)	อาคารพักเจ้าหน้าที่ เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,190 ตารางเมตร โรงพยาบาล กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดวงงานทั้งหมด 18 งวด ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วจำนวน 3 งวดงาน (งบปี 64) สรก.จะดำเนินการกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 65 ไว้เบิกเหลือปี
20	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	3	7,193,000	
	ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ ทักษะเพื่ออนาคต ตำบลสกลชัย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	1	5,700,000	กำหนดวงงานทั้งหมด 5 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว 3 งวดงาน คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.65
	ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนา สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัย	1	693,000	อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารส่งเบิกเงิน คาดว่าจะ เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน ส.ค.65
	ก่อสร้างรั้วมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	800,000	สัญญาสิ้นสุดวันที่ 15 ก.ย.65 คาดว่าจะ ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา และมีเงินเหลือ จ่าย สรก. มีความประสงค์จะให้เงินเหลือจ่ายต่อ อยู่ระหว่าง ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ประธาน

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
21	สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์	8	5,558,600	
	โครงการขุดลอกลำห้วยโภกน้ำเหมีน บ้านน้อยนาเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	1	699,800	อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารเพื่อบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai
	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นลำห้วยค้อ ตอนบน หมู่ที่ 12 บ้านบัวขาว ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	500,000	อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารเพื่อบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai
	โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองเหล่าพ่อจันทร์ พร้อมวางระบบท่อ ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 2,500 วัตต์ พร้อมถังเก็บน้ำ คสล. บ้านกุดเชื่อมโยง - บ้านสองห้อง หมู่ที่ 5 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	500,000	อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารเพื่อบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai
	โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมวางระบบท่อ ติดตั้งแผงเซลล์ แสงอาทิตย์ 2,500 วัตต์ พร้อมถังเก็บน้ำ คสล. บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	500,000	อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารเพื่อบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก วัดป่าสันติธรรม บ้านค้อพัฒนา หมู่ 12 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	432,800	อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารเพื่อบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 11 ไปหนองเล็งเปื้อน ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	498,000	อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารเพื่อบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai
	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) บ้านนาบอน หมู่ที่ 1 ตำบลนาบอน อำเภอดำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	1	1,450,000	อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารเพื่อบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai
	ขุดลอกคลองส่งน้ำสาธารณะ ห้วยสายบาตร บ้านชัยศรี หมู่ที่ 3 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	1	978,000	อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารเพื่อบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai

ประธาน

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
22	โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	3	2,203,000	
	ซ่อมแซมบานระบายฝายส่งน้ำและ บำรุงรักษาที่ 3 อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์	1	693,000	ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 8 ก.ค.65 งานดำเนินการเอง จะดำเนินการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน ก.ย.65
	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 4L-7R-RMC กม. 0+000 - 0+895 บางส่วน ความยาว 0.895 กม. ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์	1	710,000	ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 12 ก.ค.65 งานดำเนินการเอง จะดำเนินการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน ก.ย.65
	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L3-RMC กม. 2+000 - 3+000 บางส่วน ความยาว 1.000 กม. ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์	1	800,000	ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 8 ก.ค.65 งานดำเนินการเอง จะดำเนินการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน ก.ย.65
23	แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์	3	51,777,579.70	งานดำเนินการเอง ค่าแรง ค่าล่วงเวลา
24	แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์	8	47,651,146	งานดำเนินการเอง ค่าแรง ค่าล่วงเวลา
25	ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์	1	10,988,000	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.ห้วยผึ้ง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ระหว่าง ดำเนินการต่อเสาเข็ม คาดว่าจะเบิกจ่าย ไม่ทัน ก.ย.65
26	เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์	1	8,850,000	ก่อสร้างทางเดิน/วิ่ง อ่างเลิงชีว หมู่ที่ 1,12 และ 13 ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 880.00 เมตร และขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 2,644 ตารางเมตร พร้อม ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดวงดงงานทั้งหมด 4 วงด อยู่ระหว่างดำเนินการวงดงงานที่ 1 (ต่อเสาเข็ม)

ประธาน

ขอให้หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำ ทั้ง ๒๖ หน่วยงาน กำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา และเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนด

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ประธาน

การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๒๔๘๐๐ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ให้ส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในกันยายน ๒๕๖๕

๒. ให้ดำเนินการก่องหนี่ผูกพันให้ทัน ภายในกันยายน ๒๕๖๕ เพื่อไม่ให้งบประมาณถูกพับไปตาม พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. สำหรับหน่วยงานที่ก่องหนี่ครบทุกโครงการ/รายการและหรือดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายผลผลิตที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณฯ แล้วมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว ขอให้เร่งโอนเปลี่ยนแปลงรายการ เพื่อไปดำเนินโครงการ/รายการที่มีความจำเป็นดังกล่าว โดยปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเร่งดำเนินการก่องหนี่และเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

นิตยา ไชยสิทธิ์

(นางสาวนิตยา ไชยสิทธิ์)
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

สม

(นายสาโรจน์ เกศนิบุตร)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
