

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ครั้งที่ 3/2566
วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้มาประชุม

1. นายสุกมิตร์ ชินศรี	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ	ประธาน
2. นายชัยพจน์ จรูญพงศ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ	รองประธาน
3. นายวีรชาติ คงอภัย	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	คณะกรรมการ
4. นายวรกร บุ่งทอง	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
5. นางสาวสุภัทรา เขี่ยมสถาน	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
6. นางนันทรัตน์ ตลุนนิษัฏ	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
7. นายทวีลาภ ลาภวงศ์ตระกูล	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
8. นายคณาธิ อ่อนน้อม	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการ
9. นางสาววิวารวรรณ เนตรทิพย์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1	คณะกรรมการ
10. พ.ต.ท.หญิง กุหลาบ ตั้งพิมาย	แทน ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจน้ำ	คณะกรรมการ
11. พ.ต.ท.หญิง รัชฎาพร ราชกิจ	แทน ผู้กำกับการตำรวจท่องเที่ยว	
12. นางสาวสาวิตรี อุไรงาม	แทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สป.	
13. นางสาวนงนุช อนันต์วัฒนชัย	แทน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ	
14. นางศิริลักษณ์ เกิดแก้ว	แทน ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ	
15. นางสาวขวัญมณี สิมสา	แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฯ	
16. นายเฉลิมพล ประดิษฐ์	แทน นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว	
17. นางนิภาพร ทองหล่อ	คลังจังหวัดสมุทรปราการ	คณะกรรมการและ เลขานุการ
18. นางจารุณี ยอดเสนี	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ	ผู้ช่วยเลขานุการ และคณะกรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
2. เรือนจำกลางจังหวัดสมุทรปราการ
3. เทศบาลเมืองพระประแดง

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|---|
| 1. นางสาวนฤมล ตันชัยภูมิ | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ |
| 2. นางสาวอัจฉรา เทือกพุดชา | นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 |
| 3. นายทศพร ธรรมประทีป | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ |
| 4. นายเกียรติพงษ์ วาณิชเจริญ | นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร |
| 5. นางสาวสุธิภาณจน์ ตันสี | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1
(ปทุมธานี) |
| 6. ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง ชญาภา จันทรัตน์ | สว.ผอ.บก.รณ. กองบังคับการตำรวจน้ำ บข.ก. |
| 7. พ.ต.ท.หญิง ลภัส จันทรเรืองแสง | สว.กก.2 บข.ทท.1 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว |
| 8. ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง ธนิดา เอ็มพิทักษ์ | สว.ผอ.4 บก.อก.บข.ทท. กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว |
| 9. นางสาวทิพฤทัย ปานสมุทร | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ |
| 10. นายธนวัฒน์ บุญอ่ำ | เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ |

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

นายศุภมิตร ชินศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะติดตามในส่วนของงบลงทุน ซึ่งจะเน้นย้ำให้ส่วนราชการเบิกจ่ายและใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนงานแผนเงิน และตามมติกรม. กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณปัจจุบัน และลดการกักเงินไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณถัดไป

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบแล้ว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 โดยสาระสำคัญของรายงานการประชุม เป็นการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในช่วงไตรมาสที่ 2 โดยรายงานการประชุมประกอบด้วย รายชื่อผู้เข้าประชุม เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่แจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

1. สรุปผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย เงินงบประมาณจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 24 กุมภาพันธ์ 2566
2. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 24 กุมภาพันธ์ 2566

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2566

ระเบียบวาระที่ 3

3.1 เรื่องเพื่อทราบ

สรุปผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย เงินงบประมาณจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

รายการ	งบประมาณ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			เบิกจ่าย			ลำดับที่ การใช้จ่าย	ลำดับที่ การเบิกจ่าย
		ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย (%)	ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย (%)		
รายจ่ายภาพรวมจังหวัด	4,005.71	3,058.28	76.35	20.11	1,996.90	49.85	-2.15	10	48
รายจ่ายประจำ	2,164.83	1,641.96	75.85	20.07	1,618.47	74.76	19.76	30	34
งบส่วนราชการ	1,155.73	801.90	69.38	13.60	782.47	67.70	12.70		
งบกรมจังหวัด	17.73	9.80	55.27	-0.51	5.74	32.37	-22.63	23	46
งบจัดสรรให้ อปท.	991.37	830.26	83.75	27.97	830.26	83.75	28.75		
รายจ่ายลงทุน	1,840.88	1,416.32	76.94	18.79	378.43	20.56	-18.44	10	75
งบส่วนราชการ	1,553.91	1,193.76	76.82	18.67	375.82	24.19	-14.81		
งบกรมจังหวัด	280.00	222.41	79.43	21.28	2.46	0.88	-38.12	26	65
งบจัดสรรให้ อปท.	6.97	0.15	2.20	-55.95	0.15	2.20	-36.80		
รวมงบส่วนราชการ	2,709.64	1,995.66	73.65	17.41	1,158.29	42.75	-9.25		
รวมงบกรมจังหวัด	297.73	232.21	77.99	21.75	8.20	2.75	-49.25	22	75
รวมงบจัดสรรให้ อปท. (9 แห่ง)	998.34	830.41	83.18	26.94	830.41	83.18	31.18		

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินกันไว้เบิกเหลือปี 2565	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบประมาณเหลือปี	1,118.23	
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	489.69	43.79
งบประมาณคงเหลือ	628.54	56.21

ที่ประชุม

รับทราบ

3.2 หนังสือเวียนที่สำคัญ

1. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 124 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัด การปฏิบัติงานตามสัญญา และการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ

2. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 125 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม เงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)


3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.4/ว 128 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ระยะที่ 5)

4. หนังสือ ...

4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 135 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566 เรื่อง การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดย **ยกเลิก** บัญชีค่าแรงงานฯ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 โดยให้ใช้บัญชีค่าแรงงานฯ ฉบับปรับปรุงใหม่นี้แทน

5. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ 3 ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 159 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)


6. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ 3 ที่ กค (กวจ) 0405.5/ว 189 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 เรื่อง กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม

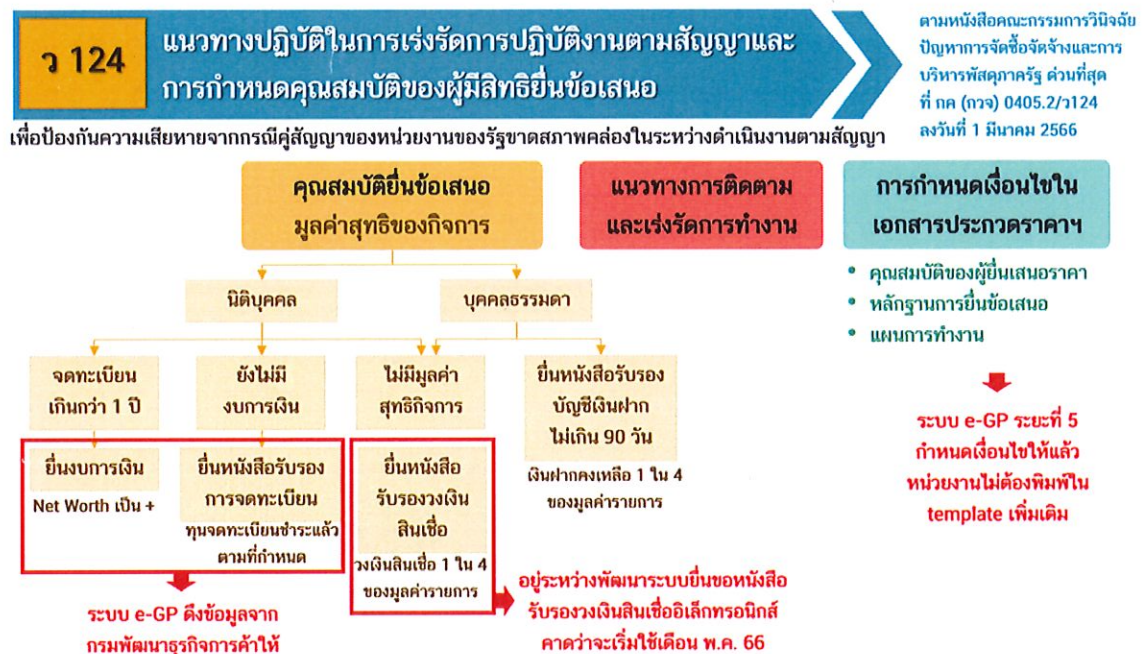

ว 125 การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ 3 ที่ กค 0405.2/ว125 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566

เพื่อลดข้อครหาเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลเสนอราคา e-bidding และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ e-GP



**กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง
และแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม**

ว 189 ลว. 29 มี.ค.66

แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง




- 1 กรณีจัดทำประกาศผลผู้ชนะ ให้จัดทำแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ตามแบบแจ้งในหนังสือฉบับนี้
- 2 ให้คณะกรรมการพิจารณาผล จัดทำแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมกับการส่งแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะผลการพิจารณาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
- 3 แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย ถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบแจ้งเหตุผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องนำเข้าในระบบ e-GP ขั้นตอนที่ 5 จัดทำและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/รายการเอกสารลำดับที่ 5 หัวข้อชี้แจ้งเหตุผลเพิ่มเติม เพื่อแจ้งผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายทราบต่อไป
- 4 นำแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมไปใช้กับวิธีคัดเลือกโดยอนุโลม

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด 1,840.88 ล้านบาท จำนวน 478 โครงการ ในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ที่ยังดำเนินการไม่ได้ตามแผนเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีทั้งหมด 16 หน่วยงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค เรียงลำดับรายหน่วยงาน ดังนี้

1. โครงการชลประทานสมุทรปราการ

โครงการชลประทานสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 84 โครงการ จำนวน 482.72 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 87.94 ล้านบาท โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร 1 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

2. งบประมาณ 87.94 ล้านบาท โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร 2 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

3. งบประมาณ 35.18 ล้านบาท โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองด่าน 2 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

4. งบประมาณ 35.17 ล้านบาท โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบางปลา โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

5. งบประมาณ 35.17 ล้านบาท โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบางปลาไร่ โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

6. งบประมาณ ...

6. งบประมาณ 26.40 ล้านบาท โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำำท่าพรุ โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

ส่วนที่เหลือจำนวน 78 โครงการ เป็นงานซ่อมแซมบำรุงรักษา โดยโครงการชลประทาน เป็นผู้ดำเนินการเอง จะใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (ข) วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท จะสามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนกันยายน 2566 ตามแผนการเบิกจ่าย จะเริ่มเบิกจ่ายได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565

2. แขวงทางหลวงสมุทรปราการ

แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 17 โครงการ จำนวน 384.95 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 1.11 ล้านบาท ค่าควบคุมงานเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพ วัสดุสร้างทาง เบิกจ่ายลักษณะค่าจ้างชั่วคราวและค่าตอบแทน

2. งบประมาณ 51.73 ล้านบาท งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงสมุทรปราการ โดยแขวงทางหลวง สมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง เบิกจ่ายในลักษณะค่าจ้างชั่วคราว, ค่าตอบแทน, ค่าเช่า เครื่องจักร, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าวัสดุ จะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน 2566 ตามแผนการเบิกจ่าย จะเริ่มเบิกจ่ายได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

3. งบประมาณ 14.36 ล้านบาท งานบำรุงปกติสำนักบริหารบำรุงทาง โดยแขวงทางหลวง สมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง เบิกจ่ายในลักษณะค่าวัสดุและค่าจ้างเหมา จะสามารถ เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน 2566 ตามแผนการเบิกจ่าย จะเริ่มเบิกจ่ายได้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

4. งบประมาณ 0.73 ล้านบาท งานบำรุงปกติสำนักบริหารบำรุงทาง โดยแขวงทางหลวง สมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

5. งบประมาณ 2.40 ล้านบาท ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน แขวงทางหลวงสมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง เบิกจ่ายลักษณะค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทน

6. งบประมาณ 0.05 ล้านบาท การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แขวงทางหลวง สมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสำนักสภาขอยกเลิก ประกาศประกวดราคา รอกการแจ้งจากสำนักสภาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

7. งบประมาณ 29.93 ล้านบาท งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3117 ตอน คลองด่าน - บางป่อ จ.สมุทรปราการ งานล่าช้า คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดสุดท้ายได้ในเดือน มิถุนายน 2566

8. งบประมาณ 46.26 ล้านบาท งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ - บางวัว จ.สมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

9. งบประมาณ 29.98 ล้านบาท งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว จ.สมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

10. งบประมาณ 24.96 ล้านบาท งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่าง บริหารสัญญา

11. งบประมาณ ...

11. งบประมาณ 29.97 ล้านบาท งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางพลี - บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

12. งบประมาณ 64.94 ล้านบาท งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว จ.สมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

13. งบประมาณ 23.46 ล้านบาท งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บางตำรุ - คลองด่าน จ.สมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

14. งบประมาณ 9.17 ล้านบาท งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 303 ตอน ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์ ตอน 1 กรุงเทพมหานคร ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

15. งบประมาณ 14.57 ล้านบาท งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางเมือง - บางพลี จ.สมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

16. งบประมาณ 1.39 ล้านบาท งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน จ.สมุทรปราการ ติดปัญหาเรื่องสายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง และสายสัญญาณ ทางแขวงทางหลวงสมุทรปราการได้เข้าประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว คาดว่าจะให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานได้ในเดือนพฤษภาคม 2566

17. งบประมาณ 39.97 ล้านบาท งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสายทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว จ.สมุทรปราการ ติดปัญหาในเรื่องของจุดติดตั้งติดต่อม่อของการทางพิเศษ ซึ่งได้มีการประชุมแล้วช่วงปลายเดือนมีนาคม 2566 คาดว่าผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2566

3. แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ

แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 20 โครงการ จำนวน 124.24 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 1.20 ล้านบาท ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (ก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง) โดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง เบิกจ่ายในลักษณะค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน, ประกันสังคม

2. งบประมาณ 4.74 ล้านบาท งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ โดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง เบิกจ่ายในลักษณะค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน, รายวัน, ประกันสังคม

3. งบประมาณ 1.00 ล้านบาท งานอำนวยความสะดวกปกติ โดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการเอง เบิกจ่ายในลักษณะค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน, ประกันสังคม

4. งบประมาณ 2.25 ล้านบาท งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย สป.5007 แยกทางหลวงชนบท สป.5004 - บ้านเทพราช อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ จะเบิกจ่ายได้ในเดือนเมษายน 2566

5. งบประมาณ 10.56 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการเวนคืนที่ดิน เบิกจ่ายในลักษณะค่าจ้างชั่วคราวรายเดือนและประกันสังคม

6. งบประมาณ 0.01 ล้านบาท ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (ก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง) เบิกจ่ายในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงค่าสำรวจออกแบบ

7. งบประมาณ ...

7. งบประมาณ 0.02 ล้านบาท เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

8. งบประมาณ 0.30 ล้านบาท งานป้องกันและอำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาล แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ เบิกจ่ายในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงตั้งด่านช่วงเทศกาล, ค่าดำเนินการเอง

9. งบประมาณ 7.98 ล้านบาท ถนนสาย สป.5004 แยก ทช.ฉช.3001 - บ.คลองนิมยตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

10. งบประมาณ 5.80 ล้านบาท ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถนนสาย สป.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 34 - บ้านลาดกระบัง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

11. งบประมาณ 0.35 ล้านบาท ค่าครุภัณฑ์ซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

12. งบประมาณ 8.95 ล้านบาท งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย สป.4010 เชื่อมทางหลวง หมายเลข 3243 - เขตบางขุนเทียน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

13. งบประมาณ 6.38 ล้านบาท งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย สป.5004 แยกทางหลวงชนบท ฉช.3001 - บ้านคลองนิมยตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

14. งบประมาณ 14.97 ล้านบาท งานอำนวยความสะดวก สะพานภูมิพล 1, 2 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

15. งบประมาณ 8.58 ล้านบาท งานบำรุงถนนสาย สป.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 34 โรงเรียนคลองหลุมลึก อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

16. งบประมาณ 12.00 ล้านบาท งานบำรุงถนนสาย สป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 3 บ้านบางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

17. งบประมาณ 14.98 ล้านบาท งานบำรุงถนนสาย สป.5003 เชื่อมทางหลวงท้องถิ่น บางเสาธง - บ้านช้างตาย อ.บางเสาธง, อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

18. งบประมาณ 14.98 ล้านบาท งานบำรุงถนนสาย สป.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 34 บ้านลาดกระบัง อ.บางพลี, อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

19. งบประมาณ 1.27 ล้านบาท ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 ลาดกระบัง สมุทรปราการ (สัญญาที่ 2) รอพ้นระยะเวลาอุทธรณ์

20. งบประมาณ 7.26 ล้านบาท ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบท สมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

3. สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 11 โครงการ จำนวน 12.42 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 0.40 ล้านบาท ค่าปรับปรุงบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

2. งบประมาณ ...

2. งบประมาณ 0.40 ล้านบาท ค่าปรับปรุงบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

3. งบประมาณ 1.00 ล้านบาท ค่าปรับปรุงห้องประชุมอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

4. งบประมาณ 1.00 ล้านบาท ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อม ริ้ว และประตูทางเข้า - ออก ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

5. งบประมาณ 5.00 ล้านบาท ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมอาคารศาลาประชาคม จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

6. งบประมาณ 0.50 ล้านบาท ค่าปรับปรุงระบบท่อประปาและระบบจ่ายน้ำภายในอาคาร ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

7. งบประมาณ 0.48 ล้านบาท ค่าปรับปรุงระบบท่อประปาและระบบส่งจ่ายน้ำภายในอาคาร ศูนย์ส่งเสริมและบริการ (กลุ่มเบญจบุรพาสุวรรณภูมิ) จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

8. งบประมาณ 2.69 ล้านบาท ค่าก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลลำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โครงการก่อสร้างปี 2564 ขอโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณปี 2566 (ค้างจ่าย 7 งวดงาน) ผู้รับจ้างได้รับความช่วยเหลือ ยกเว้นค่าปรับเป็นร้อยละ 0 จำนวน 461 วัน (21 มกราคม 2565 - 27 เมษายน 2566 คาดว่า ผู้รับจ้างจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2566

9. งบประมาณ 0.35 ล้านบาท โครงการบำรุงรักษาทางน้ำคลองท่าเกวียน (บริเวณจากวัดกุ่มไปหมู่ที่ 12) หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 12 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จบรองนายกรัฐมนตรี

10. งบประมาณ 0.30 ล้านบาท โครงการบำรุงรักษาทางน้ำคลองท่าเกวียน (แยกคลองขวางถึงถนนคู่สร้าง) หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จบรองนายกรัฐมนตรี

11. งบประมาณ 0.30 ล้านบาท โครงการบำรุงรักษาทางน้ำคลองทับจีน หมู่ที่ 6 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จบรองนายกรัฐมนตรี

4. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 5 โครงการ จำนวน 19.94 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 19.53 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดแหลม ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 125 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณผูกพัน 2 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานเพื่อแก้ไขแบบบูรณาการ

2. งบประมาณ 0.08 ล้านบาท ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน ค่าเบี้ยประชุม จะดำเนินการประชุมคณะกรรมการในเดือนมีนาคม 2566

3. งบประมาณ 0.04 ล้านบาท การสำรวจจริงวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นค่าเบี้ยประชุม จะดำเนินการประชุมคณะทำงานในเดือนพฤษภาคม 2566

4. งบประมาณ 0.23 ล้านบาท การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการผังเมืองในพื้นที่ระดับจังหวัด เบิกจ่ายรายเดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2566

5. งบประมาณ 0.06 ล้านบาท การวางแผนจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน เบิกจ่ายรายเดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2566

5. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2 โครงการ จำนวน 30.00 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 29.00 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยวิธีการถ่ายภาพชนิด X-Ray Real time ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมคณะกรรมการ TOR ครั้งที่ 5 (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ใหม่และมีการจัดซื้อครั้งแรก) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เข้าร่วมหารือแนวทางการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประกาศร่าง ระยะเวลาประกาศ 12 วัน ระยะเวลาส่งมอบ 240 วัน ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปีทั้งจำนวน

2. งบประมาณ 1.00 ล้านบาท โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะก่อกองไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายหมดแล้ว

6. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 7 โครงการ จำนวน 38.26 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 0.09 ล้านบาท ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เบิกจ่ายหมดแล้ว

2. งบประมาณ 0.03 ล้านบาท เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายหมดแล้ว

3. งบประมาณ 0.06 ล้านบาท ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายหมดแล้ว

4. งบประมาณ 0.02 ล้านบาท ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายหมดแล้ว

5. งบประมาณ 35.10 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแพรกษา โรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีทั้งหมด 9 งดงาน จะเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ทั้งสิ้น 6 งดงาน รวมเป็นเงิน 19.92 ล้านบาท ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปี 3 งดงาน รวมเป็นเงิน 15.18 ล้านบาท เบิกงวดแรกแล้วจำนวน 2.61 ล้านบาท

6. งบประมาณ 2.47 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาขลา องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางใหม่

7. งบประมาณ 0.50 ล้านบาท พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ โดยจัดซื้อธรรมา จำนวน 25 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จะเบิกจ่ายได้ในเดือนเมษายน 2566

7. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 6 โครงการ จำนวน 7.04 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 0.06 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

2. งบประมาณ 0.02 ล้านบาท โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

3. งบประมาณ 3.84 ล้านบาท โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก้ไขแบบรูปรายการและราคากลาง และได้ส่งหนังสือแจ้งไปที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขณะนี้รอการตอบกลับจากกระทรวงศึกษาธิการ

4. งบประมาณ 0.54 ล้านบาท โครงการปรับปรุงห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก้ไขแบบรูปรายการและราคากลาง และได้ส่งหนังสือแจ้งไปที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขณะนี้รอการตอบกลับจากกระทรวงศึกษาธิการ

5. งบประมาณ 1.03 ล้านบาท โครงการปรับปรุงห้องประชุมยวรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก้ไขแบบรูปรายการและราคากลาง และได้ส่งหนังสือแจ้งไปที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขณะนี้รอการตอบกลับจากกระทรวงศึกษาธิการ

6. งบประมาณ 1.55 ล้านบาท โครงการปรับปรุงระบบและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากอุปกรณ์บางรายการไปเข้ากับโครงการปรับปรุงห้องประชุม จึงต้องให้ทางไฟฟ้าปรับลดราคาและจำนวนอุปกรณ์ใหม่

8. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 8 โครงการ จำนวน 2.54 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 0.02 ล้านบาท จัดซื้อชุดอุปกรณ์เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายหมดแล้ว

2. งบประมาณ 0.02 ล้านบาท จัดซื้อแผ่นปูพื้นกันกระแทก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายหมดแล้ว

3. งบประมาณ 0.02 ล้านบาท จัดซื้อพาราซูต ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายหมดแล้ว

4. งบประมาณ 0.02 ล้านบาท จัดซื้อแม่แรงตะเฒ่ ขนาด 3 ตัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายหมดแล้ว

5. งบประมาณ 0.007 ล้านบาท จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายหมดแล้ว

6. งบประมาณ 2.43 ล้านบาท ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หน่วยงานได้ทำการประกาศผู้ชนะแล้ว แต่ผู้รับจ้างเข้ามาทำสัญญา ทางหน่วยจะทำการประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะเรียกผู้รับจ้างที่เสนอราคาลำดับถัดไปเข้าทำสัญญาแทน และส่งแบบแจ้งผู้ทำงานสำหรับผู้รับจ้างรายแรกที่ไม่เข้าทำสัญญาตามมาตรา 109 (1)

7. งบประมาณ 0.02 ล้านบาท จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายหมดแล้ว

8. งบประมาณ 0.006 ล้านบาท จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายหมดแล้ว

9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 64 โครงการ จำนวน 45.79 ล้านบาท ได้แก่

งานจ้างก่อสร้าง

- งบประมาณ 13.73 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นงบผูกพันข้ามปี เบิกจ่ายไปได้ 5 งวดงาน ส่วนที่เหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย 6 งวดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกรกฎาคม 2566

งานซ่อมแซมปรับปรุง

- จำนวน 49 โครงการ งบประมาณรวม 28.64 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข) วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 37 โครงการ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวน 12 โครงการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

แจ้งขอคืนงบประมาณ

- จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 0.45 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดกลาง (ธรรมวิธานราษฎร์วิทยา) ตำบลบางพิ่ง อำเภอยะบะระ จังหวัดสมุทรปราการ ขอคืนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2566 เนื่องจากอาคารที่จะทำการปรับปรุงได้ทำการรื้อถอนไปแล้ว เกิดการทรุดตัวเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อนักเรียน

จัดซื้อครุภัณฑ์

- จำนวน 11 โครงการ งบประมาณรวม 1.90 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน, โต๊ะเก้าอี้นักเรียน รองลงนามในสัญญา
- จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 1.07 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC20 เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลได้ทำการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะ และราคาครุภัณฑ์บางรายการ ส่งผลกระทบต้องงบประมาณที่ สพฐ.จัดสรร ขณะนี้ อยู่ระหว่างรอ สพฐ. ให้ความชัดเจน

10. กองบังคับการตำรวจน้ำ บข.ก.

กองบังคับการตำรวจน้ำ บข.ก. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 9 โครงการ จำนวน 121.04 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 0.54 ล้านบาท โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บก.ร.น. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2. งบประมาณ 79.16 ล้านบาท โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์ บก.ร.น. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
3. งบประมาณ 7.45 ล้านบาท โครงการซ่อมย่อยเรือตรวจการณ์ บก.ร.น. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
4. งบประมาณ 3.26 ล้านบาท โครงการจัดหาเรือท้องแบนพร้อมอุปกรณ์ และเครื่องยนต์ติดท้ายขนาด 40 แรงม้า ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ บก.ร.น. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
5. งบประมาณ 24.00 ล้านบาท โครงการจัดหาอุปกรณ์ค้นหาบอทดำและสร้างแผนที่ใต้น้ำสำหรับวัดอุทยาน กก.2 บก.ร.น. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รอพิจารณาเวลาอุทธรณ์ จะครบกำหนดอุทธรณ์วันที่ 7 เมษายน 2566
6. งบประมาณ 3.75 ล้านบาท โครงการจ้างเดินระบบไฟฟ้าแรงสูง สำหรับอุเรือ กก.1 บก.ร.น. ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จะลงนามในสัญญาวันที่ 5 เมษายน 2566
7. งบประมาณ 1.50 ล้านบาท โครงการจ้างปรับปรุงท่าเทียบเรือ ส.ร.น.5 กก.4 บก.ร.น. ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี 3 งาน ผู้รับเหมาแจ้งส่งมอบงานพร้อมกัน วันที่ 10 พฤษภาคม 2566
8. งบประมาณ 1.36 ล้านบาท โครงการจ้างปรับปรุงอาคารเรือนแถวชั้นประทวน กก.7 บก.ร.น. ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มี 3 งาน ผู้รับเหมาแจ้งส่งมอบงานพร้อมกัน วันที่ 22 มีนาคม 2566
9. งบประมาณ 0.10 ล้านบาท ก่อสร้างพื้นที่จัดเก็บขยะ บก.ร.น. บข.ก. อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดโครงการ

11. กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 4 โครงการ จำนวน 2.79 ล้านบาท ได้แก่

1. งบประมาณ 0.25 ล้านบาท ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู บข.ทท. คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนพฤษภาคม 2566

2. งบประมาณ 1.75 ล้านบาท ค่าปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นอาคารที่ทำการงานสืบสวน กก.2 บก.ทท.1 อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง และแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง

3. งบประมาณ 0.70 ล้านบาท ค่าปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการจักรยานสายตรวจ ตำรวจท่องเที่ยว และที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจในสังกัด ของ ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง และแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง

4. งบประมาณ 0.10 ล้านบาท ปรับปรุงจุดรั่วซึมท่อน้ำดี, ท่อน้ำทิ้ง บก.อก. บข.ทท. แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดแก้ไขจากงบลงทุนเป็นงบดำเนินงาน

12. โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ (งบกรมจังหวัด)

โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 17 โครงการ จำนวน 280.00 ล้านบาท แบ่งการดำเนินงานเป็นของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

- งบประมาณ 45.03 ล้านบาท โครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 470.00 เมตร จะลงนามสัญญาในวันที่ 11 เมษายน 2566 ระยะเวลาสัญญา 270 วัน

แขวงทางหลวงสมุทรปราการ

1. งบประมาณ 30.00 ล้านบาท โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอน บางปู - บางพลี ระหว่าง กม.5+220 - 8+600 (ด้านซ้ายทาง) ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 3.380 กิโลเมตร ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

2. งบประมาณ 26.00 ล้านบาท โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางพลี - บางบ่อ (ตอน 2) ระหว่าง กม.19+200 - 22+900 (ด้านซ้ายทาง) อำเภอบางพลีและอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 3.700 กิโลเมตร ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ

1. งบประมาณ 9.20 ล้านบาท โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดขุนสมุทรจีน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

2. งบประมาณ 5.20 ล้านบาท โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านล่าง - คลองกระอ่อม (ช่วงที่ 2) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 0.630 กิโลเมตร ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

3. งบประมาณ 7.72 ล้านบาท โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร แยกทางหลวงชนบทหมายเลข สป.1011 - บ้านลาดหวาย อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เสาไฟฟ้า ความสูง 9.00 เมตร จำนวน 45 ต้น และเสาไฟฟ้า ความสูง 6.00 เมตร จำนวน 2 ต้น ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

4. งบประมาณ 5.50 ล้านบาท โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างและงานอำนวยความสะดวก สาย สป.4010 เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3243 - เขตบางขุนเทียน (กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 4+125) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

5. งบประมาณ 5.00 ล้านบาท โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณแยกวัดบางหญ้าแพรก และทางขนาน ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

6. งบประมาณ 13.40 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองลัดนาเกลือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

7. งบประมาณ 14.25 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแยกทางหลวงชนบท สาย สป.1006 - สถานีการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 0.980 กิโลเมตร ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

8. งบประมาณ 24.00 ล้านบาท โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ (Repair of Culvert) โดยใช้รถดูดโคลนเลน ระบบฉีดน้ำแรงดันสูง อำเภอบางเสาธง อำเภอบางพลี และอำเภอเมืองสมุทรปราการ ระยะทางรวม 31.618 กิโลเมตร ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

9. งบประมาณ 20.70 ล้านบาท โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง สาย สป.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 34 (กม.ที่ 18+165) - บ้านลาดกระบัง อำเภอบางพลีและอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 13.530 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)

1. งบประมาณ 9.00 ล้านบาท โครงการปรับปรุงผิวทางจราจร และติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ถนนสาย สป.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 3 (กม.ที่ 52+600) - เคหะบางพลี อำเภอบางเสาธงและอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 9.030 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

2. งบประมาณ 9.00 ล้านบาท โครงการปรับปรุงผิวทางจราจร และติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ถนนสาย สป.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 34 (กม.ที่ 18+165) - บ้านลาดกระบัง อำเภอบางเสาธงและอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 13.130 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

3. งบประมาณ 9.00 ล้านบาท โครงการปรับปรุงผิวทางจราจร และติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ถนนสาย สป.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 34 (กม.ที่ 26+150) - ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 อำเภอบางเสาธงและอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 9.100 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

4. งบประมาณ 9.00 ล้านบาท โครงการปรับปรุงผิวทางจราจร และติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ถนนสาย สป.5004 แยกทางหลวงชนบท ฉช.3001 (กม.ที่ 11+485) - บ้านคลองนิมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 10.010 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

5. งบประมาณ 38.00 ล้านบาท โครงการปรับปรุงผิวทางและแก้ไขจุดเสี่ยงในย่านชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 (กม.ที่ 14+800) - บ้านลาดกระบัง (ตอนสมุทรปราการ) ตำบลเป็ริงและตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 8.500 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

13. เทศบาลเมืองบางแก้ว

เทศบาลเมืองบางแก้ว ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 1 โครงการ ได้แก่

งบประมาณ 4.92 ล้านบาท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขยายพัฒนาชุมชน 5 ล็อกที่ 1 หมู่ที่ 16 กว้าง 6 เมตร ยาว 281 เมตร หน้า 0.15 เมตร ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่าจะลงนามได้ในเดือนเมษายน 2566

มติที่ประชุม

รับทราบและดำเนินการ

เลิกประชุม 11.40 น.



(นายชนวัฒน์ บุญอ่ำ)

เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางจารุณี ยอดเสนี)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

