



**รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์
ประเด็น "การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหาน้ำท่วม
ในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก"**

ของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
รอบที่ ๑-๒/๒๕๖๑

คำนำ

ปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาสำคัญของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสร้างความเดือดร้อนอย่างใหญ่หลวงต่อประชาชน ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังและผู้ไร้รถใช้ถนน จึงจำเป็นที่กรุงเทพมหานครจะต้องเร่งดำเนินการเพื่อป้องกันและลดปัญหาน้ำท่วม โดยเฉพาะบริเวณถนนสายหลัก จุดเฝ้าระวัง และจุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก ซึ่งต้องมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขต

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้กำหนดประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก” บรรจุในแผนการตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การตรวจราชการจะมุ่งเน้นการวัดผลสัมฤทธิ์ของการนำนโยบายไปปฏิบัติ โดยจะมีการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการตรวจที่เน้นผลสัมฤทธิ์มากขึ้น มีจุดเน้นในการตรวจ เพื่อติดตามสถานการณ์ ประเด็นที่เป็นปัจจัยของปัญหา แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน การบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และให้ความสำคัญกับผลการดำเนินงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า ซึ่งแบ่งการตรวจราชการเป็น ๒ รอบ คือ รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และรอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้ตรวจราชการ รอบที่ ๑ และจัดทำรายงานผลการตรวจราชการเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วตามบันทึก ที่ กท ๐๔๐๐.๑/๑๗๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

บัดนี้ คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้ตรวจราชการแบบบูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก” รอบที่ ๒ พร้อมจัดทำรายงานการตรวจราชการเรียบร้อยแล้ว โดยรายงานจะประกอบด้วย ๓ บท คือ บทที่ ๑ บทนำ บทที่ ๒ รายงานผลการตรวจราชการในภาพรวม และบทที่ ๓ รายงานการตรวจราชการจำแนกเขตตรวจราชการ ๑ – ๖ ซึ่งในบทที่ ๒ นั้น คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำเขตตรวจราชการ ๑ – ๖ ได้สรุปผลการตรวจราชการ และได้ให้ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจภายในเขตตรวจราชการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ในการนำไปเป็นข้อมูลสนับสนุนและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

สารบัญ

		หน้า
บทที่ ๑	บทนำ	๑
บทที่ ๒	รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก” รอบที่ ๒ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑) ในภาพรวม	
	รายงานตามประเด็นการตรวจราชการ	
	๑. จำนวนพื้นที่น้ำท่วม	๒
	๒. ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	
	๒.๑ ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ และระบบการระบายน้ำ	๒
	๒.๒ การกำหนดจุดติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ และจัดทำแผนสำรองกรณีฉุกเฉิน	๖
	๒.๓ ความพร้อมด้านอื่น ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	๖
	๓. ความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อน	๘
	สรุปผลการดำเนินงานของสำนักการระบายน้ำและกลุ่มเขต	
	๑. สำนักการระบายน้ำ	๑๐
	๒. กลุ่มเขต	
	๒.๑ กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ	๑๑
	๒.๒ กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก	๑๓
	๒.๓ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้	๑๕
	๒.๔ กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง	๑๗
	๒.๕ กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ	๒๐
	๒.๖ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้	๒๒
	ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการในภาพรวม	๒๔
บทที่ ๓	รายงานการตรวจราชการของเขตตรวจราชการ ๑ – ๖	
	ส่วนที่ ๑ เขตตรวจราชการ ๑	
	- สำนักการระบายน้ำ	๒๖
	- กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ	๒๙
	ส่วนที่ ๒ เขตตรวจราชการ ๒ (กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก)	๓๕
	ส่วนที่ ๓ เขตตรวจราชการ ๓ (กลุ่มเขตกรุงเทพใต้)	๔๐
	ส่วนที่ ๔ เขตตรวจราชการ ๔ (กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง)	๕๒
	ส่วนที่ ๕ เขตตรวจราชการ ๕ (กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ)	๖๕
	ส่วนที่ ๖ เขตตรวจราชการ ๖ (กลุ่มเขตกรุงเทพใต้)	๗๐



บทนำ

ตามที่คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในประเด็น “การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก” รอบที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้วนั้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานมีการทบทวนสถานการณ์ ปัญหา ในการปฏิบัติที่ผ่านมา วางแนวทางในการแก้ไขหรือพัฒนา ให้ดีขึ้น และเตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่จะดำเนินการต่อไปในช่วงระหว่าง เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีหน่วยรับการตรวจ จำนวน ๕๑ หน่วยงาน (สำนักงานระบายน้ำ และ ๕๐ สำนักงานเขต) ผลปรากฏว่าจากการตรวจราชการ รอบที่ ๑ หน่วยงานมีความพร้อมในการรับมือปัญหาน้ำท่วม ของกรุงเทพมหานคร โดยสามารถจำแนกตามประเด็นการตรวจราชการ ได้ ๕ ประเด็น คือ

๑. มีการประเมินผลการดำเนินการ การตรวจสอบข้อมูลสถานการณ์ และข้อมูลการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๔๙.๙๑

๒. ความสมบูรณ์ของวัสดุ/อุปกรณ์ ร้อยละ ๙๒.๒๑

๓. ความพร้อมของท่อระบายน้ำ ร้อยละ ๘๘.๓๙

๔. ความพร้อมของคูคลอง/ลำรางสาธารณะ ร้อยละ ๘๗.๖๕

๕. มีการบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ร้อยละ ๗๕.๘๗

ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ ในประเด็น “การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วม ซ้ำซาก” รอบที่ ๒ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้หน่วยงานได้ปฏิบัติการสร้างความพร้อมใน การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน และความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์พายุดูรอันที่จะ เกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งการตรวจราชการครั้งนี้เป็นการตรวจติดตามความก้าวหน้าตาม ข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจราชการที่ให้ไว้ในการตรวจครั้งที่ ๑ และตรวจการดำเนินการของหน่วยงานเพื่อให้ เกิดความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์พายุดูรอัน

๑. ตรวจติดตามความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจราชการ ที่ให้ไว้ในการตรวจครั้งที่ ๑ เพื่อให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจราชการ ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร

๒. ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

เพื่อให้หน่วยงานรายงานความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ประกอบด้วย ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ ความพร้อมของหน่วย BEST (Bangkok Emergency Service Team) ความพร้อมของแผนปฏิบัติการ การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การประชุมเตรียมความพร้อม การติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ในจุด/บริเวณเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก และความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้า

๓. ความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์พายุดูรอัน

เพื่อให้หน่วยงานรายงานความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์พายุดูรอัน ประกอบด้วย การกำหนดแผนและมาตรการลดผลกระทบจากพายุดูรอันรวมทั้งการสร้างความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุ การสำรวจสิ่งก่อสร้าง/ต้นไม้ที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุดูรอัน การตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง และต้นไม้ในพื้นที่ และแผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายจากพายุ

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์
“การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก”
รอบที่ ๒ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑) ในภาพรวม


บัดนี้ การตรวจราชการในรอบที่ ๒ ได้เสร็จสิ้นและได้รับข้อมูลจากหน่วยรับการตรวจครบถ้วนแล้ว คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จึงขอรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น “การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก” รายละเอียดดังนี้

รายงานตามประเด็นการตรวจราชการ

๑. จำนวนพื้นที่น้ำท่วม

จากข้อมูลการตรวจราชการฯ รอบที่ ๑ กรุงเทพมหานครมีพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด จำนวน ๔๗๘ จุด โดยจำแนกเป็นจุดเฝ้าระวัง จำนวน ๑๗๐ จุด จุดเร่งระบายน้ำ จำนวน ๘๘ จุด และจุดอ่อนน้ำท่วม จำนวน ๒๒๐ จุด รายละเอียดดังนี้

แผนภูมิ ๑ แสดงข้อมูลจำนวนจุดเฝ้าระวัง จุดเร่งระบายน้ำ และจุดอ่อนน้ำท่วม ของสำนักการระบายน้ำและกลุ่มเขต

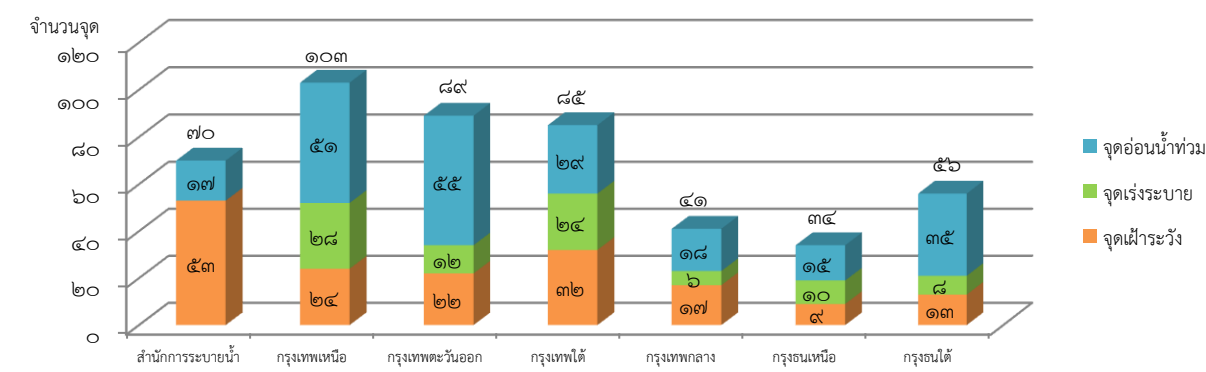

หมายเหตุ: คำจำกัดความที่สำนักการระบายน้ำกำหนดเรื่องพื้นที่น้ำท่วม

๑. จุดอ่อนน้ำท่วม (ปัจจุบัน สน. ใช้คำว่า “จุดเสี่ยงน้ำท่วม” แทน) หมายถึง พื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมกรณีฝนตกปานกลางถึงหนัก (มีฝนตกไม่เกิน ๖๐ มม./ชม. แล้วเกิดน้ำท่วมซ้ำ)
๒. จุดเร่งระบาย หมายถึง จุดที่มีน้ำท่วมซ้ำและอยู่ระหว่างการระบายน้ำออกจากพื้นที่
๓. จุดเฝ้าระวัง หมายถึง พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดน้ำท่วม กรณีฝนตกหนักถึงหนักมาก หรือบริเวณที่มีปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับระบบระบายน้ำ เช่น งานก่อสร้าง

๒. ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

๒.๑ ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ และระบบการระบายน้ำ


๑) ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์

จากการตรวจราชการ รอบที่ ๑ กรุงเทพมหานครมีอาคารบังคับน้ำ จำนวน ๙๖ แห่ง เครื่องจักรกล จำนวน ๒๓๖ เครื่อง และเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๓,๐๒๗ เครื่อง ซึ่งจากการตรวจราชการ รอบที่ ๒ หน่วยงานมีความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อม รายละเอียดดังนี้

๑.๑) อาคารบังคับน้ำ กรุงเทพมหานครมีอาคารบังคับน้ำ จำนวน ๙๖ แห่ง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ จากการตรวจราชการในรอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ อาคารบังคับน้ำมีความพร้อมในการใช้งาน ๑๐๐%

๑.๒) เครื่องสูบน้ำ กรุงเทพมหานครมีเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๓,๐๒๗ เครื่อง ในการตรวจราชการรอบที่ ๑ มีความพร้อม จำนวน ๒,๘๕๕ เครื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๒ ต้องบำรุงรักษา จำนวน ๑๗๒ เครื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๘ โดยในการตรวจราชการรอบที่ ๒ หน่วยงานมีความพร้อมในภาพรวมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๙๙.๔๑ รายละเอียดดังนี้

แผนภูมิ ๒ แสดงข้อมูลความพร้อมของเครื่องสูบน้ำของสำนักการระบายน้ำและกลุ่มเขต

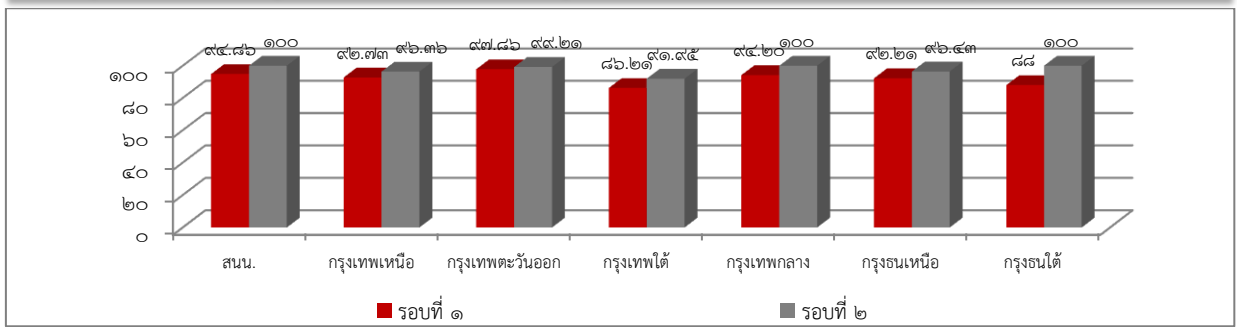


ลำดับที่	หน่วยงาน/ กลุ่มเขต	ความพร้อมในการระบายน้ำของเครื่องสูบน้ำ จากการตรวจราชการ รอบที่ ๑			การตรวจราชการ รอบที่ ๒	
		จำนวน (เครื่อง)	มีความพร้อม (เครื่อง)	มีความพร้อม (ร้อยละ)	มีความพร้อม (เครื่อง)	มีความพร้อม (ร้อยละ)
๑	สำนักการระบายน้ำ	๒,๓๐๗	๒,๑๙๘	๙๕.๘๖	๒,๓๐๗	๑๐๐
๒	กลุ่มเขต กรุงเทพมหานคร	๑๖๕	๑๕๓	๙๒.๗๓	๑๕๙	๙๖.๓๖
๓	กรุงเทพมหานครนอก	๑๘๗	๑๘๓	๙๗.๘๖	๑๘๖	๙๙.๒๑
๔	กรุงเทพมหานครใต้	๘๗	๗๕	๘๖.๒๑	๘๐	๙๑.๕๕
๕	กรุงเทพมหานครกลาง	๖๙	๖๕	๙๕.๘๖	๖๙	๑๐๐
๖	กรุงเทพมหานครเหนือ	๗๗	๗๑	๙๒.๗๓	๗๔	๙๖.๓๖
๗	กรุงเทพมหานครใต้	๑๒๕	๑๑๐	๘๘	๑๒๔	๑๐๐
รวม/เฉลี่ย		๓,๐๒๗	๒,๘๕๕	๙๕.๓๒	๓,๐๐๙	๙๙.๕๑

หมายเหตุ : กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครใต้ (สนข.หนองแขม) มีเครื่องสูบน้ำอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เครื่อง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

๑.๓) เครื่องจักรกล กรุงเทพมหานครมีเครื่องจักรกล จำนวน ๒๓๖ เครื่อง จากการตรวจราชการรอบที่ ๑ มีความพร้อม จำนวน ๒๒๖ เครื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๖ ต้องบำรุงรักษา จำนวน ๑๐ เครื่อง คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๔ โดยในการตรวจราชการรอบที่ ๒ ทุกหน่วยงานมีความพร้อมของเครื่องจักรกล ร้อยละ ๑๐๐ รายละเอียดดังนี้

แผนภูมิ ๓ แสดงข้อมูลความพร้อมของเครื่องจักรกลของสำนักการระบายน้ำและกลุ่มเขต

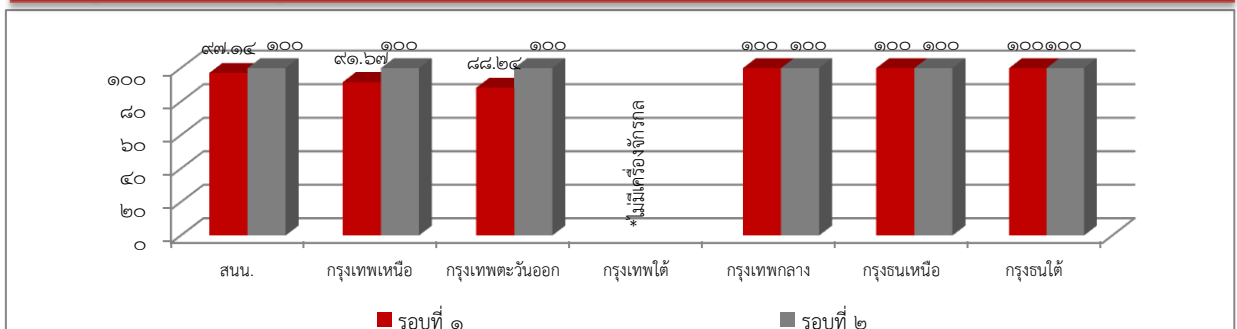


ลำดับที่	หน่วยงาน/ กลุ่มเขต	ความพร้อมในการระบายน้ำของเครื่องจักรกล จากการตรวจราชการ รอบที่ ๑			การตรวจราชการ รอบที่ ๒	
		จำนวน (เครื่อง)	มีความพร้อม (เครื่อง)	มีความพร้อม (ร้อยละ)	มีความพร้อม (เครื่อง)	มีความพร้อม (ร้อยละ)
๑	สำนักการระบายน้ำ	๑๓๕	๑๓๐	๙๗.๑๔	๑๓๕	๑๐๐
๒	กลุ่มเขต กรุงเทพมหานคร	๑๒	๑๑	๙๑.๖๗	๑๒	๑๐๐
๓	กรุงเทพมหานครนอก	๓๔	๓๐	๘๘.๒๔	๓๔	๑๐๐
๔	กรุงเทพมหานครใต้	-	-	-	-	-
๕	กรุงเทพมหานครกลาง	๓	๓	๑๐๐	๓	๑๐๐
๖	กรุงเทพมหานครเหนือ	๘	๘	๑๐๐	๘	๑๐๐
๗	กรุงเทพมหานครใต้	๔	๔	๑๐๐	๔	๑๐๐
รวม/เฉลี่ย		๒๓๖	๒๒๖	๙๕.๗๖	๒๓๖	๑๐๐

๒) ความพร้อมของท่อระบายน้ำ

จากการตรวจราชการรอบที่ ๑ กรุงเทพมหานครมีถนน/ตรอก/ซอย ที่มีท่อระบายน้ำ อยู่ในความรับผิดชอบรวมทั้งสิ้นจำนวน ๖,๕๓๙ ถนน/ตรอก/ซอย รวมความยาว ๖,๒๑๕,๖๙๙.๓๘ เมตร มีท่อระบายน้ำที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ความยาว ๕,๓๗๒,๗๔๔.๓๘ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๔ และท่อระบายน้ำที่ต้องได้รับการบำรุงรักษา ความยาว ๘๔๒,๙๒๕ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๖ ในการตรวจราชการ รอบที่ ๒ มีความพร้อมในภาพรวมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๙๔.๑๗ รายละเอียดดังนี้

แผนภูมิ ๔ แสดงข้อมูลความพร้อมของท่อระบายน้ำของสำนักการระบายน้ำและกลุ่มเขต

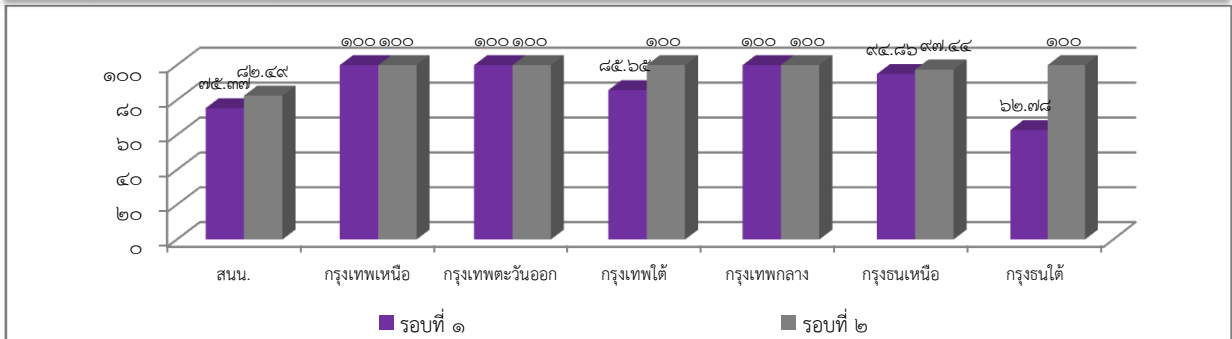

ลำดับที่	หน่วยงาน/ กลุ่มเขต	การตรวจราชการ รอบที่ ๑ ความพร้อมในการระบายน้ำของท่อระบายน้ำ				การตรวจราชการ รอบที่ ๒	
		จำนวนถนน/ ตรอก/ซอย	ความยาว (เมตร)	มีความพร้อม (เมตร)	มีความพร้อม (ร้อยละ)	มีความพร้อม (เมตร)	มีความพร้อม (ร้อยละ)
๑	สำนักการระบายน้ำ	๕๖๓	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๗,๓๕๑	๗๕.๓๗	๑,๖๔๙,๘๕๑	๘๒.๔๙
๒	กลุ่มเขต กรุงเทพเหนือ	๑,๐๕๒	๑,๐๑๔,๗๙๗	๑,๐๑๔,๗๙๗	๑๐๐	๑,๐๑๔,๗๙๗	๑๐๐
๓	กรุงเทพตะวันออก	๘๙๑	๙๖๕,๒๑๘.๓๘	๙๖๕,๒๑๘.๓๘	๑๐๐	๙๖๕,๒๑๘.๓๘	๑๐๐
๔	กรุงเทพใต้	๑,๑๖๕	๕๘๔,๘๖๙	๕๐๐,๙๒๓	๘๕.๖๕	๕๘๔,๘๖๙	๑๐๐
๕	กรุงเทพกลาง	๙๗๘	๕๒๘,๐๘๑	๕๒๘,๐๘๑	๑๐๐	๕๒๘,๐๘๑	๑๐๐
๖	กรุงเทพเหนือ	๘๖๐	๔๗๒,๔๘๒	๔๔๘,๑๙๙	๙๔.๘๖	๔๖๐,๓๘๖	๙๗.๔๔
๗	กรุงเทพใต้	๑,๐๓๐	๖๕๐,๒๕๒	๔๐๘,๒๐๕	๖๒.๗๘	๖๕๐,๒๕๒	๑๐๐
รวม/เฉลี่ย		๖,๕๓๙	๖,๒๑๕,๖๙๙.๓๘	๕,๓๗๒,๗๔๔.๓๘	๘๖.๔๔	๕,๘๕๓,๕๕๔	๙๔.๑๗

และจากการตรวจราชการในรอบที่ ๑ ยังพบว่า หน่วยงานที่มีความพร้อมของท่อระบายน้ำน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จำเป็นต้องลอกท่อระบายน้ำให้ทันกำหนดภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ มีจำนวน ๑๐ หน่วยงาน โดยจากการตรวจราชการในรอบที่ ๒ หน่วยงานมีความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รายละเอียดดังนี้


ลำดับที่	หน่วยงาน	ความพร้อมในการระบายน้ำของท่อระบายน้ำ จากการตรวจราชการ รอบที่ ๑				การตรวจราชการ รอบที่ ๒	
		จำนวนถนน/ ตรอก/ซอย	ความยาวทั้งหมด (เมตร)	มีความพร้อม (เมตร)	มีความพร้อม (ร้อยละ)	มีความพร้อม (เมตร)	มีความพร้อม (ร้อยละ)
๑	สำนักการระบายน้ำ	๕๖๓	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๗,๓๕๑	๗๕.๓๗	๑,๖๔๙,๘๕๑	๘๒.๔๙
๒	สนช.บางนา	๑๒๓	๖๒,๐๗๔	๑๓,๔๕๘	๒๑.๖๘	๖๒,๐๗๔	๑๐๐
๓	สนช.วัฒนา	๒๓๒	๑๐๗,๗๙๓	๗๔,๗๙๘	๖๙.๓๙	๖๒,๐๗๔	๑๐๐
๔	สนช.บางกอกใหญ่	๔๔	๒๙,๐๖๙	๙,๘๓๗	๓๓.๘๔	๒๓,๑๒๔	๗๙.๕๕
๕	สนช.ทุ่งครุ	๔๘	๕๑,๓๒๔	๒๙,๙๖๖	๕๘.๓๙	๕๑,๓๒๔	๑๐๐
๖	สนช.บางขุนเทียน	๑๓๒	๑๗๓,๘๓๔	๑๑๙,๖๐๗	๖๘.๘๑	๑๗๓,๘๓๔	๑๐๐
๗	สนช.บางแค	๒๑๙	๖๖,๗๕๙	๑๘,๔๔๔	๒๗.๖๓	๖๖,๗๕๙	๑๐๐
๘	สนช.ภาษีเจริญ	๑๒๓	๘๕,๗๑๖	๓๗,๘๒๔	๔๔.๑๓	๘๕,๗๑๖	๑๐๐
๙	สนช.ราชบุรีบูรณะ	๑๒	๖๐,๔๖๕	๑๘,๗๘๓	๓๑.๐๖	๖๐,๔๖๕	๑๐๐
๑๐	สนช.หนองแขม	๓๖๕	๑๑๙,๑๘๗	๙๐,๖๑๔	๗๖.๐๓	๑๑๙,๑๘๗	๑๐๐

จากการตรวจราชการ รอบที่ ๒ พบว่าหน่วยงานที่มีความพร้อมของท่อระบายน้ำในการตรวจราชการรอบที่ ๑ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จำนวน ๑๐ หน่วยงาน นั้น มีหน่วยงานที่บำรุงรักษาท่อระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้ร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๘ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเขตบางนา สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงานเขตทุ่งครุ สำนักงานเขตบางขุนเทียน สำนักงานเขตบางแค สำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ และสำนักงานเขตหนองแขม ส่วนสำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๘๒.๔๙ และ ร้อยละ ๗๙.๕๕ ตามลำดับ

๓) ความพร้อมของคูคลอง/ลำรางสาธารณะ

จากการตรวจราชการ รอบที่ ๑ กรุงเทพมหานครมีคูคลอง/ลำรางสาธารณะในความรับผิดชอบ จำนวน ๑,๘๑๔ คูคลอง/ลำรางสาธารณะ รวมความยาว ๒,๖๕๒,๘๗๖ เมตร มีคูคลอง/ลำรางที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ความยาว ๒,๑๗๑,๙๗๙ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๗ และคูคลอง/ลำรางสาธารณะที่ต้องได้รับการบำรุงรักษาให้มีความพร้อมในการระบายน้ำ ความยาว ๔๘๐,๘๙๗ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๓ ในการตรวจราชการ รอบที่ ๒ มีความพร้อมในภาพรวมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๙๙.๖๓ รายละเอียดดังนี้

แผนภูมิ ๕ แสดงข้อมูลความพร้อมของคูคลอง/ลำรางสาธารณะในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำและกลุ่ม

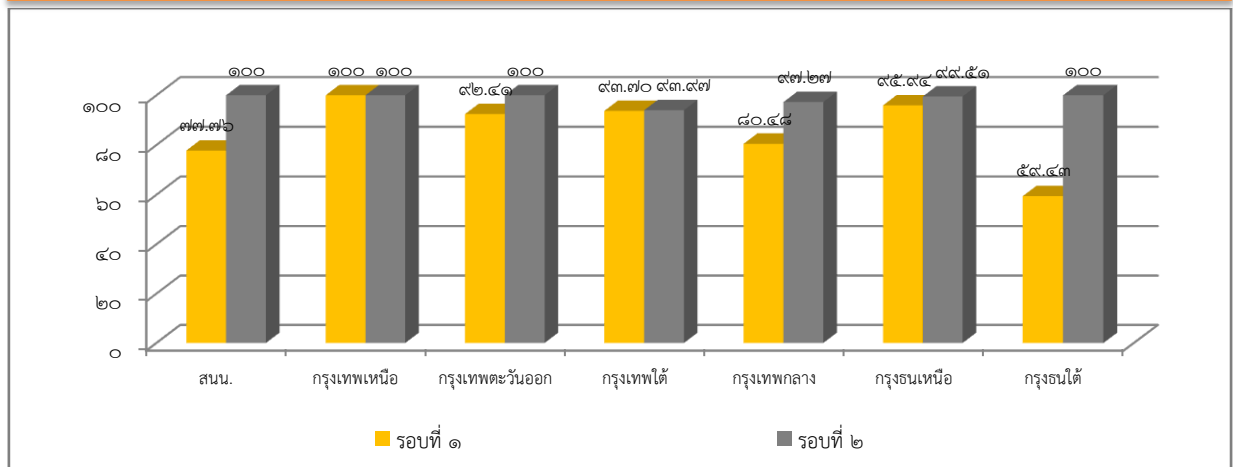

ลำดับที่	หน่วยงาน/กลุ่มเขต	ความพร้อมในการระบายน้ำของคูคลอง/ลำรางสาธารณะจากการตรวจราชการ รอบที่ ๑				การตรวจราชการ รอบที่ ๒	
		จำนวนคลอง	ความยาว (เมตร)	มีความพร้อม (เมตร)	มีความพร้อม (ร้อยละ)	มีความพร้อม (เมตร)	มีความพร้อม (ร้อยละ)
๑	สำนักการระบายน้ำ	๒๑๘	๙๖๐,๕๗๐	๗๔๖,๙๕๐	๗๗.๗๖	๙๖๐,๕๗๐	๑๐๐
๒	กลุ่มเขต กรุงเทพฯเหนือ	๑๓๒	๑๖๓,๐๑๙	๑๖๓,๐๑๙	๑๐๐	๑๖๓,๐๑๙	๑๐๐
๓	กรุงเทพฯตะวันออก	๔๑๐	๖๔๗,๘๑๕	๕๙๘,๖๔๕	๙๒.๔๑	๖๔๗,๘๑๕	๑๐๐
๔	กรุงเทพฯใต้	๑๕๒	๑๒๙,๘๔๔	๑๒๑,๖๖๓	๙๓.๗๐	๑๒๒,๐๑๙	๙๓.๙๗
๕	กรุงเทพฯกลาง	๖๔	๒๕,๒๖๒	๒๐,๓๓๒	๘๐.๔๘	๒๔,๕๗๒	๙๗.๒๗
๖	กรุงเทพฯเหนือ	๓๖๐	๒๔๕,๖๕๗	๒๓๕,๖๘๓	๙๕.๙๔	๒๔๕,๖๕๕	๙๙.๕๑
๗	กรุงเทพฯใต้	๔๗๘	๔๘๐,๗๐๙	๒๘๕,๖๘๗	๕๙.๔๓	๔๘๐,๗๐๙	๑๐๐
รวม/เฉลี่ย		๑,๘๑๔	๒,๖๕๒,๘๗๖	๒,๑๗๑,๙๗๙	๘๑.๘๗	๒,๖๕๓,๑๖๙	๙๙.๖๓

และจากการตรวจราชการในรอบที่ ๑ ยังพบว่า หน่วยงานที่มีความพร้อมของคูคลอง/ลำรางสาธารณะน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีจำนวน ๘ หน่วยงาน โดยจากการตรวจราชการในรอบที่ ๒ หน่วยงานมีความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รายละเอียดดังนี้

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/ กลุ่มเขต	ความพร้อมในการระบายน้ำของคูคลอง/ลำรางสาธารณะ จากการตรวจราชการ รอบที่ ๑				การตรวจราชการ รอบที่ ๒	
		จำนวน คลอง	ความยาว (เมตร)	มีความพร้อม (เมตร)	มีความพร้อม (ร้อยละ)	มีความพร้อม (เมตร)	มีความพร้อม (ร้อยละ)
๑	สำนักการระบายน้ำ	๒๑๘	๙๖๐,๕๗๐	๗๔๖,๙๕๐	๗๗.๗๖	๙๖๐,๕๗๐	๑๐๐
๒	สนข.บางคอแหลม	๓๐	๑๖,๕๓๙	๙,๒๒๔	๕๕.๗๗	๙,๒๒๔	๕๕.๗๗
๓	สนข.ห้วยขวาง	๘	๕,๙๕๙	๑,๗๑๙	๒๘.๘๕	๕,๙๕๙	๑๐๐
๔	สนข.หนองจอก	๙๑	๑๗๙,๓๓๕	๑๕๐,๐๒๕	๗๓.๖๒	๑๗๙,๓๓๕	๑๐๐
๕	สนข.ทุ่งครุ	๔๔	๖๖,๓๓๐	๐	๐	๖๖,๓๓๐	๑๐๐
๖	สนข.บางขุนเทียน	๑๒๓	๑๘๗,๑๙๓	๑๒๙,๓๑๓	๖๙.๐๘	๑๘๗,๑๙๓	๑๐๐
๗	สนข.บางแค	๑๒๑	๖๔,๑๕๕	๔๑,๘๖๕	๖๕.๒๖	๖๔,๑๕๕	๑๐๐
๘	สนข.ภาษีเจริญ	๑๓๓	๗๕,๒๕๒	๒๖,๗๓๐	๓๕.๕๒	๗๕,๒๕๒	๑๐๐

จากการตรวจราชการ รอบที่ ๒ พบว่าหน่วยงานที่มีความพร้อมของคูคลอง/ลำรางสาธารณะในการตรวจราชการรอบที่ ๑ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จำนวน ๘ หน่วยงาน นั้น มีหน่วยงานที่บำรุงรักษา/ขุดลอกคูคลอง/ลำรางสาธารณะให้สามารถระบายน้ำได้ร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๗ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตห้วยขวาง สำนักงานเขตหนองจอก สำนักงานเขตทุ่งครุ สำนักงานเขตบางขุนเทียน สำนักงานเขตบางแค และสำนักงานเขตภาษีเจริญ ส่วนสำนักงานเขตบางคอแหลมอยู่ระหว่างดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒

๒.๒ การกำหนดจุดติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ และจัดทำแผนสำรองกรณีฉุกเฉิน

๑) การกำหนดจุดติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ (เครื่องสูบน้ำ) ลงในแผนที่

สำนักการระบายน้ำมีการดำเนินการกำหนดจุดติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ลงในแผนที่ครบถ้วน ๑๐๐% และมีจำนวน ๔๗ สำนักงานเขตที่มีการกำหนดจุดติดตั้งฯ ลงในแผนที่ครบถ้วน ส่วนอีก ๓ สำนักงานเขตอยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

๒) การจัดทำแผนสำรองกรณีฉุกเฉินที่เกิดระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น ไฟฟ้าดับ เครื่องขัดข้อง เครื่องไม่เพียงพอต่อการรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ฯลฯ

สำนักการระบายน้ำมีการจัดทำแผนสำรองกรณีฉุกเฉิน และมีจำนวน ๒๓ สำนักงานเขตที่มีการจัดทำแผนสำรองกรณีฉุกเฉินฯ ส่วนอีก ๒๗ สำนักงานเขตอยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตลาดพร้าว สำนักงานเขตหลักสี่ สำนักงานเขตดอนเมือง สำนักงานเขตสายไหม สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตบึงกุ่ม สำนักงานเขตคันนายาว สำนักงานเขตหนองจอก สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตพระโขนง สำนักงานเขตบางนา สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตบางคอแหลม สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สำนักงานเขตพญาไท สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตบางพลัด สำนักงานเขตทวีวัฒนา สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ และสำนักงานเขตจอมทอง

๒.๓ ความพร้อมด้านอื่น ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีการตรวจความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ ท่อระบายน้ำ และคูคลอง/ลำรางสาธารณะ

เนื่องจากยังมีอีกหลายส่วนที่มีความสำคัญในการผลักดันการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ความพร้อมของหน่วย BEST ความพร้อมของแผนปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม ความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การประชุมเตรียมความพร้อม ความพร้อมในการติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ในพื้นที่น้ำท่วม และความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้า โดยหน่วยงานมีความพร้อมของหน่วย BEST (ด้านคน) มากที่สุดจำนวน ๔๙ หน่วยงาน (ร้อยละ ๙๖.๐๘) และความพร้อมในการติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ในพื้นที่น้ำท่วมน้อยที่สุดจำนวน ๓๓ หน่วยงาน (ร้อยละ ๖๔.๗๑) รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน/ กลุ่มเขต	จำนวน หน่วยงาน	ความพร้อมของ หน่วย BEST		ความพร้อม ของแผน ปฏิบัติการ	การจัดตั้ง ศูนย์ ป้องกันฯ	การประชุม เตรียมความ พร้อม	การติดตั้ง วัสดุ/อุปกรณ์	การจัดตั้งศูนย์ฯ ส่วนหน้า	
			คน	วัสดุ/อุปกรณ์					กำหนดจุด	จัดทำคำสั่งฯ
๑	สำนักการระบายน้ำ	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑
๒	กลุ่มเขต กรุงเทพเหนือ	๗	๖	๕	๗	๖	๗	๕	๗	๕
๓	กรุงเทพตะวันออก	๙	๘	๙	๗	๘	๗	๑	๙	๕
๔	กรุงเทพใต้	๑๐	๑๐	๙	๙	๙	๑๐	๗	๑๐	๘
๕	กรุงเทพกลาง	๙	๙	๙	๙	๗	๖	๕	๖	๔
๖	กรุงธนเหนือ	๘	๘	๘	๘	๘	๘	๗	๘	๗
๗	กรุงธนใต้	๗	๗	๗	๗	๖	๖	๗	๖	๖
รวม		๕๑	๔๙	๔๘	๔๘	๔๕	๔๕	๓๓	๔๗	๓๖
ร้อยละ		๑๐๐	๙๖.๐๘	๙๔.๑๑	๙๔.๑๑	๘๘.๒๔	๘๘.๒๔	๖๔.๗๑	๙๒.๑๖	๗๐.๕๙

๑) ความพร้อมของหน่วย BEST

- ด้านคน สำนักการระบายน้ำมีความพร้อม ๑๐๐% และมีจำนวน ๔๘ สำนักงานเขตที่มีความพร้อม ส่วนอีก ๒ สำนักงานเขตมีปัญหาด้านอัตรากำลัง ได้แก่ สำนักงานเขตสายไหม และสำนักงานเขตบางกะปิ

- ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ สำนักการระบายน้ำมีความพร้อม ๑๐๐% และมีจำนวน ๔๗ สำนักงานเขตที่มีความพร้อม ส่วนอีก ๓ สำนักงานเขตที่ยังไม่มีความพร้อม ได้แก่ สำนักงานเขตดอนเมือง สำนักงานเขตสายไหม และสำนักงานเขตบางนา

๒) ความพร้อมของแผนปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม

สำนักการระบายน้ำดำเนินการจัดทำแผนฯ เรียบร้อยแล้ว และมีจำนวน ๔๗ สำนักงานเขตที่มีการจัดทำแผนฯ ส่วนอีก ๓ สำนักงานเขตที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตหนองจอก และสำนักงานเขตพระโขนง

๓) ความพร้อมในการการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

สำนักการระบายน้ำมีการจัดตั้งศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้ว และมีจำนวน ๔๔ สำนักงานเขตที่มีการจัดตั้งศูนย์ฯ ส่วนอีก ๖ สำนักงานเขตอยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ สำนักงานเขตบางเขน สำนักงานเขตหนองจอก สำนักงานเขตพระโขนง สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และสำนักงานเขตทุ่งครุ

๔) การประชุมเตรียมความพร้อม

สำนักการระบายน้ำมีการประชุมเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวน ๔๔ สำนักงานเขตที่มีการประชุมเตรียมความพร้อม ส่วนอีก ๖ สำนักงานเขตยังไม่มีดำเนินการ ได้แก่ สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตบึงกุ่ม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สำนักงานเขตวังทองหลาง และสำนักงานเขตทุ่งครุ

๕) ความพร้อมในการติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ในพื้นที่น้ำท่วม

สำนักการระบายน้ำมีความพร้อมในการติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ ครบ ๑๐๐% และมีจำนวน ๓๒ สำนักงานเขตที่มีความพร้อม ส่วนอีก ๑๘ สำนักงานเขตอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งฯ ได้แก่ สำนักงานเขตดอนเมือง สำนักงานเขตสายไหม สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตสะพานสูง สำนักงานเขตมีนบุรี สำนักงานเขตคลองสามวา สำนักงานเขตบึงกุ่ม สำนักงานเขตคันนายาว สำนักงานเขตหนองจอก สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตบางนา สำนักงานเขตสวนหลวง สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สำนักงานเขตวังทองหลาง และสำนักงานเขตบางพลัด

๖) ความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้า

- การกำหนดจุดจัดตั้งศูนย์ฯ สำนักการระบายน้ำมีการกำหนดจุดจัดตั้งศูนย์ฯ จำนวน ๓ จุด และมีจำนวน ๔๖ สำนักงานเขตที่มีการกำหนดจุดจัดตั้งศูนย์ฯ (เขตละ ๑ จุด) ส่วนอีก ๔ สำนักงานเขตอยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และสำนักงานเขตทุ่งครุ

- การจัดทำคำสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ สำนักการระบายน้ำมีการจัดทำคำสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้ว และมีจำนวน ๓๕ สำนักงานเขตที่มีการจัดทำคำสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ ส่วนอีก ๑๔ สำนักงานเขตอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งฯ ได้แก่ สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตสายไหม สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตคลองสามวา สำนักงานเขตคันนายาว สำนักงานเขตหนองจอก สำนักงานเขตพระโขนง สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สำนักงานเขตวังทองหลาง สำนักงานเขตจอมทอง และสำนักงานเขตทุ่งครุ ในส่วนของสำนักงานเขตราชเทวี ไม่มีการระบุข้อมูล

๓. ความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์พายุลูซูร้อน

ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีการตรวจความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์พายุลูซูร้อน โดยหน่วยงานมีความพร้อมในด้านการสำรวจตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง/ต้นไม้ที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุลูซูร้อนมากที่สุด จำนวน ๔๖ หน่วยงาน (ร้อยละ ๙๐.๒๐) และมีความพร้อมในการจัดทำแผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายจากพายุ น้อยที่สุด จำนวน ๓๑ หน่วยงาน (ร้อยละ ๖๐.๗๘) รายละเอียดดังนี้

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/ กลุ่มเขต	จำนวน หน่วยงาน	ความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์พายุลูซูร้อน					
			การกำหนดแผนและมาตรการลดผลกระทบ		การสำรวจตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง/ต้นไม้ที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุลูซูร้อน		มีแผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายจากพายุ	
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑	สำนักการระบายน้ำ	๑	๑	-	-	๑	-	๑
๒	กลุ่มเขต กรุงเทพเหนือ	๗	๔	๓	๕	๒	๔	๓
๓	กรุงเทพตะวันออก	๙	๖	๓	๙	-	๓	๖
๔	กรุงเทพใต้	๑๐	๖	๔	๑๐	-	๖	๔
๕	กรุงเทพกลาง	๙	๘	๑	๘	๑	๗	๒
๖	กรุงเทพเหนือ	๘	๗	๑	๗	๑	๔	๔
๗	กรุงเทพใต้	๗	๗	-	๗	-	๗	-
รวม		๕๑	๓๙	๑๒	๔๖	๕	๓๑	๒๐

๓.๑ การกำหนดแผนและมาตรการลดผลกระทบ

สำนักการระบายน้ำมีการกำหนดแผนและมาตรการลดผลกระทบจากพายุฤดูร้อนรวมทั้งการสร้างความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุ และมีจำนวน ๓๘ สำนักงานเขตที่มีการดำเนินการกำหนดแผนฯ ส่วนอีก ๑๒ สำนักงานเขตอยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ สำนักงานเขตหลักสี่ สำนักงานเขตสายไหม สำนักงานเขตบางเขน สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตคลองสามวา สำนักงานเขตหนองจอก สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตพระโขนง สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงานเขตดุสิต และสำนักงานเขตบางกอกใหญ่

๓.๒ การสำรวจตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง/ต้นไม้ที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน

สำนักการระบายน้ำอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง/ต้นไม้ที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน และมีจำนวน ๔๖ สำนักงานเขตที่มีการดำเนินการตรวจสอบฯ โดยมี ๕ สำนักงานเขตอยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ สำนักงานเขตสายไหม สำนักงานเขตบางเขน สำนักงานเขตดุสิต และสำนักงานเขตบางกอกใหญ่

๓.๓ แผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายจากพายุ

สำนักการระบายน้ำอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายจากพายุ และมีจำนวน ๓๑ สำนักงานเขตที่มีการดำเนินการจัดทำแผนฯ ส่วนอีก ๑๕ สำนักงานเขตอยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ สำนักงานเขตหลักสี่ สำนักงานเขตสายไหม สำนักงานเขตบางเขน สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตคลองสามวา สำนักงานเขตบึงกุ่ม สำนักงานเขตคันนายาว สำนักงานเขตหนองจอก สำนักงานเขตพระโขนง สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สำนักงานเขตทวีวัฒนา สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ และสำนักงานเขตจอมทอง

สรุปผลการดำเนินงานของสำนักการระบายน้ำและกลุ่มเขต

๑. สำนักการระบายน้ำ


สำนักการระบายน้ำ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของ กรุงเทพมหานคร มีผลการดำเนินงาน (รายละเอียดปรากฏในบทที่ ๒ ส่วนที่ ๑ ของรายงานฉบับนี้) สรุปได้ดังนี้

๑. จำนวนพื้นที่น้ำท่วม

จากข้อมูลการตรวจราชการรอบที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) สำนักการระบายน้ำมีพื้นที่น้ำท่วม จำนวน ๗๐ จุด ประกอบด้วย จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม จำนวน ๕๓ จุด จุดเร่งระบายน้ำ จำนวน ๕๗ จุด (ซึ่งเป็นจุดเดียวกันกับจุดเฝ้าระวังหรือจุดอ่อนน้ำท่วม) และจุดอ่อนน้ำท่วม จำนวน ๑๗ จุด

๒. ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

๒.๑ ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ และระบบการระบายน้ำ ของสำนักการระบายน้ำ

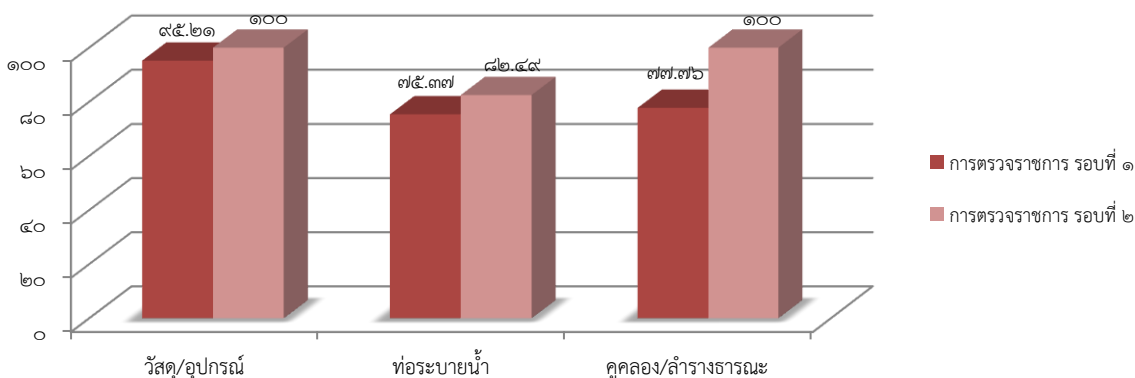

ลำดับ ที่	ประเภท	เครื่อง/ เมตร	การตรวจราชการ รอบที่ ๑		การตรวจราชการ รอบที่ ๒	
			มีความพร้อม (จำนวน/ความยาว)	คิดเป็น ร้อยละ	มีความพร้อม (จำนวน/ความยาว)	คิดเป็น ร้อยละ
๑	วัสดุ/อุปกรณ์ - อาคารบังคับน้ำ (แห่ง) - เครื่องสูบน้ำ (เครื่อง) - เครื่องจักรกล (เครื่อง) รวม	๙๖	๙๖	๑๐๐	๙๖	๑๐๐
		๒,๓๑๗	๒,๑๙๘	๙๔.๘๖	๒,๓๑๗	๑๐๐
		๑๗๕	๑๗๐	๙๗.๑๔	๑๗๕	๑๐๐
		๒,๕๘๘	๒,๔๖๔	๙๕.๒๑	๒,๕๘๘	๑๐๐
๒	ท่อระบายน้ำ (ความยาว)	๒,๐๐๐,๐๐๐	๔๙๒,๖๔๙	๗๕.๓๗	๑,๖๔๙,๘๕๑	๘๒.๔๙
๓	คูคลอง/ลำรางสาธารณะ (ความยาว)	๙๖๐,๕๗๐	๗๔๖,๙๕๐	๗๗.๗๖	๙๖๐,๕๗๐	๑๐๐

๒.๒ ความพร้อมด้านอื่น ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

๑) ความพร้อมของหน่วย BEST

สำนักการระบายน้ำ มีการเตรียมความพร้อมของหน่วย BEST ทั้งด้านคน และวัสดุ/อุปกรณ์

๒) ความพร้อมของแผนปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม

สำนักการระบายน้ำ มีแผนปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วมและแผนบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓) ความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

สำนักการระบายน้ำ มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

๔) การประชุมเตรียมความพร้อม

สำนักการระบายน้ำ มีการประชุมเตรียมความพร้อม และการประเมินสถานการณ์

๕) ความพร้อมในการติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ในพื้นที่น้ำท่วม

สำนักการระบายน้ำ มีความพร้อมในการติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ในพื้นที่น้ำท่วม ๑๐๐%

๖) ความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้า

สำนักการระบายน้ำ มีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ส่วนหน้า จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ บริเวณศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบึงหนองบอน และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมธนบุรี และมีคำสั่งมอบหมายหน้าที่และบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่น

๓. ความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อนของสำนักการระบายน้ำ

๓.๑ มีการกำหนดแผนและมาตรการลดผลกระทบจากพายุฤดูร้อนรวมทั้งการสร้างความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุ

๓.๒ สำนักการระบายน้ำไม่มีการสำรวจตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง/ต้นไม้ที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน

๓.๓ สำนักการระบายน้ำไม่มีแผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายจากพายุ เนื่องจากไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ

๒. กลุ่มเขต

๒.๑ กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย ๗ สำนักงานเขต ได้แก่ สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตบางซื่อ สำนักงานเขตลาดพร้าว สำนักงานเขตหลักสี่ สำนักงานเขตดอนเมือง สำนักงานเขตสายไหม และสำนักงานเขตบางเขน มีผลการดำเนินงาน (รายละเอียดปรากฏในบทที่ ๒ ส่วนที่ ๑ ของรายงานฉบับนี้) สรุปได้ดังนี้

๑. จำนวนพื้นที่น้ำท่วม

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด จำนวน ๑๐๓ จุด โดยจำแนกเป็นจุดเฝ้าระวัง จำนวน ๒๔ จุด จุดเร่งระบาย จำนวน ๒๘ จุด และจุดอ่อนน้ำท่วม จำนวน ๕๑ จุด


๒. ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

๒.๑ ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ และระบบการระบายน้ำ

ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์				
		จำนวน (เครื่อง)	การตรวจราชการ รอบที่ ๑		การตรวจราชการ รอบที่ ๒	
	มีความ พร้อม		ร้อยละ	มีความ พร้อม	ร้อยละ	
๑	สนข.จตุจักร	๑๙	๑๓	๖๘.๔๒	๑๓	๖๘.๔๒
๒	สนข.บางซื่อ	๒๐	๑๗	๘๕	๒๐	๑๐๐
๓	สนข.ลาดพร้าว	๓๓	๓๓	๑๐๐	๓๓	๑๐๐
๔	สนข.หลักสี่	๑๘	๑๘	๑๐๐	๑๘	๑๐๐
๕	สนข.ดอนเมือง	๑๓	๑๐	๗๖.๙๒	๑๐	๗๖.๙๒
๖	สนข.สายไหม	๔๐	๔๐	๑๐๐	๔๐	๑๐๐
๗	สนข.บางเขน	๓๔	๓๓	๙๗.๐๖	๓๔	๑๐๐
รวม/เฉลี่ย		๑๖๗	๑๖๔	๙๒.๖๖	๑๔๘	๙๔.๒๗

หมายเหตุ : เครื่องสูบน้ำ ๑๖๕ เครื่อง, เครื่องจักรกล ๑๒ เครื่อง (รอบที่ ๒ ความพร้อมเครื่องจักรกล ๑๐๐%)

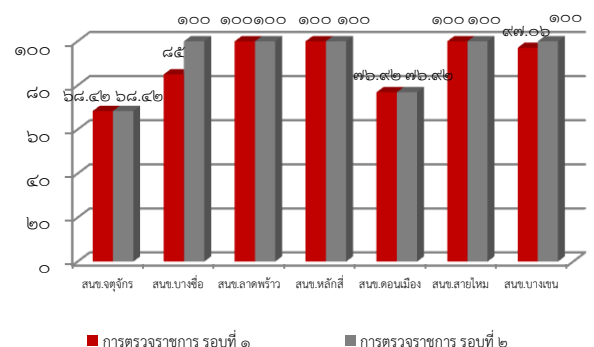


ความพร้อมของท่อระบายน้ำ

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ความพร้อมของท่อระบายน้ำ				
		ความยาว (เมตร)	การตรวจราชการ รอบที่ ๑		การตรวจราชการ รอบที่ ๒	
			มีความพร้อม	ร้อยละ	มีความพร้อม	ร้อยละ
๑	สนข.จตุจักร	๒๙๙,๒๓๖	๒๙๙,๒๓๖	๑๐๐	๒๙๙,๒๓๖	๑๐๐
๒	สนข.บางซื่อ	๖๐,๕๗๐	๖๐,๕๗๐	๑๐๐	๖๐,๕๗๐	๑๐๐
๓	สนข.ลาดพร้าว	๑๓๗,๔๑๔	๑๓๗,๔๑๔	๑๐๐	๑๓๗,๔๑๔	๑๐๐
๔	สนข.หลักสี่	๑๔๐,๘๕๐	๑๔๐,๘๕๐	๑๐๐	๑๔๐,๘๕๐	๑๐๐
๕	สนข.ดอนเมือง	๘๓,๕๓๘	๘๓,๕๓๘	๑๐๐	๘๓,๕๓๘	๑๐๐
๖	สนข.สายไหม	๑๕๐,๔๘๐	๑๕๐,๔๘๐	๑๐๐	๑๕๐,๔๘๐	๑๐๐
๗	สนข.บางเขน	๑๔๒,๗๐๙	๑๔๒,๗๐๙	๑๐๐	๑๔๒,๗๐๙	๑๐๐
รวม/เฉลี่ย		๑,๐๑๔,๗๙๗	๑,๐๑๔,๗๙๗	๑๐๐	๑,๐๑๔,๗๙๗	๑๐๐



ความพร้อมของคูคลอง/ลำรางสาธารณะ

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ความพร้อมของคูคลอง/ลำรางสาธารณะ				
		ความยาว (เมตร)	การตรวจราชการ รอบที่ ๑		การตรวจราชการ รอบที่ ๒	
			มีความพร้อม	ร้อยละ	มีความพร้อม	ร้อยละ
๑	สนข.จตุจักร	๖,๒๒๐	๖,๒๒๐	๑๐๐	๖,๒๒๐	๑๐๐
๒	สนข.บางซื่อ	๑๒,๔๖๓	๑๒,๔๖๓	๑๐๐	๑๒,๔๖๓	๑๐๐
๓	สนข.ลาดพร้าว	๑๒,๑๐๐	๑๒,๑๐๐	๑๐๐	๑๒,๑๐๐	๑๐๐
๔	สนข.หลักสี่	๙,๑๐๐	๙,๑๐๐	๑๐๐	๙,๑๐๐	๑๐๐
๕	สนข.ดอนเมือง	๒๐,๕๑๐	๒๐,๕๑๐	๑๐๐	๒๐,๕๑๐	๑๐๐
๖	สนข.สายไหม	๕๐,๙๘๒	๕๐,๙๘๒	๑๐๐	๕๐,๙๘๒	๑๐๐
๗	สนข.บางเขน	๕๑,๖๔๔	๕๑,๖๔๔	๑๐๐	๕๑,๖๔๔	๑๐๐
รวม/เฉลี่ย		๑๖๓,๐๑๙	๑๖๓,๐๑๙	๑๐๐	๑๖๓,๐๑๙	๑๐๐



๒.๒ ความพร้อมด้านอื่น ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

๑) ความพร้อมของหน่วย BEST

- ความพร้อมด้านคน (เจ้าหน้าที่) มีความพร้อมทุกสำนักงานเขต ยกเว้นเพียงสำนักงานเขตสายไหมที่มีปัญหาด้านอัตรากำลัง

- ความพร้อมด้านวัสดุ/อุปกรณ์ มีความพร้อม ๕ สำนักงานเขต ได้แก่ สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตบางซื่อ สำนักงานเขตลาดพร้าว สำนักงานเขตหลักสี่ และสำนักงานเขตบางเขน และไม่มีความพร้อม ๒ สำนักงานเขต ได้แก่ สำนักงานเขตดอนเมือง และสำนักงานเขตสายไหม

๒) ความพร้อมของแผนปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ครบถ้วนทุกสำนักงานเขต

๓) ความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ครบถ้วนทุกสำนักงานเขต ยกเว้นเพียงสำนักงานเขตบางเขนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔) การประชุมเตรียมความพร้อม

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ครบถ้วนทุกสำนักงานเขต

๕) ความพร้อมในการติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ในพื้นที่น้ำท่วม

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีความพร้อมในการติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ในพื้นที่น้ำท่วมจำนวน ๕ สำนักงานเขต ได้แก่ สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตบางซื่อ สำนักงานเขตลาดพร้าว สำนักงานเขตหลักสี่ และสำนักงานเขตบางเขน ส่วนสำนักงานเขตดอนเมืองและสำนักงานเขตสายไหม มีการติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์แต่ยังไม่ครบถ้วน

๖) ความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้า

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้า จำนวน ๕ สำนักงานเขต ได้แก่ สำนักงานเขตบางซื่อ สำนักงานเขตลาดพร้าว สำนักงานเขตหลักสี่ สำนักงานเขตดอนเมือง และสำนักงานเขตบางเขน ส่วนสำนักงานเขตจตุจักรและสำนักงานเขตสายไหม ไม่มีข้อมูลการจัดตั้งศูนย์ฯ

๓. ความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อนของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ

๓.๑ มีการกำหนดแผนและมาตรการลดผลกระทบจากพายุฤดูร้อนรวมทั้งการสร้างความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุ จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตบางซื่อ สำนักงานเขตลาดพร้าว และสำนักงานเขตดอนเมือง

๓.๒ มีการสำรวจตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้างต้นไม้อาจได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานจตุจักร สำนักงานเขตบางซื่อ สำนักงานเขตลาดพร้าว สำนักงานเขตหลักสี่ และสำนักงานเขตดอนเมือง

๓.๓ มีการจัดทำแผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน จำนวน ๔ สำนักงานเขต ได้แก่ สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตบางซื่อ สำนักงานเขตลาดพร้าว และสำนักงานเขตดอนเมือง

๒.๒ กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก

กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย ๙ สำนักงานเขต ได้แก่ สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตประเวศ สำนักงานเขตสะพานสูง สำนักงานเขตมีนบุรี สำนักงานเขตคลองสามวา สำนักงานเขตบึงกุ่ม สำนักงานเขตคันนายาว และสำนักงานเขตหนองจอก มีผลการดำเนินงาน (รายละเอียดปรากฏในบทที่ ๒ ส่วนที่ ๒ ของรายงานฉบับนี้) สรุปได้ดังนี้

๑. จำนวนพื้นที่น้ำท่วม

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก มีพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด จำนวน ๘๙ จุด โดยจำแนกเป็นจุดเฝ้าระวัง จำนวน ๒๒ จุด จุดเร่งระบาย จำนวน ๑๒ จุด และ จุดอ่อนน้ำท่วม จำนวน ๕๕ จุด


๒. ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

๒.๑ ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ และระบบการระบายน้ำ

ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์

ลำดับที่	หน่วยงาน	ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์					
		จำนวน (เครื่อง)	การตรวจราชการ รอบที่ ๑		การตรวจราชการ รอบที่ ๒		
			มีความพร้อม	ร้อยละ	มีความพร้อม	ร้อยละ	
๑	สนช.บางกะปิ	๑๔	๑๒	๘๕.๗๑	๑๓	๙๒.๘๖	
๒	สนช.ลาดกระบัง	๕๙	๕๙	๑๐๐	๕๙	๑๐๐	
๓	สนช.ประเวศ	๒๔	๒๔	๑๐๐	๒๔	๑๐๐	
๔	สนช.สะพานสูง	๓๙	๓๙	๑๐๐	๓๙	๑๐๐	
๕	สนช.มีนบุรี	๒๒	๒๒	๑๐๐	๒๒	๑๐๐	
๖	สนช.คลองสามวา	๑๗	๑๗	๑๐๐	๑๗	๑๐๐	
๗	สนช.บึงกุ่ม	๒๖	๒๒	๘๔.๖๒	๒๖	๑๐๐	
๘	สนช.คันนายาว	๑๒	๑๐	๘๓.๓๓	๑๒	๑๐๐	
๙	สนช.หนองจอก	๘	๘	๑๐๐	๘	๑๐๐	
รวมเฉลี่ย		๒๒๑	๒๓๓	๙๖.๓๘	๒๒๐	๙๙.๕๕	

หมายเหตุ : เครื่องสูบน้ำ ๑๘๗ เครื่อง, เครื่องจักรกล ๓๔ เครื่อง (รอบที่ ๒ ความพร้อมเครื่องจักรกล ๑๐๐%)

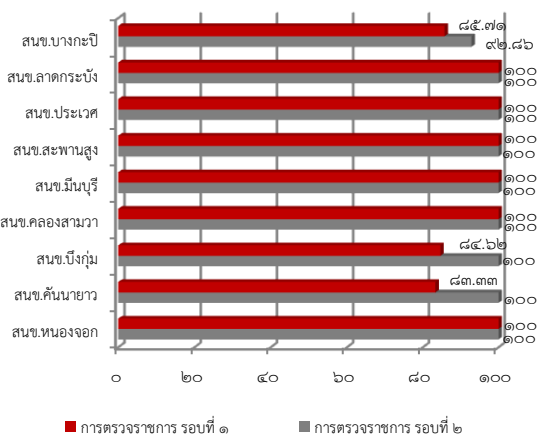

ความพร้อมของท่อระบายน้ำ


ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ความพร้อมของท่อระบายน้ำ				
		ความยาว (เมตร)	การตรวจราชการ รอบที่ ๑		การตรวจราชการ รอบที่ ๒	
			มีความพร้อม	ร้อยละ	มีความพร้อม	ร้อยละ
๑	สนช.บางกะปิ	๗๑,๘๒๗	๗๑,๘๒๗	๑๐๐	๗๑,๘๒๗	๑๐๐
๒	สนช.ลาดกระบัง	๘๕,๕๙๘.๓๘	๘๕,๕๙๘.๓๘	๑๐๐	๘๕,๕๙๘.๓๘	๑๐๐
๓	สนช.ประเวศ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐
๔	สนช.สะพานสูง	๘๔,๙๔๑	๘๔,๙๔๑	๑๐๐	๘๔,๙๔๑	๑๐๐
๕	สนช.มีนบุรี	๑๖๗,๐๐๔	๑๖๗,๐๐๔	๑๐๐	๑๖๗,๐๐๔	๑๐๐
๖	สนช.คลองสามวา	๗๒,๕๕๐	๗๒,๕๕๐	๑๐๐	๗๒,๕๕๐	๑๐๐
๗	สนช.บึงกุ่ม	๘๘,๐๑๗	๘๘,๐๑๗	๑๐๐	๘๘,๐๑๗	๑๐๐
๘	สนช.คันนายาว	๑๐๗,๙๑๗	๑๐๗,๙๑๗	๑๐๐	๑๐๗,๙๑๗	๑๐๐
๙	สนช.หนองจอก	๘๗,๓๖๔	๘๗,๓๖๔	๑๐๐	๘๗,๓๖๔	๑๐๐
รวม/เฉลี่ย		๙๖๕,๒๑๘.๓๘	๙๖๕,๒๑๘.๓๘	๑๐๐	๙๖๕,๒๑๘.๓๘	๑๐๐



■ มีความพร้อม ■ ไม่มีความพร้อม

ความพร้อมของคูคลอง/ลำรางสาธารณะ

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ความพร้อมของคูคลอง/ลำรางสาธารณะ				
		ความยาว (เมตร)	การตรวจราชการ รอบที่ ๑		การตรวจราชการ รอบที่ ๒	
			มีความพร้อม	ร้อยละ	มีความพร้อม	ร้อยละ
๑	สนช.บางกะปิ	๑๗,๓๗๓	๑๗,๓๗๓	๑๐๐	๑๗,๓๗๓	๑๐๐
๒	สนช.ลาดกระบัง	๑๐๑,๓๕๘	๑๐๑,๓๕๘	๑๐๐	๑๐๑,๓๕๘	๑๐๐
๓	สนช.ประเวศ	๑๑,๒๕๐	๑๑,๒๕๐	๑๐๐	๑๑,๒๕๐	๑๐๐
๔	สนช.สะพานสูง	๒๕,๕๕๗	๒๕,๕๕๗	๙๔.๔๘	๒๕,๕๕๗	๑๐๐
๕	สนช.มีนบุรี	๗๐,๙๖๐	๗๐,๙๖๐	๑๐๐	๗๐,๙๖๐	๑๐๐
๖	สนช.คลองสามวา	๑๕๘,๙๕๐	๑๕๘,๙๕๐	๑๐๐	๑๕๘,๙๕๐	๑๐๐
๗	สนช.บึงกุ่ม	๓๕,๕๕๒	๓๕,๑๐๒	๙๘.๗๓	๓๕,๕๕๒	๑๐๐
๘	สนช.คันนายาว	๒๙,๔๘๐	๒๙,๔๘๐	๑๐๐	๒๙,๔๘๐	๑๐๐
๙	สนช.หนองจอก	๑๙๗,๘๓๕	๑๕๐,๐๒๕	๗๖.๐๓	๑๙๗,๘๓๕	๑๐๐
	รวม/เฉลี่ย	๖๔๗,๘๑๕	๕๙๘,๖๔๕	๙๒.๔๑	๖๔๗,๘๑๕	๑๐๐

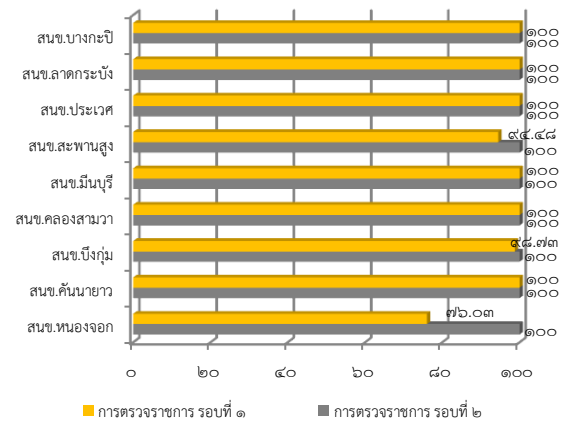

๒.๒ ความพร้อมด้านอื่น ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

๑) ความพร้อมของหน่วย BEST

- ความพร้อมด้านคน (เจ้าหน้าที่) มีความพร้อมทุกสำนักงานเขต แต่ในส่วนของสำนักงานเขตบางกะปิ มีปัญหาด้านอัตรากำลัง

- ความพร้อมด้านวัสดุ/อุปกรณ์ มีความพร้อมครบถ้วนทุกสำนักงานเขต

๒) ความพร้อมของแผนปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน จำนวน ๗ สำนักงานเขต ได้แก่ สำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตประเวศ สำนักงานเขตสะพานสูง สำนักงานเขตมีนบุรี สำนักงานเขตคลองสามวา สำนักงานเขตบึงกุ่ม และสำนักงานเขตคันนายาว ในส่วนของสำนักงานเขตบางกะปิและสำนักงานเขตหนองจอกยังไม่ได้จัดทำแผนฯ

๓) ความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ครบถ้วนทุกสำนักงานเขต แต่ในส่วนของสำนักงานเขตหนองจอกยังไม่ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ

๔) การประชุมเตรียมความพร้อม

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม จำนวน ๗ สำนักงานเขต ได้แก่ สำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตประเวศ สำนักงานเขตสะพานสูง สำนักงานเขตมีนบุรี สำนักงานเขตคลองสามวา สำนักงานเขตคันนายาว และสำนักงานเขตหนองจอก ในส่วนของสำนักงานเขตบางกะปิและสำนักงานเขตบึงกุ่มไม่มีรายงานการประชุมเตรียมความพร้อม

๕) ความพร้อมในการติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ในพื้นที่น้ำท่วม

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก จำนวน ๘ สำนักงานเขต อยู่ระหว่างการติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ในพื้นที่น้ำท่วม มีเพียงสำนักงานเขตประเวศที่มีการติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ในพื้นที่น้ำท่วมครบถ้วน

๖) ความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้า

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก มีรายงานการกำหนดจุดจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้าครบทุกสำนักงานเขต โดยมีจำนวน ๕ สำนักงานเขต ที่มีการจัดทำคำสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ ได้แก่ สำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตประเวศ สำนักงานเขตสะพานสูง สำนักงานเขตมีนบุรี และสำนักงานเขตบึงกุ่ม

๓. ความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อนของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก

๓.๑ มีการจัดทำแผนและกำหนดมาตรการลดผลกระทบจากพายุฤดูร้อนรวมทั้งการสร้างความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุ จำนวน ๖ สำนักงานเขต ได้แก่ สำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตประเวศ สำนักงานเขตสะพานสูง สำนักงานเขตมีนบุรีสำนักงานเขตบึงกุ่ม และ สำนักงานเขตคันนายาว

๓.๒ มีการสำรวจตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง/ต้นไม้ที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนครบทุกสำนักงานเขต

๓.๓ มีการจัดทำแผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน จำนวน ๓ สำนักงานเขต ได้แก่ สำนักงานเขตประเวศ สำนักงานเขตสะพานสูงและสำนักงานเขตมีนบุรี

๒.๓ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย ๑๐ สำนักงานเขต ได้แก่ สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตพระโขนง สำนักงานเขตบางนา สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตบางคอแหลม สำนักงานเขตยานนาวา และสำนักงานเขตสวนหลวง มีผลการดำเนินงาน (รายละเอียดปรากฏในบทที่ ๒ ส่วนที่ ๓ ของรายงานฉบับนี้) สรุปได้ดังนี้

๑. จำนวนพื้นที่น้ำท่วม

จากข้อมูลการตรวจราชการของเขตตรวจราชการ รอบที่ ๑ สำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ มีพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด ๘๕ จุด จำแนกเป็น จุดเฝ้าระวัง จำนวน ๓๒ จุด จุดเร่งระบายน้ำ จำนวน ๒๔ จุด และจุดอ่อนน้ำท่วม จำนวน ๒๙ จุด แต่เนื่องจากบางสำนักงานเขตได้กำหนดจุดเฝ้าระวัง จุดอ่อนน้ำท่วม และจุดเร่งระบายน้ำ อยู่ในบริเวณจุดเดียวกัน จึงทำให้พื้นที่น้ำท่วมในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ รวม ๔๖ จุด

๒. ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม


๒.๑ ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ และระบบการระบายน้ำ

ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์				
		จำนวน (เครื่อง)	การตรวจราชการ รอบที่ ๑		การตรวจราชการ รอบที่ ๒	
			มีความพร้อม	ร้อยละ	มีความพร้อม	ร้อยละ
๑	สนช.บางรัก	๖	๔	๖๖.๖๗	๖	๑๐๐
๒	สนช.พระโขนง	๘	๖	๗๕	๖	๗๕
๓	สนช.บางนา	๑๖	๑๓	๘๑.๒๕	๑๖	๑๐๐
๔	สนช.ปทุมวัน	๑	๑	๑๐๐	๑	๑๐๐
๕	สนช.คลองเตย	๒๓	๑๘	๗๘.๒๖	๑๘	๗๘.๒๖
๖	สนช.วัฒนา	๔	๔	๑๐๐	๔	๑๐๐
๗	สนช.สาทร	๔	๔	๑๐๐	๔	๑๐๐
๘	สนช.บางคอแหลม	๒	๒	๑๐๐	๒	๑๐๐
๙	สนช.ยานนาวา	๑	๑	๑๐๐	๑	๑๐๐
๑๐	สนช.สวนหลวง	๒๒	๒๒	๑๐๐	๒๒	๑๐๐
รวม/เฉลี่ย		๘๗	๗๕	๙๐.๑๒	๘๐	๙๕.๓๓


หมายเหตุ : ๑. เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๘๗ เครื่อง ไม่มีเครื่องจักรกล

๒. สนช.พระโขนง และ สนช.คลองเตย อยู่ระหว่างรื้อสภาพเครื่องสูบน้ำ

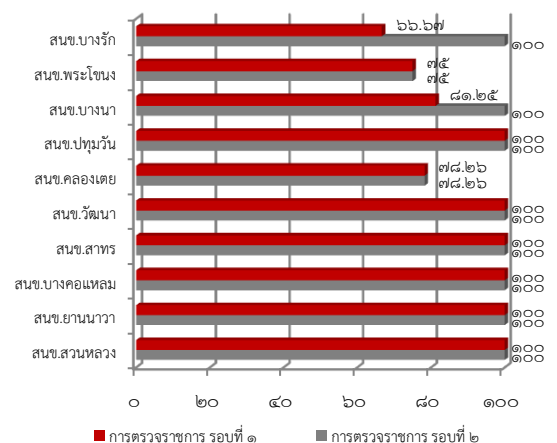


ความพร้อมของท่อระบายน้ำ

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ความพร้อมของท่อระบายน้ำ				
		ความยาว (เมตร)	การตรวจราชการ รอบที่ ๑		การตรวจราชการ รอบที่ ๒	
			มีความพร้อม	ร้อยละ	มีความพร้อม	ร้อยละ
๑	สนช.บางรัก	๓๑,๕๗๑	๓๑,๕๗๑	๑๐๐	๓๑,๕๗๑	๑๐๐
๒	สนช.พระโขนง	๔๘,๕๖๗	๔๘,๕๖๗	๑๐๐	๔๘,๕๖๗	๑๐๐
๓	สนช.บางนา	๖๒,๐๗๔	๑๓,๔๕๘	๒๑.๖๘	๖๒,๐๗๔	๑๐๐
๔	สนช.ปทุมวัน	๒๓,๗๑๙	๒๓,๗๑๙	๑๐๐	๒๓,๗๑๙	๑๐๐
๕	สนช.คลองเตย	๒๖,๗๙๕	๒๖,๗๙๕	๑๐๐	๒๖,๗๙๕	๑๐๐
๖	สนช.วัฒนา	๑๐๗,๗๙๓	๗๕,๑๙๘	๖๙.๗๖	๑๐๗,๗๙๓	๑๐๐
๗	สนช.สาทร	๖๓,๔๔๔	๖๐,๗๐๙	๙๕.๖๙	๖๓,๔๔๔	๑๐๐
๘	สนช.บางคอแหลม	๒๗,๐๗๒	๒๗,๐๗๒	๑๐๐	๒๗,๐๗๒	๑๐๐
๙	สนช.ยานนาวา	๔๔,๓๙๒	๔๔,๓๙๒	๑๐๐	๔๔,๓๙๒	๑๐๐
๑๐	สนช.สวนหลวง	๙๙,๔๔๒	๙๙,๔๔๒	๑๐๐	๙๙,๔๔๒	๑๐๐
	รวม/เฉลี่ย	๕๘๔,๘๖๙	๕๐๐,๙๒๓	๘๕.๖๕	๕๘๔,๘๖๙	๑๐๐

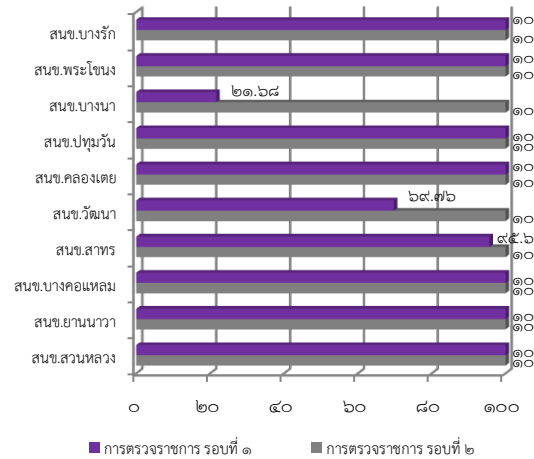

ความพร้อมของคูคลอง/ลำรางสาธารณะ

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ความพร้อมของคูคลอง/ลำรางสาธารณะ				
		ความยาว (เมตร)	การตรวจราชการ รอบที่ ๑		การตรวจราชการ รอบที่ ๒	
			มีความพร้อม	ร้อยละ	มีความพร้อม	ร้อยละ
๑	สนช.บางรัก	๑,๖๘๘	๑,๓๓๒	๗๘.๙๑	๑,๖๘๘	๑๐๐
๒	สนช.พระโขนง	๑๒,๗๕๓	๑๒,๗๕๓	๑๐๐	๑๒,๗๕๓	๑๐๐
๓	สนช.บางนา	๕,๘๓๖	๕,๓๒๖	๙๑.๒๖	๕,๓๒๖	๙๑.๒๖
๔	สนช.ปทุมวัน	๑,๗๑๐	๑,๗๑๐	๑๐๐	๑,๗๑๐	๑๐๐
๕	สนช.คลองเตย	๓,๓๓๖	๓,๓๓๖	๑๐๐	๓,๓๓๖	๑๐๐
๖	สนช.วัฒนา	๑๐,๘๑๕	๑๐,๘๑๕	๑๐๐	๑๐,๘๑๕	๑๐๐
๗	สนช.สาทร	๓,๑๒๕	๓,๑๒๕	๑๐๐	๓,๑๒๕	๑๐๐
๘	สนช.บางคอแหลม	๑๖,๕๓๙	๙,๒๒๔	๕๕.๗๗	๙,๒๒๔	๕๕.๗๗
๙	สนช.ยานนาวา	๔๔,๓๙๒	๔๔,๓๙๒	๑๐๐	๔๔,๓๙๒	๑๐๐
๑๐	สนช.สวนหลวง	๒๙,๖๕๐	๒๙,๖๕๐	๑๐๐	๒๙,๖๕๐	๑๐๐
	รวม/เฉลี่ย	๑๒๙,๘๔๔	๑๒๑,๖๖๓	๙๓.๗๐	๑๒๒,๐๑๙	๙๓.๗๗

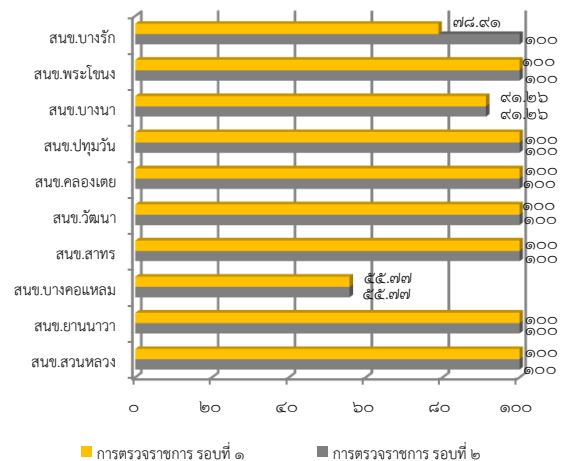

หมายเหตุ : สำนักงานเขตบางนามีคูคลอง/ลำรางสาธารณะที่ไม่มีสภาพเป็นคลอง ความยาว ๕๑๐

๒.๒ ความพร้อมด้านอื่น ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

๑) ความพร้อมของหน่วย BEST

- ความพร้อมด้านคน (เจ้าหน้าที่) ทุกสำนักงานเขตมีความพร้อมเรื่องคน
- ความพร้อมด้านวัสดุ/อุปกรณ์ สำนักงานเขตที่มีความพร้อมเรื่องวัสดุ/อุปกรณ์

จำนวน ๙ สำนักงานเขต ยกเว้นสำนักงานเขตบางนา มีเครื่องสูบน้ำไม่เพียงพอ (อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากสำนักการระบายน้ำจำนวน ๙ เครื่อง)

๒) ความพร้อมของแผนปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ มีความพร้อมของแผนปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม และแผนบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๙ สำนักงานเขต (ร้อยละ ๙๐) ยกเว้นสำนักงานเขตคลองเตย เนื่องจากสำนักงานเขตมีหน้าที่ที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นอยู่แล้วจึงไม่มีแผนดังกล่าว

๓) ความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

ทุกสำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม จำนวน ๙ สำนักงานเขต ยกเว้นสำนักงานเขตพระโขนง เนื่องจากคำสั่งการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมจะออกในช่วงฤดูฝน

๔) การประชุมเตรียมความพร้อม

ทุกสำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ มีการประชุมเตรียมความพร้อม อย่างน้อย

๑ - ๔ ครั้งต่อเดือน

๕) ความพร้อมในการติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ในพื้นที่น้ำท่วม

- สำนักงานเขตที่มีการติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ ครบ ๑๐๐% จำนวน ๗ สำนักงานเขต คือ สำนักงานเขตพระโขนง สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตบางคอแหลม และสำนักงานเขตยานนาวา

- สำนักงานเขตที่ไม่มีการติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน ๑ สำนักงานเขต คือ สำนักงานเขตบางรัก เนื่องจากพื้นที่คับแคบไม่สามารถวางเครื่องสูบน้ำได้ เพราะจะทำให้การจราจรติดขัด และได้กำหนดแนวทางแก้ไข โดยการขอจัดสรรงบประมาณในการวางท่อระบายน้ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และเพิ่มเติมบางจุด

- สำนักงานเขตที่มีการติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์แต่ยังดำเนินการไม่ครบ จำนวน ๒ สำนักงานเขต คือ สำนักงานเขตบางนา เนื่องจากอยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ จากสำนักการระบายน้ำ จำนวน ๙ เครื่อง และสำนักงานเขตสวนหลวง เนื่องจากอยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการซ่อมบำรุงและจัดหาเครื่องสูบน้ำ และวัสดุ/อุปกรณ์ ซึ่งจะติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

๖) ความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมส่วนหน้า

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ มีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมส่วนหน้าในพื้นที่ โดยมีการกำหนดบริเวณจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในพื้นที่ส่วนหน้า ครบ ๑๐๐% ทุกสำนักงานเขต แต่มีสำนักงานเขตที่มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ และบูรณาการการทำงาน จำนวน ๘ สำนักงานเขต ยกเว้นสำนักงานเขตพระโขนง และสำนักงานเขตคลองเตย

๓. ความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อนของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้

๓.๑ สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ จำนวน ๖ สำนักงานเขต (ร้อยละ ๖๐) มีการกำหนดแผนและมาตรการลดผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ได้แก่ สำนักงานเขตบางนา สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตบางคอแหลม สำนักงานเขตยานนาวา และสำนักงานเขตสวนหลวง และสำนักงานเขตที่ไม่มีการกำหนดแผนและมาตรการลดผลกระทบจากพายุฤดูร้อน จำนวน ๔ สำนักงานเขต ได้แก่ สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตพระโขนง สำนักงานเขตคลองเตย และสำนักงานเขตวัฒนา

๓.๒ สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ทุกสำนักงานเขต มีการสำรวจตรวจสอบความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง เช่น ป้ายโฆษณา เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากพายุฤดูร้อน โดยการออกหนังสือแจ้งเจ้าของอาคารให้ดำเนินการตรวจสอบสภาพการใช้ และความมั่นคงแข็งแรงของป้ายโฆษณา โครงเหล็ก และได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของต้นไม้ในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ ครบทุกสำนักงานเขต

๓.๓ สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ จำนวน ๖ สำนักงานเขต (ร้อยละ ๖๐) คือ สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตบางนา สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตบางคอแหลม สำนักงานเขตยานนาวา และสำนักงานเขตสวนหลวง มีแผนรองรับในกรณีเกิดเหตุต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายจากพายุ ส่วนสำนักงานเขตอีกจำนวน ๔ สำนักงานเขต (ร้อยละ ๔๐) ไม่มีแผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายจากพายุ คือ สำนักงานเขตพระโขนง สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตคลองเตย และสำนักงานเขตวัฒนา

๒.๔ กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครกลาง

กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครกลาง ประกอบด้วย ๙ สำนักงานเขต ได้แก่ สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สำนักงานเขตพญาไท สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขตห้วยขวาง สำนักงานเขตราชเทวี และสำนักงานเขตวังทองหลาง มีผลการดำเนินงาน (รายละเอียดปรากฏในบทที่ ๒ ส่วนที่ ๔ ของรายงานฉบับนี้) สรุปได้ดังนี้

๑. จำนวนพื้นที่น้ำท่วม

จากข้อมูลการตรวจราชการของเขตตรวจราชการ รอบที่ ๑ สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด ๔๔ จุด จำแนกเป็น จุดเฝ้าระวัง จำนวน ๑๗ จุด จุดเร่งระบายน้ำ จำนวน ๑๐ จุด และ จุดอ่อนน้ำท่วม จำนวน ๒๒ จุด แต่เนื่องจากบางสำนักงานเขตได้กำหนดจุดเฝ้าระวัง จุดอ่อนน้ำท่วม และจุดเร่งระบายน้ำ อยู่ในบริเวณจุดเดียวกัน จึงทำให้พื้นที่น้ำท่วมในกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร รวม ๓๔ จุด

๒. ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม


๒.๑ ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ และระบบการระบายน้ำ

ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์				
		จำนวน (เครื่อง)	การตรวจราชการ รอบที่ ๑		การตรวจราชการ รอบที่ ๒	
			มีความพร้อม	ร้อยละ	มีความพร้อม	ร้อยละ
๑	สนช.พระนคร	๒	๒	๑๐๐	๒	๑๐๐
๒	สนช.ดุสิต	๑๓	๑๒	๙๒.๓๑	๑๓	๑๐๐
๓	สนช.ป้อมปราบฯ	๗	๗	๑๐๐	๗	๑๐๐
๔	สนช.สัมพันธวงศ์	๓	๓	๑๐๐	๓	๑๐๐
๕	สนช.พญาไท	๗	๗	๑๐๐	๗	๑๐๐
๖	สนช.ดินแดง	๒	๒	๑๐๐	๒	๑๐๐
๗	สนช.ห้วยขวาง	๖	๖	๑๐๐	๖	๑๐๐
๘	สนช.ราชเทวี	๒	-	๐	๒	๑๐๐
๙	สนช.วังทองหลาง	๓๐	๒๙	๙๖.๖๗	๓๐	๑๐๐
รวม/เฉลี่ย		๗๒	๖๘	๙๔.๔๔	๗๒	๑๐๐

หมายเหตุ : ๑. เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๖๙ เครื่อง, เครื่องจักรกล จำนวน ๓ เครื่อง (รอบที่ ๑-๒ ความพร้อมเครื่องจักรกล ๑๐๐%)

๒. เครื่องสูบน้ำของ สนช.พญาไท จำนวน ๒ เครื่อง สน. ยืมไป (เหลืออยู่ที่ สนช.พญาไท ๕ เครื่อง)

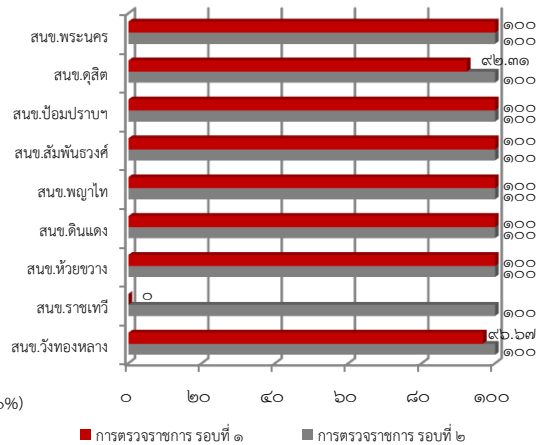

ความพร้อมของท่อระบายน้ำ


ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ความพร้อมของท่อระบายน้ำ				
		ความยาว (เมตร)	การตรวจราชการ รอบที่ ๑		การตรวจราชการ รอบที่ ๒	
			มีความพร้อม	ร้อยละ	มีความพร้อม	ร้อยละ
๑	สนช.พระนคร	๒๖,๒๓๕	๒๖,๒๓๕	๑๐๐	๒๖,๒๓๕	๑๐๐
๒	สนช.ดุสิต	๔๕,๙๕๕	๔๕,๙๕๕	๑๐๐	๔๕,๙๕๕	๑๐๐
๓	สนช.ป้อมปราบฯ	๑๕,๑๑๕	๑๕,๑๑๕	๑๐๐	๑๕,๑๑๕	๑๐๐
๔	สนช.สัมพันธวงศ์	๑๑,๙๕๑	๑๑,๙๕๑	๑๐๐	๑๑,๙๕๑	๑๐๐
๕	สนช.พญาไท	๘๒,๙๕๕	๘๒,๙๕๕	๑๐๐	๘๒,๙๕๕	๑๐๐
๖	สนช.ดินแดง	๑๐๕,๙๘๗	๑๐๕,๙๘๗	๑๐๐	๑๐๕,๙๘๗	๑๐๐
๗	สนช.ห้วยขวาง	๑๔๕,๒๔๒	๑๔๕,๒๔๒	๑๐๐	๑๔๕,๒๔๒	๑๐๐
๘	สนช.ราชเทวี	๓๖,๗๔๓	๒,๙๔๓	๑๐๐	๒,๙๔๓	๑๐๐
๙	สนช.วังทองหลาง	๕๗,๘๙๘	๕๗,๘๙๘	๑๐๐	๕๗,๘๙๘	๑๐๐
รวม/เฉลี่ย		๕๒๘,๐๘๑	๔๙๔,๒๘๑	๑๐๐	๔๙๔,๒๘๑	๑๐๐



ความพร้อมของคูคลอง/ลำรางสาธารณะ

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ความพร้อมของคูคลอง/ลำรางสาธารณะ				
		ความยาว (เมตร)	การตรวจราชการ รอบที่ ๑		การตรวจราชการ รอบที่ ๒	
			มีความพร้อม	ร้อยละ	มีความพร้อม	ร้อยละ
๑	สนช.พระนคร	๗๔๓	๗๔๓	๑๐๐	๗๔๓	๑๐๐
๒	สนช.ดุสิต	๘,๒๐๕	๗,๕๕๕	๙๒.๐๘	๗,๕๕๕	๙๒.๐๘
๓	สนช.ป้อมปราบฯ	๙๘๖	๙๘๖	๑๐๐	๙๘๖	๑๐๐
๔	สนช.สัมพันธวงศ์	-	-	-	-	-
๕	สนช.พญาไท	๑,๑๓๐	๑,๑๓๐	๑๐๐	๑,๑๓๐	๑๐๐
๖	สนช.ดินแดง	๑,๐๑๑	๑,๐๑๑	๑๐๐	๑,๐๑๑	๑๐๐
๗	สนช.ห้วยขวาง	๕,๙๕๙	๑,๗๑๙	๒๘.๘๕	๕,๙๕๙	๑๐๐
๘	สนช.ราชเทวี	๙๘๒	๙๘๒	๑๐๐	๙๘๒	๑๐๐
๙	สนช.วังทองหลาง	๖,๒๔๖	๖,๒๐๖	๙๙.๓๖	๖,๒๐๖	๙๙.๓๖
รวม/เฉลี่ย		๒๕,๖๖๒	๒๐,๓๓๒	๘๐.๔๘	๒๐,๕๗๒	๙๗.๒๗

หมายเหตุ : สนช.ดุสิต และ สนช.วังทองหลาง ไม่ได้บำรุงรักษาเนื่องจากคลองที่ไม่พร้อมในการระบายน้ำ ปัจจุบันไม่มีสภาพเป็นคูคลอง/ลำราง

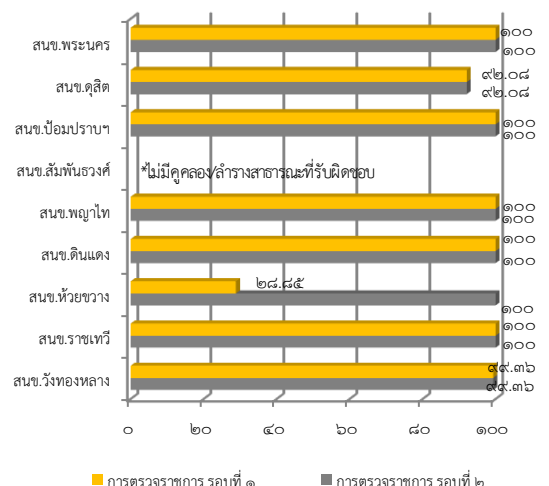

๒.๒ ความพร้อมด้านอื่น ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

๑) ความพร้อมของหน่วย BEST

ทุกสำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร มีความพร้อมด้านคน และวัสดุ/อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน

๒) ความพร้อมของแผนปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม

ทุกสำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร มีความพร้อมของแผนปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม และแผนบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓) ความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพมหานคร มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จำนวน ๗ สำนักงานเขต ยกเว้นสำนักงานเขตพระนคร (ไม่ระบุเหตุผล) และสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เนื่องจากไม่มีจุดอ่อนน้ำท่วมและไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

๔) การประชุมเตรียมความพร้อม

ทุกสำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร มีการประชุมเตรียมความพร้อม อย่างน้อย

๑ - ๒ ครั้งต่อเดือน

๕) ความพร้อมในการติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ในพื้นที่น้ำท่วม

- สำนักงานเขตที่มีการติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ ครบ ๑๐๐% จำนวน ๕ สำนักงานเขต คือ สำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตพญาไท สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขตห้วยขวาง และสำนักงานเขตราชเทวี

- สำนักงานเขตที่ไม่มีการติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน ๒ สำนักงานเขต คือ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เนื่องจาก ในพื้นที่เขตไม่มีจุดอ่อนน้ำท่วม และไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังภายในพื้นที่ และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เนื่องจาก พื้นที่แคบ มีปัญหาเรื่องการจราจร แนวทางการแก้ไข กรณีมีน้ำท่วมขัง จะจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขทันที โดยการเปิดฝาท่อระบายน้ำช่วยเร่งการระบายน้ำ

- สำนักงานเขตที่มีการติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์แต่ยังดำเนินการไม่ครบ จำนวน ๒ สำนักงานเขต คือ ๑) สำนักงานเขตพระนคร เนื่องจากจุดน้ำท่วมซ้ำซากบริเวณถนนบ้านหม้อ ใช้การระบายน้ำด้วยระบบท่อเพียงอย่างเดียว (ท่อชนิดรางยู ๔๐ เซนติเมตร) กรณีดังกล่าวได้กำหนดแนวทางแก้ไขโดยให้สำนักการระบายน้ำ ปรับปรุงระบบระบายน้ำของถนนจักรเพชร และท่อลอดจากท่อระบายน้ำของถนนบ้านหม้อ และ ๒) สำนักงานเขตวังทองหลาง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไปแล้ว จำนวน ๒ จุด และกำหนดจะติดตั้งเพิ่มเติมในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งอยู่ในช่วงปฏิบัติงานนอกเวลาทำการของเจ้าหน้าที่ ทำให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรเฝ้าเครื่องสูบน้ำ

๖) ความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้า

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพมหานคร มีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้าในพื้นที่ โดยมีการกำหนดบริเวณจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ส่วนหน้า จำนวน ๖ สำนักงานเขต คือ สำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตพญาไท สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขตห้วยขวาง สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตวังทองหลาง

๓. ความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อนของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพมหานคร

๓.๑ สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพมหานคร จำนวน ๘ สำนักงานเขต (ร้อยละ ๘๘.๘๙)

มีการกำหนดแผนและมาตรการลดผลกระทบจากพายุฤดูร้อน และสำนักงานเขตที่ไม่มีการกำหนดแผนฯ จำนวน ๑ สำนักงานเขต คือ สำนักงานเขตดุสิต

๓.๒ สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพมหานคร มีการสำรวจตรวจสอบความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง เช่น ป้ายโฆษณา เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากพายุฤดูร้อน โดยการออกหนังสือแจ้งเจ้าของอาคารให้ดำเนินการตรวจสอบสภาพการใช้ และความมั่นคงแข็งแรงของป้ายโฆษณาโครงเหล็ก และได้จัด

เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของต้นไม้ในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอจำนวน ๘ สำนักงานเขต และมีจำนวน ๑ สำนักงานเขต คือ สำนักงานเขตดุสิต ยังไม่ดำเนินการเรื่องดังกล่าว

๓.๓ สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพมหานคร จำนวน ๗ สำนักงานเขต (ร้อยละ ๗๗.๗๘) คือ สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักงานเขตพญาไท สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขตห้วยขวาง สำนักงานเขตราชเทวี และสำนักงานเขตวังทองหลาง มีแผนรองรับในกรณีเกิดเหตุต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายจากพายุ ส่วนสำนักงานเขตอีก ๒ สำนักงานเขต (ร้อยละ ๒๒.๒๒) ไม่มีแผนรองรับ คือ สำนักงานเขตดุสิต และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

๒.๕ กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร

กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ๘ สำนักงานเขต ได้แก่ สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตบางพลัด สำนักงานเขตตลิ่งชัน สำนักงานเขตทวีวัฒนา สำนักงานเขตคลองสาน สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ และสำนักงานเขตจอมทอง มีผลการดำเนินงาน (รายละเอียดปรากฏในบทที่ ๒ ส่วนที่ ๕ ของรายงานฉบับนี้) สรุปได้ดังนี้

๑. จำนวนพื้นที่น้ำท่วม

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด จำนวน ๓๔ จุด โดยจำแนกเป็นจุดเฝ้าระวังจำนวน ๙ จุด จุดเร่งระบาย จำนวน ๑๐ จุด และ จุดอ่อนน้ำท่วม จำนวน ๑๕ จุด


๒. ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

๒.๑ ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ และระบบการระบายน้ำ

ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์


ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวน (เครื่อง)	ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์			
			การตรวจราชการ รอบที่ ๑		การตรวจราชการ รอบที่ ๒	
			มีความพร้อม	ร้อยละ	มีความพร้อม	ร้อยละ
๑	สนช.บางกอกน้อย	๖	๖	๑๐๐	๖	๑๐๐
๒	สนช.บางพลัด	๘	๘	๑๐๐	๘	๑๐๐
๓	สนช.ตลิ่งชัน	๒๐	๒๐	๑๐๐	๒๐	๑๐๐
๔	สนช.ทวีวัฒนา	๑๕	๑๕	๑๐๐	๑๕	๑๐๐
๕	สนช.คลองสาน	๑๗	๑๓	๗๖.๔๗	๑๗	๑๐๐
๖	สนช.ธนบุรี	๔	๔	๑๐๐	๔	๑๐๐
๗	สนช.บางกอกใหญ่	๗	๕	๗๑.๔๓	๕	๗๑.๔๓
๘	สนช.จอมทอง	๘	๘	๑๐๐	๘	๑๐๐
รวม/เฉลี่ย		๘๕	๗๙	๙๒.๙๔	๘๓	๙๗.๖๕

หมายเหตุ : เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๗๗ เครื่อง, เครื่องจักรกล จำนวน ๘ เครื่อง (รอบที่ ๑-๒ ความพร้อมเครื่องจักรกล ๑๐๐%)

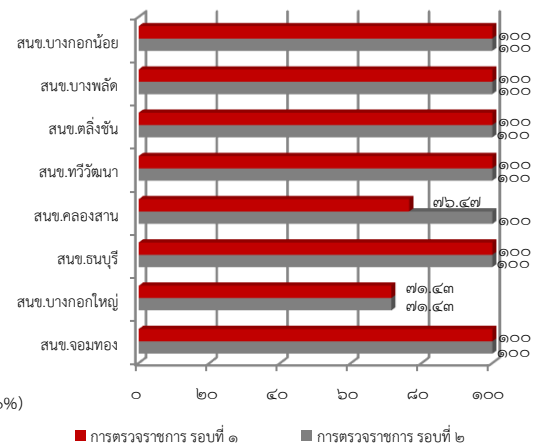


ความพร้อมของท่อระบายน้ำ

ลำดับที่	หน่วยงาน	ความยาว (เมตร)	ความพร้อมของท่อระบายน้ำ			
			การตรวจราชการ รอบที่ ๑		การตรวจราชการ รอบที่ ๒	
			มีความพร้อม	ร้อยละ	มีความพร้อม	ร้อยละ
๑	สนช.บางกอกน้อย	๓๕,๐๒๑	๓๕,๐๒๑	๑๐๐	๓๕,๐๒๑	๑๐๐
๒	สนช.บางพลัด	๗๒,๒๓๑	๗๒,๒๓๑	๑๐๐	๗๒,๒๓๑	๑๐๐
๓	สนช.ตลิ่งชัน	๗๕,๑๖๓	๗๕,๑๖๓	๑๐๐	๗๕,๑๖๓	๑๐๐
๔	สนช.ทวีวัฒนา	๑๐๙,๗๕๑	๑๐๔,๗๐๐	๙๕.๕๐	๑๐๙,๗๕๑	๑๐๐
๕	สนช.คลองสาน	๓๕,๖๒๗	๓๕,๖๒๗	๑๐๐	๓๕,๖๒๗	๑๐๐
๖	สนช.ธนบุรี	๔๑,๗๕๐	๔๑,๗๕๐	๑๐๐	๔๑,๗๕๐	๑๐๐
๗	สนช.บางกอกใหญ่	๒๙,๐๖๙	๙,๘๓๗	๓๓.๘๔	๒๓,๑๒๔	๗๙.๕๕
๘	สนช.จอมทอง	๗๓,๘๗๐	๗๓,๘๗๐	๑๐๐	๗๓,๘๗๐	๑๐๐
รวม/เฉลี่ย		๔๗๒,๔๘๒	๔๔๘,๑๙๙	๙๔.๘๖	๔๖๖,๕๓๗	๙๗.๙๔

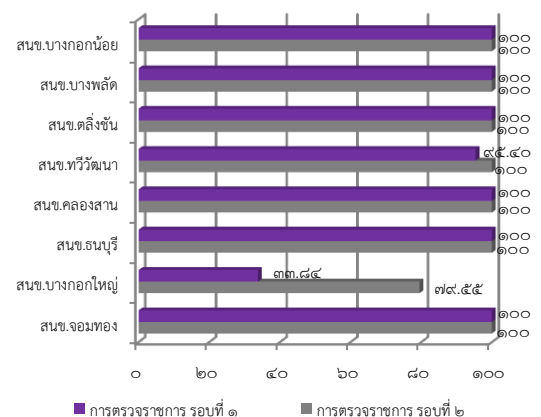

ความพร้อมของบุคคล/สำรา้งสาธารณะ

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ความพร้อมของบุคคล/สำรา้งสาธารณะ				
		ความยาว (เมตร)	การตรวจราชการ รอบที่ ๑		การตรวจราชการ รอบที่ ๒	
			มีความพร้อม	ร้อยละ	มีความพร้อม	ร้อยละ
๑	สนช.บางกอกน้อย	๒๗,๘๔๒	๒๖,๕๙๒	๙๕.๕๑	๒๗,๘๔๒	๑๐๐
๒	สนช.บางพลัด	๒๐,๖๙๙	๒๐,๖๙๙	๑๐๐	๒๐,๖๙๙	๑๐๐
๓	สนช.ตลิ่งชัน	๓๕,๙๕๐	๓๑,๖๔๐	๘๘.๐๑	๓๕,๙๕๐	๑๐๐
๔	สนช.ทวีวัฒนา	๓๔,๘๙๖	๓๔,๘๙๖	๑๐๐	๓๔,๘๙๖	๑๐๐
๕	สนช.คลองสาน	๑๑,๕๒๕	๙,๕๐๕	๘๒.๙๗	๑๐,๓๓๓	๘๙.๖๖
๖	สนช.ธนบุรี	๒๐,๙๔๖	๒๐,๙๔๖	๑๐๐	๒๐,๙๔๖	๑๐๐
๗	สนช.บางกอกใหญ่	๒๖,๓๓๓	๒๓,๙๓๙	๑๐๐	๒๖,๓๓๓	๑๐๐
๘	สนช.จอมทอง	๖๗,๔๖๖	๖๗,๔๖๖	๑๐๐	๖๗,๔๖๖	๑๐๐
	รวม/เฉลี่ย	๒๔๕,๖๕๗	๒๓๕,๖๘๓	๙๕.๙๔	๒๔๕,๖๖๕	๙๙.๕๑

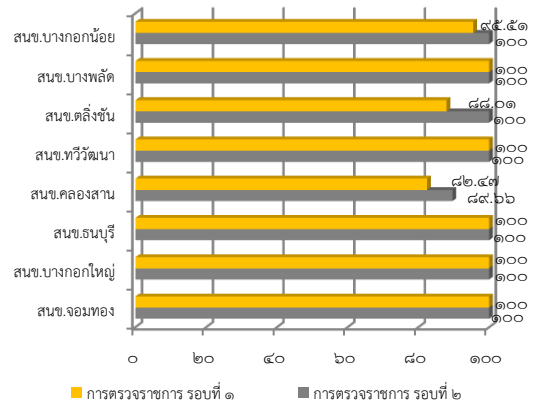

๒.๒ ความพร้อมด้านอื่น ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

๑) ความพร้อมของหน่วย BEST

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพมหานครเหนือ มีความพร้อมของหน่วย BESTทุกสำนักงานเขตทั้งด้านคน และด้านวัสดุ/อุปกรณ์

๒) ความพร้อมของแผนปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพมหานครเหนือ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ครบถ้วนทุกสำนักงานเขต

๓) ความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพมหานครเหนือ มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ครบถ้วนทุกสำนักงานเขต

๔) การประชุมเตรียมความพร้อม

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพมหานครเหนือ มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ครบถ้วนทุกสำนักงานเขต

๕) ความพร้อมในการติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ในพื้นที่น้ำท่วม

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพมหานครเหนือ จำนวน ๗ สำนักงานเขต มีความพร้อมในการติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ในพื้นที่น้ำท่วม ได้แก่ สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตตลิ่งชัน สำนักงานเขตทวีวัฒนา สำนักงานเขตคลองสาน สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ และสำนักงานเขตจอมทอง ส่วนสำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ในพื้นที่น้ำท่วม

๖) ความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมส่วนหน้า

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพมหานครตะวันออก มีรายงานการกำหนดจุดจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมส่วนหน้าและจัดทำคำสั่งจัดตั้งศูนย์ป้องกันฯ ครบถ้วนทุกสำนักงานเขต ส่วนสำนักงานเขตจอมทองมีการจัดตั้งศูนย์ฯ แต่ยังไม่ได้จัดทำคำสั่งฯ

๓. ความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อนของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพมหานครเหนือ

๓.๑ สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพมหานครเหนือ มีการกำหนดแผนและมาตรการลดผลกระทบจากพายุฤดูร้อนรวมทั้งการสร้างความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุครบทุกหน่วยงาน ยกเว้นเพียงสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ที่ไม่มีการดำเนินการ

๓.๒ สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพมหานครเหนือ มีการสำรวจตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง/ต้นไม้ที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนครบทุกหน่วยงาน ยกเว้นเพียงสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ที่ไม่มีการดำเนินการ

๓.๓ สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพมหานครเหนือ มีการจัดทำแผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายจากพายุ จำนวน ๔ สำนักงานเขต ได้แก่ สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตบางพลัด สำนักงานเขตตลิ่งชัน และสำนักงานเขตคลองสาน

๒.๖ กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร

กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ๗ สำนักงานเขต ได้แก่ สำนักงานเขตบางบอน สำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักงานเขตบางแค สำนักงานเขตหนองแขม สำนักงานเขตบางขุนเทียน สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ และสำนักงานเขตทุ่งครุ มีผลการดำเนินงาน (รายละเอียดปรากฏในบทที่ ๒ ส่วนที่ ๖ ของรายงานฉบับนี้) สรุปได้ดังนี้

๑. จำนวนพื้นที่น้ำท่วม

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด จำนวน ๑๓ จุด โดยจำแนกเป็นจุดเฝ้าระวัง จำนวน ๘ จุด จุดเร่งระบาย จำนวน ๓๕ จุด และ จุดอ่อนน้ำท่วม จำนวน ๕๖ จุด รายละเอียดดังนี้

๒. ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม


๒.๑ ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ และระบบการระบายน้ำ

ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	จำนวน (เครื่อง)	ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์			
			การตรวจราชการ รอบที่ ๑		การตรวจราชการ รอบที่ ๒	
			มีความพร้อม	ร้อยละ	มีความพร้อม	ร้อยละ
๑	สนช.บางบอน	๒๒	๒๐	๙๐.๙๑	๒๒	๑๐๐
๒	สนช.ภาษีเจริญ	๑๓	๑๓	๑๐๐	๑๓	๑๐๐
๓	สนช.บางแค	๑๙	๑๕	๗๘.๙๕	๑๙	๑๐๐
๔	สนช.หนองแขม	๑๔	๑๓	๙๒.๘๖	๑๓	๑๐๐
๕	สนช.บางขุนเทียน	๒๕	๒๑	๘๔	๒๕	๑๐๐
๖	สนช.ราชบุรีบูรณะ	๑๙	๑๖	๘๔.๒๑	๑๙	๑๐๐
๗	สนช.ทุ่งครุ	๑๗	๑๖	๙๔.๑๒	๑๗	๑๐๐
รวม/เฉลี่ย		๑๒๙	๑๑๔	๘๘.๓๗	๑๒๘	๑๐๐


หมายเหตุ : ๑. เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑๒๕ เครื่อง, เครื่องจักรกล จำนวน ๔ เครื่อง (รอบที่ ๒ ความพร้อมเครื่องจักรกล ๑๐๐%)

๒. สนช.หนองแขม มีเครื่องสูบน้ำอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เครื่อง แต่ยังเพียงพอดำเนินการ

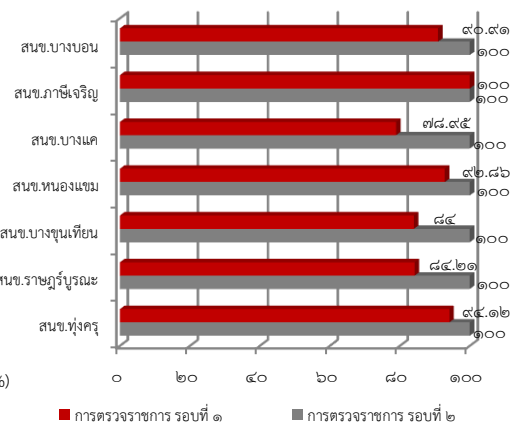


ความพร้อมของท่อระบายน้ำ

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ความยาว (เมตร)	ความพร้อมของท่อระบายน้ำ			
			การตรวจราชการ รอบที่ ๑		การตรวจราชการ รอบที่ ๒	
			มีความพร้อม	ร้อยละ	มีความพร้อม	ร้อยละ
๑	สนช.บางบอน	๙๒,๙๖๗	๙๒,๙๖๗	๑๐๐	๙๒,๙๖๗	๑๐๐
๒	สนช.ภาษีเจริญ	๘๕,๗๑๖	๓๗,๘๒๔	๔๔.๑๓	๘๕,๗๑๖	๑๐๐
๓	สนช.บางแค	๖๖,๗๕๙	๑๘,๔๔๔	๒๗.๖๓	๖๖,๗๕๙	๑๐๐
๔	สนช.หนองแขม	๖๐,๔๖๕	๑๘,๗๘๓	๓๑.๐๖	๖๐,๔๖๕	๑๐๐
๕	สนช.บางขุนเทียน	๑๓๓,๘๓๔	๑๑๙,๖๐๗	๘๙.๘๑	๑๓๓,๘๓๔	๑๐๐
๖	สนช.ราชบุรีบูรณะ	๑๑๙,๑๘๗	๙๐,๖๑๔	๗๖.๐๓	๑๑๙,๑๘๗	๑๐๐
๗	สนช.ทุ่งครุ	๕๑,๓๒๔	๒๙,๙๖๖	๕๘.๓๙	๕๑,๓๒๔	๑๐๐
รวม/เฉลี่ย		๖๕๐,๒๕๒	๔๐๘,๒๐๕	๖๒.๗๘	๖๕๐,๒๕๒	๑๐๐

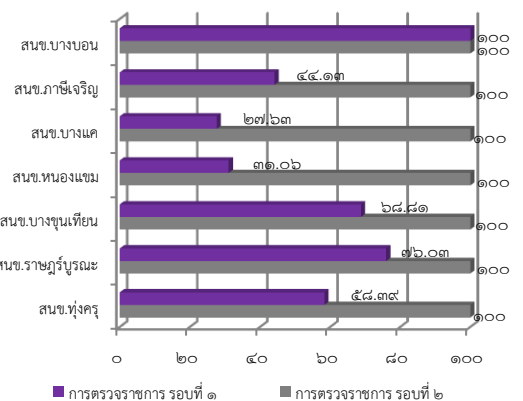

ความพร้อมของคูคลอง/ลำรางสาธารณะ

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ความยาว (เมตร)	ความพร้อมของคูคลอง/ลำรางสาธารณะ			
			การตรวจราชการ รอบที่ ๑		การตรวจราชการ รอบที่ ๒	
			มีความพร้อม	ร้อยละ	มีความพร้อม	ร้อยละ
๑	สนช.บางบอน	๔๔,๓๗๐	๔๔,๓๗๐	๑๐๐	๔๔,๓๗๐	๑๐๐
๒	สนช.ภาษีเจริญ	๗๕,๒๕๒	๒๖,๗๓๐	๓๕.๕๒	๗๕,๒๕๒	๑๐๐
๓	สนช.บางแค	๖๔,๑๕๕	๔๑,๘๖๕	๖๕.๒๖	๖๔,๑๕๕	๑๐๐
๔	สนช.หนองแขม	๑๙,๐๗๘	๑๙,๐๗๘	๑๐๐	๑๙,๐๗๘	๑๐๐
๕	สนช.บางขุนเทียน	๑๘๗,๑๙๓	๑๒๙,๓๓๓	๖๙.๐๘	๑๘๗,๑๙๓	๑๐๐
๖	สนช.ราชบุรีบูรณะ	๒๔,๓๓๓	๒๔,๓๓๓	๑๐๐	๒๔,๓๓๓	๑๐๐
๗	สนช.ทุ่งครุ	๖๖,๓๓๐	-	๐	๖๖,๓๓๐	๑๐๐
รวม/เฉลี่ย		๔๘๐,๗๐๙	๒๘๕,๖๘๗	๕๙.๔๓	๔๘๐,๗๐๙	๑๐๐

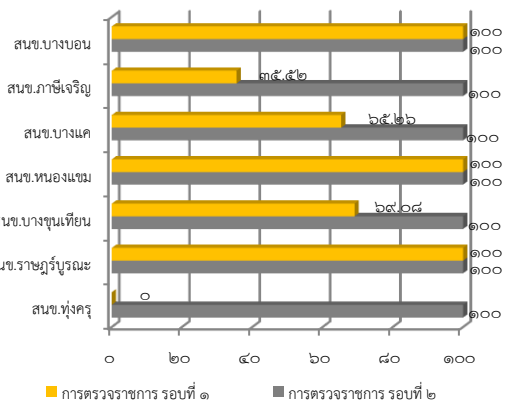

๒.๒ ความพร้อมด้านอื่น ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

๑) ความพร้อมของหน่วย BEST

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ มีความพร้อมของหน่วย BEST ๑๐๐% จำนวนลูกจ้าง มีเพียงพอ มีการจัดชุดเพื่อให้เตรียมพร้อมในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนยามเกิดเหตุ น้ำท่วม มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานฯ ในแต่ละวันมีเจ้าหน้าที่หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนการทำงานทั้งในช่วงเวลาราชการและนอกเวลาราชการ

๒) ความพร้อมของแผนปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม วัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเสียหายทางเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค ทรัพย์สิน และความเดือดร้อนของ ประชาชน เป้าหมายลดจุดน้ำท่วมที่เคยท่วมเล็กน้อยให้เป็นจุดที่ไม่ท่วม ลดและควบคุมระดับน้ำท่วม ลดระดับ ความลึก รวมทั้งลดระยะเวลาท่วมขัง

๓) ความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ณ บริเวณ สำนักงานเขต จำนวน ๖ สำนักงานเขต ยกเว้นสำนักงานเขตทุ่งครุที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ

๔) การประชุมเตรียมความพร้อม

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ มีการประชุมเตรียมความพร้อม เฉลี่ยแล้ว ๑ ครั้งต่อเดือน มีเพียงสำนักงานเขตทุ่งครุที่ยังอยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งให้เป็นปัจจุบันและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังไม่มีการประชุม

๕) ความพร้อมในการติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ในพื้นที่น้ำท่วม

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ มีการติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ ในจุด/บริเวณเฝ้าระวัง/ จุดที่น้ำท่วมซ้ำซากครบ ๑๐๐%

๖) ความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมส่วนหน้า

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมส่วนหน้า ดังนี้
- สำนักงานเขตทุ่งครุยังไม่ได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมส่วนหน้า และ คำสั่งมอบหมายหน้าที่และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น โดยอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งให้เป็นปัจจุบัน

- สำนักงานเขตบางขุนเทียน มีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมส่วนหน้า กำหนดจุดบริเวณถนนพระรามที่ ๒ ซอย ๖๙ ตามคำสั่งสำนักงานเขตบางขุนเทียน ที่ ๒๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกกรณีเกิดเหตุ น้ำท่วมขังในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

- สำนักงานเขตบางบอน มีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมส่วนหน้า กำหนดจุดบริเวณหน้าบริษัท กระทิงแดง จำกัด (ซอยเอกชัย ๖๘) ตามคำสั่งสำนักงานเขตบางบอน ที่ ๑๓๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ป้องกันน้ำท่วมและแก้ไขปัญหา ส่วนหน้า

- สำนักงานเขตภาษีเจริญ มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมส่วนหน้า บริเวณหน้าศูนย์สรรพสินค้าซีคอนบางแค ตามคำสั่งสำนักงานเขตภาษีเจริญ ที่ ๑๐๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมส่วนหน้า

- สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ มีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมส่วนหน้า กำหนดจุดบริเวณใต้สะพานพระราม ๙ บริเวณหน้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย และซอยสุขสวัสดิ์ ๓๐

- สำนักงานเขตบางแค มีการกำหนดจุดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมส่วน หน้า บริเวณวงเวียนอุทอง หมู่บ้านเศรษฐกิจ ตามคำสั่งสำนักงานเขตบางแค ที่ ๖๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และตามคำสั่งสำนักงานเขตบางแค ที่ ๖๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

- สำนักงานเขตหนองแขม มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้าบริเวณถนนเลียบคลองภาษีเจริญ ฝั่งเหนือ ซอย ๖ (ซอยสุนทร ๔) และมีคำสั่งมอบหมายหน้าที่และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น ตามคำสั่งสำนักงานเขตหนองแขม ที่ ๖๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

๓. ความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อนของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้

๓.๑ สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ มีการกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากวาตภัยและพายุฤดูร้อน เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ รวมทั้งวัสดุ/อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ มีประสิทธิภาพ

๓.๒ สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ มีการตรวจสอบความแข็งแรงของป้ายโฆษณาและต้นไม้ตามแนวสายไฟ ครบ ๑๐๐% จากการตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้างและต้นไม้ในพื้นที่ มีความแข็งแรงของป้ายโฆษณาและตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้า

๓.๓ สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ มีการกำหนดแผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน

ข้อพิจารณาและเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครในภาพรวม

๑. เมื่อพิจารณาผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก” สำนักงานระบายน้ำและสำนักงานเขต มีการเตรียมความพร้อมของท่อระบายน้ำ คูคลอง/ลำรางสาธารณะ และเครื่องมือ/เครื่องจักรกล พร้อมแผนปฏิบัติการ เพื่อป้องกันน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเห็นได้ว่าหน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้นจากการตรวจรอบที่ ๑ แต่ยังมีบางหน่วยงานที่ยังดำเนินการเตรียมความพร้อมไม่ครบถ้วน ๑๐๐% และกรุงเทพมหานครมีจุดเฝ้าระวัง ๑๗๐ จุด จุดเร่งระบายน้ำ ๘๘ จุด และจุดอ่อนน้ำท่วม ๒๒๐ จุด ซึ่งในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการเตรียมความพร้อมตามปัจจัยข้างต้นเพียงเท่านั้น สำนักงานระบายน้ำ และสำนักงานเขต ต้องวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขกรณีดังกล่าว ที่ได้ผลในระยะยาว เช่น เพิ่มขนาดท่อระบายน้ำ ยกระดับผิวจราจร การก่อสร้างเขื่อน/ประตูระบายน้ำ บ่อสูบล ฯลฯ เพื่อให้มีจำนวนพื้นที่น้ำท่วมลดน้อยลงเรื่อย ๆ

๒. คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเห็นว่า ทุกหน่วยงานควรมีความพร้อมในการทำงาน โดยมีการทำงานเชิงระบบ กล่าวคือ มีระบบฐานข้อมูลที่ดี มีการวางแผนการทำงาน มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ดังนั้น สำนักงานระบายน้ำ และสำนักงานเขต ควรให้ความสำคัญกับการทำงานเชิงระบบให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา ตามที่คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๒ ได้ให้ข้อเสนอแนะ

๓. หน่วยงานควรสำรวจจุดอ่อนน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง และจัดทำแผนงานแก้ไขระยะยาว

๔. หน่วยงานต้องดำเนินการขุดลอกคูคลอง ท่อระบายน้ำ ที่ไม่มีความพร้อมหรือมีความพร้อมในการระบายน้ำไม่สมบูรณ์ ให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝน โดยนำผลการตรวจราชการในรอบนี้เป็นข้อมูลในการดำเนินการ

๕. คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเห็นว่า ทุกหน่วยงานต้องมีการทำงานเชิงบูรณาการอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนของหน่วยงานกรุงเทพมหานครด้วยกันเอง (สำนักงานระบายน้ำ สำนักงานโยธา และสำนักงานเขตภายในกลุ่มเขต) และกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๒ ได้ให้ข้อเสนอแนะ

๖. คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเห็นว่า ทุกหน่วยงานควรให้ความสำคัญและเข้มงวดในเรื่องการทิ้งขยะตามจุดที่กำหนด รวมถึงดูแลเรื่องวัสดุก่อสร้างไหลลงท่ออย่างจริงจัง ตามที่คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๔ ได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องขยะที่ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วม

๗. ตามที่เขตตรวจราชการ ๖ ได้ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นถนนเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ช่วงหน้าหมู่บ้านอรุณทอง ๒ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเห็นว่า ถนนเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือและฝั่งใต้ เป็นถนนที่อยู่ในพื้นที่สำนักงานเขตหนองแขมทั้งเส้น มิได้เป็นเส้นทางยาวเชื่อมต่อในหลายเขต ซึ่งในหลักการที่ถูกต้องแล้วควรให้สำนักงานเขตหนองแขมซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะในพื้นที่ และเป็นหน่วยที่อยู่ใกล้ชิดกับปัญหาและประชาชนเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ อันเป็นเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ ที่วางระบบการบริหารของกรุงเทพมหานครไว้เป็นสองชั้น โดยสำนักงานเขตเป็นหน่วยปฏิบัติหลักในพื้นที่ ซึ่งสำนักงานเขตมีความพร้อมและศักยภาพที่จะดำเนินการได้

ดังนั้น ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ จึงมีข้อเสนอแนะให้มีการโอนความรับผิดชอบในการดูแลถนนเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือและฝั่งใต้ จากสำนักการโยธาให้มาอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตหนองแขม ในฐานะหน่วยงานปฏิบัติหลักในระดับพื้นที่ เพื่อสำนักงานเขตหนองแขมจะได้ดูแลรับผิดชอบในการพัฒนาและแก้ไขปัญหามาให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริงต่อไป ทั้งในการออกแบบและขอจัดสรรงบประมาณ ในการปรับปรุง รวมทั้งการพัฒนาดูแลรักษาในด้านอื่นๆ ต่อไป เช่นเดียวกับกรณีของถนนครุใน สำนักงานเขตทุ่งครุ ที่ปลัดกรุงเทพมหานครได้มีการสั่งการไปแล้ว ตามหนังสือที่ กท ๐๔๐๐.๑/๑๓๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

ในการนี้คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเห็นว่า หลักการตามที่คณะผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ ๖ ได้ให้ข้อเสนอแนะ เป็นหลักการที่ถูกต้องในการบริหารจัดการ นอกจากนี้ถนนที่มีลักษณะเช่นเดียวกับถนนเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือและฝั่งใต้ สำนักการโยธาควรให้มีการถ่ายโอนความรับผิดชอบให้อยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตทั้งหมด

๘. คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเห็นควรให้ หน่วยรับตรวจนำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการในแต่ละเขตตรวจราชการที่ได้ให้ไว้ไปดำเนินการ

บทที่ ๓

รายงานการตรวจราชการของเขตตรวจราชการ ๑ - ๖

ส่วนที่ ๑ เขตตรวจราชการ ๑ (สำนักการระบายน้ำ)

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ของเขตตรวจราชการ ๑ (สำนักการระบายน้ำ)

ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก” จำนวน ๒ รอบ และรอบนี้เป็นการตรวจติดตามผล ในรอบที่ ๒ เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาซ้ำซาก

๑. ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาซ้ำซาก จากข้อมูลการตรวจราชการรอบที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) สำนักการระบายน้ำมีพื้นที่น้ำท่วม จำนวน ๗๐ จุด ประกอบด้วย จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม จำนวน ๕๓ จุด จุดเร่งระบายน้ำ จำนวน ๕๗ จุด (ซึ่งเป็นจุดเดียวกันกับจุดเฝ้าระวังหรือจุดอ่อนน้ำท่วม) และจุดอ่อนน้ำท่วม จำนวน ๑๗ จุด ในการตรวจติดตามความก้าวหน้าซึ่งได้เตรียมความพร้อมในการปรับลดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาซ้ำซาก ดังนี้

๑.๑ ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ ซึ่งได้มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติครบทุกเครื่องแล้วคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามปรากฏในตาราง ดังนี้

ลำดับ	ประเภท	ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ รอบที่ ๑				ความพร้อมวัสดุ/อุปกรณ์ รอบที่ ๒		
		จำนวน	พร้อม	คิดเป็น (ร้อยละ)	ไม่พร้อม	พร้อม	ไม่พร้อม	คิดเป็น (ร้อยละ)
๑.	เครื่องสูบน้ำ*	๒,๓๑๗	๒,๑๙๘	๙๔.๘๖	๑๑๙	๒,๓๑๗	-	๑๐๐
๒.	เครื่องจักรกล**	๑๗๕	๑๗๐	๙๗.๑๔	๕	๑๗๕	-	๑๐๐
๓.	อาคารบังคับน้ำ	๙๖	๙๖	๑๐๐	-	๙๖	-	๑๐๐
รวม		๒,๕๘๘	๒,๔๖๔	๙๕.๒๑	๑๒๔	๒,๕๘๘	-	๑๐๐

๑.๒ ความพร้อมของท่อระบายน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕๖๓ ถนน/ตรอก/ซอย ความยาวประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ เมตร ซึ่งมีแผนการบำรุงรักษา จำนวน ๔๙๒,๖๔๙ เมตร ในรอบที่ ๑ มีความพร้อมในการระบายน้ำของท่อระบายน้ำ จำนวน ๑,๕๐๗,๓๕๑ เมตร จากการตรวจติดตามในรอบที่ ๒ ได้ดำเนินการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นจากเดิม จำนวน ๑๔๒,๕๐๐ เมตร รวมเป็น ๑,๖๔๙,๘๕๑ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๙ และยังมีท่อระบายน้ำที่ต้องดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้ระบายน้ำได้ตามปกติ จำนวน ๓๕๐,๑๔๙ เมตร ตามปรากฏในตาราง ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน ถนน/ ตรอก/ ซอย	ความยาว รวม (เมตร)	มีแผน บำรุงรักษา ปี ๒๕๖๑ (เมตร)	ความพร้อมในการระบายน้ำของท่อ ระบายน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบ	
					มีความพร้อม รอบ ๑ (เมตร)	มีความพร้อม รอบ ๒ (เมตร)
๑.	สำนักการระบายน้ำ	๕๖๓	๒,๐๐๐,๐๐๐	๔๙๒,๖๔๙	๑,๕๐๗,๓๕๑	๑,๖๔๙,๘๕๑
รวม		๕๖๓	๒,๐๐๐,๐๐๐	๔๙๒,๖๔๙	๑,๕๐๗,๓๕๑	๑,๖๔๙,๘๕๑

๑.๓ ความพร้อมของคู คลอง ลำรางสาธารณะ สำนักการระบายน้ำมีคู คลอง ลำราง ที่อยู่ในความรับผิดชอบจำนวนทั้งสิ้น ๒๑๘ แห่ง มีความยาวของคูคลองลำราง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๙๖๐,๕๗๐ เมตร ซึ่งในรอบที่ ๑ มีความพร้อมในการระบายน้ำ จำนวน ๗๔๖,๙๕๐ เมตร ในการติดตามความก้าวหน้าในรอบที่ ๒ มีพร้อม ในการระบายน้ำได้ตามปกติเพิ่มขึ้น จำนวน ๙๖๐,๕๗๐ เมตร ซึ่งมีความพร้อมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามปรากฏในตาราง ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	ความพร้อมของคูคลอง/ลำรางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ			
		จำนวน คลอง	ความยาวรวม (เมตร)	มีความพร้อม รอบ ๑ (เมตร)	มีความพร้อม รอบ ๒ (เมตร)
๑.	สำนักการระบายน้ำ	๒๑๘	๙๖๐,๕๗๐	๗๔๖,๙๕๐	๙๖๐,๕๗๐
รวม		๒๑๘	๙๖๐,๕๗๐	๗๔๖,๙๕๐	๙๖๐,๕๗๐

- ๑.๔ มีการกำหนดจุดติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ในแต่ละจุด/บริเวณ ลงในแผนที่
- ๑.๕ มีการจัดทำแผนสำรองกรณีฉุกเฉินที่เกิดระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น ไฟฟ้าดับ เครื่องขัดข้อง เครื่องไม่เพียงพอต่อการรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
- ๑.๖ มีการเตรียมความพร้อมของหน่วย BEST ทั้งคน และวัสดุ/อุปกรณ์
- ๑.๗ มีแผนปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วมและแผนบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ๑.๘ มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม
- ๑.๙ มีการประชุมเตรียมความพร้อม และการประเมินสถานการณ์
- ๑.๑๐ มีการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ในจุด/บริเวณเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซากครบ ๑๐๐%
- ๑.๑๑ มีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมส่วนหน้า จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ บริเวณศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมบึงหนองบอน และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมธนบุรี
- ๑.๑๒ มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น

๒. ความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อน

๒.๑ มีการกำหนดแผนและมาตรการลดผลกระทบจากพายุฤดูร้อนรวมทั้งการสร้างความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุ

๒.๒ สำนักการระบายน้ำไม่มีการสำรวจตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง/ต้นไม้ที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน และไม่มีแผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายจากพายุ เนื่องจากไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

๑. สำนักการระบายน้ำ ควรเร่งรัดผู้รับจ้างโครงการลอกท่อระบายน้ำและชุดลอกคู คลอง ลำราง สาธารณะ มิให้ดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงาน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในภาพรวม และควรมีมาตรการเข้มงวดกับโครงการก่อสร้างอื่นที่ทำให้เศษวัสดุ ดิน ทราหายไปอุดตันท่อระบายน้ำ

๒. สำนักการระบายน้ำ ต้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาบริเวณจุดเสี่ยงน้ำท่วม จุดเฝ้าระวัง และพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการน้ำท่วม ตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ระบบท่อ ระบบคลอง ให้อยู่ในสภาพพร้อมรับมือกรณีฝนตกหนักตลอดทั้งปี

ส่วนที่ ๑ เขตตรวจราชการ ๑ (กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ)

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก” รอบที่ ๒ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑) ของเขตตรวจราชการ ๑ (กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ)

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๑ ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก” รอบที่ ๒ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑) ของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ รวม ๗ หน่วยงาน


ผลปรากฏว่า สำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือซึ่งประกอบด้วย สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตบางซื่อ สำนักงานเขตลาดพร้าว สำนักงานเขตหลักสี่ สำนักงานเขตดอนเมือง สำนักงานเขตสายไหม และสำนักงานเขตบางเขน มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมของกรุงเทพมหานครตามประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก” โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

๑.๑ ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์

๑) จำนวนพื้นที่น้ำท่วม

จากข้อมูลการตรวจราชการฯ รอบที่ ๑ สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด จำนวน ๑๐๓ จุด โดยจำแนกเป็น จุดเฝ้าระวัง จำนวน ๒๔ จุด จุดเร่งระบาย จำนวน ๒๘ จุด และจุดอ่อนน้ำท่วม จำนวน ๕๑ จุด

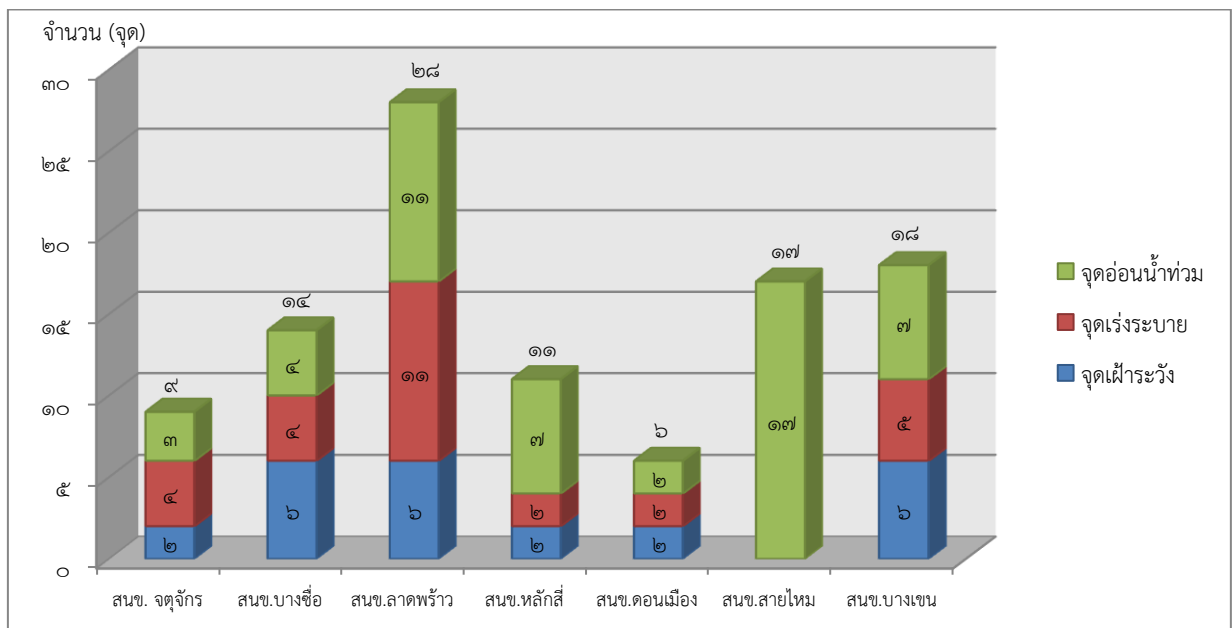

๒) ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์

การตรวจราชการในรอบที่ ๑ และ ๒ สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือมีความคืบหน้าความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	ความพร้อมเครื่องสูบน้ำ รอบ ๑			ความพร้อมเครื่องสูบน้ำ รอบ ๒ (ร้อยละ)
		จำนวน (เครื่อง)	พร้อม (ร้อยละ)	ไม่พร้อม (ร้อยละ)	
๑	สำนักงานเขตจตุจักร	๑๙	๖๘.๔๒	๓๑.๕๘	๖๘.๔๒
๒	สำนักงานเขตบางซื่อ	๒๐	๘๕	๑๕	๑๐๐
๓	สำนักงานเขตลาดพร้าว	๓๐	๑๐๐		๑๐๐
๔	สำนักงานเขตหลักสี่	๑๘	๑๐๐		๑๐๐
๕	สำนักงานเขตดอนเมือง	๑๓	๗๖.๙๒	๒๓.๐๘	๗๖.๙๒
๖	สำนักงานเขตสายไหม	๑๗	๑๐๐		๑๐๐
๗	สำนักงานเขตบางเขน	๒๘	๑๐๐		๑๐๐
รวม		๑๖๕	๙๒.๗๓	๘.๑๗	๙๖.๓๖

โดยมี ๓ หน่วยงานที่เครื่องสูบน้ำต้องได้รับบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ สำนักงานเขตจตุจักร จำนวน ๖ เครื่อง สำนักงานเขตบางซื่อ จำนวน ๓ เครื่อง และสำนักงานเขตดอนเมือง จำนวน ๓ เครื่อง ซึ่งจากการตรวจราชการในรอบที่ ๒ ปรากฏว่าสำนักงานเขตบางซื่อมีการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำให้ใช้งานได้ ๑๐๐% สำนักงานเขตดอนเมือง อยู่ระหว่างรออนุมัติสภาพ จำนวน ๓ เครื่อง ส่วนของสำนักงานเขตจตุจักรนั้นไม่มีการรายงานผลการดำเนินงาน โดยในภาพรวมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากรอบที่ ๑ ร้อยละ ๙๒.๗๓ เป็นร้อยละ ๙๖.๓๖

๓) ความพร้อมของท่อระบายน้ำ

จากการตรวจราชการรอบที่ ๑ สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีท่อระบายน้ำ รวม ๑,๐๕๒ ถนน/ตรอก/ซอย มีความยาวรวม ๑,๐๑๔,๗๙๗ เมตร มีความพร้อมในการระบายน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และมีแผนการเฝ้าระวังและบำรุงรักษาท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง ในการตรวจราชการรอบที่ ๒ จึงไม่มีผลการบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ

ลำดับ	หน่วยงาน	ความพร้อมในการระบายน้ำของท่อระบายน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบ		
		จำนวนถนน/ตรอก/ซอย	ความยาวรวม (เมตร)	มีความพร้อม (เมตร)
๑	สำนักงานเขตจตุจักร	๒๗๖	๒๙๙,๒๓๖	๒๙๙,๒๓๖
๒	สำนักงานเขตบางซื่อ	๙๘	๖๐,๕๗๐	๖๐,๕๗๐
๓	สำนักงานเขตลาดพร้าว	๓๓๔	๑๓๗,๔๑๔	๑๓๗,๔๑๔
๔	สำนักงานเขตหลักสี่	๔๕	๑๔๐,๘๕๐	๑๔๐,๘๕๐
๕	สำนักงานเขตดอนเมือง	๕๙	๘๓,๕๓๘	๘๓,๕๓๘
๖	สำนักงานเขตสายไหม	๘๖	๑๕๐,๔๘๐	๑๕๐,๔๘๐
๗	สำนักงานเขตบางเขน	๑๕๔	๑๔๒,๗๐๙	๑๔๒,๗๐๙
รวม		๑,๐๕๒	๑,๐๑๔,๗๙๗	๑,๐๑๔,๗๙๗


๔) ความพร้อมของคูคลอง/ลำรางสาธารณะ

จากการตรวจราชการรอบที่ ๑ สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีคูคลอง/ลำราง รวม ๑๓๒ คูคลอง/ลำราง มีความยาวรวม ๑๖๓,๐๑๙ เมตร มีความพร้อมในการระบายน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ในการตรวจราชการรอบที่ ๒ จึงไม่มีผลการบำรุงรักษาคูคลอง/ลำรางสาธารณะ

ลำดับ	หน่วยงาน	ความพร้อมของคูคลอง/ลำรางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ		
		จำนวนคลอง	ความยาวรวม (เมตร)	มีความพร้อม (เมตร)
๑	สำนักงานเขตจตุจักร	๑๐	๖,๒๒๐	๖,๒๒๐
๒	สำนักงานเขตบางซื่อ	๒๓	๑๒,๔๖๓	๑๒,๔๖๓
๓	สำนักงานเขตลาดพร้าว	๑๐	๑๒,๑๐๐	๑๒,๑๐๐
๔	สำนักงานเขตหลักสี่	๑๒	๙,๑๐๐	๙,๑๐๐
๕	สำนักงานเขตดอนเมือง	๑๔	๒๐,๕๑๐	๒๐,๕๑๐
๖	สำนักงานเขตสายไหม	๒๙	๕๐,๙๘๒	๕๐,๙๘๒
๗	สำนักงานเขตบางเขน	๓๔	๕๑,๖๔๔	๕๑,๖๔๔
รวม		๑๓๒	๑๖๓,๐๑๙	๑๖๓,๐๑๙

๕) การกำหนดจุดติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ และจัดทำแผนสำรองกรณีฉุกเฉิน


สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีการกำหนดจุดติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ลงในแผนที่ครบถ้วนทุกสำนักงานเขต และมีการจัดทำแผนสำรองกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น ไฟฟ้าดับ เครื่องขัดข้อง เครื่องไม่เพียงพอต่อการรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเขตบางซื่อและสำนักงานเขตบางเขน



ลำดับที่	หน่วยงาน	จัดทำแผนสำรองกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน		สาเหตุที่ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑	สำนักงานเขตจตุจักร		✓	ไม่ระบุสาเหตุ
๒	สำนักงานเขตบางซื่อ	✓		
๓	สำนักงานเขตลาดพร้าว		✓	มีการเตรียมความพร้อมอยู่แล้วในแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม
๔	สำนักงานเขตหลักสี่		✓	มีการตรวจสอบสภาพวัสดุ/อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
๕	สำนักงานเขตดอนเมือง		✓	หากเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น กรณีเครื่องขัดข้องได้ประสานเจ้าหน้าที่กองเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการเร่งด่วนโดยไม่มีแผนแนบ
๖	สำนักงานเขตสายไหม		✓	เครื่องใช้ไฟฟ้ามีจุดเดียว หากเสียหายจะจัดเครื่องยนต์ดีเซลเข้าไปทดแทน
๗	สำนักงานเขตบางเขน	✓		
คิดเป็นร้อยละ		๒๘.๕๗	๗๑.๔๓	

๑.๒ ความพร้อมด้านอื่น ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ในการตรวจราชการรอบที่ ๒ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๑ ได้มีการตรวจสอบความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ เนื่องจากมีความสำคัญในการผลักดันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ความพร้อมของหน่วยเบส แผนปฏิบัติการ การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การประชุมเตรียมความพร้อม การติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ ในพื้นที่น้ำท่วม และการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้า ปรากฏว่าสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือมีการจัดทำแผนปฏิบัติการและมีการประชุมครบทุกสำนักงานเขต โดยรายละเอียดความพร้อมในภาพรวมแยกรายหน่วยงานดังนี้

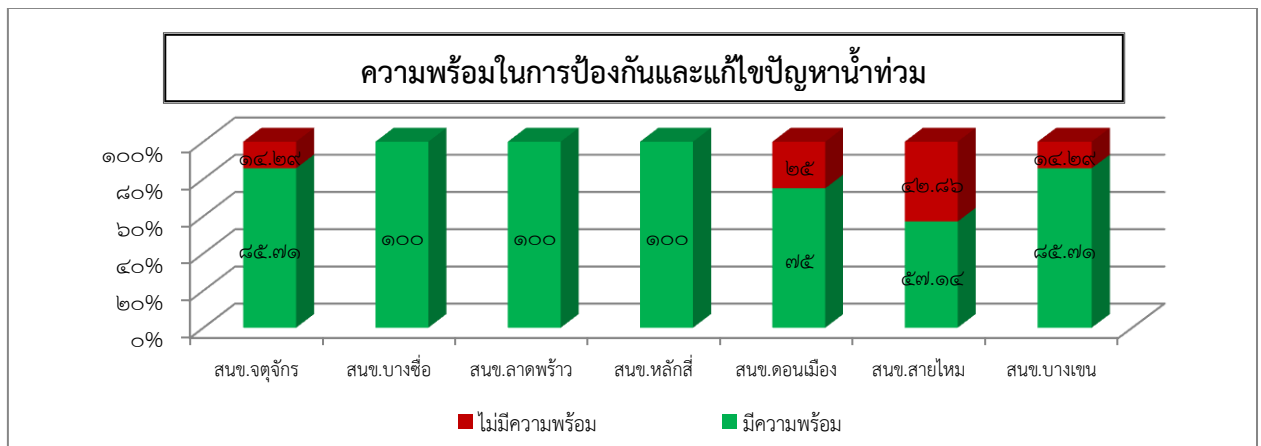


ลำดับ	หน่วยงาน	ความพร้อมของหน่วยเบส				ความพร้อมของแผนปฏิบัติการ		การจัดตั้งศูนย์ฯ		การประชุมเตรียมความพร้อม		การติดตั้งวัสดุอุปกรณ์			การจัดตั้งศูนย์ฯส่วนหน้า			
		คน		วัสดุอุปกรณ์											กำหนดจุด		คำสั่งฯ	
		มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	มีไม่ครบ	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
๑	สนข. จตุจักร	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓			✓
๒	สนข. บางซื่อ	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	
๓	สนข. ตลาดพลู	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	
๔	สนข. หลักสี่	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	
๕	สนข. ดอนเมือง	✓			✓	✓		✓		✓			✓		✓		✓	
๖	สนข. สายไหม		✓		✓	✓		✓		✓			✓	✓	✓			✓
๗	สนข. บางเขน	✓		✓		✓			✓	✓		✓			✓		✓	
รวม		๖	๑	๕	๒	๗	-	๖	๑	๗	-	๕	๑	๑	๗	-	๕	๒
ความพร้อมคิดเป็นร้อยละ		๗๘.๕๗				๑๐๐		๘๕.๗๑		๑๐๐		๗๑.๔๓			๘๕.๗๑			

โดยหน่วยงานมีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้าในพื้นที่ของเขต สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	บริเวณที่จัดตั้งศูนย์ฯ
๑	สำนักงานเขตจตุจักร	*ไม่ระบุข้อมูล
๒	สำนักงานเขตบางซื่อ	สำนักงานเขตบางซื่อ
๓	สำนักงานเขตตลาดพลู	*ไม่ระบุข้อมูล
๔	สำนักงานเขตหลักสี่	สำนักงานเขตหลักสี่
๕	สำนักงานเขตดอนเมือง	ถนนช่างอากาศอุทิศ
๖	สำนักงานเขตสายไหม	ประตูระบายน้ำคลองหม้อแตก และตลาดเอซี ถนนสายไหม
๗	สำนักงานเขตบางเขน	หน้าอาคารระบายน้ำ เขตบางเขน

๓. ความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อน


๓.๑ การกำหนดแผนและมาตรการลดผลกระทบ

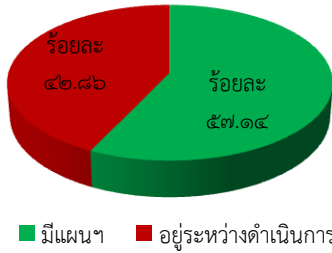

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีการกำหนดแผนและมาตรการลดผลกระทบจากพายุฤดูร้อนรวมทั้งการสร้างความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุ จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตบางซื่อ สำนักงานเขตลาดพร้าว และสำนักงานเขตดอนเมือง

ลำดับที่	หน่วยงาน	กำหนดแผนและมาตรการลดผลกระทบ		สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑	สำนักงานเขตจตุจักร	✓		
๒	สำนักงานเขตบางซื่อ	✓		
๓	สำนักงานเขตลาดพร้าว	✓		
๔	สำนักงานเขตหลักสี่		✓	มีการสำรวจและตรวจสอบความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง/ต้นไม้ที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนอยู่เสมอ
๕	สำนักงานเขตดอนเมือง	✓		
๖	สำนักงานเขตสายไหม		✓	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผน
๗	สำนักงานเขตบางเขน		✓	ไม่ระบุสาเหตุ
คิดเป็นร้อยละ		๕๗.๑๔	๔๒.๘๖	

๓.๒ การสำรวจตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง/ต้นไม้ที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน

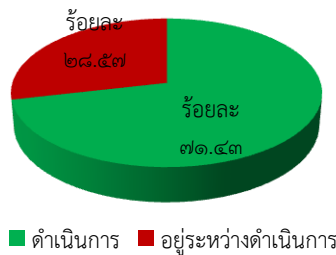

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีการสำรวจตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง/ต้นไม้ที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตบางซื่อ สำนักงานเขตลาดพร้าว สำนักงานเขตหลักสี่ และสำนักงานเขตดอนเมือง

ลำดับที่	หน่วยงาน	การสำรวจตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง/ต้นไม้ที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน		สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑	สำนักงานเขตจตุจักร	✓		
๒	สำนักงานเขตบางซื่อ	✓		
๓	สำนักงานเขตลาดพร้าว	✓		
๔	สำนักงานเขตหลักสี่	✓		
๕	สำนักงานเขตดอนเมือง	✓		
๖	สำนักงานเขตสายไหม		✓	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผน
๗	สำนักงานเขตบางเขน		✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ
คิดเป็นร้อยละ		๗๑.๔๓	๒๘.๕๗	

โดยมีการรายงานข้อมูลจำนวนสิ่งก่อสร้าง/ต้นไม้ที่ไม่แข็งแรง จำนวน ๓ สำนักงานเขต ได้แก่

- ๑) สำนักงานเขตบางซื่อ ไม่มีสิ่งก่อสร้าง/ต้นไม้ที่ไม่แข็งแรง
- ๒) สำนักงานเขตหลักสี่ มีสิ่งก่อสร้าง/ต้นไม้ที่ไม่แข็งแรง จำนวน ๕ จุด โดยได้แนบแผนการป้องกัน/แก้ไข
- ๓) สำนักงานเขตดอนเมือง มีสิ่งก่อสร้าง/ต้นไม้ที่ไม่แข็งแรง จำนวน ๖๕ จุด แต่ไม่ได้แนบแผนการป้องกัน/แก้ไข โดยในส่วนของสำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตลาดพร้าว และสำนักงานเขตสายไหม และสำนักงานเขตบางเขน ไม่มีการรายงานข้อมูล

๓.๓ แผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายจากพายุ


สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ มีการจัดทำ

แผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างได้รับความ

เสียหายจากพายุ จำนวน ๔ สำนักงานเขต ได้แก่

สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตบางซื่อ สำนักงานเขตลาดพร้าว

และสำนักงานเขตดอนเมือง



ลำดับ ที่	หน่วยงาน	จัดทำแผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายจากพายุ		สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑	สำนักงานเขตจตุจักร	✓		
๒	สำนักงานเขตบางซื่อ	✓		
๓	สำนักงานเขตลาดพร้าว	✓		
๔	สำนักงานเขตหลักสี่		✓	มีการเข้าไปดำเนินการดูแลและตัดแต่งต้นไม้ที่อาจได้รับความเสียหายจากพายุแล้ว
๕	สำนักงานเขตดอนเมือง	✓		
๖	สำนักงานเขตสายไหม	-	-	ไม่มีการรายงานข้อมูล
๗	สำนักงานเขตบางเขน		✓	มีหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร คอยแก้ไขปัญหา
คิดเป็นร้อยละ		๖๖.๖๗	๓๓.๓๓	


ส่วนที่ ๒ เขตตรวจราชการ ๒ (กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร)

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก” รอบที่ ๒ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑) ของเขตตรวจราชการ ๒ (กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร)

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๒ ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก” รอบที่ ๒ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑) ของกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ๙ สำนักงานเขต ได้แก่ สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตประเวศ สำนักงานเขตสะพานสูง สำนักงานเขตมีนบุรี สำนักงานเขตคลองสามวา สำนักงานเขตบึงกุ่ม สำนักงานเขตคันนายาว และสำนักงานเขตหนองจอก โดยตรวจความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของสำนักงานเขต ซึ่งมีผลสรุป ดังนี้

๑. จำนวนพื้นที่น้ำท่วม

จากข้อมูลการตรวจราชการฯ รอบที่ ๑ สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด จำนวน ๘๘ จุด โดยจำแนกเป็นจุดเฝ้าระวัง จำนวน ๒๒ จุด จุดเร่งระบาย จำนวน ๑๒ จุด และจุดอ่อนน้ำท่วม จำนวน ๕๕ จุด รายละเอียดดังนี้

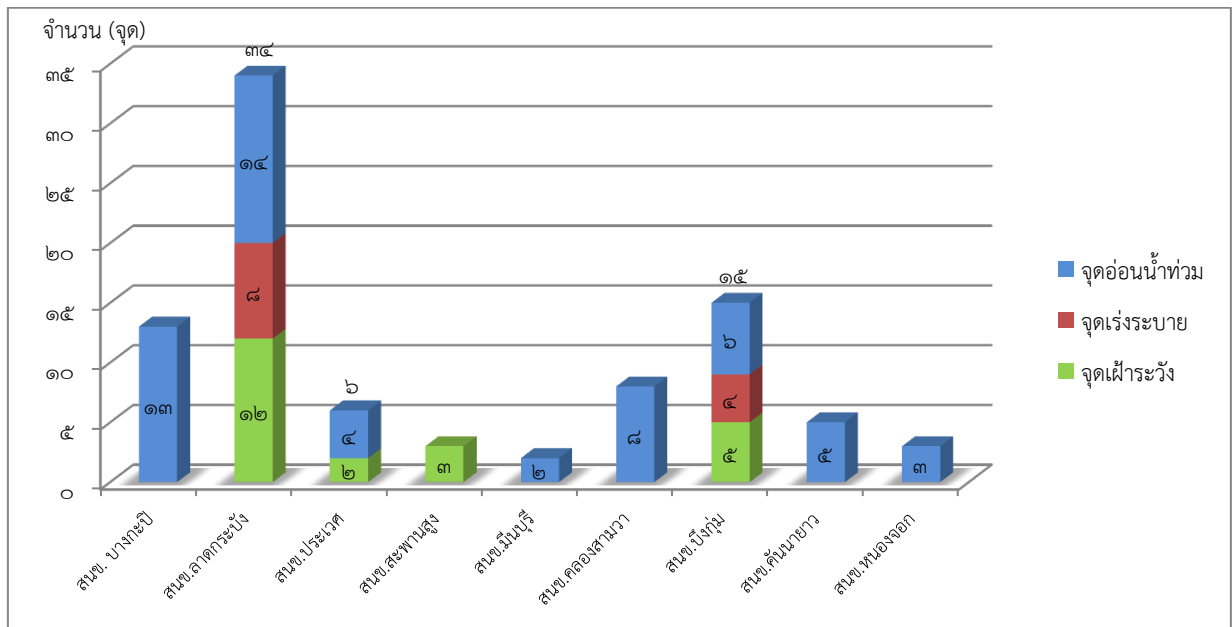

หมายเหตุ : คำจำกัดความที่สำนักงานการระบายน้ำกำหนดเรื่องพื้นที่น้ำท่วม

๑. จุดอ่อนน้ำท่วม (ปัจจุบัน สน. ใช้คำว่า “จุดเสี่ยงน้ำท่วม” แทน) หมายถึง พื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมกรณีฝนตกปานกลางถึงหนัก (มีฝนตกไม่เกิน ๖๐ มม./ชม. แล้วเกิดน้ำท่วมขัง)
๒. จุดเร่งระบาย หมายถึง จุดที่มีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างการระบายน้ำออกจากพื้นที่
๓. จุดเฝ้าระวัง หมายถึง พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดน้ำท่วม กรณีฝนตกหนักถึงหนักมาก หรือบริเวณที่มีปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับระบบระบายน้ำ เช่น งานก่อสร้าง

๒. ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

๒.๑ ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ และระบบการระบายน้ำ

๑) ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์

จากการตรวจราชการรอบที่ ๒ ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานเขตกลุ่ม กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบรอบที่ ๑ และ ๒ มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	รอบที่ ๑ ความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ			รอบที่ ๒ มีความพร้อม (ร้อยละ)
		จำนวน (เครื่อง)	มีความพร้อม (ร้อยละ)	ไม่มีความพร้อม (ร้อยละ)	
๑	สำนักงานเขตบางกะปิ	๑๔	๘๕.๗๑	๑๔.๒๙	๙๒.๘๖
๒	สำนักงานเขตลาดกระบัง	๔๖	๑๐๐	-	๑๐๐
๓	สำนักงานเขตประเวศ	๑๙	๑๐๐	-	๑๐๐
๔	สำนักงานเขตสะพานสูง	๓๙	๑๐๐	-	๑๐๐
๕	สำนักงานเขตมีนบุรี	๒๒	๑๐๐	-	๑๐๐
๖	สำนักงานเขตคลองสามวา	๑๓	๑๐๐	-	๑๐๐
๗	สำนักงานเขตบึงกุ่ม	๑๔	๑๐๐	-	๑๐๐
๘	สำนักงานเขตคันนายาว	๑๒	๘๓.๓๓	๑๖.๖๗	๑๐๐
๙	สำนักงานเขตหนองจอก	๘	๑๐๐	-	๑๐๐
รวม		๑๘๗	๙๗.๘๖	๒.๑๒	๙๙.๒๑

โดยมี ๒ สำนักงานเขต ที่เครื่องสูบน้ำต้องได้รับการบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ สำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน ๒ เครื่อง และสำนักงานเขตคันนายาว จำนวน ๒ เครื่อง ซึ่งจากการตรวจราชการในรอบที่ ๒ ปรากฏว่าสำนักงานเขตบางกะปิ มีการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง ยังอยู่ระหว่างการส่งซ่อมอีก ๑ เครื่อง และสำนักงานเขตคันนายาว มีการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำให้ใช้งานได้ครบทั้ง ๑๒ เครื่องแล้ว ความพร้อมของเครื่องสูบน้ำในรอบที่ ๒ เพิ่มขึ้นจากรอบที่ ๑ ร้อยละ ๙๗.๘๖ เป็นร้อยละ ๙๙.๒๑

๒) ความพร้อมของท่อระบายน้ำ

จากการตรวจราชการรอบที่ ๑ สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพมหานครตะวันออก มีจำนวนท่อระบายน้ำในความรับผิดชอบ จำนวน ๘๙๑ ถนน/ซอย ความยาวทั้งหมด ๙๖๕,๒๑๘.๓๘ เมตร โดยมีความพร้อมในภาพรวม ร้อยละ ๑๐๐ และสำนักงานเขต มีแผนการเฝ้าระวังและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ตรวจราชการที่รับผิดชอบ สำนักงานเขตจะติดตามดำเนินงานตามแผนของสำนักงานเขตเป็นระยะ และติดตามผลที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ

๓) ความพร้อมของคูคลอง/ลำรางสาธารณะ

จากการตรวจราชการรอบที่ ๑ สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพมหานครตะวันออก มีคูคลอง/ลำรางในความรับผิดชอบ รวม ๔๑๐ คูคลอง/ลำราง มีความยาวรวม ๖๔๗,๘๑๕ เมตรมีความพร้อมในการระบายน้ำความยาวรวม ๕๙๘,๖๔๕ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๑ รายละเอียดดังนี้


ลำดับ	หน่วยงาน	รอบที่ ๑ ความพร้อมของคูคลอง/ลำรางสาธารณะ			รอบที่ ๒ มีความพร้อม (ร้อยละ)
		จำนวน คลอง	มีความพร้อม (ร้อยละ)	ไม่มีความพร้อม (ร้อยละ)	
๑	สำนักงานเขตบางกะปิ	๒๒	๑๐๐	-	๑๐๐
๒	สำนักงานเขตลาดกระบัง	๕๘	๑๐๐	-	๑๐๐
๓	สำนักงานเขตประเวศ	๑๖	๑๐๐	-	๑๐๐
๔	สำนักงานเขตสะพานสูง	๒๑	๙๔.๔๘	๕.๕๒	๑๐๐
๕	สำนักงานเขตมีนบุรี	๕๗	๑๐๐	-	๑๐๐
๖	สำนักงานเขตคลองสามวา	๗๓	๑๐๐	-	๑๐๐
๗	สำนักงานเขตบึงกุ่ม	๔๕	๙๘.๗๓	๑.๒๗	๑๐๐
๘	สำนักงานเขตคันนายาว	๒๗	๑๐๐	-	๑๐๐
๙	สำนักงานเขตหนองจอก	๙๑	๗๖.๐๓	๑๓.๙๗	๑๐๐
รวม		๔๑๐	๙๒.๔๑	๗.๕๙	๑๐๐

โดยมี ๓ สำนักงานเขตที่คูคลอง/ลำรางสาธารณะต้องได้รับบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ สำนักงานเขตสะพานสูง ความยาว ๑,๔๑๐ เมตร สำนักงานเขตบึงกุ่ม ความยาว ๔๕๐ เมตร และสำนักงานเขตหนองจอก ความยาว ๔๗,๓๑๐ เมตร ซึ่งจากการตรวจราชการในรอบที่ ๒ ปรากฏว่าสำนักงานเขตที่ต้องบำรุงรักษาคูคลอง/ลำรางสาธารณะ ได้ดำเนินการบำรุงรักษาเรียบร้อยแล้วครบทุกสำนักงานเขต ความพร้อมของคูคลอง/ลำรางสาธารณะเพิ่มขึ้นจากรอบที่ ๑ ร้อยละ ๙๒.๔๑ เป็นร้อยละ ๑๐๐

๔) การกำหนดจุดติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ และจัดทำแผนสำรองกรณีฉุกเฉิน

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก มีการกำหนด

จุดติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ลงในแผนที่ครบถ้วนทุกสำนักงานเขต
และมีการจัดทำแผนสำรองกรณีฉุกเฉินที่เกิดระหว่าง
การปฏิบัติงาน เช่น ไฟฟ้าดับ เครื่องขัดข้อง เครื่องไม่เพียงพอ
ต่อการรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จำนวน ๕ สำนักงานเขต
ได้แก่ สำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตประเวศ
สำนักงานเขตสะพานสูง สำนักงานเขตมีนบุรี และ
สำนักงานเขตคลองสามวา ส่วนอีก ๔ สำนักงานเขต ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำแผนฯ ดังกล่าว

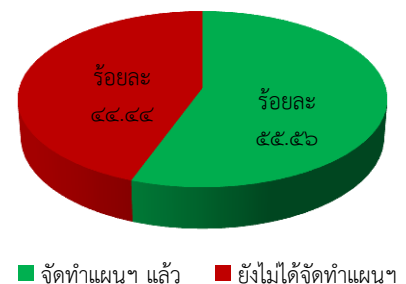

๒.๒ ความพร้อมด้านอื่น ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๒ ได้มีการตรวจสอบความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ และระบบการระบายน้ำ เนื่องจากมีความสำคัญในการผลักดันการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ความพร้อมของหน่วยเบส แผนปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วมฯ การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม การประชุมเตรียมความพร้อม การติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ในพื้นที่น้ำท่วม และการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมส่วนหน้า โดยรายละเอียดความพร้อมในภาพรวมแยกรายสำนักงานเขตดังนี้


ตารางแสดงความพร้อมด้านอื่น ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ลำดับ ที่	ความพร้อม ด้านต่าง ๆ	สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพมหานครตะวันออก								
		สนช. บางกะปิ	สนช. ลาดกระบัง	สนช. ประเวศ	สนช. สะพานสูง	สนช. มีนบุรี	สนช. คลองสามวา	สนช. บึงกุ่ม	สนช. คันนายาว	สนช. หนองจอก
๑	ความพร้อมของ หน่วยเบส	X (ปัญหา อัตราค่าสิ่ง)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๒	แผนปฏิบัติการ ป้องกันน้ำท่วมฯ	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
๓	การจัดตั้งศูนย์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
๔	การประชุมเตรียม ความพร้อม	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
๕	การติดตั้งวัสดุ/ อุปกรณ์ ในพื้นที่ น้ำท่วม	*	*	✓	*	*	*	*	*	*
๖	การจัดตั้งศูนย์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ส่วนหน้า	X (ไม่มีค่าสิ่ง)	✓	✓	✓	✓	X (ไม่มีค่าสิ่ง)	✓	X (ไม่มีค่าสิ่ง)	X (ไม่มีค่าสิ่ง)

หมายเหตุ : ✓ คือ มีความพร้อม , X คือ ไม่มีความพร้อม หรือ ยังไม่ได้ดำเนินการ , * อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. ความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อน

๓.๑ การกำหนดแผนและมาตรการลดผลกระทบ

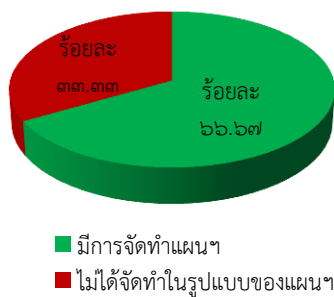


สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพมหานครตะวันออก มีการจัดทำแผนและกำหนดมาตรการลดผลกระทบจากพายุฤดูร้อนรวมทั้งการสร้างความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุ จำนวน ๖ สำนักงานเขต ได้แก่ สำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตประเวศ สำนักงานเขตสะพานสูง สำนักงานเขตมีนบุรี สำนักงานเขตบึงกุ่ม และสำนักงานเขตคันนายาว

๓.๒ การสำรวจตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง/ต้นไม้ที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพมหานครตะวันออก มีการสำรวจตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง/ต้นไม้ที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนครบทุกสำนักงานเขต

๓.๓ แผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายจากพายุ

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก มีการจัดทำ
แผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายจากพายุ จำนวน ๓ สำนักงานเขต ได้แก่
สำนักงานเขตประเวศ สำนักงานเขตสะพานสูง
และสำนักงานเขตมีนบุรี

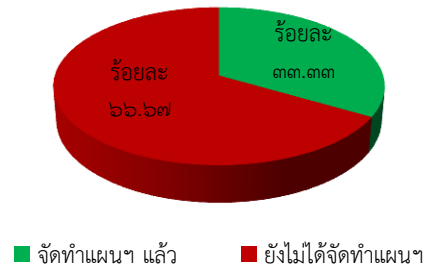

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการในภาพรวม

๑. พื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก เป็นพื้นที่หนึ่งซึ่งโดยภาพรวมมีความเสี่ยงน้ำท่วมและต้องเฝ้าระวังเมื่อเกิดฝนตก โดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งมีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ดังนั้น จึงต้องมีการทำงานเชิงบูรณาการอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนของหน่วยงานกรุงเทพมหานครด้วยกันเอง (สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา และสำนักงานเขตภายในกลุ่มเขต) และกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผู้ตรวจราชการได้ประสานให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก และในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ มีการประชุมระหว่างสำนักงานเขตภายในกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก เพื่อเน้นย้ำถึงการทำงานเชิงบูรณาการ

๒. สำนักงานเขตที่มีการดำเนินงานอย่างมีความพร้อม จะมีการทำงานเชิงระบบ กล่าวคือ มีระบบฐานข้อมูลที่ดี มีการวางแผนการทำงาน มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ดังนั้น สำนักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพตะวันออกควรให้ความสำคัญกับการทำงานเชิงระบบให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา

๓. ระบบโครงข่ายหลักพื้นฐานของการระบายน้ำในพื้นที่ซึ่งได้แก่ คูคลอง และท่อระบายน้ำ ยังเป็นเรื่องสำคัญที่สำนักงานเขตต้องดูแลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคูคลองต้องไม่ตันเขิน ปราศจากการรูกกล้าและวัชพืชเพื่อรักษาหรือเพิ่มปริมาตรการรับน้ำ และมีการเชื่อมต่อของโครงข่ายการระบายน้ำ อีกทั้งอยู่ในสภาพที่รับน้ำได้ดีตลอดแนวเส้นทาง

๔. สำนักการระบายน้ำ เป็นหน่วยงานสำคัญที่จะนำหลักวิชาการและองค์ความรู้มาสนับสนุนการทำงานของสำนักงานเขต อาทิ การจัดทำแบบจำลองการระบายน้ำ กรณีที่มีฝนตกกระจัดต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการรับน้ำของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาทางกายภาพของโครงข่ายการระบายน้ำหลักที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก

๕. สำนักการโยธา เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีความรับผิดชอบการดูแลถนนสายหลักในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก ซึ่งการต่อเชื่อมท่อและการหลุดตัวของถนนและผิวจราจรที่มีการเป็นหลุมหรือหลุดตัวเป็นช่วง ๆ ในพื้นที่ที่เป็นสาเหตุทางกายภาพที่ทำให้น้ำท่วมขังในถนนเป็นช่วง ๆ และการระบายน้ำบนผิวจราจรได้เข้าสำนักการโยธาคควรเร่งดำเนินการสำรวจและแก้ไขการหลุดตัวของถนนและผิวจราจรที่มีการเป็นหลุมในความรับผิดชอบทุกสาย

ส่วนที่ ๓ เขตตรวจราชการ ๓ (กลุ่มเขตกรุงเทพใต้)

**รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
“การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก”**

รอบที่ ๒ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑)

เขตตรวจราชการ ๓ (กลุ่มเขตกรุงเทพใต้)

ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้มีการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก” โดยกำหนดการตรวจติดตามครั้งที่ ๒ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้หน่วยงานได้ปฏิบัติการสร้างความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาซ้ำซากในช่วงฤดูฝน และความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๑

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๓ ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร (นายธวัชชัย อรรถนิตย์) ผู้ตรวจราชการสูง (นางแซ่ไข จิตพิชานนท์ นางศรีนวล สุคนธชาติ และนางนันทวัน ฉัตรสกุลเพ็ญ) ได้ร่วมกันตรวจราชการดังกล่าวของกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ (สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตพระโขนง สำนักงานเขตบางนา สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตบางคอแหลม สำนักงานเขตยานนาวา และสำนักงานเขตสวนหลวง) ขอรายงานผลการตรวจราชการโดยสรุปดังนี้

๑. ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาซ้ำซาก

๑.๑ ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์

๑) จำนวนพื้นที่น้ำท่วม

ตารางที่ ๑ แสดงจุดพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

ลำดับที่	หน่วยงาน	จุดเฝ้าระวัง (จุด)	จุดเร่งระบายน้ำ (จุด)	จุดอ่อน น้ำท่วม (จุด)	รวมทั้งหมด	รวมพื้นที่ น้ำท่วม
๑.	สำนักงานเขตบางรัก	๓	-	๓	๖	๖
๒.	สำนักงานเขตพระโขนง	๒*	๑*	๒*	๕	๒
๓.	สำนักงานเขตบางนา	๑๐*	๑๐*	๑๐*	๓๐	๑๐
๔.	สำนักงานเขตปทุมวัน	-	-	๑	๑	๑
๕.	สำนักงานเขตคลองเตย	๙	-	-	๙	๙
๖.	สำนักงานเขตวัฒนา	๒	๒	๒	๖	๖
๗.	สำนักงานเขตสาทร	๒*	๒*	๒*	๖	๒
๘.	สำนักงานเขตบางคอแหลม	๑*	๑*	๑*	๓	๑
๙.	สำนักงานเขตยานนาวา	๒*	๒*	๒*	๖	๒
๑๐	สำนักงานเขตสวนหลวง	๑***	๖**	๖**	๑๓	๗
รวม (กลุ่มเขตกรุงเทพใต้)		๓๒	๒๔	๒๙	๘๕	๔๖

หมายเหตุ * หมายถึง ข้อมูลจุดเฝ้าระวัง/จุดเร่งระบายน้ำ /จุดอ่อนน้ำท่วม คือจุดเดียวกัน

** หมายถึง ข้อมูลจุดเร่งระบายน้ำ จำนวน ๖ จุด และจุดอ่อนน้ำท่วมเป็นพื้นที่จุดเดียวกัน

*** หมายถึง ข้อมูลจุดเฝ้าระวัง เพียง ๑ จุด เป็นพื้นที่คนละจุดกับจุดเร่งระบายน้ำ และจุดอ่อนน้ำท่วม

จากข้อมูลการตรวจราชการของเขตตรวจราชการ รอบที่ ๑ สำนักงานเขตกลุ่มเขต กรุงเทพฯได้ มีพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด ๘๕ จุด จำแนกเป็น จุดเฝ้าระวัง จำนวน ๓๒ จุด จุดเร่งระบายน้ำ จำนวน ๒๔ จุด และจุดอ่อนน้ำท่วม จำนวน ๒๙ จุด แต่เนื่องจากบางสำนักงานเขตได้กำหนดจุดเฝ้าระวัง จุดอ่อนน้ำท่วม และจุดเร่งระบายน้ำ อยู่ในบริเวณจุดเดียวกัน จึงทำให้พื้นที่น้ำท่วมในกลุ่มเขตกรุงเทพฯได้ รวม ๔๖ จุด ดังปรากฏในตารางที่ ๑

๒) ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์

ตารางที่ ๒ ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ (เครื่องสูบน้ำ)

ลำดับ ที่	สำนักงานเขต	เครื่องสูบน้ำ (รอบที่ ๑)			การดำเนินการ (รอบที่ ๒)		
		รวม	พร้อม	ไม่พร้อม	ต้อง บำรุงรักษา	ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ
๑.	สำนักงานเขตบางรัก	๖	๔	๒	๒	๒	-
๒.	สำนักงานเขตพระโขนง	๘	๖	๒*	๒*	-	๒*
๓.	สำนักงานเขตบางนา	๑๖	๑๓	๓	๓	๓	-
๔.	สำนักงานเขตปทุมวัน	๑	๑	-	-	-	-
๕.	สำนักงานเขตคลองเตย	๒๓	๑๘	๕*	๕*	-	๕*
๖.	สำนักงานเขตวัฒนา	๔	๔	-	-	-	-
๗.	สำนักงานเขตสาทร	๔	๔	-	-	-	-
๘.	สำนักงานเขตบางคอ แหลม	๒	๒	-	-	-	-
๙.	สำนักงานเขตยานนาวา	๑	๑	-	-	-	-
๑๐.	สำนักงานเขตสวนหลวง	๒๒	๒๒	-	-	-	-
รวม		๘๗	๗๕	๑๒	๑๒	๕	๗*

หมายเหตุ :- * หมายความว่า รอยบุสภาพ

จากข้อมูลการตรวจราชการ รอบที่ ๑ สำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพฯได้ มีสำนักงานเขตที่ต้องดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตามปกติ จำนวน ๔ สำนักงานเขต ได้แก่ สำนักงานเขตบางรัก จำนวน ๒ เครื่อง สำนักงานเขตพระโขนง รอยบุสภาพ จำนวน ๒ เครื่อง สำนักงานเขตบางนา จำนวน ๓ เครื่อง และสำนักงานเขตคลองเตย รอยบุสภาพ จำนวน ๕ เครื่อง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๒ เครื่อง และจากการตรวจราชการ รอบที่ ๒ เพื่อติดตามผลการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ ดังกล่าว ปรากฏว่า สำนักงานเขตที่ได้ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตามปกติ ๑๐๐% จำนวน ๒ สำนักงานเขต คือ สำนักงานเขตบางรัก และสำนักงานเขตบางนา ส่วนสำนักงานเขตพระโขนง และสำนักงานเขตคลองเตย อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อรื้อสภาพ

สรุป สำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพฯได้ มีความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ ๑๐๐% จำนวน ๘ สำนักงานเขต ยกเว้น สำนักงานเขตพระโขนง และสำนักงานเขตคลองเตย ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ รื้อรื้อสภาพเครื่องสูบน้ำ ตามรายละเอียดในตารางที่ ๒

๓) ความพร้อมของท่อระบายน้ำ

ตารางที่ ๓ ความพร้อมของท่อระบายน้ำ

ลำดับ ที่	สำนักงานเขต	ท่อระบายน้ำ (รอบที่ ๑)				การดำเนินการ (รอบที่ ๒)		
		จำนวน ถนน/ ซอย	ความยาว รวม (เมตร)	พร้อม	ไม่พร้อม	ต้อง บำรุงรักษา	ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ
๑.	สำนักงานเขตบางรัก	๙๘	๓๑,๕๗๑	๓๑,๕๗๑	-	-	-	-
๒.	สำนักงานเขตพระโขนง	๒๓๗	๙๘,๕๖๗	๙๘,๕๖๗	-	-	-	-
๓.	สำนักงานเขตบางนา	๑๒๓	๖๒,๐๗๔	๑๓,๔๕๘	๔๘,๖๑๖	๔๘,๖๑๖	๔๘,๖๑๖	-
๔.	สำนักงานเขตปทุมวัน	๕๘	๒๓,๗๑๙	๒๓,๗๑๙	-	-	-	-
๕.	สำนักงานเขตคลองเตย	๖๙	๒๖,๗๙๕	๒๖,๗๙๕	-	-	-	-
๖.	สำนักงานเขตวัฒนา	๒๓๒	๑๐๗,๗๙๓	๗๕,๑๙๘	๓๒,๕๙๕	๓๒,๕๙๕	๓๒,๕๙๕	-
๗.	สำนักงานเขตสาทร	๑๑๖	๖๓,๔๔๔	๖๐,๗๐๙	๒,๗๓๕	๒,๗๓๕	๒,๗๓๕	-
๘.	สำนักงานเขตปทุมวัน	๕๘	๒๗,๐๗๒	๒๗,๐๗๒	-	-	-	-
๙.	สำนักงานเขตยานนาวา	๔๗	๔๔,๓๙๒	๔๔,๓๙๒	-	-	-	-
๑๐.	สำนักงานเขตสวนหลวง	๑๒๗	๙๙,๔๔๒	๙๙,๔๔๒	-	-	-	-
รวม		๑,๑๖๕	๕๘๔,๘๖๙	๕๐๐,๕๒๓	๘๔,๓๔๖	๘๔,๓๔๖	๘๔,๓๔๖	-

จากข้อมูลการตรวจราชการ รอบที่ ๑ สำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงใต้ มีสำนักงานเขตที่ต้องดำเนินการบำรุงรักษาท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ระบายน้ำได้ตามปกติ จำนวน ๓ สำนักงานเขต ได้แก่ สำนักงานเขตบางนา จำนวน ๑๐๒ ถนน/ซอย ความยาว ๔๘,๖๑๖ เมตร สำนักงานเขตวัฒนา จำนวน ๓๖ ถนน/ซอย ความยาว ๓๒,๕๙๕ เมตร และสำนักงานเขตสาทร จำนวน ๔ ถนน/ซอย ความยาว ๒,๗๓๕ เมตร และจากการรายงานผลการตรวจราชการ รอบที่ ๒ เพื่อติดตามผลการบำรุงรักษาท่อระบายน้ำดังกล่าว ปรากฏว่า ทุกสำนักงานเขตที่ได้ดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ระบายน้ำได้ตามปกติ

สรุป ทุกสำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ มีความพร้อมในการระบายน้ำของท่อระบายน้ำครบ ๑๐๐% ตามรายละเอียดในตารางที่ ๓

๔) ความพร้อมของคูคลอง ลำรางสาธารณะ

ตารางที่ ๔ ความพร้อมของคูคลอง/ลำรางสาธารณะ

ลำดับ ที่	สำนักงานเขต	คูคลอง/ลำรางสาธารณะ (รอบที่ ๑)				การดำเนินการ (รอบที่ ๒)		
		จำนวน คูคลอง/ ลำราง	ความยาว รวม (เมตร)	พร้อม	ไม่พร้อม	ต้อง บำรุงรักษา	ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ
๑.	สำนักงานเขตบางรัก	๙	๑,๖๘๘	๑,๓๓๒	๓๕๖	๓๕๖	๓๕๖	-
๒.	สำนักงานเขตพระโขนง	๓๐	๑๒,๗๕๓	๑๒,๗๕๓	-	-	-	-

ตารางที่ ๔ ความพร้อมคูคลอง/ลำรางสาธารณะ

ลำดับ ที่	สำนักงานเขต	คูคลอง/ลำรางสาธารณะ (รอบที่ ๑)				การดำเนินการ (รอบที่ ๒)		
		จำนวน ถนน/ ซอย	ความยาว รวม (เมตร)	พร้อม	ไม่พร้อม	ต้อง บำรุง รักษา	ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ
๓.	สำนักงานเขตบางนา	๖	๕,๘๓๖	๕,๓๒๖	๕๑๐*	๕๑๐*	-	๕๑๐*
๔.	สำนักงานเขตปทุมวัน	๔	๑,๗๑๐	๑,๗๑๐	-	-	-	-
๕.	สำนักงานเขตคลองเตย	๗	๓,๓๓๖	๓,๓๓๖	-	-	-	-
๖.	สำนักงานเขตวัฒนา	๑๑	๑๐,๘๑๕	๑๐,๘๑๕	-	-	-	-
๗.	สำนักงานเขตสาทร	๖	๓,๑๒๕	๓,๑๒๕	-	-	-	-
๘.	สำนักงานเขตบางคอแหลม	๓๐	๑๖,๕๓๙	๙,๒๒๔	๗,๓๑๕	๗,๓๑๕	-	๗,๓๑๕
๙.	สำนักงานเขตยานนาวา	๒๐	๔๔,๓๙๒	๔๔,๓๙๒	-	-	-	-
๑๐.	สำนักงานเขตสวนหลวง	๒๙	๒๙,๖๕๐	๒๙,๖๕๐	-	-	-	-
รวม		๑๕๒	๑๒๙,๘๔๔	๑๒๑,๖๖๓	๘,๑๘๑	๘,๑๘๑	๓๕๖	๗,๘๒๕-

หมายเหตุ:- * หมายความว่า คลองไม่มีสภาพคูคลอง

จากข้อมูลการตรวจราชการ รอบที่ ๑ สำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ มีสำนักงานเขตที่ต้องดำเนินการบำรุงรักษาคูคลอง/ลำรางสาธารณะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ระบายน้ำได้ ตามปกติ จำนวน ๓ สำนักงานเขต ได้แก่ สำนักงานเขตบางรัก จำนวน ๑ คูคลอง/ลำราง คือ คูระบาย ซอยพิพัฒน์ ความยาว ๓๕๖ เมตร สำนักงานเขตบางนา จำนวน ๑ คูคลอง/ลำราง (คูน้ำซอยลาซาล ๖๓) ความยาว ๕๑๐ เมตร ซึ่งไม่มีสภาพคูคลอง และสำนักงานเขตบางคอแหลม จำนวน ๖ คูคลอง/ลำราง (คูระบายน้ำคลองข้าง ธนคารกสิกรไทยคูระบายน้ำคลองโรงฆ่าสัตว์ คูระบายน้ำคลองวัดจันทร์ใน คูระบายน้ำคลองบางคอแหลม คูระบายน้ำคลองซอยเจริญกรุง ๑๐๙ และคูระบายน้ำคลองหมู่บ้านภักดี ความยาว ๗,๓๑๕ เมตร รวมความ ยาวของคูคลอง/ลำรางที่ต้องบำรุงรักษาทั้งสิ้น ๘,๑๘๑ เมตร และจากการรายงานผลการตรวจราชการ รอบ ที่ ๒ เพื่อติดตามผลการบำรุงรักษาคูคลอง/ลำรางสาธารณะดังกล่าว ปรากฏว่า มีสำนักงานเขตที่ได้ดำเนินการตาม แผนการบำรุงรักษาคูคลอง/ลำรางสาธารณะให้สามารถระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ระบายน้ำได้ตามปกติ จำนวน ๑ สำนักงานเขต คือ สำนักงานเขตบางรัก ส่วนสำนักงานเขตบางคอแหลมยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอยู่ ระหว่างการดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการขุดลอกคูคลองดังกล่าว และ สำนักงานเขตบางนา สภาพคูน้ำซอยลาซาล ๖๓ เป็นคูคลองไม่มีสภาพคูคลอง

สรุป สำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ มีคูคลอง/ลำราง ในพื้นที่ที่มีสภาพพร้อม ให้น้ำสามารถไหลผ่านได้โดยไม่ติดขัดครบ ๑๐๐% จำนวน ๘ สำนักงานเขต คือ สำนักงานเขตบางรัก สำนักงาน เขต พระโขนง สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงานเขตสาทร สำนักงาน เขตยานนาวา และสำนักงานเขตสวนหลวง ส่วนสำนักงานเขตอีก ๒ สำนักงานเขต คือ สำนักงานเขตบางนา มีคู คลอง/ลำราง ที่ไม่มีสภาพคูคลอง ๑ คูคลอง/ลำราง ควรให้สำนักงานเขตดำเนินการเรื่องคลองหมดสภาพตาม ระเบียบ โดยไม่ควรนับไว้ในคูคลอง/ลำรางที่พร้อมในการระบายน้ำ ส่วนสำนักงานเขตบางคอแหลม มีคูคลอง/ลำราง จำนวน ๖ คูคลอง ที่อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการขุดลอก รายละเอียดในตารางที่ ๔

๕) การกำหนดจุดติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ และจัดทำแผนสำรองกรณีฉุกเฉิน

ตารางที่ ๕ การกำหนดจุดติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ และจัดทำแผนสำรองกรณีฉุกเฉิน

ลำดับ ที่	สำนักงานเขต	การกำหนดจุดติดตั้ง วัสดุ/อุปกรณ์(เครื่อง สูบน้ำ) ลงในแผนที่ (จำนวนทั้งหมด)		แผนสำรองกรณีฉุกเฉินที่เกิดระหว่างการปฏิบัติการ		
		มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	สาเหตุที่ไม่มีเพราะ
๑	สำนักงานเขตบางรัก	-	๖	-	✓	ไม่ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพราะ พื้นที่น้อยหากวางเครื่องสูบน้ำ จะ ทำให้เกิดขวางการจราจร
๒.	สำนักงานเขตพระโขนง	๒	-	-	✓	พื้นที่เขตพระโขนงจะมีประตูละบายน้ำเปิด-ปิด และปั๊มสูบน้ำ ของสำนักการระบายน้ำทุกจุด หากเกิดกรณีไฟฟ้าดับ จะมีการ ประสานกับการไฟฟ้านครหลวง (บางกะปิ)
๓.	สำนักงานเขตบางนา	๑๖	-	-	✓	มีหน่วยเบสท์ปฏิบัติหน้าที่ใน สถานการณ์เร่งด่วน
๔.	สำนักงานเขตปทุมวัน	๑	-	-	✓	มีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์อย่าง สม่ำเสมอ
๕.	สำนักงานเขตคลองเตย	๙	-	-	✓	กรณีไฟฟ้าดับจะประสานการ ไฟฟ้านครหลวงทันที กรณีเครื่อง สูบน้ำไม่เพียงพอจะประสานสำนัก การระบายน้ำ
๖.	สำนักงานเขตวัฒนา	๔	-	-	✓	การระบายน้ำในพื้นที่เขตวัฒนา อาศัยการระบายน้ำในระบบหลักของ สำนักการระบายน้ำ การติดตั้งเครื่อง สูบน้ำบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมจะเป็น การเร่งระบายน้ำไปสู่ระบบหลัก
๗	สำนักงานเขตสาทร	๒	-	-	✓	เครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำ อยู่ใน การดูแลของสำนักการระบายน้ำ

ตารางที่ ๕ การกำหนดจุดติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ และจัดทำแผนสำรองกรณีฉุกเฉิน

ลำดับ ที่	สำนักงานเขต	การกำหนดจุดติดตั้ง วัสดุ/อุปกรณ์(เครื่อง สูบน้ำ) ลงในแผนที่ (จำนวนทั้งหมด)		แผนสำรองกรณีฉุกเฉินที่เกิดระหว่างการปฏิบัติการ		
		มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	สาเหตุที่ไม่มีเพราะ
๘.	สำนักงานเขตบางคอ แหลม	๒	-	-	✓	พื้นที่เขตไม่มีสถานะน้ำท่วมแบบ รุนแรง และในพื้นที่มีสถานีสูบน้ำ จำนวน ๖ แห่ง และประตูระบาย น้ำจำนวน ๙ แห่ง อยู่ในการดูแล ของสำนักการระบายน้ำ และมี หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ หน่วยเร่งด่วน
๙.	สำนักงานเขตยานนาวา	๑	-	✓	-	
๑๐.	สำนักงานเขตสวนหลวง	๖	-	✓	-	
รวม		๔๓	๖	๒	๘	

ข้อมูลจากตารางที่ ๕ สรุปผลการกำหนดจุดติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ (เครื่องสูบน้ำ) ในแต่ละจุด/บริเวณ ลงในแผนที่ และการกำหนดแผนสำรองกรณีฉุกเฉินที่เกิดระหว่างการปฏิบัติการ มีดังนี้

๕.๑) สำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพได้มีการกำหนดจุดติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ (เครื่องสูบน้ำ) ในแต่ละจุด/บริเวณ ลงในแผนที่ จำนวน ๙ สำนักงานเขต รวมทั้งสิ้น ๔๓ จุด/บริเวณ ซึ่งสำนักงานเขตบางนา มีความต้องการขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากสำนักการระบายน้ำ เพื่อติดตั้งเพิ่มเติมในพื้นที่อีก จำนวน ๙ เครื่อง ส่วนสำนักงานเขตบางรัก ไม่มีการกำหนดจุดติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ (เครื่องสูบน้ำ) ในพื้นที่ เนื่องจาก พื้นที่น้อยไม่สามารถวางเครื่องสูบน้ำได้ หากติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมจะทำให้กีดขวางการจราจร

๕.๒) การเตรียมแผนสำรองกรณีฉุกเฉินที่เกิดในระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น ไฟฟ้าดับ เครื่องสูบน้ำขัดข้อง หรือเครื่องสูบน้ำไม่เพียงพอต่อการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ปรากฏว่า สำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพได้มีแผนสำรองกรณีฉุกเฉินที่เกิดในระหว่างปฏิบัติงาน จำนวน ๒ สำนักงานเขต คือ สำนักงานเขตยานนาวา และสำนักงานเขตสวนหลวง สำนักงานเขตที่ไม่มีแผนสำรองกรณีฉุกเฉินที่เกิดในระหว่างปฏิบัติงาน จำนวน ๘ สำนักงานเขต คือ สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตพระโขนง สำนักงานเขตบางนา สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงานเขตสาทร และสำนักงานเขตบางคอแหลม

๑.๒ ความพร้อมด้านอื่นๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ตารางที่ ๖ ข้อมูลความพร้อมของหน่วยเบสท์ แผนปฏิบัติการ การจัดตั้งศูนย์ฯ

ลำดับที่	หน่วยงาน	ความพร้อมของหน่วยเบสท์				ความพร้อมของแผนปฏิบัติการ		การจัดตั้งศูนย์ฯ		การประชุมเตรียมความพร้อม		การติดตั้งวัสดุอุปกรณ์			การจัดตั้งศูนย์ฯ ส่วนหน้า			
		คน		วัสดุอุปกรณ์		มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่ครบ	ไม่มี	การกำหนดจุดตั้งศูนย์ฯ		คำสั่งมอบหมายหน้าที่	
		มี	ไม่มี	มี	ไม่มี										มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
๑.	สำนักงานเขตบางรัก	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	✓	-
๒.	สำนักงานเขตพระโขนง	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	✓
๓.	สำนักงานเขตบางนา	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-
๔.	สำนักงานเขตปทุมวัน	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-
๕.	สำนักงานเขตคลองเตย	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	✓
๖.	สำนักงานเขตวัฒนา	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-
๗.	สำนักงานเขตสาทร	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-
๘.	สำนักงานเขตบางคอแหลม	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-
๙.	สำนักงานเขตยานนาวา	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-
๑๐.	สำนักงานเขตสวนหลวง	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-
รวม		๑๐	-	๙	๑	๙	๑	๙	๑	๑๐	-	๗	๒	๑	๑๐		๘	๒
คิดเป็นร้อยละ		๑๐๐		๙๐	๑๐	๙๐	๑๐	๙๐	๑๐	๑๐๐	-	๗๐	๒๐	๑๐	๑๐๐	-	๘๐	๒๐

สำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงเทพใต้มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ ท่อระบายน้ำ และคูคลอง/ลำรางสาธารณะ ได้แก่ ความพร้อมของหน่วยเบสท์ (คนและวัสดุอุปกรณ์) ความพร้อมของแผนปฏิบัติการ การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การประชุมเตรียมความพร้อม การติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ และการจัดตั้งศูนย์ส่วนหน้า ดังรายละเอียดตามตารางที่ ๖ ดังนี้

๑) ความพร้อมของหน่วยเบสท์

๑.๑ เรื่องคน ทุกสำนักงานเขตมีความพร้อมเรื่องคน

๑.๒ เรื่องวัสดุอุปกรณ์ สำนักงานเขตที่มีความพร้อมเรื่องวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๙ สำนักงานเขต ยกเว้นสำนักงานเขตบางนา มีเครื่องสูบน้ำไม่เพียงพอ (อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากสำนักการระบายน้ำจำนวน ๙ เครื่อง)

๒) ความพร้อมของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและแผนบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ มีความพร้อมของแผนปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม และแผนบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๙ สำนักงานเขต (ร้อยละ ๙๐) ยกเว้นสำนักงานเขตคลองเตย เนื่องจาก สำนักงานเขตมีหน้าที่ที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นอยู่แล้วจึงไม่มีแผนดังกล่าว

๓) การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ทุกสำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จำนวน ๙ สำนักงานเขต ยกเว้นสำนักงานเขตพระโขนง เนื่องจาก คำสั่งการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจะออกในช่วงฤดูฝน

- ๔) การประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ทุกสำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ มีการประชุมเตรียมความพร้อม อย่างน้อย

๑ - ๔ ครั้งต่อเดือน

- ๕) การติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ในจุด/บริเวณเฝ้าระวัง/จุดน้ำท่วมซ้ำซาก

๕.๑ สำนักงานเขตที่มีการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ ครบ ๑๐๐% จำนวน ๗ สำนักงานเขต
คือ สำนักงานเขตพระโขนง สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงานเขต
สาทร สำนักงานเขตบางคอแหลม และสำนักงานเขตยานนาวา

๕.๒ สำนักงานเขตที่ไม่มีการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑ สำนักงานเขต คือ สำนักงาน
เขตบางรัก เนื่องจาก พื้นที่คับแคบไม่สามารถวางเครื่องสูบน้ำได้ เพราะจะทำให้การจราจรติดขัด และได้กำหนดแนว
ทางแก้ไข โดยการขอจัดสรรงบประมาณในการวางท่อระบายน้ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และเพิ่มเติมบางจุด

๕.๓ สำนักงานเขตที่มีการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์แต่ยังดำเนินการไม่ครบ จำนวน ๒ สำนักงานเขต
คือ สำนักงานเขตบางนา เนื่องจากอยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ จากสำนักการระบายน้ำ จำนวน ๔ เครื่อง
และสำนักงานเขตสวนหลวง เนื่องจากอยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการซ่อมบำรุงและจัดหาเครื่องสูบน้ำ
และวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งจะติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

- ๖) ความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้า

สำนักงานเขตของกลุ่มเขตกรุงเทพใต้มีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้าในพื้นที่ โดยมีการกำหนดบริเวณจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ส่วน
หน้าครบ ๑๐๐% ทุกสำนักงานเขต แต่มีสำนักงานเขตที่มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ และบูรณาการการทำงาน จำนวน ๘
สำนักงานเขต ยกเว้นสำนักงานเขตพระโขนง และสำนักงานเขตคลองเตย รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๗
ตารางที่ ๗ ความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้า

ลำดับ ที่	สำนักงานเขต	บริเวณที่จัดตั้งศูนย์ฯ	คำสั่งมอบหมาย หน้าที่	หากไม่มี (เหตุผล)
๑.	สำนักงานเขตบางรัก	๑. ถนนศาลาแดง ๒. ซอยสาทร ๖,๘ ๓. ถนนสุรวงศ์ (ใต้ทางด่วนศรีรัช)	มี	-
๒.	สำนักงานเขตพระโขนง	๑. ซอยสุขุมวิท ๑๐๑ ๒. ซอยปทุมวันวิถิ ๕๓ ๓. หมู่บ้านเมืองทอง ๔	ไม่มี	จะดำเนินการก่อน เข้าฤดูฝนประมาณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
๓.	สำนักงานเขตบางนา	ถนนลาซาล-แบร์ริง	มี	-
๔.	สำนักงานเขตปทุมวัน	หน้าวัดดวงแข	มี	-

ตารางที่ ๗ ความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้า

ลำดับ ที่	สำนักงานเขต	บริเวณที่จัดตั้งศูนย์ฯ	คำสั่งมอบหมาย หน้าที่	หากไม่มี (เหตุผล)
๕.	สำนักงานเขตคลองเตย	หน้าห้างบิ๊กซีพระรามที่ ๔	ไม่มี	เป็นหน้าที่ที่ต้อง ประสานงานกับ หน่วยงานอื่นอยู่ แล้ว
๖.	สำนักงานเขตวัฒนา	๑. หน้าตึกซิโนทัย ถนนโอศกมนตรี ๒. บริเวณแยกพร้อมศรี ซอยสุขุมวิท ๓๙	มี	-
๗.	สำนักงานเขตสาทร	๑. ถนนจันทน์ ๒. ถนนสวนพลู	มี	-
๘.	สำนักงานเขตบางคอแหลม	บริเวณสี่แยกถนนตก	มี	-
๙.	สำนักงานเขตยานนาวา	สำนักงานเขตยานนาวา	มี	-
๑๐.	สำนักงานเขตสวนหลวง	สำนักงานเขตสวนหลวง	มี	-

๒. ความพร้อมในการรับมือมือมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อน

๒.๑ การกำหนดแผนและมาตรการลดผลกระทบจากพายุฤดูร้อน รวมทั้งการสร้าง

ความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุ

สำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ จำนวน ๖ สำนักงานเขต (ร้อยละ ๖๐) มีการกำหนดแผนและมาตรการลดผลกระทบจากพายุฤดูร้อน และสำนักงานเขตที่ไม่มีการกำหนดแผนและมาตรการลดผลกระทบจากพายุฤดูร้อน จำนวน ๔ สำนักงานเขต รายละเอียดข้อมูลตามตารางที่ ๘

ตารางที่ ๘ การกำหนดแผนและมาตรการลดผลกระทบจากพายุฤดูร้อน

ลำดับ ที่	สำนักงานเขต	การกำหนดแผนและ มาตรการลด ผลกระทบ		เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ เนื่องจาก
		มี	ไม่มี	
๑.	สำนักงานเขตบางรัก	-	✓	ใช้แผนป้องกันน้ำท่วมประจำปี ซึ่งกำหนดมาตรการ ครอบคลุมผลกระทบจากพายุฤดูร้อนแล้ว
๒.	สำนักงานเขตพระโขนง	-	✓	มีหน่วยเบสท์ปฏิบัติหน้าที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อม รับมือกรณีเกิดเหตุ
๓.	สำนักงานเขตบางนา	✓		-
๔.	สำนักงานเขตปทุมวัน	✓		-
๕.	สำนักงานเขตคลองเตย	-	✓	มีคำสั่งแต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์จุดอ่อนน้ำท่วม ครอบคลุมการปฏิบัติงานแล้ว

ตารางที่ ๘ การกำหนดแผนและมาตรการลดผลกระทบจากพายุฤดูร้อน

ลำดับ ที่	สำนักงานเขต	การกำหนดแผนและ มาตรการลด ผลกระทบ		เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ เนื่องจาก
		มี	ไม่มี	
๖.	สำนักงานเขตวัฒนา	-	✓	มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมไว้ ตลอดเวลา ไม่มีการเคลื่อนย้าย และสภาพเครื่อง พร้อมใช้งาน
๗.	สำนักงานเขตสาทร	✓	-	-
๘.	สำนักงานเขตบางคอ แหลม	✓	-	-
๙.	สำนักงานเขตยานนาวา	✓	-	-
๑๐.	สำนักงานเขตสวนหลวง	✓	-	-
รวม		๖	๔	
คิดเป็นร้อยละ		๖๐	๔๐	

๒.๒ มีการสำรวจตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง/ต้นไม้ที่อาจได้รับ

ผลกระทบจากพายุฤดูร้อน

สำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ทุกสำนักงานเขตมีการสำรวจตรวจสอบความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง เช่น ป้ายโฆษณา เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากพายุฤดูร้อน โดยการออกาหนังสือแจ้งเจ้าของอาคารให้ดำเนินการตรวจสอบสภาพการใช้ และความมั่นคงแข็งแรงของป้ายโฆษณาโครงเหล็ก และได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของต้นไม้ในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ รายละเอียดตามตารางที่ ๘

ตารางที่ ๘ การสำรวจสิ่งก่อสร้าง/ต้นไม้ที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน

ลำดับ ที่	สำนักงานเขต	การสำรวจ สิ่งก่อสร้าง/ต้นไม้ที่ อาจได้รับผลกระทบ จากพายุฤดูร้อน		เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ เนื่องจาก
		มี	ไม่มี	
๑.	สำนักงานเขตบางรัก	✓	-	-
๒.	สำนักงานเขตพระโขนง	✓	-	-
๓.	สำนักงานเขตบางนา	✓	-	-
๔.	สำนักงานเขตปทุมวัน	✓	-	-
๕.	สำนักงานเขตคลองเตย	✓	-	-
๖.	สำนักงานเขตวัฒนา	✓	-	-
๗.	สำนักงานเขตสาทร	✓	-	-

ตารางที่ ๘ การสำรวจสิ่งก่อสร้าง/ต้นไม้ที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน

ลำดับ ที่	สำนักงานเขต	การสำรวจ สิ่งก่อสร้าง/ต้นไม้ที่ อาจได้รับผลกระทบ จากพายุฤดูร้อน		เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ เนื่องจาก
		มี	ไม่มี	
๘.	สำนักงานเขตบางคอ แหลม	✓	-	-
๙.	สำนักงานเขตยานนาวา	✓	-	-
๑๐.	สำนักงานเขตสวนหลวง	✓	-	-
รวม		๑๐	-	
คิดเป็นร้อยละ		๑๐๐	-	

๒.๓ การตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้างและต้นไม้ในพื้นที่

สำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ทุกสำนักงานเขต มีการตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้างและต้นไม้ในพื้นที่ และมีการรายงานข้อมูลจำนวนสิ่งก่อสร้างและต้นไม้ในพื้นที่ที่ไม่แข็งแรง สรุปดังนี้

๑) สำนักงานเขตที่มีสิ่งก่อสร้าง ต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงในพื้นที่ จำนวน ๓ สำนักงานเขต คือ

- สำนักงานเขตบางรัก มีต้นไม้ที่ไม่แข็งแรง จำนวน ๑๑ ต้น สำนักงานเขตบางรักได้ดำเนินการตัดแต่งลดระดับทรงพุ่ม และกิ่งผุซึ่งเกิดจากโรคและแมลงเข้าทำลาย
- สำนักงานเขตบางนา มีป้าย จำนวน ๒๖ ป้าย และต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงจำนวน ๖ ต้น สำนักงานเขตบางนาได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไข กรณีป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ได้ทำหนังสือแจ้งเจ้าของป้ายดำเนินการต่อไป ส่วนกรณีต้นไม้ไม่แข็งแรง ถ้าต้นไม้เอน ได้ดำเนินการตัดค้ำยัน
- สำนักงานเขตปทุมวัน มีสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรง จำนวน ๑๖ แห่ง สำนักงานเขตปทุมวันได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขโดยมีหนังสือแจ้งเจ้าของป้ายดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขต่อไป

๒) สำนักงานเขตที่ไม่พบสิ่งก่อสร้าง ต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงในพื้นที่ จำนวน ๗ สำนักงานเขต คือ สำนักงานเขตพระโขนง สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตบางคอแหลม สำนักงานเขตยานนาวา และสำนักงานเขตสวนหลวง

๒.๔ แผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุต้นไม้ หรือสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายจากพายุ

สำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ จำนวน ๖ สำนักงานเขต (ร้อยละ ๖๐) คือ สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตบางนา สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตบางคอแหลม สำนักงานเขตยานนาวา และสำนักงานเขตสวนหลวง มีแผนรองรับในกรณีเกิดเหตุต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายจากพายุ

ส่วนสำนักงานเขต อีกจำนวน ๔ สำนักงานเขต (ร้อยละ ๔๐) ไม่มีแผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายจากพายุ คือ สำนักงานเขตพระโขนง สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตคลองเตย และสำนักงานเขตวัฒนา รายละเอียดตามตารางที่ ๙

ตารางที่ ๔ แผนรองรับในกรณีเกิดเหตุต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน

ลำดับ ที่	สำนักงานเขต	แผนรองรับในกรณีที่ เกิดเหตุต้นไม้หรือ สิ่งก่อสร้างได้รับความ เสียหาย		เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ เนื่องจาก
		มี	ไม่มี	
๑.	สำนักงานเขตบางรัก	✓	-	
๒.	สำนักงานเขตพระโขนง	-	✓	มีการทำหนังสือแจ้งให้เจ้าของสิ่งก่อสร้างให้ ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงป้ายโฆษณาโครงเหล็ก เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากพายุฤดู ร้อน
๓.	สำนักงานเขตบางนา	✓	-	-
๔.	สำนักงานเขตปทุมวัน	-	✓	มีการทำหนังสือแจ้งให้เจ้าของสิ่งก่อสร้างให้ ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงป้ายโฆษณาโครงเหล็ก เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากพายุฤดู ร้อน
๕.	สำนักงานเขตคลองเตย	-	✓	มีคำสั่งแต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์จุดอ่อนน้ำท่วม ครอบคลุมการปฏิบัติงานแล้ว
๖.	สำนักงานเขตวัฒนา	-	✓	มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของป้ายตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรง และมีหนังสือรับรองของวิศวกรเป็นประจำ ทุกปี
๗.	สำนักงานเขตสาทร	✓	-	-
๘.	สำนักงานเขตบางคอ แหลม	✓	-	-
๙.	สำนักงานเขตยานนาวา	✓	-	-
๑๐.	สำนักงานเขตสวนหลวง	✓	-	-
รวม		๖	๔	
คิดเป็นร้อยละ		๖๐	๔๐	

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ

สำนักงานเขตควรจัดทำแผนป้องกันอุบัติภัย หรือแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละ
ด้านไว้ในแผนเดียวกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านไว้ในแผนเดียวกัน เพื่อ
สะดวกในการติดตามงาน

ส่วนที่ ๔ เขตตรวจราชการ ๔ (กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร)

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก”

รอบที่ ๒ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑)

เขตตรวจราชการ ๔ (กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร)

ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้มีการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก” โดยกำหนดการตรวจติดตามครั้งที่ ๒ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้หน่วยงานได้ปฏิบัติการสร้างความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน และความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๑

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๔ ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร (นายพินิต เลิศอุดมธนา และนางสาวกาญจนา สมวงศ์) ผู้ตรวจราชการสูง (นายอุดมศักดิ์ นาดี และนางสาวมุสตี พรหมายน) ได้ร่วมกันตรวจราชการดังกล่าวของกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สำนักงานเขตพญาไท สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขตห้วยขวาง สำนักงานเขตราชเทวี และสำนักงานเขตวังทองหลาง) ขอรายงานผลการตรวจราชการโดยสรุปดังนี้

๑. ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

๑.๑ ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์

๑) จำนวนพื้นที่น้ำท่วม

ตารางที่ ๑ แสดงจุดพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	จุดเฝ้า ระวัง (จุด)	จุดเร่งระบาย น้ำ (จุด)	จุดอ่อน น้ำท่วม (จุด)	รวมทั้งหมด	รวมพื้นที่ น้ำท่วม
๑.	สำนักงานเขตพระนคร	๑	-	๑	๒	๒
๒.	สำนักงานเขตดุสิต	๕	๑	๑	๗	๗
๓.	สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	-	-	-	-	-
๔.	สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์	๒	-	-	๒	๒
๕.	สำนักงานเขตพญาไท	-	-	๔	๔	๔
๖.	สำนักงานเขตดินแดง	-	-	๓	๓	๓
๗.	สำนักงานเขตห้วยขวาง	๒*	๒*	๖*	๑๐	๖*
๘.	สำนักงานเขตราชเทวี	๔	-	-	๔	๔
๙.	สำนักงานเขตวังทองหลาง	๓**	๓	๓**	๙	๖**
รวม (กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร)		๑๗	๑๐	๒๒	๔๙	๓๔

หมายเหตุ * หมายถึง ข้อมูลจุดเฝ้าระวัง/จุดเร่งระบายน้ำ เป็นพื้นที่จุดเดียวกันจำนวน ๒ จุด และรวมอยู่ในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม

** หมายถึง ข้อมูลจุดเฝ้าระวัง และจุดอ่อนน้ำท่วมเป็นพื้นที่จุดเดียวกัน

จากข้อมูลการตรวจราชการของเขตตรวจราชการ รอบที่ ๑ สำนักงานเขตกลุ่มเขต
กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด ๔๙ จุด จำแนกเป็น จุดเฝ้าระวัง จำนวน ๑๗ จุด จุดเร่งระบายน้ำ จำนวน
๑๐ จุด และจุดอ่อนน้ำท่วม จำนวน ๒๒ จุด แต่เนื่องจากบางสำนักงานเขตได้กำหนดจุดเฝ้าระวัง จุดอ่อนน้ำท่วม
และจุดเร่งระบายน้ำ อยู่ในบริเวณจุดเดียวกัน จึงทำให้พื้นที่น้ำท่วมในกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร รวม ๓๔ จุด ดัง
ปรากฏในตารางที่ ๑

๒) ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์

ตารางที่ ๒ ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ (เครื่องสูบน้ำ)

ลำดับ ที่	สำนักงานเขต	เครื่องสูบน้ำ (รอบที่ ๑)			การดำเนินการ (รอบที่ ๒)		
		รวม	พร้อม	ไม่พร้อม	ต้อง บำรุงรักษา	ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ
๑.	สำนักงานเขตพระนคร	๒	๒	-	-	-	-
๒.	สำนักงานเขตดุสิต	๑๓	๑๒	๑	๑	๑	-
๓.	สำนักงานเขตป้อมปราบ ฯ	๔	๔	-	-	-	-
๔.	สำนักงานเขตสัม พันธวงศ์	๓	๓	-	-	-	-
๕.	สำนักงานเขตพญาไท	๗	๗	-	-	-	-
๖.	สำนักงานเขตดินแดง	๒	๒	-	-	-	-
๗.	สำนักงานเขตห้วยขวาง	๖	๖	-	-	-	-
๘.	สำนักงานเขตราชเทวี	๒	-	๒*	๒*	๒	-
๙.	สำนักงานเขตวัง ทองหลาง	๓๐	๒๙	๑*	๑*	๑	-
รวม		๖๙	๖๕	๔	๔	๔	-

หมายเหตุ :- * หมายความว่า รอยุบสภาพ

จากข้อมูลการตรวจราชการ รอบที่ ๑ สำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร
มีสำนักงานเขตที่ต้องดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตามปกติ จำนวน ๓ สำนักงานเขต
ได้แก่ สำนักงานเขตดุสิต จำนวน ๑ เครื่อง สำนักงานเขตราชเทวี รอยุบสภาพ จำนวน ๒ เครื่อง และ
สำนักงานเขตวังทองหลาง รอยุบสภาพ จำนวน ๑ เครื่อง รวมทั้งสิ้น ๔ เครื่อง และจากการตรวจราชการ รอบที่ ๒
เพื่อติดตามผลการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ ดังกล่าว ปรากฏว่า ทุกสำนักงานเขตดังกล่าวได้ดำเนินการบำรุงรักษา
เครื่องสูบน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตามปกติ ๑๐๐%

สรุป ทุกสำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร มีความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์
(เครื่องสูบน้ำ) ๑๐๐% ตามรายละเอียดในตารางที่ ๒

๓) ความพร้อมของท่อระบายน้ำ

ตารางที่ ๓ ความพร้อมของท่อระบายน้ำ

ลำดับที่	สำนักงานเขต	ท่อระบายน้ำ (รอบที่ ๑)				การดำเนินการ (รอบที่ ๒)		
		จำนวนถนน/ซอย	ความยาวรวม (เมตร)	พร้อม	ไม่พร้อม	ต้องบำรุงรักษา	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ
๑.	สำนักงานเขตพระนคร	๑๐๒	๒๖,๒๓๕	๒๖,๒๓๕	-	-	-	-
๒.	สำนักงานเขตดุสิต	๑๐๓	๔๕,๙๕๕	๔๕,๙๕๕	-	-	-	-
๓.	สำนักงานเขตป้อมปราบฯ	๖๐	๑๕,๑๑๕	๑๕,๑๑๕	-	-	-	-
๔.	สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์	๖๔	๑๑,๙๕๑	๑๑,๙๕๑	-	-	-	-
๕.	สำนักงานเขตพญาไท	๑๒๒	๘๒,๙๕๕	๘๒,๙๕๕	-	-	-	-
๖.	สำนักงานเขตดินแดง	๑๙๕	๑๐,๕๙๘๗	๑๐,๕๙๘๗	-	-	-	-
๗.	สำนักงานเขตห้วยขวาง	๑๗๕	๑๔๕,๒๔๒	๑๔๕,๒๔๒	-	-	-	-
๘.	สำนักงานเขตราชเทวี	๙๔	๓๖,๗๔๓	๓๖,๗๔๓	-	-	-	-
๙.	สำนักงานเขตวังทองหลาง	๖๓	๕๗,๘๙๘	๕๗,๘๙๘	-	-	-	-
รวม		๙๗๘	๕๒๘,๐๘๑	๕๒๘,๐๘๑	-	-	-	-

จากข้อมูลการตรวจราชการ รอบที่ ๑ สำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพมหานครกลาง ทุกสำนักงานเขตมีการบำรุงรักษาท่อระบายน้ำที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ระบายน้ำได้ตามปกติ ครบ ๑๐๐% และจากการรายงานผลการตรวจราชการ รอบที่ ๒ เพื่อติดตามผลการบำรุงรักษาท่อระบายน้ำดังกล่าว ปรากฏว่า ทุกสำนักงานเขตที่ได้ดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ระบายน้ำได้ตามปกติของแต่ละสำนักงานเขต ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบางสำนักงานเขตดำเนินการโดยใช้แรงงานของสำนักงานเขตดำเนินการ บางสำนักงานเขตมีการจ้างเหมาเอกชนล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยสรุปดังนี้

- สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ มีการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ กำหนดดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

- สำนักงานเขตดุสิต มีการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการดำเนินการกำหนดวันแล้วเสร็จ แต่ในส่วนของการทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยใช้แรงงานเขต ได้ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จไปแล้ว (๔๕% ของความยาวท่อระบายน้ำทั้งหมด)

- สำนักงานเขตพญาไท มีการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่ทั้งหมด กำหนดดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

- สำนักงานเขตห้วยขวาง มีการดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยใช้แรงงานเขต จำนวน ๑๗ ซอย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สำหรับการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ จำนวน ๑๕๘ ซอย กำหนดดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

- สำนักงานเขตราชเทวี มีการดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยใช้แรงงาน
เขต จำนวน ๘๕.๕๐๐ (ความยาว ๓๒,๒๗๗.๕๐ เมตร) ดำเนินการเสร็จแล้ว ๕.๕๐๐ (ความยาว ๕๘๑ เมตร) และ
ดำเนินการโดยการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ จำนวน ๗๕.๕๐๐ (ความยาว ๓๐,๗๕๔.๕๐ เมตร) กำหนดวันดำเนินการ
แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

โดยภาพรวม สำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ มีความพร้อมของท่อระบายน้ำในการ
ระบายน้ำได้ตามปกติ ครบ ๑๐๐% ตามรายละเอียดในตารางที่ ๓

๔) ความพร้อมของคูคลอง ลำรางสาธารณะ

ตารางที่ ๔ ความพร้อมของคูคลอง/ลำรางสาธารณะ

ลำดับ ที่	สำนักงานเขต	คูคลอง/ลำรางสาธารณะ (รอบที่ ๑)				การดำเนินการ (รอบที่ ๒)		
		จำนวน คูคลอง/ ลำราง	ความ ยาวรวม (เมตร)	พร้อม	ไม่ พร้อม	ต้อง บำรุงรักษา	ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ
๑.	สำนักงานเขตพระนคร	๖	๗๔๓	๗๔๓	-	-	-	-
๒.	สำนักงานเขตดุสิต	๑๘	๘,๒๐๕	๗,๕๕๕	๖๕๐*	๖๕๐*		
๓.	สำนักงานเขตป้อมปราบฯ	๗	๙๘๖	๙๘๖	-	-	-	-
๔.	สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์	-	-	-	-	-	-	-
๕.	สำนักงานเขตพญาไท	๓	๑,๑๓๐	๑,๑๓๐	-	-	-	-
๖.	สำนักงานเขตดินแดง	๔	๑,๐๑๑	๑,๐๑๑	-	-	-	-
๗.	สำนักงานเขตห้วยขวาง	๘	๕,๙๕๙	๑,๗๑๙	๔,๒๔๐	๔,๒๔๐		
๘.	สำนักงานเขตราชเทวี	๖	๙๘๒	๙๘๒	-	-	-	-
๙.	สำนักงานเขตวังทองหลาง	๑๒	๖,๒๔๖	๖,๒๐๖	๔๐**	๔๐**	-	๔๐**
รวม		๖๔	๒๕,๒๖๒	๒๐,๓๓๒	๔,๙๓๐	๔,๙๓๐		

หมายเหตุ:- * คลองลำปึก และคลองวัดญวนสะพานขาว เขตดุสิต ไม่มีสภาพคูคลอง

** ลำรางแยกคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง ไม่มีสภาพเป็นลำราง

จากข้อมูลการตรวจราชการ รอบที่ ๑ สำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง
มีสำนักงานเขตที่ต้องดำเนินการบำรุงรักษาคูคลอง/ลำรางสาธารณะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ระบายน้ำได้
ตามปกติ จำนวน ๓ สำนักงานเขต ได้แก่

- สำนักงานเขตดุสิต คลองลำปึก และคลองวัดญวนสะพานขาว ความยาวรวม
๖๕๐ เมตร ซึ่งไม่มีสภาพคูคลอง

- สำนักงานเขตห้วยขวาง ลำรางขุดตาเชียง และลำรางขุดบางจาก ความยาว
รวม ๔,๒๔๐ เมตร ซึ่งสำนักงานเขตห้วยขวางได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการจ้างเหมา
เอกชนดำเนินการปรับปรุงขุดลอกลำรางดังกล่าวให้มีความพร้อมในการระบายน้ำให้สามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด

- สำนักงานเขตวังทองหลาง ลำรางแยกคลองเจ้าคุณสิงห์ ความยาว ๔๐ เมตร
รวมความยาวของคูคลอง/ลำรางที่ต้องบำรุงรักษา ทั้งสิ้น ๘,๑๘๑ เมตร

จากการรายงานผลการตรวจราชการ รอบที่ ๒ เพื่อติดตามผลการบำรุงรักษา
คูคลอง/ลำรางสาธารณะดังกล่าว ปรากฏว่า มีสำนักงานเขตที่ได้ดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาคูคลอง/ลำราง
สาธารณะให้สามารถระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ระบายน้ำได้ตามปกติ จำนวน ๑ สำนักงานเขต คือ
สำนักงานเขต- ห้วยขวาง ได้จ้างเหมาเอกชนดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ และมี
สำนักงานเขตไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก คูคลอง/ลำรางดังกล่าว ไม่มีสภาพคูคลอง/ลำราง คือ สำนักงานเขตดุสิต
และสำนักงานเขตวังทองหลาง

สรุป ในภาพรวม ทุกสำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพมหานครมีคูคลอง/ลำราง
ในพื้นที่ที่มีสภาพพร้อมให้น้ำสามารถไหลผ่านได้โดยไม่ติดขัดครบ ๑๐๐% ยกเว้นสำนักงานเขตเขตดุสิต และ
สำนักงานเขตวังทองหลาง เนื่องจากเป็นคูคลอง/ลำราง ที่ไม่มีสภาพคูคลอง ลำราง

๕) การกำหนดจุดติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ และจัดทำแผนสำรองกรณีฉุกเฉิน

ตารางที่ ๕ การกำหนดจุดติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ และจัดทำแผนสำรองกรณีฉุกเฉิน

ลำดับ ที่	สำนักงานเขต	การกำหนดจุดติดตั้ง วัสดุ/อุปกรณ์(เครื่อง สูบน้ำ) ลงในแผนที่ (จำนวนทั้งหมด)		แผนสำรองกรณีฉุกเฉินที่เกิดระหว่างการปฏิบัติการ		
		มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	สาเหตุที่ไม่มีเพราะ
๑	สำนักงานเขตพระนคร	๑๓	-	-	✓	มีการตรวจความพร้อมของ กำลังคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องทุ่น แรง ก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง
๒.	สำนักงานเขตดุสิต	๙	-	-	✓	๑. กรณีไฟฟ้าดับมีเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าส่องสว่าง (แอร์ไลต์) ๒. กรณีเครื่องสูบน้ำขัดข้อง/ไม่ เพียงพอ ประสานแจ้งสำนักการ ระบายน้ำ เพื่อแก้ไขและสนับสนุน เครื่องสูบน้ำสำรอง
๓.	สำนักงานเขตป้อมปราบ ฯ	-	✓	-	✓	และไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่
๔.	สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์	-	✓	-	✓	ในพื้นที่เขตไม่มีการติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ เนื่องจากกีดขวาง การจราจร พื้นที่ค่อนข้างหนาแน่น มีน้ำท่วมขังไม่นาน สำนักงานเขต ฯ แก้ไขปัญหา กรณีน้ำท่วมขังโดย การจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อแก้ไข ทันที

ตารางที่ ๕ การกำหนดจุดติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ และจัดทำแผนสำรองกรณีฉุกเฉิน

ลำดับ ที่	สำนักงานเขต	การกำหนดจุดติดตั้ง วัสดุ/อุปกรณ์(เครื่อง สูบน้ำ) ลงในแผนที่ (จำนวนทั้งหมด)		แผนสำรองกรณีฉุกเฉินที่เกิดระหว่างการปฏิบัติการ		
		มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	สาเหตุที่ไม่มีเพราะ
๕.	สำนักงานเขตพญาไท	๔	-	-	✓	จัดตั้งหน่วยเบสท์ดำเนินการให้ ความช่วยเหลือ ๒๔ ชั่วโมง
๖.	สำนักงานเขตดินแดง	๒	-	✓	-	-
๗.	สำนักงานเขตห้วยขวาง	๖	-	✓	-	-
๘.	สำนักงานเขตราชเทวี	๔	-	-	✓	เครื่องสูบน้ำในพื้นที่เขตราชเทวี สำนักการระบายน้ำเป็นผู้ดูแล
๙.	สำนักงานเขตวัง ทองหลาง	๓	-	✓	-	
รวม		๗ เขต/ ๔๑ จุด	๒ เขต	๓	๖	

ข้อมูลจากตารางที่ ๕ สรุปผลการกำหนดจุดติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ (เครื่องสูบน้ำ) ในแต่ละจุด/บริเวณ ลงในแผนที่ และการกำหนดแผนสำรองกรณีฉุกเฉินที่เกิดระหว่างการปฏิบัติการ มีดังนี้

๕.๑) การกำหนดจุดติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ (เครื่องสูบน้ำ) ในแต่ละจุด/บริเวณ ลงในแผนที่สำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร โดยสรุปดังนี้

- สำนักงานเขตที่มีการกำหนดจุดติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ (เครื่องสูบน้ำ) ในแต่ละจุด/บริเวณ ลงในแผนที่ จำนวน ๗ สำนักงานเขต รวมทั้งสิ้น ๔๑ จุด/บริเวณ คือ สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตพญาไท สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขตห้วยขวาง สำนักงานเขตราชเทวี และสำนักงานเขตวังทองหลาง

- สำนักงานเขตที่ไม่มีการกำหนดจุดติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ (เครื่องสูบน้ำ) ในแต่ละจุด/บริเวณ ลงในแผนที่ จำนวน ๒ สำนักงานเขต คือ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เนื่องจากไม่มีพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เนื่องจาก การติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ทำให้เกิดขวางการจราจรในพื้นที่ ที่มีสภาพค่อนข้างหนาแน่น และมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ไม่นาน

๕.๒) การเตรียมแผนสำรองกรณีฉุกเฉินที่เกิดในระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ไฟฟ้าดับ เครื่องสูบน้ำขัดข้อง หรือเครื่องสูบน้ำไม่เพียงพอต่อการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ของสำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร ปรากฏว่า

- สำนักงานเขตที่มีแผนสำรองกรณีฉุกเฉินที่เกิดในระหว่างปฏิบัติงาน จำนวน ๓ สำนักงานเขต คือ สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขตห้วยขวาง และสำนักงานเขตวังทองหลาง

- สำนักงานเขตที่ไม่มีแผนสำรองกรณีฉุกเฉินที่เกิดในระหว่างปฏิบัติงาน
จำนวน ๖ สำนักงานเขต คือ สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สำนักงานเขตพญาไท และสำนักงานเขตราชเทวี

๑.๒ ความพร้อมด้านอื่นๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

ตารางที่ ๖ ข้อมูลความพร้อมของหน่วยเบสท์ แผนปฏิบัติการ การจัดตั้งศูนย์ฯ

ลำดับที่	หน่วยงาน	ความพร้อมของหน่วยเบสท์				ความพร้อมของแผนปฏิบัติการ		การจัดตั้งศูนย์ฯ		การประชุมเตรียมความพร้อม		การติดตั้งวัสดุอุปกรณ์			การจัดตั้งศูนย์ฯ ส่วนหน้า			
		คน		วัสดุอุปกรณ์		มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	มีไม่ครบ	ไม่มี	กำหนดจุด		คำสั่งฯ	
		มี	ไม่มี	มี	ไม่มี										มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
๑.	สำนักงานเขตพระนคร	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	✓
๒.	สำนักงานเขตดุสิต	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-
๓.	สำนักงานเขตป้อมปราบฯ	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓
๔.	สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓
๕.	สำนักงานเขตพญาไท	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-
๖.	สำนักงานเขตดินแดง	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-
๗.	สำนักงานเขตห้วยขวาง	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-
๘.	สำนักงานเขตราชเทวี	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-
๙.	สำนักงานเขตวังทองหลาง	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓
รวม		๙		๙		๙		๗	๒	๖	๓	๕	๒	๒	๖	๓	๕	๔

สำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ ท่อระบายน้ำ และคูคลอง/ลำรางสาธารณะ ได้แก่ ความพร้อมของหน่วยเบสท์ (คนและวัสดุอุปกรณ์) ความพร้อมของแผนปฏิบัติการ การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม การประชุมเตรียมความพร้อม การติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ และการจัดตั้งศูนย์ส่วนหน้า ดังรายละเอียดตามตารางที่ ๖ ดังนี้

๑) ความพร้อมของหน่วยเบสท์ ทุกสำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร มีความพร้อมของคน และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

๒) ความพร้อมของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมและแผนบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกสำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร มีความพร้อมในเรื่องดังกล่าว

๓) การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม สำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม จำนวน ๗ สำนักงานเขต ยกเว้นสำนักงานเขตพระนคร (ไม่ระบุเหตุผล) และสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เนื่องจาก ไม่มีจุดอ่อนน้ำท่วมและไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

๔) การประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

สำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ มีการประชุมเตรียมความพร้อม อย่างน้อย ๑ - ๒ ครั้ง ต่อเดือน

๕) การติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ในจุด/บริเวณฝ้าระวัง/จุดน้ำท่วมซ้ำซาก

๕.๑ สำนักงานเขตที่มีการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ ครบ ๑๐๐% จำนวน ๕ สำนักงานเขต คือ สำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตพญาไท สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขตห้วยขวาง และสำนักงานเขตราชเทวี

๕.๒ สำนักงานเขตที่ไม่มีการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ สำนักงานเขต คือ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เนื่องจาก ในพื้นที่เขตไม่มีจุดอ่อนน้ำท่วม และไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังภายในพื้นที่ และสำนักงานเขต สัมพันธวงศ์ เนื่องจาก พื้นที่แคบ มีปัญหาเรื่องการจราจร แนวทางการแก้ไข กรณีมีน้ำท่วมขัง จะจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขทันที โดยการเปิดฝาท่อระบายน้ำช่วยเร่งการระบายน้ำ

๕.๓ สำนักงานเขตที่มีการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์แต่ยังดำเนินการไม่ครบ จำนวน ๒ สำนักงานเขต คือ

- สำนักงานเขตพระนคร เนื่องจาก จุดน้ำท่วมซ้ำซาก บริเวณถนนบ้านหม้อ ใช้การระบายน้ำด้วยระบบท่อเพียงอย่างเดียว (ท่อชนิดรางยู ๔๐ เซนติเมตร) กรณีดังกล่าวได้กำหนดแนวทางแก้ไข โดยให้สำนักการระบายน้ำปรับปรุงระบบระบายน้ำของถนนจักรเพชร และท่อลอดจากท่อระบายน้ำของถนนบ้านหม้อ

- สำนักงานเขตวังทองหลาง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไปแล้ว จำนวน ๒ จุด และกำหนดจะติดตั้งเพิ่มเติมในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งอยู่ในช่วงปฏิบัติงานนอกเวลาทำการของเจ้าหน้าที่ ทำให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรเฝ้าเครื่องสูบน้ำ

๖) ความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้า

สำนักงานเขตของกลุ่มเขตกรุงเทพมหานครกลางมีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้าในพื้นที่ โดยมีการกำหนดบริเวณจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ส่วนหน้าจำนวน ๖ สำนักงานเขต คือ สำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตพญาไท สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขตห้วยขวาง สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตวังทองหลาง โดยทุกสำนักงานเขตดังกล่าวมีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ และบูรณาการการทำงาน ยกเว้นสำนักงานเขตวังทองหลางอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ และมีสำนักงานเขตที่ไม่มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้า และคำสั่งมอบหมายหน้าที่และบูรณาการการทำงาน จำนวน ๔ สำนักงานเขต คือ สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๗

ตารางที่ ๗ ความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้า

ลำดับที่	สำนักงานเขต	บริเวณที่จัดตั้งศูนย์ฯ	คำสั่งมอบหมายหน้าที่	หากไม่มี (เหตุผล)
๑.	สำนักงานเขตพระนคร	-ไม่มี-	ไม่มี	ไม่ระบุเหตุผล
๒.	สำนักงานเขตดุสิต	บริเวณชั้น ๓ ห้องประชุมเฉลิม-พระเกียรติ	มี	
๓.	สำนักงานเขตป้อมปราบฯ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มีพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม และไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

ตารางที่ ๗ ความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้า

ลำดับ ที่	สำนักงานเขต	บริเวณที่จัดตั้งศูนย์ฯ	คำสั่งมอบหมาย หน้าที่	หากไม่มี (เหตุผล)
๔.	สำนักงานเขตสัม พันธวงศ์	ไม่มี	ไม่มี	- ไม่มีการจัดตั้ง ศูนย์ฯ เนื่องจากพื้นที่ แคบ และมีปัญหา ด้านการจราจร เมื่อ ฤดูฝนจะมีการเตรียม ความพร้อมในการ ปฏิบัติงานตลอดเวลา - กรณีไม่มีคำสั่ง มอบหน้าที่เนื่องจาก มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ- ชอบอยู่แล้ว จะดำเนินการเมื่อเกิด ปัญหาการปฏิบัติงาน โดยประสานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
๕.	สำนักงานเขตปทุมไ	บริเวณหน้าปั้มน้ำมัน ป.ต.ท. ถนนวิภาวดีรังสิต (ร.๑ รอ.)	มี	-
๖.	สำนักงานเขตดินแดง	ถนนประชาสุข ซอยخانเมือง หน้าตลาดห้วยขวาง	มี	-
๗.	สำนักงานเขตห้วยขวาง	บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขต ห้วยขวาง	มี	-
๘.	สำนักงานเขตราชเทวี	ห้องประชุมชั้น ๑ สำนักงานเขต ราชเทวี	มี	-
๙.	สำนักงานเขตวัง ทองหลาง	มีการตั้งเต็นท์ศูนย์จุดอ่อนน้ำท่วมซึ่ง บริเวณที่เกิดน้ำท่วมซ้ำ	ไม่มี	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจะแล้ว เสร็จภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

๒. ความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อน

๒.๑ การกำหนดแผนและมาตรการลดผลกระทบจากพายุฤดูร้อน รวมทั้งการสร้าง ความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุ

สำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน ๘ สำนักงานเขต (ร้อยละ ๘๘.๘๙) มีการกำหนดแผนและมาตรการลดผลกระทบจากพายุฤดูร้อน และสำนักงานเขตที่ไม่มีการกำหนดแผนและมาตรการลดผลกระทบจากพายุฤดูร้อน จำนวน ๑ สำนักงานเขต คือสำนักงานเขตดุสิต รายละเอียดข้อมูลตามตารางที่ ๘ ตารางที่ ๘ การกำหนดแผนและมาตรการลดผลกระทบจากพายุฤดูร้อน

ลำดับ ที่	สำนักงานเขต	การกำหนดแผนและ มาตรการลด ผลกระทบ		เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ เนื่องจาก
		มี	ไม่มี	
๑.	สำนักงานเขตพระนคร	✓	-	-
๒.	สำนักงานเขตดุสิต	-	✓	อยู่ระหว่างประสานรายละเอียดกับสำนักป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
๓.	สำนักงานเขตป้อมปราบฯ	✓	-	-
๔.	สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์	✓		-
๕.	สำนักงานเขตพญาไท	✓		-
๖.	สำนักงานเขตดินแดง	✓		-
๗.	สำนักงานเขตห้วยขวาง	✓		-
๘.	สำนักงานเขตราชเทวี	✓		-
๙.	สำนักงานเขตวัง ทองหลาง	✓	-	-
รวม		๘	๑	
คิดเป็นร้อยละ		๘๘.๘๙	๑๑.๑๑	

๒.๒ มีการสำรวจตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง/ต้นไม้ที่อาจได้รับ ผลกระทบจากพายุฤดูร้อน

สำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพมหานครมีการสำรวจตรวจสอบความแข็งแรงของ
สิ่งก่อสร้าง เช่น บ้ายโฆษณา เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากพายุฤดูร้อน โดยการออกหาหนังสือแจ้ง
เจ้าของอาคารให้ดำเนินการตรวจสอบสภาพการใช้ และความมั่นคงแข็งแรงของป้ายโฆษณาโครงเหล็ก และได้จัด
เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของต้นไม้ในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ จำนวน ๘ สำนักงานเขต และมี
สำนักงานเขตยังไม่ดำเนินการเรื่องดังกล่าว จำนวน ๑ สำนักงานเขต คือ สำนักงานเขตดุสิต รายละเอียดตาม
ตารางที่ ๘

ตารางที่ ๘ การสำรวจสิ่งก่อสร้าง/ต้นไม้ที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน

ลำดับ ที่	สำนักงานเขต	การสำรวจ สิ่งก่อสร้าง/ต้นไม้ที่ อาจได้รับผลกระทบ จากพายุฤดูร้อน		เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ เนื่องจาก
		มี	ไม่มี	
๑.	สำนักงานเขตพระนคร	✓	-	-
๒.	สำนักงานเขตดุสิต	-	✓	เนื่องจาก ยังไม่มีการกำหนดแผนและมาตรการลดผลกระทบฯ และอยู่ระหว่างการประสานรายละเอียดกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓.	สำนักงานเขตป้อมปราบฯ	✓	-	-
๔.	สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์	✓	-	-
๕.	สำนักงานเขตพญาไท	✓	-	-
๖.	สำนักงานเขตดินแดง	✓	-	-
๗.	สำนักงานเขตห้วยขวาง	✓	-	-
๘.	สำนักงานเขตราชเทวี	✓	-	-
๙.	สำนักงานเขตวังทองหลาง	✓	-	-
รวม		๘	๑	
คิดเป็นร้อยละ		๘๘.๘๙	๑๑.๑๑	

๒.๓ การตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้างและต้นไม้ในพื้นที่

สำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพมหานครจำนวน ๘ สำนักงานเขตที่มีการตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้างและต้นไม้ในพื้นที่ และมีการรายงานข้อมูลจำนวนสิ่งก่อสร้างและต้นไม้ในพื้นที่ที่ไม่แข็งแรง สรุปดังนี้

๑) สำนักงานเขตที่มีสิ่งก่อสร้าง ต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงในพื้นที่ จำนวน ๔ สำนักงานเขต คือ

- สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงจำนวน ๑๓๖ จุด/ต้น สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไข โดยการลดทอนความสูงลง และตัดแต่งให้โปร่ง จากนั้นดำเนินการตรวจสอบลำต้นว่าผุหรือไม่ ถ้ามีการผุให้ขออนุมัติขุดล้อมต่อไป
- สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ มีต้นไม้ที่ไม่แข็งแรง จำนวน ๒๘ ต้น สำนักงานเขตฯ ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขโดยการค้ำยันต้นไม้กรณีที่ต้องค้ำยัน และตัดทอนต้นไม้ที่สูงเพื่อลดความเสี่ยง
- สำนักงานเขตห้วยขวาง มีต้นไม้ที่ไม่แข็งแรง จำนวน ๔ จุด สำนักงานเขตฯ ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยให้เจ้าหน้าที่ตัดแต่งต้นไม้ที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน
- สำนักงานเขตวังทองหลาง มีต้นไม้ที่ไม่แข็งแรง จำนวน ๑๐๒ จุด/ต้น สำนักงานเขตฯ ได้ดำเนินการแก้ไขโดยการลดทอนความสูงของต้นไม้ให้อยู่ในระดับปลอดภัยและบำรุงรักษาต้นไม้ให้มีความแข็งแรง

๒) สำนักงานเขตที่ไม่พบสิ่งก่อสร้าง ต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงในพื้นที่ จำนวน ๕ สำนักงานเขต คือ สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตพญาไท สำนักงานเขตดินแดง และสำนักงานเขตราชเทวี

๒.๔ แผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุต้นไม้ หรือสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายจากพายุ

สำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน ๗ สำนักงานเขต (ร้อยละ ๗๗.๗๘) คือ สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักงานเขตพญาไท สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขตห้วยขวาง สำนักงานเขตราชเทวี และสำนักงานเขตวังทองหลาง มีแผนรองรับในกรณีเกิดเหตุต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายจากพายุ

ส่วนสำนักงานเขต อีกจำนวน ๒ สำนักงานเขต (ร้อยละ ๒๒.๒๒) ไม่มีแผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายจากพายุ คือ สำนักงานเขตดุสิต และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ รายละเอียดตามตารางที่ ๙

ตารางที่ ๙ แผนรองรับในกรณีเกิดเหตุต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน

ลำดับ ที่	สำนักงานเขต	แผนรองรับในกรณีที่ เกิดเหตุต้นไม้หรือ สิ่งก่อสร้างได้รับ ความเสียหาย		เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ เนื่องจาก
		มี	ไม่มี	
๑.	สำนักงานเขตพระนคร	✓	-	
๒.	สำนักงานเขตดุสิต	-	✓	ยังไม่มีกำหนดแผนและมาตรการลดผลกระทบ และอยู่ระหว่างการประสานรายละเอียดกับสำนัก ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓.	สำนักงานเขตป้อมปราบ ฯ	✓	-	-
๔.	สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์	-	✓	มีเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานทุกวัน
๕.	สำนักงานเขตพญาไท	✓	-	-
๖.	สำนักงานเขตดินแดง	✓	-	มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของป้ายตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรง และมีหนังสือรับรองของวิศวกรเป็นประจำ ทุกปี
๗.	สำนักงานเขตห้วยขวาง	✓	-	-
๘.	สำนักงานเขตราชเทวี	✓	-	-
๙.	สำนักงานเขตวัง ทองหลาง	✓	-	-
รวม		๗	๒	
คิดเป็นร้อยละ		๗๗.๗๘	๒๒.๒๒	

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ

๑. สาเหตุหลักของปัญหาน้ำท่วมเกิดจากขยะ ฉะนั้นจึงควรนำข้อมูลมาสัมพันธ์กับข้อมูลในโครงการทิ้งเป็นที่เก็บเป็นเวลา ในเรื่องของจุดทิ้งขยะและการจัดเก็บขยะ ในบริเวณใกล้เคียงกับจุดเผ่าะวังและจุดน้ำท่วมซ้ำซาก
๒. เนื่องจากปัจจุบันภาวะฝนตก ไม่ได้ขึ้นกับฤดูกาล ฉะนั้นการเตรียมพร้อมในเรื่องนี้ควรมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอดทั้งปี
๓. เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบบริเวณก่อสร้างในบริเวณจุดเผ่าะวังน้ำท่วม ซึ่งอาจมีทรายหรือวัสดุก่อสร้างลงไปอุดท่อระบายน้ำ
๔. กำลังคน เป็นเรื่องสำคัญในการปฏิบัติงาน ควรมีอัตรากำลังที่พอเพียง เพราะเป็นงานที่หนักและต้องทำงานในสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม ต้องตากฝนและลุยน้ำ
๕. เป็นงานบูรณาการระหว่างสำนักงานเขตกับสำนักการระบายน้ำ ควรมีการพูดคุยประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

ส่วนที่ ๕ เขตตรวจราชการ ๕ (กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร)

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก” รอบที่ ๒ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑) ของเขตตรวจราชการ ๕ (กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร)

คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๕ ได้ดำเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก” รอบที่ ๒ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑) ของกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร


ผลปรากฏว่า สำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ๘ สำนักงานเขต ได้แก่ สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตบางพลัด สำนักงานเขตตลิ่งชัน สำนักงานเขตทวีวัฒนา สำนักงานเขตคลองสาน สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ และสำนักงานเขตจอมทอง มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครตามประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก” โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

๑.๑ ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์

๑) จำนวนพื้นที่น้ำท่วม

จากข้อมูลการตรวจราชการฯ รอบที่ ๑ สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมดจำนวน ๓๔ จุด โดยจำแนกเป็นจุดเฝ้าระวัง จำนวน ๙ จุด จุดเร่งระบาย จำนวน ๑๐ จุด และ จุดอ่อนน้ำท่วม จำนวน ๑๕ จุด รายละเอียดดังนี้

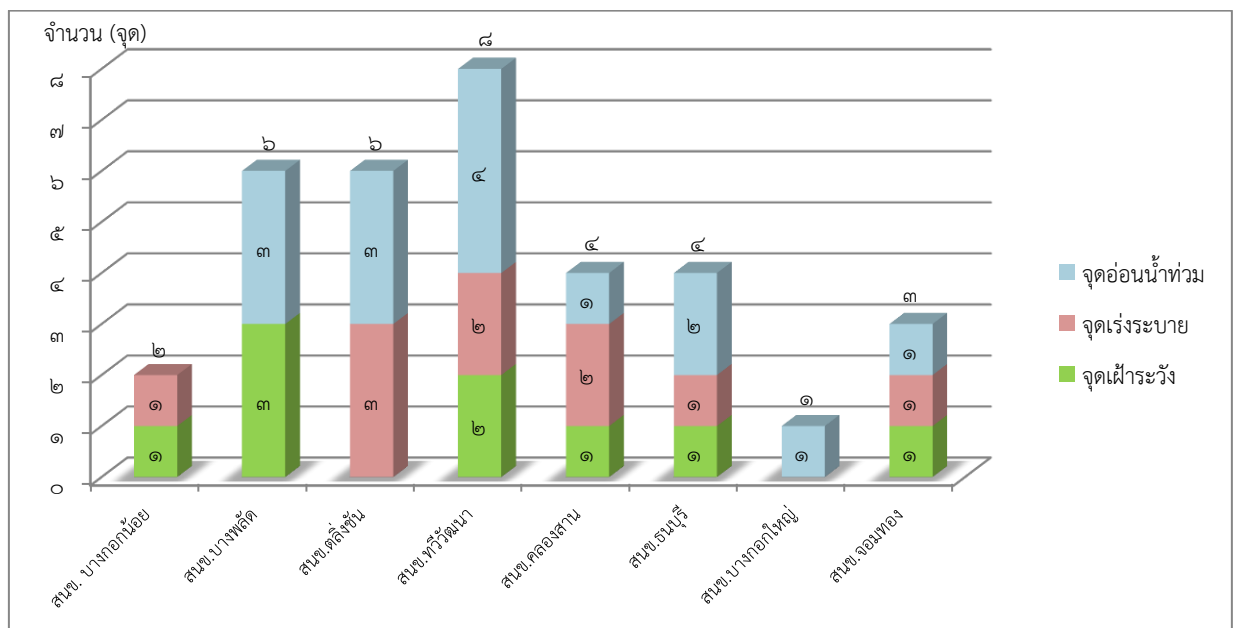

๒) ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์

จากการตรวจราชการรอบที่ ๒ ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพมหานคร
เปรียบเทียบกับรอบที่ ๑ และ ๒ รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	รอบที่ ๑ ความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ			รอบที่ ๒ มีความพร้อม (ร้อยละ)
		จำนวน	มีความพร้อม (ร้อยละ)	ไม่มีความพร้อม (ร้อยละ)	
๑	สำนักงานเขตบางกอกน้อย	๖	๑๐๐	-	๑๐๐
๒	สำนักงานเขตบางพลัด	๘	๑๐๐	-	๑๐๐
๓	สำนักงานเขตตลิ่งชัน	๒๐	๑๐๐	-	๑๐๐
๔	สำนักงานเขตทวีวัฒนา	๑๕	๑๐๐	-	๑๐๐
๕	สำนักงานเขตคลองสาน	๙	๕๕.๕๖	๔๔.๔๔	๑๐๐
๖	สำนักงานเขตธนบุรี	๔	๑๐๐	-	๑๐๐
๗	สำนักงานเขตบางกอกใหญ่	๗	๗๑.๔๓	๒๘.๕๗	๗๑.๔๓
๘	สำนักงานเขตจอมทอง	๘	๑๐๐	-	๑๐๐
รวม		๗๗	๙๐.๘๗	๙.๑๓	๙๖.๔๐

โดยมี ๒ หน่วยงานที่เครื่องสูบน้ำต้องได้รับบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ สำนักงานเขตคลองสาน จำนวน ๖ เครื่อง และสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จำนวน ๒ เครื่อง ซึ่งจากการตรวจราชการในรอบที่ ๒ ปรากฏว่าสำนักงานเขตคลองสานมีการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำให้ใช้งานได้ ๑๐๐% แล้ว ในส่วนข้อมูลของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่นั้น ยังไม่สามารถระบุได้ว่าการดำเนินการแล้วหรือยัง เนื่องจากจำนวนเครื่องสูบน้ำไม่สอดคล้องกับข้อมูลการตรวจราชการ รอบที่ ๑

๓) ความพร้อมของท่อระบายน้ำ

จากการตรวจราชการรอบที่ ๑ สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพมหานคร มีจำนวนท่อระบายน้ำทั้งหมด จำนวน ๘๖๐ ถนน ความยาวทั้งหมด ๔๗๒,๔๘๒ เมตร โดยมีความพร้อมในภาพรวม ๔๔๘,๑๙๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๖ โดยมี ๒ หน่วยงานที่ต้องดำเนินการบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ ได้แก่ สำนักงานเขตทวีวัฒนา และสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งสำนักงานเขตทวีวัฒนาได้ดำเนินการบำรุงรักษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ มีการบำรุงรักษา จำนวน ๑๒ จุด จากจำนวนที่ต้องบำรุงรักษาทั้งหมด ๒๑ จุด

ลำดับ	หน่วยงาน	รอบที่ ๑ ความพร้อมในการระบายน้ำของท่อระบายน้ำ			รอบที่ ๒ มีความพร้อม (ร้อยละ)
		จำนวนถนน/ ตรอก/ซอย	มีความพร้อม (ร้อยละ)	ไม่มีความพร้อม (ร้อยละ)	
๑	สำนักงานเขตบางกอกน้อย	๘๕	๑๐๐	-	๑๐๐
๒	สำนักงานเขตบางพลัด	๗๐	๑๐๐	-	๑๐๐
๓	สำนักงานเขตตลิ่งชัน	๑๖๗	๑๐๐	-	๑๐๐
๔	สำนักงานเขตทวีวัฒนา	๖๒	๙๕.๔๐	๔.๖๐	๑๐๐
๕	สำนักงานเขตคลองสาน	๑๓๓	๑๐๐	-	๑๐๐
๖	สำนักงานเขตธนบุรี	๑๗๑ (ซอย)	๑๐๐	-	๑๐๐
๗	สำนักงานเขตบางกอกใหญ่	๔๔ (ซอย)	๓๓.๘๔	๖๖.๑๖	๓๓.๕๕
๘	สำนักงานเขตจอมทอง	๑๒๘ (ซอย)	๑๐๐	-	๑๐๐
รวม		๘๖๐	๙๔.๘๖	๕.๑๔	๙๗.๔๔

๔) ความพร้อมของคูคลอง/ลำรางสาธารณะ


จากการตรวจราชการรอบที่ ๑ สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพมหานครเหนือ มีคูคลอง/ลำราง รวม ๓๖๐ คูคลอง/ลำรางมีความยาวรวม ๒๔๕,๖๕๗ เมตร มีความพร้อมในการระบายน้ำความยาวรวม ๒๓๕,๖๘๓ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๔ โดยมีสำนักงานเขตที่ต้องบำรุงรักษาคูคลอง/ลำรางสาธารณะ จำนวน ๓ สำนักงาน ได้แก่ สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตตลิ่งชัน และสำนักงานเขตคลองสาน ซึ่งสำนักงานเขตบางกอกน้อย และสำนักงานเขตตลิ่งชัน ได้ดำเนินการบำรุงรักษาเรียบร้อยแล้ว ส่วนสำนักงานเขตคลองสาน มีความพร้อมเพิ่มขึ้นจากรอบที่ ๑ โดยในภาพรวมสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพมหานครเหนือ มีความพร้อมเพิ่มขึ้นจากรอบที่ ๑ ร้อยละ ๙๕.๕๔ เป็นร้อยละ ๙๘.๗๑

ลำดับ	หน่วยงาน	รอบที่ ๑ ความพร้อมของคูคลอง/ลำรางสาธารณะ			รอบที่ ๒ มีความพร้อม (ร้อยละ)
		จำนวน คลอง	มีความพร้อม (ร้อยละ)	ไม่มีความพร้อม (ร้อยละ)	
๑	สำนักงานเขตบางกอกน้อย	๓๓	๙๕.๕๑	๔.๔๙	๑๐๐
๒	สำนักงานเขตบางพลัด	๔๗	๑๐๐	-	๑๐๐
๓	สำนักงานเขตตลิ่งชัน	๒๑	๘๘.๐๑	๑๑.๙๙	๑๐๐
๔	สำนักงานเขตทวีวัฒนา	๑๗	๑๐๐	-	๑๐๐
๕	สำนักงานเขตคลองสาน	๒๙	๘๒.๔๗	๑๗.๕๓	๘๙.๖๖
๖	สำนักงานเขตธนบุรี	๖๓	๑๐๐	-	๑๐๐
๗	สำนักงานเขตบางกอกใหญ่	๔๔	๑๐๐	-	๑๐๐
๘	สำนักงานเขตจอมทอง	๑๐๖	๑๐๐	-	๑๐๐
รวม		๑๓๒	๙๕.๕๔	๔.๔๕	๙๘.๗๑

๕) การกำหนดจุดติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ และจัดทำแผนสำรองกรณีฉุกเฉิน


สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพมหานครเหนือ มีการกำหนด

จุดติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ลงในแผนที่ครบถ้วนทุกสำนักงานเขต และมีการจัดทำแผนสำรองกรณีฉุกเฉินที่เกิดระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น ไฟฟ้าดับ เครื่องขัดข้อง เครื่องไม่เพียงพอต่อการรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตตลิ่งชัน สำนักงานคลองสาน และสำนักงานเขตธนบุรี



๑.๒ ความพร้อมด้านอื่น ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

ในการตรวจราชการรอบที่ ๒ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๕ ได้มีการตรวจสอบความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ เนื่องจากมีความสำคัญในการผลักดันในการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ความพร้อมของหน่วยเบส แผนปฏิบัติการ การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม การประชุมเตรียมความพร้อม การติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ ในพื้นที่น้ำท่วม และการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมส่วนหน้า ปรากฏว่าสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพมหานครเหนือมีการจัดทำแผนปฏิบัติการและมีการประชุมครบทุกสำนักงานเขต โดยรายละเอียดความพร้อมในภาพรวมแยกรายหน่วยงานดังนี้

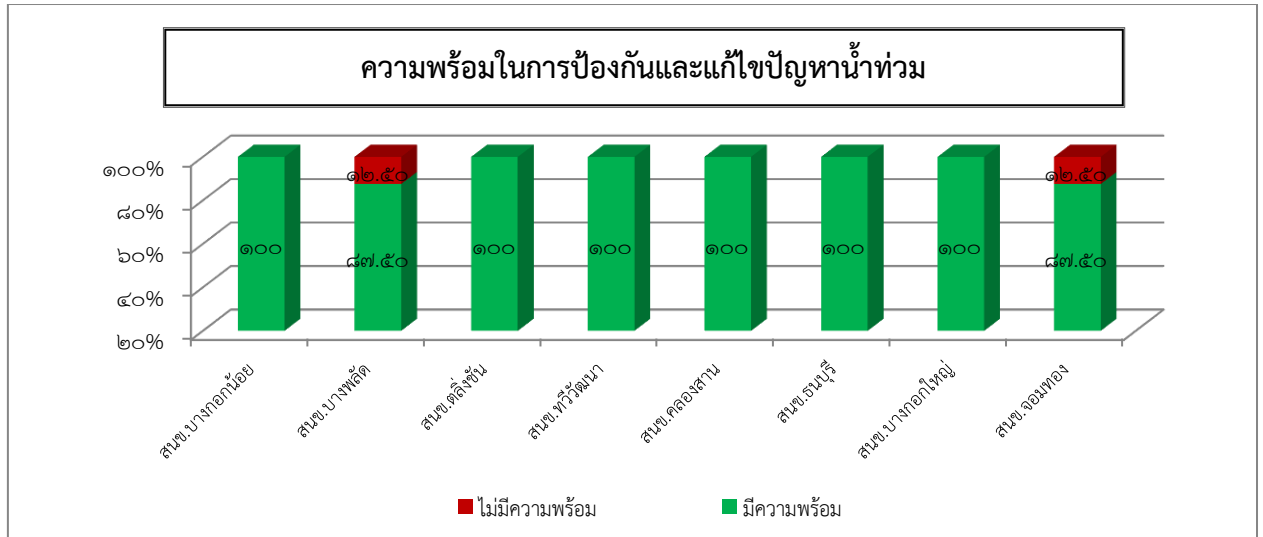


โดยหน่วยงานมีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมส่วนหน้าในพื้นที่ของเขต สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	บริเวณที่จัดตั้งศูนย์ฯ
๑	สำนักงานเขตบางกอกน้อย	*ไม่ระบุข้อมูล
๒	สำนักงานเขตบางพลัด	สำนักงานเขตบางพลัด
๓	สำนักงานเขตตลิ่งชัน	*ไม่ระบุข้อมูล
๔	สำนักงานเขตทวีวัฒนา	สำนักงานเขตทวีวัฒนา
๕	สำนักงานเขตคลองสาน	สำนักงานเขตคลองสาน
๖	สำนักงานเขตธนบุรี	สำนักงานเขตธนบุรี
๗	สำนักงานเขตบางกอกใหญ่	สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
๘	สำนักงานเขตจอมทอง	สำนักงานเขตจอมทอง

๓. ความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อน


๓.๑ การกำหนดแผนและมาตรการลดผลกระทบ



■ มีแผนฯ ■ อยู่ระหว่างดำเนินการ

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ มีการกำหนดแผนและมาตรการลดผลกระทบจากพายุฤดูร้อนรวมทั้งการสร้างความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุครบทุกหน่วยงาน ยกเว้นเพียงสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓.๒ การสำรวจตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง/ต้นไม้ที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน



■ ดำเนินการ ■ อยู่ระหว่างดำเนินการ

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ มีการสำรวจตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง/ต้นไม้ที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนครบทุกหน่วยงาน ยกเว้นเพียงสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ


ลำดับ ที่	หน่วยงาน	การสำรวจตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง/ ต้นไม้ที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน	
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑	สำนักงานเขตบางกอกน้อย		✓
๒	สำนักงานเขตบางพลัด	✓	
๓	สำนักงานเขตตลิ่งชัน	✓	
๔	สำนักงานเขตทวีวัฒนา	✓	
๕	สำนักงานเขตคลองสาน	✓	
๖	สำนักงานเขตธนบุรี	✓	
๗	สำนักงานเขตบางกอกใหญ่	✓	
๘	สำนักงานเขตจอมทอง	✓	
คิดเป็นร้อยละ		๘๗.๕๐	๑๒.๕๐

โดยมีการรายงานข้อมูลจำนวนสิ่งก่อสร้าง/ต้นไม้ที่ไม่แข็งแรง จำนวน ๓ สำนักงานเขต ได้แก่

๑) สำนักงานเขตตลิ่งชัน	จำนวน ๑๔ จุด
๒) สำนักงานเขตคลองสาน	จำนวน ๑๒ จุด
๓) สำนักงานเขตธนบุรี	จำนวน ๑๒ จุด
รวม	จำนวน ๓๘ จุด

๓.๓ แผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายจากพายุ

สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ มีการจัดทำ
แผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายจากพายุ จำนวน ๔ สำนักงานเขต ได้แก่
สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตบางพลัด
สำนักงานเขตตลิ่งชัน และสำนักงานเขตคลองสาน



ส่วนที่ ๒ เขตตรวจราชการ ๖ (กลุ่มเขตกรุงธนใต้)

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ (กลุ่มเขตกรุงธนใต้)

ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้มีการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในประเด็น “การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก” โดยในการตรวจติดตามครั้งที่ ๒ มีวัตถุประสงค์ เป็นการตรวจติดตามความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจราชการที่ให้ไว้ในครั้งที่ ๑ และตรวจการดำเนินการของหน่วยงานเพื่อให้เกิดความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาซ้ำซาก และความพร้อมในการรับมือสถานการณ์พายุฤดูร้อน โดยผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ ๖ รับผิดชอบการตรวจราชการกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ได้ร่วมกันตรวจให้คำแนะนำและทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจราชการพร้อมอธิบายแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจติดตามตั้งแต่ต้นรอบของการตรวจราชการ

บัดนี้ การตรวจติดตามได้เสร็จสิ้นและได้รับข้อมูลจากหน่วยรับตรวจครบถ้วนแล้ว ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ ขอรายงานผลการตรวจราชการในภาพรวมของกลุ่มเขตกรุงธนใต้ และจำแนกเป็นรายสำนักงานเขต พร้อมข้อเสนอแนะเป็นลำดับไป ดังนี้

๑. รายงานผลการดำเนินการในภาพรวมของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้

จากการตรวจติดตามแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหาน้ำท่วม ในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก รอบที่ ๒ ของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ พบว่า

การตรวจติดตามความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการที่ให้ไว้ในครั้งที่ ๑ ปรากฏว่า สำนักงานเขตทุ่งครุ มีข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ จำนวน ๒ ข้อ สำนักงานเขตบางขุนเทียน มีข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ จำนวน ๒ ข้อ สำนักงานเขตบางแค มีข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ จำนวน ๒ ข้อ สำนักงานเขตบางบอน มีข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ จำนวน ๑ ข้อ สำนักงานเขตภาษีเจริญ มีข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ จำนวน ๒ ข้อ และสำนักงานเขตหนองแขม มีข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ จำนวน ๒ ข้อ ซึ่งทั้ง ๖ สำนักงานเขต ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะไม่ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จำแนกได้ดังนี้

สำนักงานเขตทุ่งครุ

๑. การแก้ไขปัญหาขยะยวบริเวณซอยครุใน ๓ ซอยประชาอุทิศ ๗๕ แยก ๑๓ และ ๑๕ สำนักงานเขตทุ่งครุมีแผนในการขอจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อปรับปรุงยกระดับผิวจราจร และวางท่อระบายน้ำ เห็นควรให้สำนักงานเขตทุ่งครุกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการราชการประจำปี ๒๕๖๒ และให้สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานครพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาต่อไป

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว สำนักงานเขตทุ่งครุได้ดำเนินการเสนอขอจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณออนุมัติ

๒. การแก้ไขปัญหาขยะยวในถนนครุใน ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเห็นว่า ถนนเส้นนี้ อยู่ในพื้นที่เขตทุ่งครุได้เป็นเส้นทางยาวเชื่อมต่อในหลายเขต ซึ่งในหลักการที่ถูกต้องแล้วควรให้สำนักงานเขตทุ่งครุ

ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะในพื้นที่เป็นหน่วยที่อยู่ใกล้ชิดกับปัญหาและประชาชนเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ อันเป็นเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่วางระบบการบริหารของกรุงเทพไว้เป็นสองชั้น โดยสำนักงานเขตเป็นหน่วยปฏิบัติหลักในพื้นที่ และการดำเนินงานต่าง ๆ สำนักงานเขตมีความพร้อมและศักยภาพที่จะดำเนินการได้ ดังจะเห็นได้ว่า การแก้ปัญหาในถนนทุ่งครุในเบื้องต้นโดยสำนักการโยธา (ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะ ๕) ได้ดำเนินการปรับปรุงและยกระดับผิวการจราจรก็เกิดจากความริเริ่มและข้อเสนอแนะของสำนักงานเขตทุ่งครุ จนปัญหาได้รับการแก้ไข

ดังนั้น ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครจึงมีข้อเสนอแนะให้มีการโอนความรับผิดชอบในการดูแลถนนครุในจากสำนักการโยธา ให้มาอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตทุ่งครุ ในฐานะหน่วยงานปฏิบัติหลักในระดับพื้นที่ เพื่อสำนักงานเขตทุ่งครุจะได้ดูแลรับผิดชอบในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริงต่อไป ทั้งในการออกแบบและขอจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุง รวมทั้งการพัฒนาดูแลรักษาในด้านอื่น ๆ ต่อไป

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว สำนักงานเขตทุ่งครุได้ประสานสำนักการโยธา ตามข้อสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท ๐๔๐๐.๑/๑๗๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ แล้ว

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

๑. เห็นควรให้สำนักงานเขตบางขุนเทียนปรับแผนการบำรุงรักษาคูคลอง/ลำรางสาธารณะให้เสร็จสิ้นทั้งหมดภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ตามข้อสั่งการต่อไป

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว สำนักงานเขตบางขุนเทียนได้ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำจำนวน ๓๘,๕๗๓ เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๕,๖๕๔ เมตร และได้ทำการบำรุงรักษาคูคลอง/ลำรางสาธารณะจำนวน ๓๑,๐๖๐ เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๖,๘๒๐ เมตร ซึ่งทั้ง ๒ กิจกรรม สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑

๒. ในการแก้ไขปัญหาระยะยาว ควรให้สำนักงานเขตบางขุนเทียนวางแผนและจัดตั้งงบประมาณประจำปีเป็นเร่งด่วนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว สำนักงานเขตบางขุนเทียนได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

สำนักงานเขตบางแค

๑. การแก้ไขปัญหาระยะยาวของสำนักงานเขตบางแคที่จะขอจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๒ ควรให้สำนักงานเขตบางแคจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒ ให้ชัดเจน และให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครพิจารณาสนับสนุนงบประมาณตามที่สำนักงานเขตขอจัดสรร

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว สำนักงานเขตบางแค ได้ดำเนินการจัดลำดับความจำเป็นไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒ และขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

๒. ปัญหาอันเนื่องมาจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ควรให้สำนักการระบายน้ำและสำนักการโยธาประสานให้ รฟม. และผู้รับจ้างของ รฟม. แก้ไขต่อไป

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว สำนักงานเขตบางแคได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยได้ประสานกับ สำนักการระบายน้ำ และสำนักการโยธา พร้อมทั้งได้ร่วมออกตรวจติดตามความก้าวหน้าของงานทั้ง ๑๕ รายการ กับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม) ทั้งนี้ รฟม. ได้รายงานข้อมูลมายังสำนักงานเขตบางแค ทุกวันศุกร์ ซึ่งสำนักงานเขตบางแคได้นำข้อมูลรายงานรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม) และสำนักการระบายน้ำอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า และไม่เกิดผลกระทบในการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป

สำนักงานเขตบางบอน

การแก้ไขปัญหาหระยะยาวสำนักงานเขตบางบอนควรให้วางแผนและจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว สำนักงานเขตบางบอนได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

สำนักงานเขตภาษีเจริญ

๑. ให้สำนักงานเขตภาษีเจริญ ปรับแผนการดูแลบำรุงรักษาคลอง/ลำรางสาธารณะ กรณีการใช้แรงงานเขต และกำหนดแผนปฏิบัติงานในการจ้างเหมาขุดลอกคลอง/ลำราง และกำหนดเวลาแล้วเสร็จให้ทันภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ตามที่ได้มีการสั่งการไว้ในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดเวลาดังกล่าว

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว สำนักงานเขตภาษีเจริญได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

๒. การแก้ไขปัญหาหระยะยาวบริเวณซอยเพชรเกษม ๓๗ ช่วงปลายซอย ควรให้สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาต่อไป

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว สำนักงานเขตภาษีเจริญได้ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงซอยเพชรเกษม ๓๗ และได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักงานเขตหนองแขม

๑. เห็นควรให้สำนักงานเขตหนองแขมกำหนดแผนปฏิบัติงานในการจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ และกำหนดแล้วเสร็จให้ทันภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ตามที่มีสั่งการไว้ในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดดังกล่าว

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว สำนักงานเขตหนองแขม ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดแผนจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครบทุกรายการ แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ ส่วนคลอง/ลำรางที่ได้รับการบำรุงรักษาให้น้ำสามารถไหลผ่านได้โดยไม่ติดขัด จำนวน ๑๕ คลอง/ลำราง ดำเนินการได้ ๑๐๐ %

๒. มาตรการแก้ไขปัญหาหระยะยาวที่สำนักงานเขตหนองแขมเสนอ ควรกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการและแผนการขอจัดสรรงบประมาณต่อไป และเห็นควรให้สำนักการระบายน้ำพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานเขตหนองแขม

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว สำนักงานเขตหนองแขม ได้ดำเนินการในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว ส่วนในประเด็นบริเวณถนนเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ช่วงหน้าหมู่บ้านอรุณทอง ๒ ปรับปรุงยกระดับถนนเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ช่วงที่มีระดับต่ำ น้ำท่วมขังความยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร เป็นความรับผิดชอบของสำนักการโยธา จึงไม่สามารถกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการและแผนการขอจัดสรรงบประมาณต่อไปได้ ซึ่งได้ทำหนังสือแจ้งสำนักการโยธาแล้ว และในส่วนเครื่องผลักดันน้ำที่ไม่ได้รับการติดตั้งจากสำนักการระบายน้ำได้โทรศัพท์ประสานหลายครั้งและได้ทำหนังสือแจ้งไปแล้ว

ในส่วนของการเตรียมความพร้อม แบ่งออกได้ดังนี้

๑.๑ ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทั่วม

ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์

- **วัสดุ/อุปกรณ์** ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ มีดังนี้

เครื่องสูบน้ำ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๒๕ เครื่อง จากการตรวจราชการ รอบที่ ๑ พบว่า อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จำนวน ๑๑๐ เครื่อง ต้องได้รับการบำรุงรักษา จำนวน ๑๕ เครื่อง ซึ่งจากการตรวจราชการ รอบที่ ๒ พบว่าดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๔ เครื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ แบ่งออกเป็นดำเนินการซ่อมแซมจำนวน ๘ เครื่อง ดำเนินการยุบสภาพ จำนวน ๖ เครื่อง (อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางแค ๔ เครื่อง และสำนักงานเขตบางบอน ๒ เครื่อง) โดยสำนักงานเขตบางแคได้ดำเนินการโดยขอจัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อทดแทนในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยระหว่างที่รอจัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อเครื่องสูบน้ำทดแทน สำนักงานเขตบางแคได้ทำหนังสือขอยืมเครื่องสูบน้ำจากสำนักการระบายน้ำมาติดตั้งบริเวณจุดอ่อนทั่วมเพื่อทดแทนเครื่องสูบน้ำที่ขอยุบสภาพ จำนวน ๔ เครื่อง และใช้สูบน้ำในกรณีฉุกเฉิน ๒ เครื่อง รวม ๖ เครื่อง ส่วนสำนักงานเขตบางบอนไม่ได้ขอสนับสนุนเพื่อทดแทน เนื่องจากเพียงพอต่อการใช้งาน และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ เครื่อง (อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตหนองแขม) เนื่องจากปั๊มเชื้อเพลิงชำรุด เป็นการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการ มีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

รถบรรทุกดูดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขนาด ๓ ตัน มีจำนวน ๑ คัน อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางแค อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

รถตักหน้าขุดหลัง มีจำนวน ๑ คัน อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตหนองแขม อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน


เครื่องจักรกล มีจำนวน ๒ เครื่อง อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตราชพฤกษ์ บุรณะและสำนักงานเขตบางขุนเทียน อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

โดยสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้มีแผนเฝ้าระวังและบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

- **ท่อระบายน้ำ** ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ มีจำนวน ๑,๐๓๐ ซอย ความยาวรวมทั้งสิ้น ๖๕๐,๒๕๒.- เมตร จากการตรวจราชการ รอบที่ ๑ พบว่า อยู่ในสภาพพร้อมในการระบายน้ำ จำนวน ๔๐๘,๒๐๕.- เมตร ต้องได้รับการบำรุงรักษา จำนวน ๒๔๒,๐๔๗.- เมตร ซึ่งจากการตรวจราชการ รอบที่ ๒ พบว่าดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

- **คูคลอง/ลำราง** ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มกรุงธนใต้ มี ๔๗๘ คูคลอง/ลำราง ความยาวรวมทั้งสิ้น ๔๘๐,๗๐๙.- เมตร จากการตรวจราชการ รอบที่ ๑ พบว่าอยู่ในสภาพพร้อมในการระบายน้ำ จำนวน ๑๙๕,๐๒๒.- เมตร ต้องได้รับการบำรุงรักษา จำนวน ๑๙๕,๐๒๒.- เมตร ซึ่งจากการตรวจราชการ รอบที่ ๒ พบว่าดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

รายละเอียดตามตารางและกราฟด้านล่าง

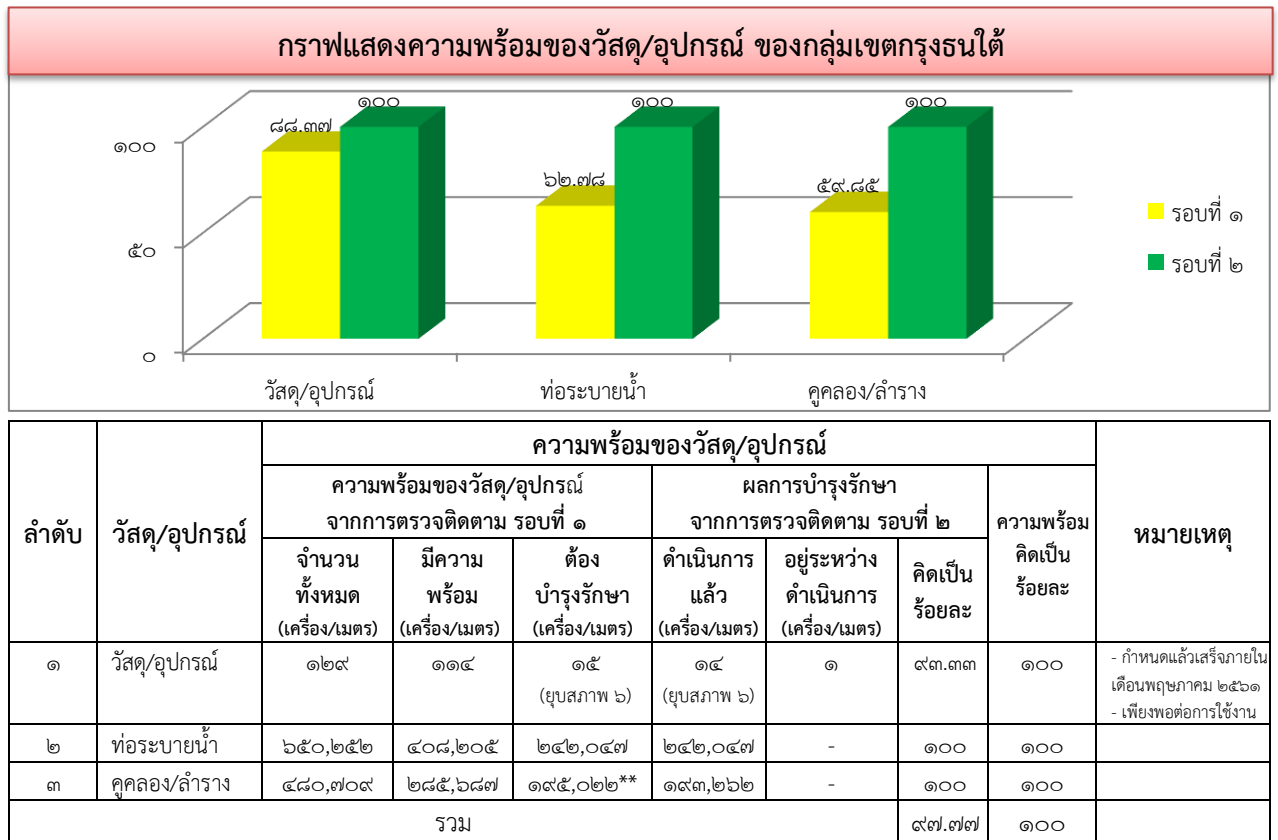

** สำนักงานเขตบางแค รายงานข้อมูลคูคลอง/ลำราง เกินไป จำนวน ๑,๗๖๐ เมตร

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า กลุ่มเขตกรุงธนใต้มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก ทั้งในส่วน of วัสดุ/อุปกรณ์ ท่อระบายน้ำ และ คูคลอง/ลำราง เพิ่มขึ้นจากการตรวจติดตามในรอบที่ ๑ (๗๐.๓๓%) เป็น ๑๐๐% เพิ่มขึ้น ๒๙.๖๗% ซึ่งสอดคล้อง และเป็นไปตามข้อสั่งการของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม) ในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ความพร้อมของหน่วยเบส กลุ่มเขตกรุงธนใต้มีความพร้อมของหน่วยเบส ๑๐๐% จำนวน ลูกจ้างมีเพียงพอ มีการจัดชุดเพื่อให้เตรียมพร้อมในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนยามเกิดเหตุ น้ำท่วม มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ในแต่ละวันมีเจ้าหน้าที่หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนการทำงานทั้งในช่วงเวลาราชการและนอกเวลาราชการ

ความพร้อมของแผนปฏิบัติการ กลุ่มเขตกรุงธนใต้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเสียหายทางเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค ทรัพย์สิน และความเดือดร้อนของประชาชน เป้าหมายลดจุดน้ำท่วมที่เคยท่วมเล็กน้อยให้เป็นจุดที่ไม่ท่วม ลดและควบคุมระดับน้ำท่วม ลดระดับความลึก รวมทั้งลดระยะเวลาท่วมขัง

การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กลุ่มเขตกรุงธนใต้มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ณ บริเวณเขตสำนักงานเขต จำนวน ๖ สำนักงานเขต ยกเว้นสำนักงานเขตทุ่งครุ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ

การประชุมเตรียมความพร้อม กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครได้มีการประชุมเตรียมความพร้อม
เฉลี่ยแล้ว ๑ ครั้งต่อเดือน มีเพียงสำนักงานเขตทุ่งครุที่ยังอยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งให้เป็นปัจจุบันและบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังไม่มีการประชุม

การติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ ในจุด/บริเวณเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร
มีการติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ ในจุด/บริเวณเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก ครบ ๑๐๐%

ความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมส่วนหน้า กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร
ได้มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมส่วนหน้า ดังนี้

- สำนักงานเขตทุ่งครุยังไม่ได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมส่วนหน้า และ
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น โดยอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งให้เป็นปัจจุบัน
- สำนักงานเขตบางขุนเทียน มีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำ
ท่วมส่วนหน้า กำหนดจุดบริเวณถนนพระรามที่ ๒ ซอย ๖๙ ตามคำสั่งสำนักงานเขตบางขุนเทียน ที่
๒๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกกรณีเกิดเหตุ น้ำท่วมขังในพื้นที่
เขตบางขุนเทียน

- สำนักงานเขตบางบอน มีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม
ส่วนหน้า กำหนดจุดบริเวณหน้าบริษัท กระทั่งแดง จำกัด (ซอยเอกชัย ๖๘) ตามคำสั่งสำนักงานเขตบางบอน
ที่ ๑๓๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ป้องกันน้ำท่วมและแก้ไขปัญหาส่วนหน้า

- สำนักงานเขตภาษีเจริญ มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมส่วนหน้า
บริเวณหน้าศูนย์สรรพสินค้าซีคอนบางแค ตามคำสั่งสำนักงานเขตภาษีเจริญ ที่ ๑๐๘/๒๕๖๑ ลงวันที่
๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมส่วนหน้า

- สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ มีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมส่วนหน้า กำหนดจุดบริเวณใต้สะพานพระราม ๙ บริเวณหน้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย และซอยสุขสวัสดิ์ ๓๐

- สำนักงานเขตบางแค มีการกำหนดจุดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมส่วน
หน้า บริเวณวงเวียนอุทอง หมู่บ้านเศรษฐกิจ ตามคำสั่งสำนักงานเขตบางแค ที่ ๖๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ และตามคำสั่งสำนักงานเขตบางแค ที่ ๖๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

- สำนักงานเขตหนองแขม มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมส่วนหน้า
บริเวณถนนเลียบคลองภาษีเจริญ ฝั่งเหนือ ซอย ๖ (ซอยสุนทร ๔) และมีคำสั่งมอบหมายหน้าที่และบูรณาการการ
ทำงานกับหน่วยงานอื่น ตามคำสั่งสำนักงานเขตหนองแขม ที่ ๖๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

๑.๒ ความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อน

- กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร มีการกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากวาตภัย
และพายุฤดูร้อน เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ รวมทั้งวัสดุ/อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ มีประสิทธิภาพ

- กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร มีการตรวจสอบความแข็งแรงของป้ายโฆษณาและต้นไม้ตามแนว
สายไฟ ครบ ๑๐๐% จากการตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้างและต้นไม้ในพื้นที่ มีความแข็งแรงของ
ป้ายโฆษณาและตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้า

- กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร มีการกำหนดแผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้าง
ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร ได้วางแผนเตรียมการรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามข้อสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานคร (นายภัทรุทธิ์ ทรพรานนท์) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๐/๔๓๑๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

๑. เห็นควรให้สำนักงานเขตทุ่งครุ ดำเนินการจัดทำคำสั่งการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเห็นควรให้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเฉพาะหน้า ในการมอบหมายหน้าที่ควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นด้วย

๒. การเตรียมความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ เห็นควร

๒.๑ สำนักงานเขตควรมีการตรวจความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน ได้ทันทีอยู่เสมอ ๆ

๒.๒ ให้สำนักการระบายน้ำรีบดำเนินการซ่อมเครื่องสูบน้ำให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำที่สำนักงานเขตหนองแขมขอเพิ่มเติม จำนวน ๘ เครื่อง หากเครื่องมีจำนวนจำกัดให้สนับสนุนในจุดที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ๑ - ๒ จุดก่อน

๒.๓ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสูบน้ำและการเปลี่ยนแบตเตอรี่ควรจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตดำเนินการเอง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

๓. ในประเด็นถนนเลียบบulongภาษีเจริญฝั่งเหนือ ช่วงหน้าหมู่บ้านอรุณทอง ๒ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเห็นว่า ถนนเลียบบulongภาษีเจริญฝั่งเหนือและฝั่งใต้ เป็นถนนที่อยู่ในพื้นที่สำนักงานเขตหนองแขมทั้งเส้น มิได้เป็นเส้นทางยาวเชื่อมต่อในหลายเขต ซึ่งในหลักการที่ถูกต้องแล้วควรให้สำนักงานเขตหนองแขมซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะในพื้นที่ และเป็นหน่วยที่อยู่ใกล้ชิดกับปัญหาและประชาชนเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ อันเป็นเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ ที่วางระบบการบริหารของกรุงเทพมหานครไว้เป็นสองชั้น โดยสำนักงานเขตเป็นหน่วยปฏิบัติหลักในพื้นที่ ซึ่งสำนักงานเขตมีความพร้อมและศักยภาพที่จะดำเนินการได้

ดังนั้น ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ จึงมีข้อเสนอแนะให้มีการโอนความรับผิดชอบในการดูแลถนนเลียบบulongภาษีเจริญฝั่งเหนือและฝั่งใต้ จากสำนักการโยธาให้มาอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตหนองแขม ในฐานะหน่วยงานปฏิบัติหลักในระดับพื้นที่ เพื่อสำนักงานเขตหนองแขมจะได้ดูแลรับผิดชอบในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริงต่อไป ทั้งในการออกแบบและขอจัดสรรงบประมาณ ในการปรับปรุง รวมทั้งการพัฒนาดูแลรักษาในด้านอื่นๆ ต่อไป เช่นเดียวกับกรณีของถนนครุใน สำนักงานเขตทุ่งครุ ที่ปลัดกรุงเทพมหานครได้มีการสั่งการไปแล้ว ตามหนังสือที่ กท ๐๔๐๐.๑/๑๗๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

อนึ่ง ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ ที่ปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำ ควรให้เขตตรวจราชการที่รับผิดชอบเร่งรัดติดตามให้เป็นไปตามข้อสั่งการ

๒. รายงานผลการดำเนินการจําแนกตามสํานักงานเขต

๒.๑ สํานักงานเขตทุ่งครุ

จากการตรวจติดตามแบบบูรณาการเพื่อบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดน้ำท่วมซ้ำซาก” รอบที่ ๒ ของสํานักงานเขตทุ่งครุ พบว่า

การตรวจติดตามความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการที่ให้ไว้ในครั้งที่ ๑ ปรากฏว่า สํานักงานเขตทุ่งครุ มีข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ ดังนี้

๑. การแก้ไขปัญหาขยะยาวบริเวณซอยครุใน ๓ ซอยประชาอุทิศ ๗๕ แยก ๑๓ และ ๑๕ สํานักงานเขตทุ่งครุมีแผนในการขอจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อปรับปรุงยกระดับผิวจราจรและวางท่อระบายน้ำ เห็นควรให้สํานักงานเขตทุ่งครุกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒ และให้สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาต่อไป

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว สํานักงานเขตทุ่งครุได้ดำเนินการเสนอขอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ให้สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณออนุมัติ

๒. การแก้ไขปัญหาขยะยาวในถนนครุใน ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเห็นว่า ถนนเส้นนี้อยู่ในพื้นที่เขตทุ่งครุ มิได้เป็นเส้นทางยาวเชื่อมต่อในหลายเขต ซึ่งในหลักการที่ถูกต้องแล้วควรให้สํานักงานเขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะในพื้นที่ เป็นหน่วยที่อยู่ใกล้ชิดกับปัญหาและประชาชนเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ อันเป็นเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่วางระบบการบริหารของกรุงเทพไว้เป็นสองชั้น โดยสํานักงานเขตเป็นหน่วยปฏิบัติหลักในพื้นที่ และการดำเนินงานต่าง ๆ สํานักงานเขตมีความพร้อมและศักยภาพที่จะดำเนินการได้ ดังจะเห็นได้ว่า การแก้ปัญหาในถนนครุในเบื้องต้นโดยสํานักการโยธา (ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะ ๕) ได้ดำเนินการปรับปรุงและยกระดับผิวจราจร ก็เกิดจากความริเริ่มและข้อเสนอแนะของสํานักงานเขตทุ่งครุ จนปัญหาได้รับการแก้ไข

ดังนั้น ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครจึงมีข้อเสนอแนะให้มีการโอนความรับผิดชอบในการดูแลถนนครุในจากสํานักการโยธา ให้มาอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานเขตทุ่งครุในฐานะหน่วยงานปฏิบัติหลักในระดับพื้นที่ เพื่อสํานักงานเขตทุ่งครุจะได้ดูแลรับผิดชอบในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริงต่อไป ทั้งในการออกแบบและขอจัดสรรงบประมาณ ในการปรับปรุง รวมทั้งการพัฒนา ดูแลรักษาในด้านอื่น ๆ ต่อไป

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว สํานักงานเขตทุ่งครุได้ประสานสํานักการโยธา ตามข้อสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท ๐๔๐๐.๑/๑๗๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ แล้ว

ในส่วนของการเตรียมความพร้อม แบ่งออกได้ดังนี้

๒.๑.๑ ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาซ้ำ


ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์

- วัสดุ/อุปกรณ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานเขตทุ่งครุ มีเครื่องสูบน้ำจำนวนทั้งสิ้น ๑๗ เครื่อง จากการตรวจราชการ รอบที่ ๑ พบว่า อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จำนวน ๑๖ เครื่อง ต้องได้รับการบำรุงรักษา จำนวน ๑ เครื่อง ซึ่งจากการตรวจราชการ รอบที่ ๒ พบว่า ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

- **ท่อระบายน้ำ** ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตทุ่งครุ มีจำนวน ๔๘ ซอย ความยาวรวมทั้งสิ้น ๕๑,๓๒๔.- เมตร จากการตรวจราชการ รอบที่ ๑ พบว่า อยู่ในสภาพพร้อมในการระบายน้ำ จำนวน ๒๙,๙๖๖.- เมตร ต้องได้รับการบำรุงรักษา จำนวน ๒๑,๓๕๘.- เมตร ซึ่งจากการตรวจราชการ รอบที่ ๒ พบว่า ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐

- **คูคลอง/ลำราง** ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตทุ่งครุ มีจำนวน ๔๔ คูคลอง/ลำราง ความยาวรวมทั้งสิ้น ๖๖,๓๓๐.- เมตร จากการตรวจราชการ รอบที่ ๑ พบว่า ต้องได้รับการบำรุงรักษา จำนวน ๖๖,๓๓๐.- เมตร ซึ่งจากการตรวจราชการ รอบที่ ๒ พบว่าดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐

รายละเอียดตามตารางและกราฟด้านล่าง

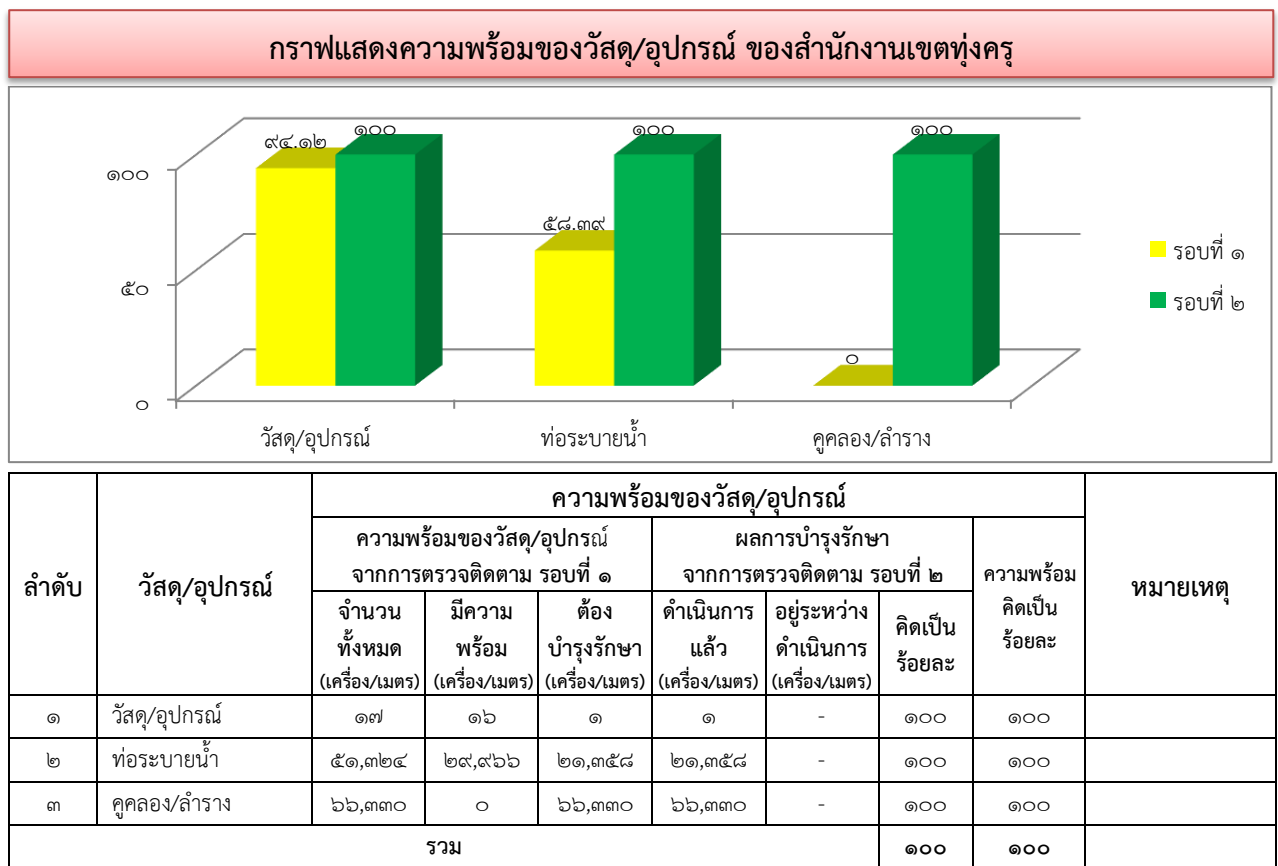

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สำนักงานเขตทุ่งครุมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก ทั้งในส่วน of วัสดุ/อุปกรณ์ ท่อระบายน้ำ และคูคลอง/ลำราง เพิ่มขึ้นจากที่ได้มีการตรวจติดตามในรอบที่ ๑ (๕๐.๘๔ %) เป็น ๑๐๐% เพิ่มขึ้น ๔๙.๑๖% ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามข้อสั่งการของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม) ในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

นอกจากนี้สำนักงานเขตทุ่งครุได้ดำเนินการจัดเก็บวัชพืชและเปิดทางน้ำไหลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ จำนวน ๔๗,๒๕๐.- เมตร โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน เดือนเมษายน ๒๕๖๑ มีการกำหนดจุดติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ในแต่ละจุด/บริเวณ ลงในแผนที่ มีแผนสำรองกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดระหว่างการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

ความพร้อมของหน่วยเบส สำนักงานเขตทุ่งครุได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจำนวน ๖ ชุด ชุดละ ๗ คน และมีความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ

ความพร้อมของแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตทุ่งครุมีแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ เป้าหมายเป็นพื้นที่ราบลุ่มที่อยู่ติดกับคูคลองและที่ราบลุ่มในพื้นที่เขต และบริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะจุดอ่อนน้ำท่วมต่างๆ ระยะเวลาดำเนินการตลอดปี พ.ศ.๒๕๖๑

การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม สำนักงานเขตทุ่งครุ มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยตั้งสำนักงานศูนย์อำนวยการฯ ที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตทุ่งครุ

การประชุมเตรียมความพร้อม สำนักงานเขตทุ่งครุยังไม่มีการประชุมเตรียมความพร้อมเนื่องจากอยู่ระหว่างทำคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นปัจจุบัน

การติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ ในจุด/บริเวณเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก สำนักงานเขตทุ่งครุ มีการติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ ในจุด/บริเวณเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก ครบ ๑๐๐%

ความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้า สำนักงานเขตทุ่งครุยังไม่ได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้า และคำสั่งมอบหมายหน้าที่และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งให้เป็นปัจจุบัน

๒.๑.๒ ความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อน

- สำนักงานเขตทุ่งครุ มีการกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากวาตภัย วัตถุประสงคเพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะให้สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากวาตภัยได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ กำหนดกรอบการปฏิบัติงานให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากวาตภัยได้อย่างเป็นระบบและบูรณาการและเพื่อป้องกัน บรรเทาผลกระทบตอชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจเกิดจากวาตภัย

- สำนักงานเขตทุ่งครุ มีการสำรวจตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง/ต้นไม้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ จำนวน ๓ ป้าย และต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้า จำนวน ๒,๒๗๒ ต้น จากการตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้างและต้นไม้ในพื้นที่ มีความมั่นคงแข็งแรงของป้ายโฆษณาและตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้า จำนวน ๕๒๔ ต้น

- สำนักงานเขตทุ่งครุ มีการกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากวาตภัยมีแผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายจากพายุ โดยมีการแบ่งกิจกรรม ๓ ช่วง คือ การดำเนินการก่อนเกิดภัย การดำเนินการขณะเกิดภัย และการดำเนินการหลังเกิดภัย

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสำนักงานเขตทุ่งครุได้วางแผนเตรียมการรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามข้อสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๐/๔๓๑๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

เห็นควรให้สำนักงานเขตทุ่งครุ ดำเนินการจัดทำคำสั่งการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเฉพาะหน้า ในการมอบหมายหน้าที่ควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นด้วย

๒.๒ สำนักงานเขตบางขุนเทียน

จากการตรวจติดตามแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ การเพิ่มประสิทธิภาพ การลดปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดน้ำท่วมซ้ำซาก” รอบที่ ๒ ของสำนักงานเขตบางขุนเทียน พบว่า

การตรวจติดตามความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการที่ให้ไว้ในครั้งที่ ๑
ปรากฏว่า สำนักงานเขตบางขุนเทียน มีข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ ดังนี้

๑. เห็นควรให้สำนักงานเขตบางขุนเทียนปรับแผนการบำรุงรักษาคูคลอง/ลำรางสาธารณะให้เสร็จสิ้นทั้งหมดในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ตามข้อสั่งการต่อไป

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว สำนักงานเขตบางขุนเทียนได้ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ จำนวน ๓๘,๕๗๓ เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๕,๖๕๔ เมตร และได้ทำการบำรุงรักษาคูคลอง/ลำรางสาธารณะ จำนวน ๓๑,๐๖๐ เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๖,๘๒๐ เมตร ซึ่งทั้ง ๒ กิจกรรม สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑

๒. ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาระยะยาวควรให้สำนักงานเขตบางขุนเทียน วางแผนและจัดทำลำดับ ความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว สำนักงานเขตบางขุนเทียนได้ปรับการดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ และได้ทำการบำรุงรักษาคูคลอง/ลำรางสาธารณะ ให้สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑

ในส่วนของการเตรียมความพร้อม แบ่งออกได้ดังนี้

๒.๒.๑ ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์

- วัสดุ/อุปกรณ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางขุนเทียน มีดังนี้
เครื่องสูบน้ำ มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๔ เครื่อง จากการตรวจราชการ รอบที่ ๑ พบว่า อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จำนวน ๒๐ เครื่อง ต้องได้รับการบำรุงรักษา จำนวน ๔ เครื่อง ซึ่งจากการตรวจราชการ รอบที่ ๒ พบว่า ดำเนินการเรียบร้อยแล้วคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐


ในการดำเนินงาน สำนักงานเขตบางขุนเทียนได้แจ้งปัญหาในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของเครื่องสูบน้ำที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากสำนักระบายน้ำ โดยมีข้อเสนอแนะในระดับพื้นที่ว่า หากเป็นไปได้ควรจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตมาดำเนินการบำรุงรักษาเองจะสะดวกและรวดเร็วขึ้น

เครื่องจักรกล มีจำนวน ๑ เครื่อง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

- **ท่อระบายน้ำ** ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางขุนเทียน มีจำนวน ๑๓๒ ซอย ความยาวรวมทั้งสิ้น ๑๗๓,๘๓๔.- เมตร จากการตรวจราชการ รอบที่ ๑ พบว่า อยู่ในสภาพพร้อมในการระบายน้ำ จำนวน ๑๑๙,๖๐๗.- เมตร ต้องได้รับการบำรุงรักษา จำนวน ๕๔,๒๒๗.- เมตร ซึ่งจากการตรวจราชการ รอบที่ ๒ พบว่า ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐

- **คูคลอง/ลำราง** ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางขุนเทียน มีจำนวน ๑๒๓ คูคลอง/ลำราง ความยาวรวมทั้งสิ้น ๑๘๗,๑๙๓.- เมตร จากการตรวจราชการ รอบที่ ๑ พบว่า อยู่ในสภาพพร้อมในการระบายน้ำ จำนวน ๑๒๙,๓๑๓.- เมตร ต้องได้รับการบำรุงรักษา จำนวน ๕๗,๘๘๐ เมตร ซึ่งจากการตรวจราชการ รอบที่ ๒ พบว่า ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

รายละเอียดตามตารางและกราฟด้านล่าง

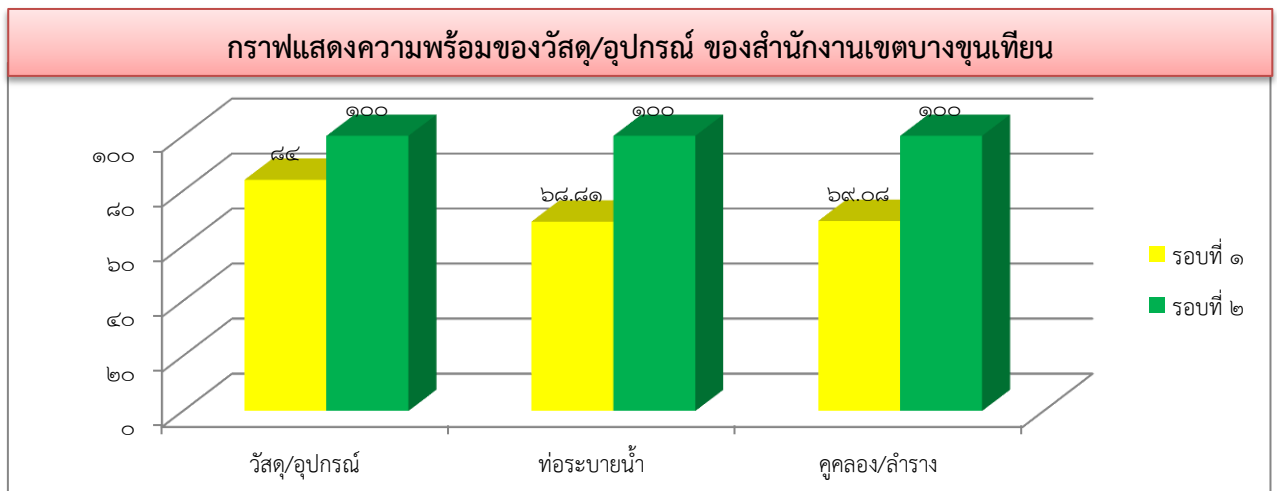

ลำดับ	รายการ	ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์							หมายเหตุ
		ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ จากการตรวจติดตาม รอบที่ ๑			ผลการบำรุงรักษา จากการตรวจติดตาม รอบที่ ๒			ความพร้อม คิดเป็น ร้อยละ	
		จำนวน ทั้งหมด (เครื่อง/เมตร)	มีความ พร้อม (เครื่อง/เมตร)	ต้อง บำรุงรักษา (เครื่อง/เมตร)	ดำเนินการ แล้ว (เครื่อง/เมตร)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (เครื่อง/เมตร)	คิดเป็น ร้อยละ		
๑	วัสดุ/อุปกรณ์	๒๕	๒๑	๔	๔	-	๑๐๐	๑๐๐	
๒	ท่อระบายน้ำ	๑๗๓,๘๓๔	๑๑๙,๖๐๗	๕๔,๒๒๗	๕๔,๒๒๗	-	๑๐๐	๑๐๐	
๓	คูคลอง/ลำราง	๑๘๗,๑๙๓	๑๒๙,๓๑๓	๕๗,๘๘๐	๕๗,๘๘๐	-	๑๐๐	๑๐๐	
รวม							๑๐๐	๑๐๐	

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สำนักงานเขตบางขุนเทียนมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก ทั้งในส่วนของวัสดุ/อุปกรณ์ ท่อระบายน้ำ และคูคลอง/ลำราง เพิ่มขึ้นจากที่ได้มีการตรวจติดตามในรอบที่ ๑ (๗๓.๙๖%) เป็น ๑๐๐% เพิ่มขึ้น ๒๖.๐๔% ในส่วนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามข้อสั่งการของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม) ในการ ประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

นอกจากนี้ยังมีการกำหนดจุดติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ในแต่ละจุด/บริเวณ ลงในแผนที่ มีแผนสำรองกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดระหว่างการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ อย่างน้อยจุดละ ๒ เครื่อง มีการตรวจสอบสภาพเครื่องสูบน้ำทุกวัน ตามจุดที่ติดตั้งเครื่อง สามารถประสานกับเจ้าหน้าที่ของกองเครื่องจักรกล กรณีเกิดเหตุขัดข้องได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ความพร้อมของหน่วยเบส สำนักงานเขตบางขุนเทียน มีเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน โดยมีลูกจ้าง จำนวน ๕๘ คน แบ่งเป็นชุดได้ ๖ ชุด (๙ – ๑๐ คนต่อชุด) โดยแต่ละวันจะมีหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันในวันทำงานปกติ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามเวลาปฏิบัติราชการและนอกเวลาราชการ มีความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ ครบถ้วน

ความพร้อมของแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตบางขุนเทียน มีแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากน้ำฝนและน้ำทะเลหนุนในพื้นที่ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากฝนตกและน้ำทะเลหนุน สามารถลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค ทรัพย์สิน และความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อมุ่งลดจุดน้ำท่วมพื้นที่และลดระดับความลึกของน้ำท่วม รวมทั้งระยะเวลาที่น้ำท่วมซึ่งอันเกิดจากน้ำฝนและน้ำทะเลหนุนสูง เพื่อสนับสนุนแผนหลักของสำนักการระบายน้ำ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของพื้นที่ฝั่งธนบุรี

เป้าหมาย การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝน ลดจุดน้ำท่วมที่เคยท่วมเล็กน้อยให้เป็นจุดที่ไม่มีน้ำท่วม ลดพื้นที่และความลึกของน้ำท่วม ลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมให้เร็วขึ้น ส่วนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำทะเลหนุน ตรวจสอบสภาพและดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างแนวคันกันน้ำทุกประเภท ทั้งแนวเรียงกระสอบทราย สร้างคันดิน เสริมและยกระดับถนนให้เหมาะสม ตรวจสอบสภาพและดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ณ จุดปิดกั้นทางน้ำต่างๆ เพื่อสูบน้ำออกจากบึงรับน้ำ หรือท่อระบายน้ำลงสู่คลองในช่วงระดับน้ำทะเลหนุนสูง

การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม สำนักงานเขตบางขุนเทียน มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยตั้งสำนักงานศูนย์อำนวยการฯ ที่บริเวณชั้น ๑ อาคารระบายน้ำ สำนักงานเขตบางขุนเทียน

การประชุมเตรียมความพร้อม สำนักงานเขตบางขุนเทียน มีการประชุมเตรียมความพร้อม ความถี่ ๒ ครั้ง/เดือน

การติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ ในจุด/บริเวณเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก สำนักงานเขตบางขุนเทียน มีการติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ ในจุด/บริเวณเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก ครบ ๑๐๐%

ความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้า สำนักงานเขตบางขุนเทียน มีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้า กำหนดจุดบริเวณถนนพระรามที่ ๒ ซอย ๖๙ ตามคำสั่งสำนักงานเขตบางขุนเทียน ที่ ๒๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการความสะดวกกรณีเกิดเหตุน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

๒.๒.๒ ความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อน

- สำนักงานเขตบางขุนเทียน มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อน ตามคำสั่งฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางขุนเทียน ที่ ๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อน

- สำนักงานเขตบางขุนเทียน มีการสำรวจตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง/ต้นไม้ ตามหนังสือ ที่ กทบ๒๐๓/๒๓๑๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมรสุม ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ จำนวน ๒๔ ป้าย เป็นป้ายที่ได้รับอนุญาต จำนวน ๑๙ ป้าย และป้ายถูกดำเนินคดีและอยู่ระหว่างรื้อถอน จำนวน ๕ ป้าย จากการตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้างและต้นไม้ในพื้นที่สำนักงานเขตบางขุนเทียน พบว่าไม่มีสิ่งก่อสร้างหรือต้นไม้ที่แข็งแรงในพื้นที่ มีการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟ จำนวน ๖๐ ต้น

- สำนักงานเขตบางขุนเทียน มีแผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายจากพายุ มีการจัดเจ้าหน้าที่ (Best) รอรับแจ้งเหตุพร้อมออกปฏิบัติหน้าที่ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ หากมีต้นไม้ที่ได้รับความเสียหายจากพายุ และเกินขีดความสามารถของสำนักงานเขตจะดำเนินการประสานหน่วยงาน อปพร สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานโยธาขอความร่วมมือสนับสนุนเครื่องจักรกลหนักในการแก้ไขปัญหาต่อไป

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสำนักงานเขตบางขุนเทียนได้วางแผนเตรียมการรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามข้อสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานคร (นายภักดิ์ ทรพรานนท์) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๐/๔๓๑๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่

๒.๓ สำนักงานเขตบางแค

จากการตรวจติดตามแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ การเพิ่มประสิทธิภาพ การลดปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดน้ำท่วมซ้ำซาก” รอบที่ ๒ ของสำนักงานเขตบางแค พบว่า

การตรวจติดตามความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการที่ให้ไว้ในครั้งที่ ๑ ปรากฏว่า สำนักงานเขตบางแค มีข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ ดังนี้

๑. การแก้ไขปัญหาระยะยาวของสำนักงานเขตบางแคที่จะขอจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๒ ควรให้สำนักงานเขตบางแคจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒ ให้ชัดเจน และให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครพิจารณาสนับสนุนงบประมาณตามที่สำนักงานเขตขอจัดสรร

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว สำนักงานเขตบางแค ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดลำดับความจำเป็นไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒ และขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

๒. ปัญหาอันเนื่องมาจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ควรให้สำนักการระบายน้ำและสำนักการโยธาประสานให้ รฟม. และผู้รับจ้างของ รฟม. แก้ไขต่อไป

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว สำนักงานเขตบางแคได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยได้ประสานกับ สำนักการระบายน้ำ และสำนักการโยธา พร้อมทั้งได้ร่วมออกตรวจติดตามความก้าวหน้าของงาน ทั้ง ๑๕ รายการ กับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม) ทั้งนี้ รพม. ได้รายงานข้อมูลมายัง สำนักงานเขตบางแค ทุกวันศุกร์ ซึ่งสำนักงานเขตบางแคได้นำข้อมูลรายงานรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม) และสำนักการระบายน้ำอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า และไม่เกิดผลกระทบ ในการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป

ในส่วนของการเตรียมความพร้อม แบ่งออกได้ดังนี้

๒.๓.๑ ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์

- วัสดุ/อุปกรณ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางแค มีดังนี้

เครื่องสูบน้ำ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๘ เครื่อง จากการตรวจราชการ รอบที่ ๑ พบว่า อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จำนวน ๑๔ เครื่อง ต้องดำเนินการยุบสภาพ จำนวน ๔ เครื่อง ซึ่งจากการตรวจราชการ รอบที่ ๒ พบว่า ดำเนินการยุบสภาพเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และได้ดำเนินการโดยขอจัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อทดแทนในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยระหว่างที่รอจัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อเครื่องสูบน้ำทดแทน สำนักงานเขตบางแคได้ทำหนังสือขอยืมเครื่องสูบน้ำจากสำนักการระบายน้ำมาติดตั้งบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมเพื่อทดแทนเครื่องสูบน้ำที่ขอยุบสภาพ จำนวน ๔ เครื่อง และใช้สูบน้ำในกรณีฉุกเฉิน ๒ เครื่อง รวม ๖ เครื่อง

รถบรรทุกดูดล้างทำความสะอาดขนาด ๓ ตัน จำนวน ๑ คัน อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน


- ท่อระบายน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางแค มีจำนวน ๒๑๙

ถนน ความยาวรวมทั้งสิ้น ๖๖,๗๕๙.- เมตร จากการตรวจราชการ รอบที่ ๑ พบว่า อยู่ในสภาพพร้อมในการระบายน้ำ จำนวน ๑๘,๔๔๔.- เมตร ต้องได้รับการบำรุงรักษา จำนวน ๔๘,๓๑๕.- เมตร ซึ่งจากการตรวจราชการ รอบที่ ๒ พบว่า ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐

- คูคลอง/ลำราง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางแค มีจำนวน

๑๒๑ คูคลอง/ลำราง ความยาวรวมทั้งสิ้น ๖๔,๑๕๕.- เมตร จากการตรวจราชการ รอบที่ ๑ พบว่า อยู่ในสภาพพร้อมในการระบายน้ำ จำนวน ๔๑,๘๖๕.- เมตร ต้องได้รับการบำรุงรักษา จำนวน ๒๒,๒๙๐.- เมตร ซึ่งจากการตรวจราชการ รอบที่ ๒ พบว่า ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

รายละเอียดตามตารางและกราฟด้านล่าง

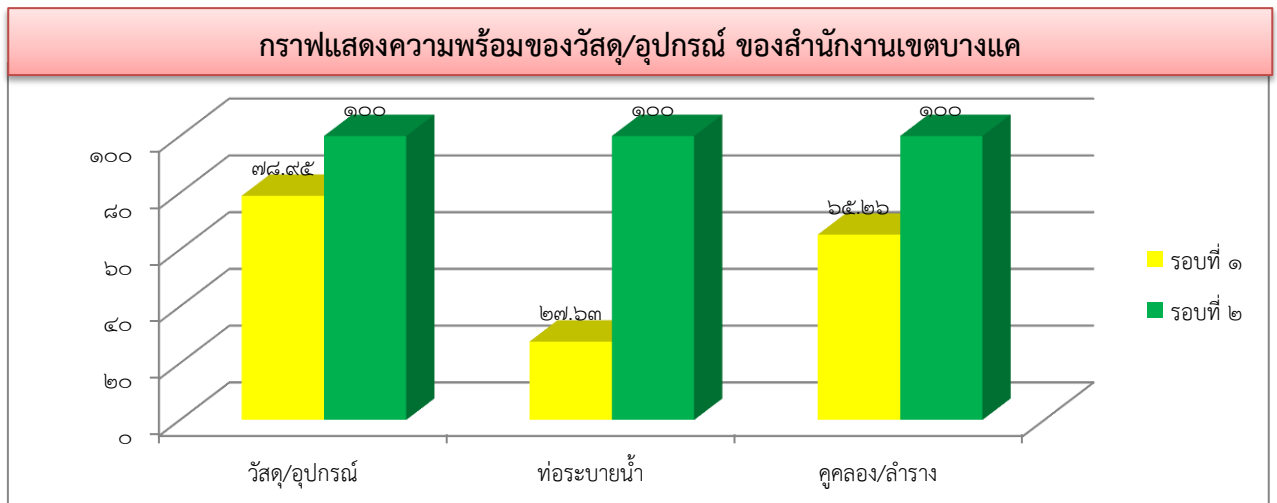

ลำดับ	รายการ	ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์							หมายเหตุ
		ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ จากการตรวจติดตาม รอบที่ ๑			ผลการบำรุงรักษา จากการตรวจติดตาม รอบที่ ๒			ความพร้อม คิดเป็น ร้อยละ	
		จำนวน ทั้งหมด (เครื่อง/เมตร)	มีความ พร้อม (เครื่อง/เมตร)	ต้อง บำรุงรักษา (เครื่อง/เมตร)	ดำเนินการ แล้ว (เครื่อง/เมตร)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (เครื่อง/เมตร)	คิดเป็น ร้อยละ		
๑	วัสดุ/อุปกรณ์	๑๙	๑๕	๔ (ยุบสภาพ)	๔ (ยุบสภาพ)	-	๑๐๐	๑๐๐	
๒	ท่อระบายน้ำ	๖๖,๗๕๙	๑๘,๔๔๔	๔๘,๓๑๕	๔๘,๓๑๕	-	๑๐๐	๑๐๐	
๓	คูคลอง/ลำราง	๖๔,๑๕๕	๔๑,๘๖๕	๒๒,๒๙๐	๒๒,๒๙๐	-	๑๐๐	๑๐๐	
รวม							๑๐๐	๑๐๐	

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สำนักงานเขตบางแคมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก ทั้งในส่วนของวัสดุ/อุปกรณ์ ท่อระบายน้ำ และคูคลอง/ลำราง เพิ่มขึ้นจากที่ได้มีการตรวจติดตามในรอบที่ ๑ (๕๗.๒๘%) เป็น ๑๐๐% เพิ่มขึ้น ๔๒.๗๒% ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามข้อสั่งการของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม) ในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

นอกจากนี้สำนักงานเขตบางแคได้ดำเนินการจัดเก็บวัชพืชและเปิดทางน้ำไหล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน เดือนเมษายน ๒๕๖๑ มีการกำหนดจุดติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ในแต่ละจุด/บริเวณ ลงในแผนที่ มีแผนสำรองกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดระหว่างการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม มีแผนสำรองกรณีฉุกเฉินที่เกิดในระหว่างการปฏิบัติงานโดยจะขอสนับสนุนรถกำเนิดไฟฟ้า จากสำนักการระบายน้ำที่จอดเตรียมความพร้อมบริเวณซอยเพชรเกษม ๖๓/๒ จำนวน ๑ คัน หรือกรณีเครื่องขัดข้อง จะขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่(รถโม่บายูนิก) จากสำนักการระบายน้ำ แจ้งสายด่วน กองเครื่องจักรกลดำเนินการ หรือกรณีเครื่องไม่เพียงพอต่อการรับมือกับสถานการณ์ มีการจัดทำแผนสำรองขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากสำนักการระบายน้ำ

ความพร้อมของหน่วยเบส สำนักงานเขตบางแคมีความพร้อม ด้านบุคลากร จำนวน ๖๑ อัตรา มีบุคลากร ๕๘ อัตราว่าง ๓ อัตรา อยู่ระหว่างเปิดรับสมัคร ส่วนวัสดุ/อุปกรณ์ มีความพร้อม (กระสอบทราย จำนวน ๗,๐๐๐ ใบ ท่อเหล็กเครื่องสูบน้ำจำนวน ๕๐ ท่อน เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๒๐ เครื่อง) พร้อมทั้งมีตารางการตรวจสอบวัสดุ/อุปกรณ์

ความพร้อมของแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตบางแคมีแผนปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและในพื้นที่ เป้าหมายลดจุดน้ำท่วมที่เคยท่วมเล็กน้อยให้เป็นจุดที่ไม่มีน้ำท่วม ลดพื้นที่และความลึกของน้ำท่วม และลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วม และมีแผนบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่ง ประเทศไทย กรมชลประทาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมทางหลวงชนบท

การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม สำนักงานเขตบางแค มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยตั้งสำนักงานศูนย์อำนวยการฯ ที่ห้องเพชรเกษม ชั้น ๒ สำนักงานเขตบางแค

การประชุมเตรียมความพร้อม สำนักงานเขตบางแค มีความถี่ในการประชุม ๑ ครั้งต่อเดือน

การติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ ในจุด/บริเวณเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก สำนักงานเขตบางแค มีการติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ ในจุด/บริเวณเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก ครบ ๑๐๐% โดยติดตั้งในบริเวณจุดเฝ้าระวัง จำนวน ๒ จุด (๑.บริเวณหน้าบางแคคอนโดทาวน์ (สนน.) ๒.บริเวณหน้าเดอะมอลล์ บางแค (สนน.)/ และติดตั้งในจุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก จำนวน ๙ แห่ง (๑. บริเวณหมู่บ้านซัชฎาวิลล่า ๒.บริเวณหมู่บ้านเพิ่มทรัพย์ ๓.บริเวณหมู่บ้านสุขสันต์ ๖ ถนนกาญจนาภิเษก ๔.บริเวณหมู่บ้านสุขสันต์ ๗ ถนนกาญจนาภิเษก ๕. บริเวณหมู่บ้านชัยมงคล ๖.บริเวณซอยโรงเรียนคลองหน่อใหญ่ ๗.บริเวณหมู่บ้านโชคสำออง ๘.บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ ตลอดสาย (สนน.) ๙.บริเวณถนนเพชรเกษมตรงข้ามตลาดบางแค (สนน.))

ความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้า สำนักงานเขตบางแค มีการกำหนดจุดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้า บริเวณวงเวียนอุโมงค์ หมู่บ้านเศรษฐกิจ ตามคำสั่งสำนักงานเขตบางแค ที่ ๖๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รวมทั้งจุดวิกฤติที่ต้องแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเร่งด่วน

๒.๓.๒ ความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อน

- สำนักงานเขตบางแค มีการกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัย จากวาตภัย วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะให้สามารถ ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหากวาตภัยได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ กำหนดกรอบ การปฏิบัติงานให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากวาตภัยได้อย่างเป็นระบบ และบูรณาการ และเพื่อป้องกัน บรรเทาผลกระทบต่อนิเวศและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจเกิดจากวาตภัย

- สำนักงานเขตบางแค มีการสำรวจตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของ สิ่งก่อสร้าง/ต้นไม้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ โดยสำรวจป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ตามหนังสือที่ กท๗๐๓/- ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ และสำรวจต้นไม้ตามหนังสือที่ กท๗๐๖/-ลงวันที่๑๓ มีนาคม๒๕๖๑ จากการตรวจสอบ สภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้างและต้นไม้ในพื้นที่ พบว่ามีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบ จำนวน ๑๔ ป้าย

และต้นไม้ที่ไม่แข็งแรง จำนวน ๑๓ ต้น มีแนวทางในการป้องกันแก้ไขโดย กรณีป้ายโฆษณา งานอาคาร สำนักงานเขตบางแคได้จัดทำหนังสือถึงเจ้าของป้ายโฆษณาเพื่อให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของป้ายโฆษณา ส่วนต้นไม้ในพื้นที่เขต ได้ตัดโค่นต้นไม้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เสี่ยงต่อการโค่นล้มในพื้นที่สาธารณะ

- สำนักงานเขตบางแค มีการกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัย

จากวาตภัย มีแผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายจากพายุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีการแบ่งกิจกรรม ๓ ช่วง คือ การดำเนินการก่อนเกิดภัย การดำเนินการขณะเกิดภัย และการดำเนินการหลังเกิดภัย

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสำนักงานเขตบางแคได้วางแผนเตรียมการรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามข้อสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานคร (นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๐/๔๓๑๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่

๒.๔ สำนักงานเขตบางบอน

จากการตรวจติดตามแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ การเพิ่มประสิทธิภาพ การลดปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดน้ำท่วมซ้ำซาก” รอบที่ ๒ ของสำนักงานเขตบางบอน พบว่า

การตรวจติดตามความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการที่ให้ไว้ในครั้งที่ ๑ ปรากฏว่า สำนักงานเขตบางบอน มีข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ ดังนี้

ในการแก้ไขปัญหาระยะยาวของสำนักงานเขตบางบอน ว่าควรให้วางแผนและจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว สำนักงานเขตบางบอนได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ในส่วนของการเตรียมความพร้อม แบ่งออกได้ดังนี้

๒.๔.๑ ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม


ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์

- วัสดุ/อุปกรณ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางบอน มีเครื่องสูบน้ำ จำนวนทั้งสิ้น ๒๒ เครื่อง จากการตรวจราชการ รอบที่ ๑ พบว่า อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จำนวน ๒๐ เครื่อง ต้องดำเนินการยุบสภาพ จำนวน ๒ เครื่อง ซึ่งจากการตรวจราชการ รอบที่ ๒ พบว่า ดำเนินการยุบสภาพเรียบร้อยแล้ว คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐

- ท่อระบายน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางบอน มีจำนวน ๙๐ ถนน ความยาวรวมทั้งสิ้น ๙๒,๙๖๗.- เมตร จากการตรวจราชการ รอบที่ ๑ พบว่า อยู่ในสภาพพร้อมในการระบายน้ำ จำนวนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

- คูคลอง/ลำราง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางบอน มีจำนวน ๒๐ คูคลอง/ลำราง ความยาวรวมทั้งสิ้น ๔๔,๓๗๐.- เมตร จากการตรวจราชการ รอบที่ ๑ พบว่า อยู่ในสภาพพร้อมในการระบายน้ำทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

รายละเอียดตามตารางและกราฟด้านล่าง

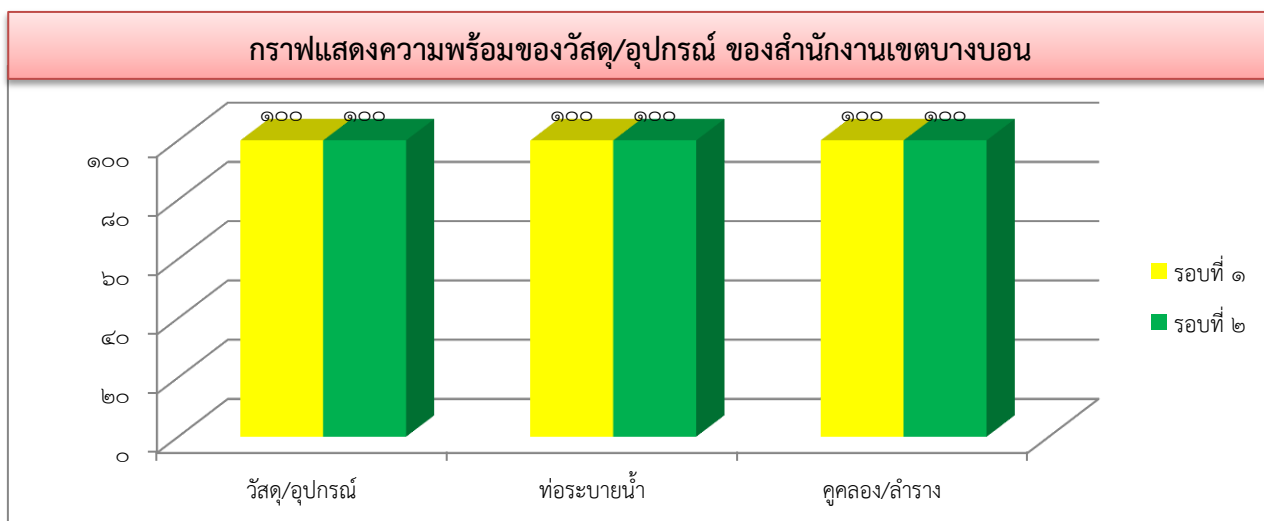

ลำดับ	วัสดุ/อุปกรณ์	ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์							หมายเหตุ
		ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ จากการตรวจติดตาม รอบที่ ๑			ผลการบำรุงรักษา จากการตรวจติดตาม รอบที่ ๒			ความพร้อม คิดเป็น ร้อยละ	
		จำนวน ทั้งหมด (เครื่อง/เมตร)	มีความ พร้อม (เครื่อง/เมตร)	ต้อง บำรุงรักษา (เครื่อง/เมตร)	ดำเนินการ แล้ว (เครื่อง/เมตร)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (เครื่อง/เมตร)	คิดเป็น ร้อยละ		
๑	วัสดุ/อุปกรณ์	๒๒	๒๐	๒ (ยุบสภาพ)	๒ (ยุบสภาพ)	-	๑๐๐	๑๐๐	ไม่ขอทดแทน เนื่องจาก เพียงพอต่อการใช้งาน
๒	ท่อระบายน้ำ	๙๒,๙๖๗	๙๒,๙๖๗	-	-	-	-	๑๐๐	
๓	คูคลอง/ลำราง	๔๔,๓๗๐	๔๔,๓๗๐	-	-	-	-	๑๐๐	
รวม							๑๐๐	๑๐๐	

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สำนักงานเขตบางบอนมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก ทั้งในส่วนของวัสดุ/อุปกรณ์ ท่อระบายน้ำ และคูคลอง/ลำราง เป็น ๑๐๐% ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามข้อสั่งการของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม) ในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

นอกจากนี้ สำนักงานเขตบางบอนมีการกำหนดจุดติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ในแต่ละจุด/บริเวณ ลงในแผนที่ มีแผนสำรองกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดระหว่างการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ อย่างน้อยจุดละ ๒ เครื่อง มีการตรวจสอบสภาพเครื่องสูบน้ำทุกวัน ตามจุดที่ติดตั้งเครื่อง สามารถประสานกับเจ้าหน้าที่ของกองเครื่องจักรกล กรณีเกิดเหตุขัดข้องได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ความพร้อมของหน่วยเบส สำนักงานเขตบางบอน มีเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน โดยมีลูกจ้างประจำ จำนวน ๓๑ คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๙ คน รวม ๔๐ คน และมีความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ ครบถ้วน

ความพร้อมของแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตบางบอน มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต เพื่อบรรเทาลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค ทรัพย์สิน และความเดือดร้อนของประชาชน ลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมและลดระยะเวลาที่น้ำท่วมขัง เป้าหมาย ลดจุดน้ำท่วมที่เคยท่วมเล็กน้อยให้เป็นจุดที่ไม่ท่วม ลดและควบคุมระดับน้ำท่วม มุ่งจุดลดน้ำท่วมในพื้นที่ ลดระดับความลึกของน้ำท่วม รวมทั้งลดระยะเวลาที่ท่วมขัง

การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม สำนักงานเขตบางบอน มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยตั้งสำนักงานศูนย์อำนวยการฯ ที่บริเวณชั้น ๑ ด้านข้างห้องฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางบอน ตามคำสั่งสำนักงานเขตบางบอน ที่ ๒๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของเขตบางบอน

การประชุมเตรียมความพร้อม สำนักงานเขตบางบอน มีการประชุมเตรียมความพร้อม ความถี่ ๑ ครั้ง/เดือน

การติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ ในจุด/บริเวณเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก สำนักงานเขตบางบอน มีการติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ ในจุด/บริเวณเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก ครบ ๑๐๐%

ความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้า สำนักงานเขตบางบอน มีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้า กำหนดจุดบริเวณหน้าบริษัท กระเทียมแดง จำกัด (ซอยเอกชัย ๖๘) ตามคำสั่งสำนักงานเขตบางบอน ที่ ๑๓๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ป้องกันน้ำท่วมและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้า

๒.๔.๒ ความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อน

- สำนักงานเขตบางบอน มีการแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อน วัตถุประสงค์ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนทางจราจรและประชาชนที่สัญจรผ่านไป-มา เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เป้าหมาย ลดปริมาณและจุดน้ำท่วมขังเมื่อฝนตก ป้ายโฆษณามีความมั่นคงแข็งแรง ต้นไม้ได้รับการดูแลและตัดแต่งให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง

- สำนักงานเขตบางบอน มีการสำรวจตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง/ต้นไม้ โดยทำหนังสือ ที่ กท ๘๙๐๓/๒๑๔๘ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบความแข็งแรงของป้ายโฆษณาและดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ไปยังเจ้าของป้ายโฆษณาที่อยู่ในเขตบางบอน ทั้งหมด จำนวน ๖ ราย และให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน จากการตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้างและต้นไม้ในพื้นที่สำนักงานเขตบางบอน พบป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ จำนวน ๑๐ ป้าย เป็นป้ายที่ได้รับอนุญาต จำนวน ๗ ป้าย และป้ายถูกดำเนินคดี จำนวน ๓ ป้าย มีการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟ จำนวน ๒๖๔ ต้น และมีแผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายจากพายุ จัดเจ้าหน้าที่หน่วย BEST ดำเนินการแก้ไข กรณีมีเหตุต้นไม้หักโค่น ป้ายโฆษณาล้ม

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสำนักงานเขตบางบอนได้วางแผนเตรียมการรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามข้อสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานคร (นายภักดิ์ ทรพรานนท์) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๐/๔๓๑๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

๑. สำนักงานเขตควรมีการตรวจความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้ทันที อยู่เสมอๆ

๒. ควรติดตามการดำเนินการของเจ้าของป้าย กรณีที่สำนักงานเขตได้มีหนังสือให้สำรวจตรวจสอบสภาพความแข็งแรงจากป้ายและให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันด้วย

๒.๕ สำนักงานเขตภาษีเจริญ

จากการตรวจติดตามแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ การเพิ่มประสิทธิภาพ การลดปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดน้ำท่วมซ้ำซาก” รอบที่ ๒ ของสำนักงานเขตภาษีเจริญ พบว่า

การตรวจติดตามความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการที่ให้ไว้ในครั้งที่ ๑
ปรากฏว่า สำนักงานเขตภาษีเจริญ มีข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ ดังนี้

๑. ให้สำนักงานเขตภาษีเจริญ ปรับแผนการดูแลบำรุงรักษาคูคลอง/ลำรางสาธารณะ กรณีการใช้แรงงานเขต และกำหนดแผนปฏิบัติงานในการจ้างเหมาขุดลอกคูคลอง/ลำราง และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ให้ทันภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ตามที่ได้มีการสั่งการไว้ในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดเวลาดังกล่าว

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว สำนักงานเขตภาษีเจริญได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

๒. การแก้ไขปัญหาระยะยาวบริเวณซอยเพชรเกษม ๓๗ ช่วงปลายซอย ควรให้สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว สำนักงานเขตภาษีเจริญได้ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณ เพื่อปรับปรุงซอยเพชรเกษม ๓๗ และได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ในส่วนของการเตรียมความพร้อม แบ่งออกได้ดังนี้

๒.๕.๑ ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์


- **วัสดุ/อุปกรณ์** ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตภาษีเจริญ มีเครื่องสูบน้ำ จำนวนทั้งสิ้น ๑๓ เครื่อง จากการตรวจราชการ รอบที่ ๑ พบว่า อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทั้งหมด ๑๐๐%

ในการดำเนินงานสำนักงานเขตภาษีเจริญได้แจ้งปัญหาในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของเครื่องสูบน้ำที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากสำนักระบายน้ำ โดยมีข้อเสนอแนะในระดับพื้นที่ หากเป็นไปได้ควรจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตมาดำเนินการบำรุงรักษาเองจะสะดวกและรวดเร็วขึ้น

- **ท่อระบายน้ำ** ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตภาษีเจริญ มีจำนวน ๑๒๓ ซอย ความยาวรวมทั้งสิ้น ๘๕,๗๑๖.- เมตร จากการตรวจราชการ รอบที่ ๑ พบว่า อยู่ในสภาพพร้อมในการระบายน้ำ จำนวน ๓๗,๘๒๔.- เมตร ต้องได้รับการบำรุงรักษา จำนวน ๔๗,๘๙๒.- เมตร ซึ่งจากการตรวจราชการ รอบที่ ๒ พบว่า ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐

- **คูคลอง/ลำราง** ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตภาษีเจริญ มีจำนวน ๑๓๓ คูคลอง/ลำราง ความยาวรวมทั้งสิ้น ๗๕,๒๕๒.- เมตร จากการตรวจราชการ รอบที่ ๑ พบว่า อยู่ในสภาพพร้อมในการระบายน้ำ จำนวน ๒๖,๗๓๐.- เมตร ต้องได้รับการบำรุงรักษา จำนวน ๔๘,๕๒๒.- เมตร ซึ่งจากการตรวจราชการ รอบที่ ๒ พบว่า ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

รายละเอียดตามตารางและกราฟด้านล่าง

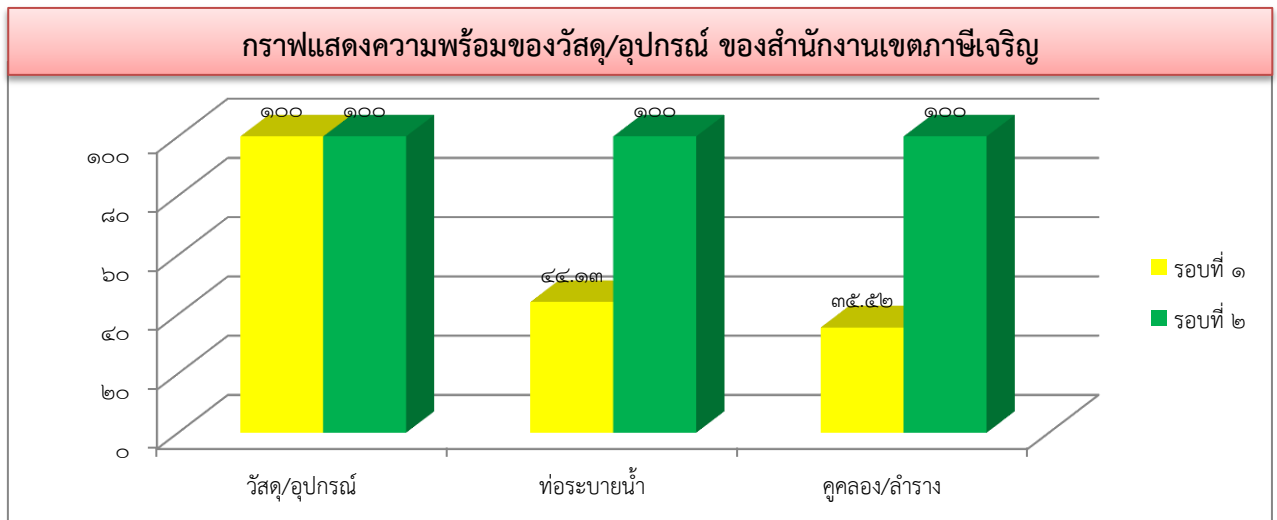

ลำดับ	วัสดุ/อุปกรณ์	ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์							หมายเหตุ
		ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์จากการตรวจติดตาม รอบที่ ๑			ผลการบำรุงรักษาจากการตรวจติดตาม รอบที่ ๒			ความพร้อมคิดเป็นร้อยละ	
		จำนวนทั้งหมด (เครื่อง/เมตร)	มีความพร้อม (เครื่อง/เมตร)	ต้องบำรุงรักษา (เครื่อง/เมตร)	ดำเนินการแล้ว (เครื่อง/เมตร)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (เครื่อง/เมตร)	คิดเป็นร้อยละ		
๑	วัสดุ/อุปกรณ์	๑๓	๑๓	-	-	-	-	๑๐๐	
๒	ท่อระบายน้ำ	๘๕,๗๑๖	๓๗,๘๒๔	๔๗,๘๙๒	๔๗,๘๙๒	-	๑๐๐	๑๐๐	
๓	คูคลอง/ลำราง	๗๕,๒๕๒	๒๖,๗๓๐	๔๘,๕๒๒	๔๘,๕๒๒	-	๑๐๐	๑๐๐	
รวม							๑๐๐	๑๐๐	

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สำนักงานเขตภาษีเจริญมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก ทั้งในส่วนของวัสดุ/อุปกรณ์ ท่อระบายน้ำ และคูคลอง/ลำราง เพิ่มขึ้นจากที่ได้มีการตรวจติดตามในรอบที่ ๑ (๕๙.๘๘%) เป็น ๑๐๐% เพิ่มขึ้น ๔๐.๑๒% ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามข้อสั่งการของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม) ในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

มีการกำหนดจุดติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ในแต่ละจุด/บริเวณ ลงในแผนที่ มีแผนสำรองกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดระหว่างการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซึ่งสำนักงานเขตภาษีเจริญมีเครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์ดีเซล แบบลากจูง ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑๑ เครื่อง มีจุดอ่อนน้ำท่วมในพื้นที่ ที่จำเป็นต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ทั้งสิ้น ๘ เครื่อง กรณีเกิดเครื่องชำรุดตามจุดสูบน้ำ สามารถนำเครื่องมาทดแทนได้ในทันที

ความพร้อมของหน่วยเบส สำนักงานเขตภาษีเจริญ มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน ๔ ชุด เพื่อปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชนในวันและเวลาราชการปกติ, ในวันและเวลาราชการปกติ ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง จัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไว้ให้พร้อมปฏิบัติงาน ตามคำสั่งสำนักงานเขตภาษีเจริญ ที่ ๔๙๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. (BEST) สำนักงานเขตภาษีเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ความพร้อมของแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตภาษีเจริญ มีแผนสำรองฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน ในพื้นที่เขตภาษีเจริญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป้าหมายเพื่อมีความพร้อมในการปฏิบัติงานฉุกเฉินในส่วนของบุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องพ่นแรงต่างๆ เครื่องสูบน้ำชนิดต่างๆ หรือขนาดต่างๆ โดยต้องมีการบำรุงรักษาจัดหาทดแทนให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างทันที มีช่องทางติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ กรณีเกิดปัญหาสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ตัดสินใจหรือรับผิดชอบได้อย่างทันทีเพื่อลดการสูญเสียอันอาจเกิดผลกระทบกับการดำรงชีวิต ต่อทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยขอประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อย่างรวดเร็วทันที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม สำนักงานเขตภาษีเจริญ มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยตั้งสำนักงานศูนย์อำนวยการฯ ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตภาษีเจริญ ตามคำสั่งสำนักงานเขตภาษีเจริญ ที่ ๔๙๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่เขตภาษีเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

การประชุมเตรียมความพร้อม สำนักงานเขตภาษีเจริญ มีการประชุมเตรียมความพร้อมความถี่ ๑ ครั้ง/เดือน

การติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ ในจุด/บริเวณเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก สำนักงานเขตภาษีเจริญ มีการติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ ในจุด/บริเวณเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก ครบ ๑๐๐%

ความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้า สำนักงานเขตภาษีเจริญ มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้า บริเวณหน้าศูนย์สรรพสินค้าชีคอน บางแค ตามคำสั่งสำนักงานเขตภาษีเจริญ ที่ ๑๐๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้า

๒.๕.๒ ความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อน

- สำนักงานเขตภาษีเจริญ มีการแผนปฏิบัติการและมาตรการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อนิคมและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากภัยพายุหมุนเขตร้อน เพื่อให้การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนในการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพายุหมุนเขตร้อนให้ชัดเจน บูรณาการ และมีประสิทธิภาพ

- สำนักงานเขตภาษีเจริญ มีการสำรวจตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง/ต้นไม้ โดยทำหนังสือ ที่ กท ๖๐๐๓/๑๘๓๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของป้ายโฆษณาและแสดงใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (ตามแบบ ร.๑) ไปยังเจ้าของป้ายโฆษณาที่อยู่ในเขตภาษีเจริญทั้งหมด จำนวน ๒ ราย และให้ดำเนินการในส่วนต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน จากการตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้างและต้นไม้ในพื้นที่สำนักงานเขตภาษีเจริญ พบป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต ๑๕ ป้าย รื้อถอนแล้ว จำนวน ๓ ป้าย อยู่ระหว่างดำเนินการคดี จำนวน ๑๐ ป้าย อยู่ระหว่างตรวจสอบกรณีสิทธิต่างๆ จำนวน ๒ ป้าย

- สำนักงานเขตภาษีเจริญ มีแผนดำเนินการกรณีเกิดเหตุต้นไม้ล้มที่เสียหายจากพายุ เป้าหมาย คือ เตรียมความพร้อมในด้านการดูแล บำรุงรักษา ตัดแต่ง เพื่อให้ต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่เขตมีความสมบูรณ์แข็งแรง และดำเนินการแก้ไขกรณีเกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างรุนแรง ทำให้ต้นไม้ของกรุงเทพมหานครโค่นล้มทำลายทรัพย์สินของประชาชน และการเคลื่อนย้ายต้นไม้ไม่ให้เกิดขวางทางสัญจร

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสำนักงานเขตภาษีเจริญได้วางแผนเตรียมการรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามข้อสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานคร (นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๐/๔๓๑๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่

๒.๖ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

จากการตรวจติดตามแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ การเพิ่มประสิทธิภาพ การลดปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดน้ำท่วมซ้ำซาก” รอบที่ ๒ ของสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ พบว่า

การตรวจติดตามความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการที่ให้ไว้ในครั้งที่ ๑ ปรากฏว่า สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ไม่ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

ในส่วนของการเตรียมความพร้อม แบ่งออกได้ดังนี้

๒.๖.๑ ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์


- วัสดุ/อุปกรณ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ มีดังนี้ เครื่องสูบน้ำ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๘ เครื่อง จากการตรวจราชการ รอบที่ ๑ พบว่า อยู่ในสภาพพร้อมในการใช้งาน จำนวน ๑๕ เครื่อง ต้องได้รับการบำรุงรักษา จำนวน ๓ เครื่อง ซึ่งจากการตรวจราชการ รอบที่ ๒ พบว่า ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

เครื่องจักรกล มีจำนวน ๑ เครื่อง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

- ท่อระบายน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ มีจำนวน ๑๒ ซอย ความยาวรวมทั้งสิ้น ๖๐,๔๖๕.- เมตร จากการตรวจราชการ รอบที่ ๑ พบว่า อยู่ในสภาพต้องได้รับการบำรุงรักษา จำนวน ๔๑,๖๘๒.- เมตร ซึ่งจากการตรวจราชการ รอบที่ ๒ พบว่า ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

- คูคลอง/ลำราง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะมีจำนวน ๒๒ คูคลอง/ลำราง ความยาวรวมทั้งสิ้น ๑๙,๐๗๘.- เมตร จากการตรวจราชการ รอบที่ ๑ พบว่า อยู่ในสภาพพร้อมในการระบายน้ำทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

รายละเอียดตามตารางและกราฟด้านล่าง

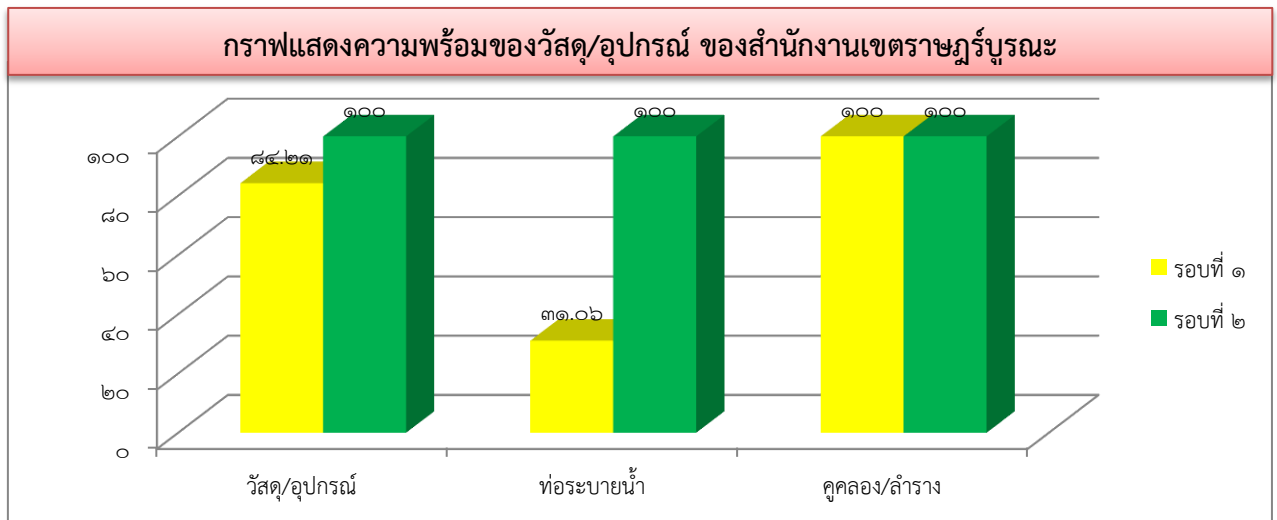

ลำดับ	รายการ	ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์							หมายเหตุ
		ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์จากการตรวจติดตาม รอบที่ ๑			ผลการบำรุงรักษาจากการตรวจติดตาม รอบที่ ๒			ความพร้อมคิดเป็นร้อยละ	
		จำนวนทั้งหมด (เครื่อง/เมตร)	มีความพร้อม (เครื่อง/เมตร)	ต้องบำรุงรักษา (เครื่อง/เมตร)	ดำเนินการแล้ว (เครื่อง/เมตร)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (เครื่อง/เมตร)	คิดเป็นร้อยละ		
๑	วัสดุ/อุปกรณ์	๑๙	๑๖	๓	๓	-	๑๐๐	๑๐๐	
๒	ท่อระบายน้ำ	๖๐,๔๖๕	๑๘,๗๘๓	๔๑,๖๘๒	๔๑,๖๘๒	-	๑๐๐	๑๐๐	
๓	คูคลอง/ลำราง	๑๙,๐๗๘	๑๙,๐๗๘	-	-	-	-	๑๐๐	
รวม							๑๐๐	๑๐๐	

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก ทั้งในส่วนของวัสดุ/อุปกรณ์ ท่อระบายน้ำ และคูคลอง/ลำราง เพิ่มขึ้นจากที่ได้มีการตรวจติดตามในรอบที่ ๑ (๗๑.๗๖%) เป็น ๑๐๐% เพิ่มขึ้น ๒๘.๒๔% ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามข้อสั่งการของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม) ในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ความพร้อมของหน่วยเบส สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ มีเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน โดยมีลูกจ้างประจำ จำนวน ๓๑ คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๙ คน รวม ๔๐ คน และมีความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ ครบถ้วน

ความพร้อมของแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม เป้าหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ตลอดจนการฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพโดยเร็วที่สุด ตลอดจนกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยตั้งสำนักงานศูนย์อำนวยการฯ ที่งานระบายน้ำ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ตามคำสั่งสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ที่ ๔๗๐/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ

การประชุมเตรียมความพร้อม สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ มีการประชุมเตรียมความพร้อม ความถี่ ๔ ครั้ง/เดือน เป็นการประชุมภายในฝ่ายโยธา

การติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ ในจุด/บริเวณเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก
สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ มีการติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ ในจุด/บริเวณเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก ครบ ๑๐๐%

ความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้า
สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ มีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้า กำหนดจุดบริเวณใต้สะพานพระราม ๙ บริเวณหน้าบมจ.ธนาคารกสิกรไทย และซอยสุขสวัสดิ์

๒.๖.๒ ความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์พายุดูรอัน

- สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ มีการแผนปฏิบัติการและบรรเทาภัยจากวาตภัย วัสดุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหามาจากวาตภัยได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติงานให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากวาตภัยได้อย่างเป็นระบบและบูรณาการ

- สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ มีการสำรวจตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง/ต้นไม้ จากการตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้างและต้นไม้ในพื้นที่สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ มีการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟ จำนวน ๕ ต้น มีแผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายจากพายุ

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะได้วางแผนเตรียมการรับมือกับสถานการณ์พายุดูรอันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามข้อสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานคร (นายภัทรธัมม์ ทรชรานนท์) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๐/๔๓๑๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่

๒.๗ สำนักงานเขตหนองแขม

จากการตรวจติดตามแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ การเพิ่มประสิทธิภาพ การลดปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดน้ำท่วมซ้ำซาก” รอบที่ ๒ ของสำนักงานเขตหนองแขม พบว่า

การตรวจติดตามความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการที่ให้ไว้ในครั้งที่ ๑
ปรากฏว่า สำนักงานเขตหนองแขม มีข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ ดังนี้

๑. เห็นควรให้สำนักงานเขตหนองแขมกำหนดแผนปฏิบัติงานในการจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำและกำหนดแล้วเสร็จให้ทันภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ตามที่มีสั่งการให้ไว้ในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดดังกล่าว

สำนักงานเขตหนองแขม ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดแผนจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งครบทุกรายการ แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ ส่วนคูคลอง/ลำรางที่ได้รับการบำรุงรักษาให้น้ำสามารถไหลผ่านได้โดยไม่ติดขัด จำนวน ๑๕ คู/คลอง ดำเนินการได้ ๑๐๐ %

๒. มาตรการแก้ไขปัญหาระยะยาวที่สำนักงานเขตหนองแขมเสนอ ควรกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการและแผนการขอจัดสรรงบประมาณต่อไป และเห็นควรให้สำนักการระบายน้ำพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานเขตหนองแขม

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว สำนักงานเขตหนองแขม ได้ดำเนินการในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว ส่วนในประเด็นบริเวณถนนเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ช่วงหน้าหมู่บ้านอรุณทอง ๒ ปรับปรุงยกระดับถนนเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ช่วงที่มีระดับต่ำ น้ำท่วมขังความยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร เป็นความรับผิดชอบของสำนักการโยธา จึงไม่สามารถกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการและแผนการขอจัดสรรงบประมาณต่อไปได้ ซึ่งได้ทำหนังสือแจ้งสำนักการโยธาแล้ว และในส่วนเครื่องผลักดันน้ำที่ไม่ได้รับการติดตั้งจากสำนักการระบายน้ำได้โทรศัพท์ประสานหลายครั้งและได้ทำหนังสือแจ้งไปแล้ว

ในส่วนของการเตรียมความพร้อม แบ่งออกได้ดังนี้

๒.๗.๑ ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์

- วัสดุ/อุปกรณ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตหนองแขม มีดังนี้ เครื่องสูบน้ำ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๓ เครื่อง จากการตรวจราชการ รอบที่ ๑ พบว่าอยู่ในสภาพพร้อมในการใช้งาน จำนวน ๑๒ เครื่อง ต้องได้รับการบำรุงรักษา จำนวน ๑ เครื่อง โดยได้ดำเนินการส่งสำนักการระบายน้ำบำรุงรักษา ซึ่งจากการตรวจราชการ รอบที่ ๒ พบว่า เครื่องสูบน้ำที่ส่งสำนักการระบายน้ำเพื่อบำรุงรักษาอยู่ระหว่างดำเนินการเนื่องจากปั๊มเชื้อเพลิงชำรุด เป็นการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการ มีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

นอกจากนี้ สำนักงานเขตหนองแขมได้ขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากสำนักการระบายน้ำ ขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๕ เครื่อง ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง รวมทั้งสิ้น ๘ เครื่อง เพื่อติดตั้งบริเวณจุดที่น้ำท่วมขังรอการระบายเวลาฝนตก และจุดที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาโดยพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาน้ำท่วมขังเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามหนังสือที่ กท ๖๑๐๓/๒๑๙๒ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑

ในการดำเนินงาน สำนักงานเขตหนองแขมได้แจ้งปัญหาในการปฏิบัติ

เกี่ยวกับ


การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของเครื่องสูบน้ำที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากสำนักการระบายน้ำ โดยมีข้อเสนอแนะในระดับพื้นที่ว่า หากเป็นไปได้ควรจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตมาดำเนินการบำรุงรักษาเอง จะสะดวกและรวดเร็วขึ้น

รถตักหน้าขุดหลัง มีจำนวน ๑ เครื่อง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

- ท่อระบายน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตหนองแขม มีจำนวน ๓๖๕ ถนน ความยาวรวมทั้งสิ้น ๑๑๙,๑๘๗.- เมตร จากการตรวจราชการ รอบที่ ๑ พบว่า อยู่ในสภาพพร้อมในการระบายน้ำ จำนวน ๙๐,๖๑๔.- เมตร ต้องได้รับการบำรุงรักษา จำนวน ๒๘,๕๗๓.- เมตร ซึ่งจากการตรวจราชการ รอบที่ ๒ พบว่า ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

- คูคลอง/ลำราง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตหนองแขมมีจำนวน ๑๕ คูคลอง/ลำราง ความยาวรวมทั้งสิ้น ๒๔,๓๓๑.- เมตร จากการตรวจราชการ รอบที่ ๑ พบว่า อยู่ในสภาพพร้อมในการระบายน้ำทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

รายละเอียดตามตารางและกราฟด้านล่าง

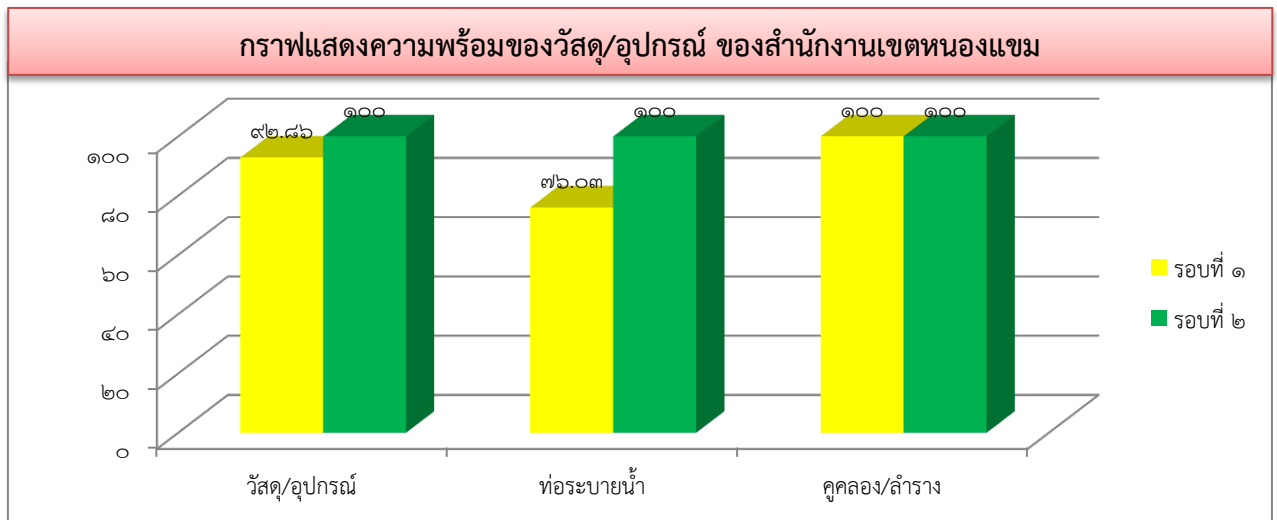

ลำดับ	รายการ	ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์							หมายเหตุ
		ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์จากการตรวจติดตาม รอบที่ ๑			ผลการบำรุงรักษาจากการตรวจติดตาม รอบที่ ๒		ความพร้อมคิดเป็นร้อยละ		
		จำนวนทั้งหมด (เครื่อง/เมตร)	มีความพร้อม (เครื่อง/เมตร)	ต้องบำรุงรักษา (เครื่อง/เมตร)	ดำเนินการแล้ว (เครื่อง/เมตร)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (เครื่อง/เมตร)		คิดเป็นร้อยละ	
๑	วัสดุ/อุปกรณ์	๑๔	๑๓	๑	-	๑	๐	๑๐๐	- กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ - เพียงพอต่อการใช้งาน
๒	ท่อระบายน้ำ	๑๑๙,๑๘๗	๙๐,๖๑๔	๒๘,๕๗๓	๒๘,๕๗๓	-	๑๐๐	๑๐๐	
๓	คูคลอง/ลำราง	๒๔,๓๓๑	๒๔,๓๓๑	-	-	-	-	๑๐๐	
รวม							๕๐	๑๐๐	

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สำนักงานเขตหนองแขมมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก ทั้งในส่วนของวัสดุ/อุปกรณ์ ท่อระบายน้ำ และคูคลอง/ลำราง เพิ่มขึ้นจากที่ได้มีการตรวจติดตามในรอบที่ ๑ (๘๙.๖๓%) เป็น ๑๐๐% เพิ่มขึ้น ๑๐.๓๗% ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามข้อสั่งการของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม) ในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

นอกจากนี้สำนักงานเขตหนองแขมได้ดำเนินการจัดเก็บวัชพืชและเปิดทางน้ำไหลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑๒ เดือนเมษายน ๒๕๖๑ มีการกำหนดจุดติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ในแต่ละจุด/บริเวณ ลงในแผนที่ มีแผนสำรองกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดระหว่างการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยฝ่ายโยธา เป็นผู้รับผิดชอบ

ความพร้อมของหน่วยเบส สำนักงานเขตหนองแขมมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจำนวน ๖๐ คนหมุนเวียนกันเป็นประจำทุกวัน วันละ ๔-๕ คน และมีความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ

ความพร้อมของแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตหนองแขมมีแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เป้าหมายลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วม และสำรวจตรวจสอบพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม สำนักงานเขตหนองแขม มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอำนวยความสะดวกช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยตั้งสำนักงาน ศูนย์อำนวยความสะดวกฯ อยู่ที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตหนองแขม

การประชุมเตรียมความพร้อม สำนักงานเขตหนองแขม มีความถี่ในการประชุม ๑-๒ ครั้งต่อเดือน (มิถุนายน-พฤศจิกายน หรือตามสถานการณ์จริง)

การติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ ในจุด/บริเวณเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก
สำนักงานเขตหนองแขม มีการติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ ในจุด/บริเวณเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก ครบ ๑๐๐%

ความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้า
สำนักงานเขตหนองแขม มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้า บริเวณถนนเลียบคลองภาษีเจริญ ฝั่งเหนือ ซอย ๖ (ซอยสุนทร ๔) และมีคำสั่งมอบหมายหน้าที่และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น ตามคำสั่งสำนักงานเขตหนองแขม ที่ ๖๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ประสานกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการสงเคราะห์ที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบภัย ได้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๒.๗.๒ ความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อน

- สำนักงานเขตทุ่งหนองแขมมีการกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและลด อุบัติภัยจากพายุฤดูร้อน วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติภัยจากพายุฤดูร้อน ของสำนักงานเขตหนองแขม ประจำปี ๒๕๖๑ ให้ประชาชนในพื้นที่สำนักงานเขตหนองแขม มีความรู้และทราบ ถึงอันตรายจากภัยต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความตระหนัก และร่วมเฝ้าระวังไม่ประมาท และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานเขตหนองแขมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตหนองแขม เตรียมพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามแผนฯ

- ต้นไม้ที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ตามโครงการ ตรวจสอบระบบ การป้องกันอัคคีภัยในอาคารและความมั่นคงแข็งแรงของป้ายโฆษณา และประกาศสำนักงานเขตหนองแขมเรื่อง การป้องกันอันตรายจากต้นไม้หักโค่นล้ม

- การตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้างและต้นไม้ในพื้นที่ พบว่า ป้ายโฆษณา มีความมั่นคงแข็งแรง ส่วนต้นไม้ที่ไม่แข็งแรง มี ๕๔ ต้น มีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขโดยตัด ทอนความสูงของต้นไม้ จำนวน ๔๗ ต้น และล้อมย้ายชุดดอก ๗ ต้น ตามประกาศของสำนักงานเขตหนองแขม เรื่องการป้องกันอันตรายจากต้นไม้โค่นล้ม

- สำนักงานเขตหนองแขม มีการกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัย จากวาตภัยมีแผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายจากพายุ โดยมีกรอบ กิจกรรรม ๓ ช่วง คือ การดำเนินการก่อนเกิดภัย การดำเนินการขณะเกิดภัย และการดำเนินการหลังเกิดภัย

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสำนักงานเขตหนองแขมได้วางแผนเตรียมการ รับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตาม ข้อสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานคร (นายภักดิ์ ทรพรานนท์) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๐/๔๓๑๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณา ขนาดใหญ่

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

๑. การเตรียมความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ เห็นควร

๑.๑ ให้สำนักการระบายน้ำรีบดำเนินการซ่อมเครื่องสูบน้ำให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำที่สำนักงานเขตหนองแขมขอเพิ่มเติม จำนวน ๘ เครื่อง หากเครื่องมีจำนวนจำกัดให้สนับสนุนในจุดที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ๑ – ๒ จุดก่อน

๑.๒ การซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสูบน้ำและการเปลี่ยนแบตเตอรี่ควรจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตดำเนินการเอง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

๓. ในประเด็นถนนเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ช่วงหน้าหมู่บ้านอรุณทอง ๒ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเห็นว่า ถนนเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือและฝั่งใต้ เป็นถนนที่อยู่ในพื้นที่สำนักงานเขตหนองแขมทั้งเส้น มิได้เป็นเส้นทางยาวเชื่อมต่อในหลายเขต ซึ่งในหลักการที่ถูกต้องแล้วควรให้สำนักงานเขตหนองแขมซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะในพื้นที่ และเป็นหน่วยที่อยู่ใกล้ชิดกับปัญหาและประชาชนเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ อันเป็นเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ ที่วางระบบการบริหารของกรุงเทพมหานครไว้เป็นสองชั้น โดยสำนักงานเขตเป็นหน่วยปฏิบัติหลักในพื้นที่ ซึ่งสำนักงานเขตมีความพร้อมและศักยภาพที่จะดำเนินการได้

ดังนั้น ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ จึงมีข้อเสนอแนะให้มีการโอนความรับผิดชอบในการดูแลถนนเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือและฝั่งใต้จากสำนักการโยธาให้มาอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตหนองแขมในฐานะหน่วยงานปฏิบัติหลักในระดับพื้นที่ เพื่อสำนักงานเขตหนองแขมจะได้ดูแลรับผิดชอบในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเกิด ผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริงต่อไป ทั้งในการออกแบบและขอจัดสรรงบประมาณ ในการปรับปรุง รวมทั้งการพัฒนา ดูแลรักษาในด้านอื่นๆ ต่อไป เช่นเดียวกับกรณีของถนนครุใน สำนักงานเขตทุ่งครุ ที่ปัดกรุงเทพมหานครได้มีการสั่งการไปแล้ว ตามหนังสือที่ กท ๐๔๐๐.๑/๑๗๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

อนึ่ง ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการ ๖ ที่ปัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำ ควรให้เขตตรวจราชการที่รับผิดชอบเร่งรัดติดตามให้เป็นไปตามข้อสั่งการ
