



บันทึกข้อความ

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรน้ำ
สำนักการระบายน้ำ
รับที่ ๐๔๔๒
วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๓

สำนักการระบายน้ำ
12/15 กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 305
วันที่ 15 ม.ค. ๒๕๖๓

ส่วนราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๒๑๔๑ หรือโทร. ๑๒๕๖ โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๒๙๑๐.

ที่ กท.๐๔๐๐.๑/๑๓ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปผลการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ของสำนักการระบายน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ

พร้อมนี้ ขอส่งสำเนาหนังสือ ที่ กท. ๐๔๐๐.๑/๑๑๘๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง สรุปผลการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ของ สำนักการระบายน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาเพื่อโปรดพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินการตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๙ ตามแบบติดตามผลการดำเนินการที่แนบ

กลุ่มงานแผนและโครงการ
ส่วนวิชาการและแผนงาน
รับที่ 69
วันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๓ 1037

ส่วนวิชาการและแผน
สำนักงานพัฒนาทรัพยากรน้ำ
รับที่ ๐๑๘
วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๓ 14:55

(นายสวัชชัย อรรถนิตย)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

เรียน ผอ.สนน.

- เพื่อโปรดทราบ
 - เห็นควรมอบ ผอ.สพน.พิจารณาดำเนินการ
- โดยประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

(นางสาวชลนงณี ศรีสังข์)
เลขานุการสำนักการระบายน้ำ

- ทราบ, ดำเนินการตามเสนอ

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและแผน
พิจารณาดำเนินการ.

(นายเจษฎา จันทะประภา)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาทรัพยากรน้ำ
สำนักการระบายน้ำ

(นายอรรถ ศรีสงฆ์)
ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ
๑๖ ม.ค. ๒๕๖๓

กลุ่มงานวิชาการและวิศวกรรมจัดการน้ำ
พิจารณาดำเนินการ

(นายวิษณุ เจริญ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและวิศวกรรมจัดการน้ำ
ส่วนวิชาการและแผน สำนักงานพัฒนาทรัพยากรน้ำ
สำนักการระบายน้ำ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนวิชาการและแผน

กลุ่มงานแผนและโครงการ
เพื่อทราบ

(นายวิษณุ เจริญ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและวิศวกรรมจัดการน้ำ
ส่วนวิชาการและแผน สำนักงานพัฒนาทรัพยากรน้ำ
สำนักการระบายน้ำ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนวิชาการและแผน



กรุงเทพมหานคร กรมการช่าง
และ หน่วยงาน (ระบุ) (ระบุ)
วันที่ ๒๕/๑๒/๖๒
ที่ ๒๕/๑๒/๖๒
หน้า ๑

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๒๑๔๑ หรือโทร. ๐๒๕๖ โทรสาร. ๐ ๒๒๒๖ ๒๕๑๐.
ที่ กท.๐๔๐๐.๑/ว.๕๗ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง สรุปผลการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ของสำนักการระบายน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒.
เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร (ผ่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร)

ต้นเรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครตรวจราชการเฉพาะพื้นที่เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานระดับสำนักและสำนักงานเขต โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นปัญหา หรือมีผลกระทบต่อประชาชน หรือภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นในพื้นที่การตรวจราชการที่ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครรับผิดชอบ กำหนดการตรวจรอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และปลัดกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ ๒๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการ โดยให้ นายศรชัย โควานิขกุล ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง รับผิดชอบการตรวจราชการสำนักการระบายน้ำ

ข้อเท็จจริง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง (นายศรชัย โควานิขกุล) ได้ตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ รอบที่ ๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ของสำนักการระบายน้ำตามประเด็นการตรวจราชการ จำนวน ๖ ประเด็น ดังต่อไปนี้

๑. ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการสำคัญต่างๆ

๑.๑ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

การตรวจความคืบหน้าของโครงการพบว่า ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อขนาด ๖๐ ลบ.ม./วินาที จำนวน ๑ แห่ง และดำเนินการจัดหาชิ้นส่วนอุโมงค์และติดตั้งชิ้นส่วนอุโมงค์พร้อมอุปกรณ์แล้ว ผลงานที่ทำได้ ๓๘.๙๙๓ % เร็วกว่าแผนงาน ๐.๖๓ %

๑.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้วยระบบ Pipe Jacking สำนักการระบายน้ำมีผลการดำเนินโครงการ Pipe Jacking ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจำนวน ๒ ระยะ คือ

ระยะที่ ๑ จำนวน ๑๑ โครงการ (งบประมาณ ๒,๒๐๘.๗๙ ล้านบาท) ดังนี้

ลำดับ	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำระยะที่ ๑ (สถานที่)	พื้นที่ (ตร.กม.)	ผลการดำเนินการ (ความก้าวหน้า)	ปัญหาและอุปสรรค
๑	ถนนสุขุมวิท ๒๑ (อโศกมนตรี)	๑	๒๓ %	-
๒	ถนนศรีอยุธยา และถนนพระรามที่ ๖	๘	๔๘ %	แนวท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและแนวท่อประปา กีดขวางการก่อสร้าง
๓	ถนนพหลโยธิน บริเวณแยกเกษตรศาสตร์	๕	๖๒ %	-
๔	ซอยสุขุมวิท ๓๑ และซอยสวัสดี	๑.๑	๙๕ %	-
๕	ถนนสุขุมวิท ๖๓ (เอกมัย)	๒.๗	๗๕ %	-
๖	ถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช และ	๑.๒	๙๙ %	-

ลำดับ	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ระยะที่ ๑ (สถานที่)	พื้นที่ (ตร.กม.)	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค
	ถนนเจริญกรุง			
๗	ซอยสุขุมวิท ๔ (นานาใต้)	๐.๕	๗๕.๐๐%	-
๘	ซอยสุขุมวิท ๑๔	๐.๓	อยู่ระหว่างสรุปผล ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ ๒	-
๙	ซอยสุขุมวิท ๓๙	๑.๓	๓๕%	- ไฟฟ้า ประปา สายสื่อสาร อยู่ระหว่างดำเนินการหารือ เพื่อหาแนวทางการรื้อย้าย โดย สน. มีหนังสือที่ กท.๑๐๐๒/ก.๙๘๐ ลงวันที่ ๑๙ เม.ย.๖๑ ถึงการไฟฟ้านครหลวง บางกะปิ และการประปา นครหลวงสาขาสุขุมวิท เรื่องขอให้ตรวจสอบและ รื้อ ย้ายแล้ว - การไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ ได้ดำเนินการ รื้อย้ายเสาไฟฟ้าและ สายไฟฟ้าที่กีดขวางบริเวณ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำเชิง สะพานข้ามคลองแสนแสบ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑
๑๐	ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ๑๗ และ ถนนสวนพลู	๓	๙๕%	-
๑๑	ซอยสุขุมวิท ๑๐๗ ถึงคลองบางนา	๒.๖	๙๗%	-

ระยะที่ ๒ จำนวน ๓ โครงการ (งบประมาณ ๒๘๙.๔๔ ล้านบาท) ดังนี้

ลำดับ	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ระยะที่ ๒ (สถานที่)	พื้นที่ (ตร.กม.)	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค
๑	พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์	๑	๐%	อยู่ระหว่างรอกรมศิลป์การ สำรวจโบราณคดี
๒	ถนนจันทน์	๑.๒	๐%	อยู่ระหว่างอนุมัติจ้าง
๓	ถนนสุวินทวงศ์	๒.๒	๔๔.๕%	- รอกรมทางหลวงอนุญาต

ลำดับ	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ระยะที่ ๑ (สถานที่)	พื้นที่ (ตร.กม.)	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค
				ให้เข้าดำเนินการสร้าง บ่อสูบน้ำ จำนวน ๔ บ่อ ได้แก่ บ่อ ๒, ๕, ๖ และ ๗ - มีแนวท่อก๊าซของ ปตท. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อ สูบน้ำ บ่อ ๒ และ บ่อ ๗ - มีแนวท่อระปานาค ๓๐๐ มม. กีดขวางตำแหน่ง ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ ๒ และ บ่อ ๗

๑.๓ การก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน Water bank สำนักการระบายน้ำมีผลการดำเนิน
โครงการ Water bank จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ Water bank	ผลการดำเนินการ (ความก้าวหน้า)	ปัญหาและอุปสรรค
๑	งานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินบริเวณ สถานีตำรวจนครบาลบางเขน (ปริมาณเก็บกัก ๑,๐๐๐ ลบ.ม.)	๑๐๐ %	-
๒	งานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินบริเวณ ปากซอยสุทธิพร ๒ (ปริมาณเก็บกัก ๑,๒๐๐ ลบ.ม.)	๕๘.๘๓%	-
๓	งานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินในที่ดิน สาธารณะบริเวณใต้สะพานทางแยก ต่างระดับถนนศรีนครินทร์กับถนน กรุงเทพกรีฑา (ปริมาณเก็บกัก ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม.)	อยู่ระหว่างขออนุมัติแผน การทำงาน และเตรียมการ เข้าพื้นที่	-
๔	งานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินบริเวณ สวนสาธารณะใต้สะพานข้ามแยก ถนนรัชดาภิเษกตัดถนนวิภาวดี (ปริมาณเก็บกัก ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม.)	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	-

๑.๔ โครงการแก้มลิง สำนักการระบายน้ำมีผลการดำเนินโครงการ จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการแก้มลิง	ผลการดำเนินการ (ความก้าวหน้า)	ปัญหาและอุปสรรค
๑	งานปรับปรุงแก้มลิงบึงรับน้ำ	๑๐๐ %	-

ลำดับ	โครงการแก้มลิง	ผลการดำเนินการ (ความก้าวหน้า)	ปัญหาและอุปสรรค
	ประชาชนเวศน์ (ปริมาณเก็บกัก ๗๓,๐๐๐ ลบ.ม.)		
๒	งานก่อสร้างแก้มลิงบึงรางเข้ (ปริมาณเก็บกัก ๒๓,๐๐๐ ลบ.ม.)	๑๐๐ %	-
๓	ผังบริเวณงานก่อสร้างแก้มลิงบึง สาธารณะลาดพร้าว ๗๑ (ปริมาณเก็บกัก ๓๘,๐๐๐ ลบ.ม.)	๒๙.๘๕ %	-
๔	ผังรายการงานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมประตุน้ำ เพื่อเป็นแก้มลิง หมู่บ้านเฟรนช์ (ปริมาณเก็บกัก ๖๔,๐๐๐ ลบ.ม.)	๑๔.๐๕ %	- มีเสาพร้อมสายไฟฟ้า และสิ่งปลูกสร้างอยู่ใน แนวเขตคลองสาธารณะ กีดขวางการก่อสร้าง
๕	งานปรับปรุงระบบระบายน้ำบึงเสื่อคำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนเพชรบุรี ถนนกำแพงเพชร๗ และถนนอโศกดิน แดงเขตราชเทวี (ปริมาณเก็บกัก ๑๗,๒๕๐ ลบ.ม.)	๑๐๐ %	- ขั้นตอนการขอมิเตอร์ ไฟฟ้าของ การไฟฟ้านครหลวง ต้องใช้ระยะเวลา จึงยังไม่สามารถ ใช้งานเครื่องสูบน้ำ ชนิดไฟฟ้าได้
๖	โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนเบญจกิติ (ปริมาณเก็บกัก ๑๓,๗๐๐ ลบ.ม.)	อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง	-

๑.๕ โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว

แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองลาดพร้าว และคลองบางซื่อตลอดแนวโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลองความยาวรวมประมาณ ๒๔.๕ กิโลเมตร ขอบเขตพื้นที่โครงการทั้งหมด ๘ เขต ได้แก่ เขตสายไหม เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตจตุจักร เขตลาดพร้าว เขตวังทองหลางและเขตห้วยขวาง พื้นที่ทั้งโครงการ ๔๕,๓๐๐ เมตร ส่งมอบพื้นที่ ๒๖,๐๐๘ เมตร ดอกเสาเข็มแล้ว ๒๓,๓๑๐ เมตร คงเหลือ ๒,๖๙๘ เมตร ความคืบหน้า ๔๔.๐๐ %

ปัญหาอุปสรรค

๑. การส่งมอบพื้นที่ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากยังมีผู้รักร้างที่ไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการ โครงการกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ ซึ่งกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเจรจาทำความเข้าใจ ควบคู่กับการใช้มาตรการด้านกฎหมาย

๒. ผู้รับจ้างทำงานล่าช้ามาก ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๒ สำนักการระบายน้ำได้นัดประชุมเร่งรัดติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวทุกสัปดาห์ โดยได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างรีบดำเนินการงานก่อสร้างในพื้นที่ที่ส่งมอบแล้ว ได้แก่ งานดอกเสาเข็มเขื่อน งานติดตั้งแผ่นกันดิน งานคานและทางเดินหลังเขื่อน งานติดตั้งราวกันตก งานชุดลอกคลอง และการจัดการน้ำเสียจากชุมชนริมคลองลาดพร้าว

รูปแบบการจัดการน้ำเสียจากชุมชนริมคลองลาดพร้าว

๑. การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียที่แหล่งกำเนิด ครอบคลุมพื้นที่ เขตสายไหม เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ (บางส่วน) เขตบางเขน (บางส่วน) อยู่ระหว่างการศึกษาคัดตั้งถังบำบัดน้ำเสียที่แหล่งกำเนิด (onsite)

๒. การก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ครอบคลุมพื้นที่ เขตลาดพร้าว เขตจตุจักร เขตหลักสี่ (บางส่วน) และเขตบางเขน (บางส่วน) อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบแนวท่อรวบรวมน้ำเสีย

๓. การก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ครอบคลุมพื้นที่ เขตห้วยขวาง และเขตวังทองหลาง อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบแนวท่อรวบรวมน้ำเสีย

๔. การก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียวังทองหลาง ครอบคลุมพื้นที่ เขตลาดพร้าว และเขตวังทองหลาง เป็นมาตรการระยะยาวที่คาดว่าจะดำเนินการ

๑.๖ โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร แบ่งการดำเนินการก่อสร้าง ๔ ช่วง คือ

ช่วงที่ ๑ (จากคลองบ้านใหม่ ถึงบริเวณหมู่บ้านแกรนด์คาแนล) ความยาวประมาณ ๕๘๑ เมตร ประมาณการค่าก่อสร้าง ๖๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๐๐ วัน (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยมีความคืบหน้า ๗๒ % ณ วันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๒)

ช่วงที่ ๒ (จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบ้านใหม่และจากหมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงถนนสรองประชา) ความยาวรวมประมาณ ๕,๐๐๐ เมตร ประมาณการค่าก่อสร้าง ๖๗๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘ เดือน (ดำเนินการปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔)


ช่วงที่ ๓ (จากถนนสรองประชาถึงถนนแจ้งวัฒนะ) ความยาวประมาณ ๑๐,๐๐๐ เมตร ประมาณการค่าก่อสร้าง ๑,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๔ เดือน (ดำเนินการปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

ช่วงที่ ๔ (จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์) ความยาวประมาณ ๑๐,๗๐๐ เมตร ประมาณการค่าก่อสร้าง ๑,๔๐๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๖ เดือน ดำเนินการปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

รวมประมาณการค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๓,๔๔๓ ล้านบาท ดำเนินการโดย บริษัท พี.วาย.เอส. คอนสตรัคชั่น จำกัด สัญญาเลขที่ สน. ๘๖/๒๕๖๒ เริ่มต้นสัญญา ๒๓ พ.ค. ๖๒ สิ้นสุดสัญญา ๘ ธ.ค. ๖๒ ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๐๐ วัน วงเงินค่าก่อสร้าง ๖๑,๖๙๐,๐๐๐.-บาท ผลงานที่ได้ ๗๒ %

๑.๗ โครงการจิตอาสา สำนักการระบายน้ำมีคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน ๒๑๓ คลอง ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลอง “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามแผนการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๒ จำนวน ๑๕๗ คลอง คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมด จำนวน ๒๑๓ คลอง ภายในสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

๒. การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักการระบายน้ำมีการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

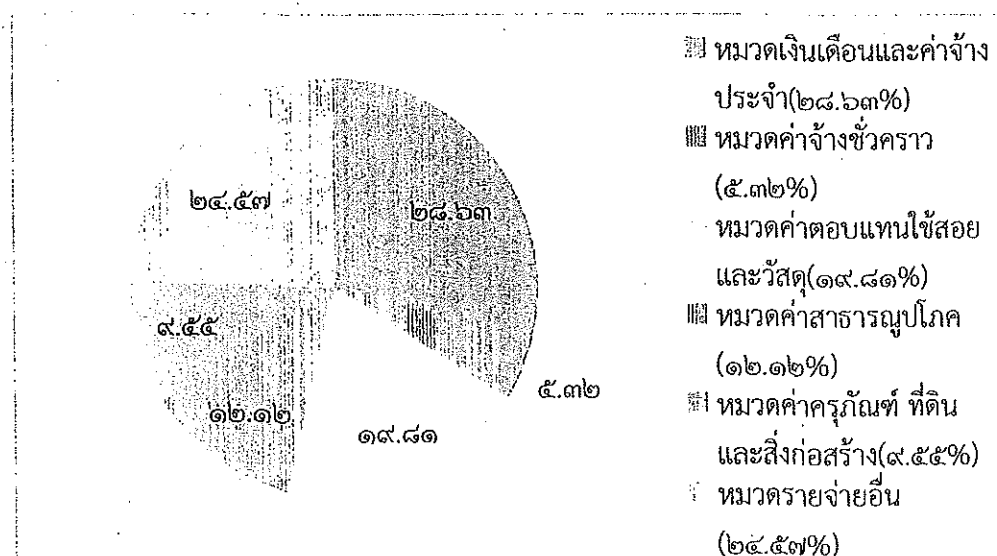

ในการตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักการระบายน้ำพบว่า
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีโครงการที่ยังไม่สามารถก่อหนี้ จำนวน ๑๙ โครงการ รายละเอียด
ปรากฏดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	การแก้ไข
๑	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ และประตูระบายน้ำ คลองหลุมไผ่ ตอนคลองลาดพร้าว	๑๐,๕๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างรอลงนาม ในสัญญา	-	-
๒	โครงการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ หน้า สน.หัวหมาก	๔,๘๐๐,๐๐๐	๑. รอ สม. อนุมัติ เงินประจำงวด (หนังสือ กท ๑๘๐๓/๐๐๑๕๔ ลว. ๔ ก.ย. ๖๒) ๒. ส่งนิติการ ตรวจร่างสัญญา ลว. ๑๓ ก.ย. ๖๒ ๓. ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว (บริษัท เรืองฤทธิ์ จำกัด) คาดว่า ลงนามสัญญาได้ ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๒	-	
๓	โครงการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ คลองห้วยขวาง	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑. อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเงิน ขออนุมัติเงิน ประจำงวด ๒. ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว (บริษัท ปาล์มคอน จำกัด) คาดว่า ลงนามสัญญาได้ ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๒	-	
๔	โครงการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ คลองบางนางจัน	๔,๕๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง การชี้แจงขอยกเลิก การดำเนินการ E-bidding ครั้งที่ ๒	ดำเนินการ E-bidding ๒ ครั้ง - ครั้งที่ ๑ ยกเลิก (มีผู้ยื่นเอกสาร ๑ ราย) - ครั้งที่ ๒ อยู่ระหว่าง ขออนุมัติยกเลิก	ยกเลิกและ ดำเนินการ E-bidding ใหม่

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	การแก้ไข
				เนื่องจากผู้เสนอราคา ยื่นราคาสูงกว่า ราคากลาง และ ได้ต่อรองราคาแล้ว ผู้เสนอราคายืนยัน ราคาเดิม	
๕	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบ้านหลายจากเขื่อนเดิม บริเวณคลองขวางล่าง ถึงเขื่อนเดิมบริเวณ ซอยวิจิตรธรรมสาธิต ๕๕ (ครั้งที่ ๒)	๑๑,๒๘๖,๐๐๐	เผยแพร่ประกาศ ๑๑ ก.ย. ๖๒ - ๑๐ ต.ค. ๖๒	ไม่มีผู้เสนอราคา	ยกเลิกและ ดำเนินการ E-bidding ใหม่
๖	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ลำรางสาธารณะ ๑๗ จาก ถนนลาดพร้าวถึงคลองตาหนิง (ครั้งที่ ๒)	๑๐,๕๕๐,๐๐๐	เผยแพร่ประกาศ ๓๐ ส.ค. ๖๒ - ๒๗ ก.ย. ๖๒	มีผู้เสนอราคา รายเดียว	ยกเลิกและ ดำเนินการ E-bidding ใหม่
๗	โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองน้ำแก้วจากคลองพญาเว็ก ถึงคลองลาดพร้าว	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างพิจารณา ผลและหารือ กับกรมบัญชีกลาง เนื่องจากผู้ยื่น ข้อเสนอยื่นหลักฐาน บัญชีแสดงรายการ ก่อสร้างหรือ ใบแจ้งปริมาณและ ราคาไม่ถูกต้อง	-	-
๘	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ำคลองมหาศร จากบริเวณคลองบางไพร ถึงบริเวณคลองภาษีเจริญ	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ขออนุมัติจ้าง บจก. กรุงเทพฯ สถาปัตย์	-	-
๙	โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ และออกแบบรายละเอียด ระบบรวบรวมน้ำเสียและ ระบบบำบัดน้ำเสียมันบุรี ระยะที่ ๒	๔,๓๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างประกาศ เชิญชวนทั่วไป ระหว่างวันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๒ - ๒๙ ต.ค. ๖๒	คกก. วินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง มีหนังสือ เรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและ	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	การแก้ไข
				แนวทางการป้องกัน การทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้าง และ ตัดคุณสมบัติ ของผู้ยื่นข้อเสนอ ตามที่ คกก. ป.ป.ช. กำหนดออกจากแบบ ประกาศและเอกสาร เชิญชวน ทำให้ คกก. พิจารณาร่างขอบเขต ของงาน (TOR) ปรับปรุงและทบทวน TOR ให้เป็นไปตาม หนังสือดังกล่าวทำให้ ระยะเวลาดำเนินการ ยืดเยื้อออกไป	
๑๐	โครงการจัดหาทดแทน เครื่องจักรและอุปกรณ์ โรงควบคุมคุณภาพน้ำ ช่องนนทรี	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำ ราคากลาง	มีการทักท้วง รายละเอียดขอบเขต ของงานบางประเด็น จึงแจ้งนัด คกก. ประชุมเพื่อพิจารณา ขอบเขตงานอีกครั้ง เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๒	
๑๑	โครงการปรับปรุงแก้มลิง บึงพิบูลย์วัฒนา	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างเห็นชอบ ดำเนินการ E-bidding ครั้งที่ ๒		
๑๒	โครงการปรับปรุงแนวป้องกัน น้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่วงคลองบางเขนเก่า ถึงคลองบางเขนใหม่	๖๓,๐๖๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างเห็นชอบ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการปรับปรุงแนวป้องกัน น้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองบางลำพู ชุมชนวัดสังเวช	๓๗,๑๗๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง บริษัท เดชากร เอ็นจิเนียริง จำกัด ผลงาน ๑๙ %		

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	การแก้ไข
๑๔	โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองกะจะ	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง		
๑๕	โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนบางขุนเทียนจากถนนพระรามที่ ๒ ถึงบริเวณคลองสะแกงาม	๑๙,๕๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างการศึกษา ร่างขอบเขตงาน		
๑๖	โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนเอกชัยตอนลงคลองราชมนตรี	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างการศึกษา ร่างขอบเขตงาน		
๑๗	โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนงามวงศ์วาน (ฝั่งขาออก) ตอนคลองประปา	๑๔,๕๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง		
๑๘	โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำคลองขุนจันทร์ด้านถนนบรมราชชนนี (ฝั่งขาออก)	๒๔,๕๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง	การรื้อย้ายเครื่องสูบน้ำเดิมและรังวัดแนวคลองสาธารณะ	
๑๙	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนรามคำแหง (ฝั่งขาออก) ช่วงจากทางรถไฟถึงคลองกะจะ	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างก่อสร้างบ่อพักและวางท่อระบายน้ำ ผลงาน ๑๕ %	มีแนวท่อประปาขนาด ๖๐๐ มม. และท่อร้อยสายไฟฟ้ากีดขวางแนววางท่อระบายน้ำ	

๓. มาตรการแก้ไขอุปสรรคการระบายน้ำ

๓.๑ สิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำคูคลอง สำนักการระบายน้ำมีการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำคูคลอง คือ สํารวจตรวจสอบสิ่งรุกล้ำ ประชาสัมพันธ์ และแจ้งสำนักงานเขตในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๓.๒ การทิ้งขยะมูลฝอยในคูคลอง ปัญหาอุปสรรคที่พบมากคือ สภาพคลองมีบ้านเรือนประชาชนและสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำ มีการทิ้งขยะ และมีขยะบางส่วน เข้าไปติดอยู่ใต้บ้านเรือนประชาชน ทำให้ยากต่อการจัดเก็บ สำนักการระบายน้ำโดยกองระบบคลองมีการร่วมรณรงค์ชุมชนริมคลอง ช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะลงคลอง จำนวน ๔ ครั้ง (คลองเปรมประชากร, คลองลาดพร้าว, คลองหนองบอนและคลองภาษีเจริญ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๓.๓ ผักตบชวา ปริมาณผักตบชวาที่กำจัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒๔,๙๔๑ ตัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓๗,๗๕๖ ตัน

มาตรการดำเนินการป้องกันและเก็บกำจัดผักตบชวา มีการดำเนินการ ๒ มาตรการ คือ

๑. มาตรการระยะสั้น

- ติดตั้งจุดสกัดผักตบชวาเป็นระยะๆ เพื่อเก็บผักตบชวาชั้นฝั่ง

- การเก็บและกำจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง ตลอดลำน้ำทั้งสาย รวมถึงคลอง
ที่เชื่อมต่อกัน

- การขุดลอกคู คลองและร่องน้ำที่ตื้นเขิน ช่วยกำจัดรากของผักตบชวา
- การประชาสัมพันธ์ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ช่วยกันกำจัดขยะผักตบชวา
วัชพืชในคูคลอง และแหล่งน้ำสาธารณะ

๒. มาตรการระยะยาว

- จัดสร้างอาคารบังคับน้ำ เช่น ประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
ของวัชพืช ผักตบชวาเข้าหรือออกจากพื้นที่ควบคุมผักตบชวา

- การสร้างตะแกรงเก็บขยะอัตโนมัติ พร้อมสายพานลำเลียงขยะ และหรือ
เครื่องบีบอัดขยะบริเวณหน้าสถานีสูบน้ำ หรือคลองที่มีผักตบชวาหนาแน่น มีเส้นทางให้รถบรรทุกสัญจรเข้าออก
ได้สะดวกเพื่อลำเลียงผักตบชวาไปจัดเก็บนำไปทิ้งทำลายอย่างถูกวิธี

๔. การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการควบคุมคุณภาพน้ำ ๘ แห่ง ๒๖,๕๗๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๖๑ จำนวน ๘,๓๗๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ความจำเป็นที่ต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย กรุงเทพมหานครต้องใช้จ่าย
งบประมาณจำนวนมากในการเดินระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง หากกรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียได้จะได้นำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย และขยายพื้นที่บริการบำบัด
น้ำเสีย โดยประมาณการรายรับจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ๖๐๐ ล้านบาท/ปี ใช้หลักการ
ผู้ก่อมลภาวะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำบัดมลภาวะนั้น เป็นการสร้างและปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับคือ น้ำเสียจากบ้านเรือน ชุมชน และสถานประกอบการ
ในพื้นที่บริการได้รับการบำบัดให้ได้ตามมาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ประชาชนในพื้นที่บริการ
บำบัดน้ำเสียได้อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งผลดีต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัด
น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๔๗

๑. สภากรุงเทพมหานครได้ลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ ในคราวประชุม
สภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๒

๒. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในข้อบัญญัติฯ เมื่อวันที่ ๔ ก.ค. ๖๒

๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบข้อบัญญัติฯ เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค. ๖๒ ขณะนี้
อยู่ในระหว่างส่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อบังคับใช้ต่อไป

สาระสำคัญของร่างข้อบัญญัติฯ

๑. จัดเก็บค่าธรรมเนียมในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมน้ำ ๘ แห่ง ครอบคลุม
พื้นที่ ๒๑ เขตการปกครอง

๒. คิดปริมาณน้ำเสียที่ร้อยละ ๘๐ ของปริมาณการใช้น้ำ

๓. ประเภทของแหล่งกำเนิดน้ำเสียและอัตราค่าธรรมเนียม แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้

ลำดับ	รายละเอียดชื่อประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสีย	อัตราค่าธรรมเนียม
๑	แหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทที่ ๑ (ก) บ้านเรือนที่พักอาศัยรวมถึงอาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อาศัยได้	๒ บาท/ลูกบาศก์เมตร

ลำดับ	รายละเอียดชื่อประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสีย	อัตราค่าธรรมเนียม
	ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว (ข) อาคารประเภทอาคารชุด คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนต์ หอพัก รวมทั้งอาคารที่อยู่อาศัยรวม	
๒	แหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทที่ ๒ (ก) หน่วยงานของรัฐ หรืออาคารที่ทำการของเอกชนหรือองค์กรระหว่างประเทศ (ข) มุลินี ศาสนสถาน สถานสาธารณกุศล (ค) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ง) โรงเรียนหรือสถานศึกษา (จ) สถานประกอบการ ที่มีการใช้น้ำเฉลี่ยย้อนหลัง ๑ ปีก่อนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน หากกรณีที่ประกอบการไม่ถึง ๑ ปี ให้ใช้ค่าเฉลี่ยตามระยะเวลาที่ประกอบการ (ฉ) สถานที่ที่ใช้ประโยชน์ในลักษณะคล้ายคลึงกันกับ (ก) ถึง (ง)	๔ บาท/ลูกบาศก์เมตร
๓	แหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทที่ ๓ (ก) โรงแรม (ข) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (ค) สถานประกอบการ ที่มีการใช้น้ำเฉลี่ยย้อนหลัง ๑ ปีก่อนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียเกินกว่า ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน หากกรณีที่ประกอบการไม่ถึง ๑ ปี ให้ใช้ค่าเฉลี่ยตามระยะเวลาที่ประกอบการ (ง) สถานที่ที่ใช้ประโยชน์ในลักษณะคล้ายคลึงกันกับ (ก) และ (ข)	๘ บาท/ลูกบาศก์เมตร

แนวทางการดำเนินงานต่อไป

๑. จัดทำร่างระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง

๒. จัดทำระบบการจัดเก็บ ระบบบริหาร และการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับ

๓. ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (คาดว่าจะเริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียในเดือนกันยายน ๒๕๖๓)

๕. สถิติเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหา สำนักการระบายน้ำมีสถิติเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหา (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒) จำนวน ๑,๔๓๓ เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น ๑,๓๖๑ เรื่อง คิดเป็น ๙๔.๙๘ % อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗๒ เรื่อง คิดเป็น ๕.๐๒ %

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินงานของสำนักการระบายน้ำ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและกรุงเทพมหานครในส่วนที่มีปัญหาการดำเนินงานจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้วยระบบ Pipe Jacking มีผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานมาก เนื่องจากติดปัญหาเรื่องระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ได้ดิน เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ กีดขวางการก่อสร้างทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน สำนักการระบายน้ำควรประสานขอแบบ asbuilt กับหน่วยงานสาธารณูปโภคมาใช้ประกอบในขั้นตอนการออกแบบโครงการ

๒. งบประมาณที่ยังมิได้ก่อหนี้มีจำนวนหลายรายการ สาเหตุเกิดจากปัญหาการกำหนดขอบเขตงาน ราคากลาง ทำให้ต้องแก้ไขหรือไม่มีผู้สนใจยื่นเสนอราคา ทำให้การก่อหนี้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สำนักการระบายน้ำควรพิจารณาตรวจสอบสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางการดำเนินการเพื่อให้สามารถก่อหนี้ในทุกโครงการได้ตามแผน

๓. มาตรการแก้ไขอุปสรรคการระบายน้ำ ประเด็นสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำคูคลอง การทิ้งขยะมูลฝอยในคูคลอง และผักตบชวา นั้น สำนักการระบายน้ำแล้ว แต่เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควรมีมาตรการในเชิงป้องกันอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อมิให้มีสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำคูคลอง การทิ้งขยะมูลฝอยในคูคลอง และผักตบชวาเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ สำนักการระบายน้ำควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต ในการจัดทำแผน หรือมาตรการในการดูแลคูคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ดี ตลอดจนสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในคูคลอง

๔. สำนักการระบายน้ำต้องเตรียมการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย เมื่อข้อบัญญัติฯ มีการประกาศใช้เพื่อให้สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ตามแผนภายในกันยายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ

- ให้ สนบ. พิจารณาดำเนินการในข้อ ๑ - ๔ ตามที่ ผอ. กทม. เสนอ
- สำเนาเรียนร.ป.กทผ. (ส่งราชการ สนบ.) เพื่อทราบ

(นายศรชัย โตวานิชกุล)
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
หัวหน้าเขตสาย ๑
สำนักงานเขตสาย ๑

(นายพิษณุ นาควัชร)

รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร
๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๒

12862

(นายรัชชัย อรรถนิตย์)

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

เรียน ผอ. กทม.

เพื่อโปรดทราบ

(นายพิษณุ นาควัชร)

รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร
๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๒

ทราบ

(นายศักดิ์ชัย บุญมา)

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๒
