



เรียน.....
☐ ท.กป. ☐ ท.พ.บ. ☐ ท.พ.บ. ☐ จ.การ
☐ เพื่อทราบ
☐ เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
☐ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
☐ อื่นๆ

(ผดพ.กปบ.ส.บ.๓)
เลขที่รับ 269
วันที่รับ 26 ก.พ. 2563
OMS.No. 3677066704
รหัสอุปกรณ์ KON06R-01

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

(นายณรงคชัย สุนิมิตพงศ์)

จาก พชง.ผก.กค.๓.3

ผจก.กฟส.อ.สส.

ถึง ผจก.กฟส.เสิงสาง

เลขที่

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงเพื่อก่อสร้าง - ปรับปรุงระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.สส. ผ่าน ท.กป.สส.

๒๖ ก.พ. ๖๓

ตามที่ ผก.กค.๓.3 ได้มอบหมายให้ นายฉัตรชนะ กางทาสี ตำแหน่ง พชง.ผก.กค.๓.3 เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง / ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง (ชั่วคราว) รองรับการก่อสร้างสายส่ง 115 เค.วี. ช่วง สฟ.ครบุรี - สฟ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

เนื่องจาก การดำเนินการดังกล่าว จำเป็นต้องดับไฟฟ้าแรงสูงในการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัย ตั้งแต่บริเวณ

- (จุดที่3) 2DDE ไร่พวงศิริ - (จุดที่4) 2DDE เลี้ยวทางโค้งท่าไกรเงินก่อนถึง หจก.ยงสวัสดิ์เคหะภัณฑ์ (ตามแผนผัง)

โดยมีปริมาณงานที่จะดำเนินการดังนี้

1. ผู้รับจ้างปักเสา 22.00 เมตร จำนวน 70 ต้น
2. ติดตั้งอุปกรณ์รับสายชั่วคราว

ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. เวลาที่ขออนุมัติในครั้งนี้ ไม่นับเวลา

ที่จะดำเนินการ Switching ถ่ายเทโหลดก่อนและหลังการดับไฟปฏิบัติงาน ทั้งนี้ หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดเวลา

จะแจ้ง ให้ ผ.บ.บ. / ท.กป. และ ศจพ. กฟอ. 3 ทราบ เพื่อดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการขออนุมัติต่อไป


เรียน ผจก.กฟส.สส.
ผกป. สส. พิจารณาขออนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงานแล้ว เห็นควรอนุมัติให้ดับไฟได้ตามเสนอ ทั้งนี้มีผู้ใช้ไฟที่ติดตั้ง หม้อแปลงรวม ตั้งแต่ 300 KVA. ขึ้นไปได้รับผลกระทบ จำนวน ราย พร้อมนี้ได้แนบแผนผังแสดงพื้นที่ดับไฟมาด้วยแล้ว
(ลงชื่อ) ๒๖ ก.พ. ๖๓
(นายเดชา กลัดสำเนียง)
ท.กป.สส.
ที่ ๓.๓ สส.(ทป.) ๕๔๑/๒๕๖๓
เรียน อ.ป.บ.๓ (ผดพ.กปบ.๓.๓)
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(ลงชื่อ)
(นายณรงคชัย สุนิมิตพงศ์)
ผจก.กฟส.สส.

(ลงชื่อ)
(นายฉัตรชนะ กางทาสี)
ผู้ควบคุมงาน โทร 093-3324057
เรียน อ.ก.บ.๓.3
ผคพ. พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติให้ดับไฟ ได้ตามเสนอ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว
(ลงชื่อ)
(นายนิรันดร์ นนวงเงินต์)
ขม.คพ. ปฏิบัติงานแทน ท.คพ.๓.3
ที่ ๓.3 ปบ.(ปบ.)-คพ. 5๕212563 2.7 ก.พ. 2563
เรียน ผจก.กฟส.สส.(ผกป.) , ผจก.กฟส.คบ.(ผกป.)
อนุมัติ - และให้ควบคุมการปฏิบัติงานให้สามารถจ่าย กระแสไฟฟ้าตามเวลาที่กำหนดด้วย
(ลงชื่อ)
(นายสุทธิกาญจน์ วีระเสถียร)

บันทึกการดับไฟปฏิบัติงาน เริ่มดับไฟ เวลา..... น. (นาย.....)	อ.ก.บ.๓.3	ผู้แจ้ง
แจ้งงานแล้วเสร็จ เวลา..... น. (นาย.....)		ผู้แจ้ง
จ่ายไฟคืนได้ เวลา..... น. (นาย.....)		ผู้แจ้ง

* * Up Date แอปพลิเคชันในเครื่อง FTP:172.22.4.20 > 0.กปบ.๓.3 > 0.ผคพ. > 00 any form

แผนผังตัวไฟปฏิบัติงานวันที่ 4 มีนาคม 2563

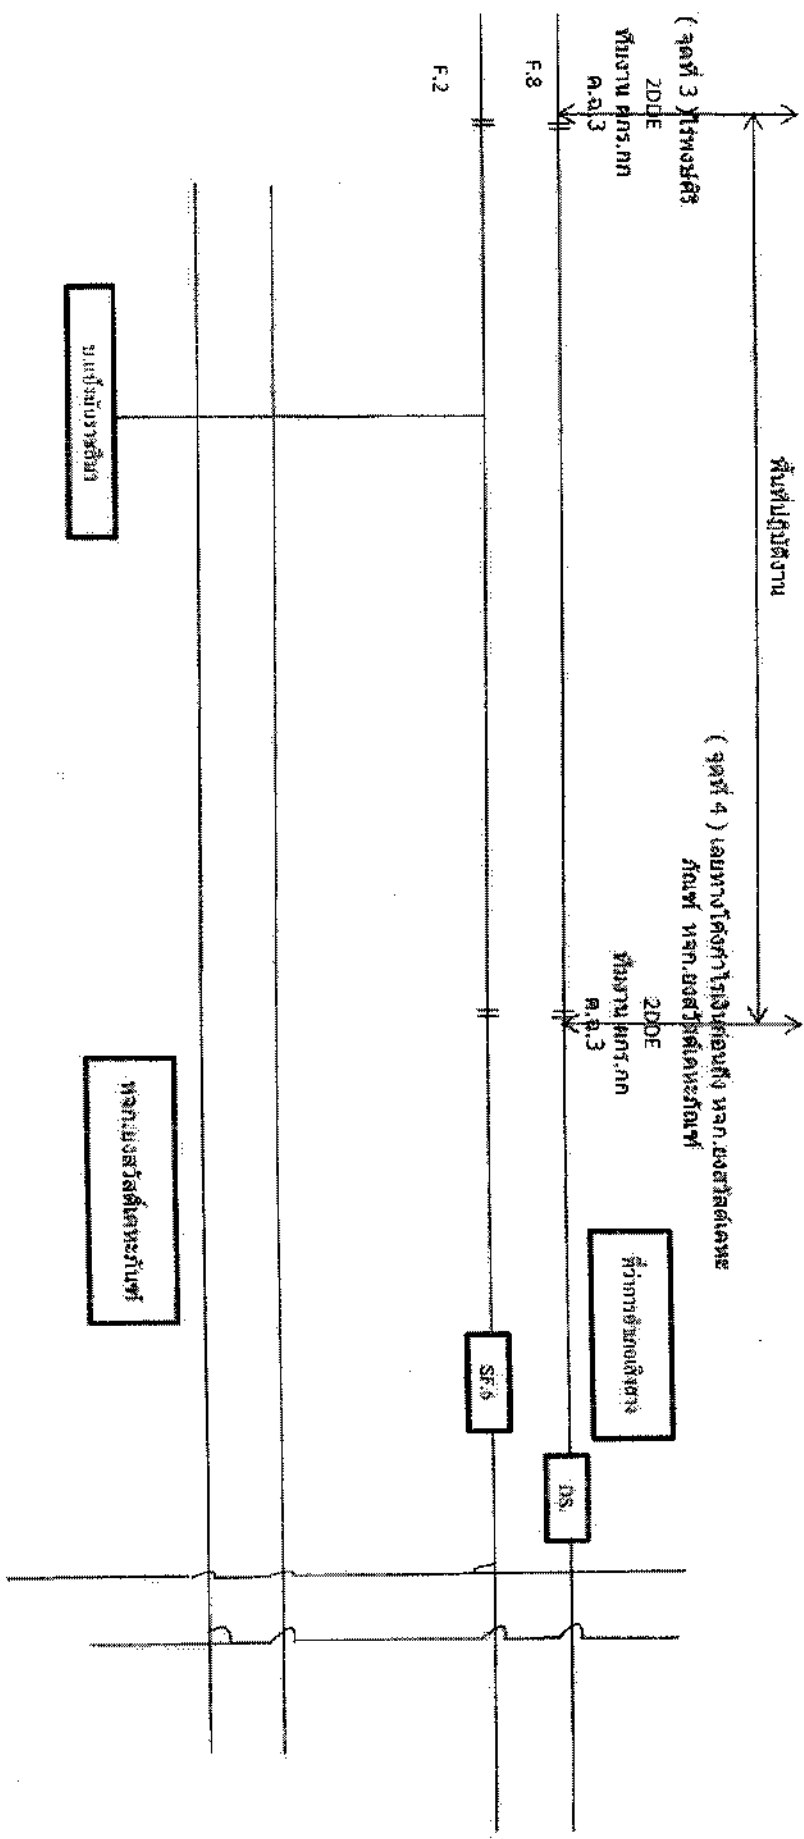

แผนผังการปฏิบัติงานวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
 เวลาต้นไฟ เวลาต้นไฟตั้งแต่ 08.00 น. - 17.00 น.
 ปริมาณงาน ปริมาณงานปกติขนาด 22.00 เมตร จำนวน 73 ต้น

แบบฟอร์มกำหนดขั้นตอนการดับไฟ (Switching Order)

เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายตามอนุมัติที่ ฉ.3 กปบ.(คฟ).....ลว.-..4 มี.ค.2563.....

ที่	การทำงานของอุปกรณ์	รหัสอุปกรณ์	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน					
1	สับ	KON 08S-09		กฟส.สง.	
2	ปลด	KON 08R-01+SW.L		กฟส.สง.	
3	ปลด	KON 08VB-01		ศจฟ.	
4	ปลด	KON 02VS-901		กฟส.สง.	
5	ปลด	KON 08VS-101		กฟอ.คบ.	
6	ปลด	KON 02S-T01		กฟอ.คบ.	
7	ตัดเบรก	DDE จุด A		ก่อสร้าง	
8	ตัดเบรก	DDE จุด B		ก่อสร้าง	
9	สับ	KON 02S-07		ศจฟ.	
10	สับ	KON 02S-T01		กฟอ.คบ.	
หลังปฏิบัติงานแล้วเสร็จ					
11	ปลด	KON 02S-T01		กฟอ.คบ.	
12	ปลด	KON 02S-07		ศจฟ.	
13	เชื่อมเบรก	DDE จุด B		ก่อสร้าง	
14	เชื่อมเบรก	DDE จุด A		ก่อสร้าง	
15	สับ	KON 02S-T01		กฟอ.คบ.	
16	สับ	KON 08VS-101		กฟอ.คบ.	
17	สับ	KON 02VS-901		กฟส.สง.	
18	สับ	KON 08VB-01		ศจฟ.	
19	สับ	KON 08R-01+SW.L		กฟส.สง.	
20	ปลด	KON 08S-09		กฟส.สง.	

หมายเหตุ 1.ก่อนดำเนินการสวิตซ์ซิง สับ-ปลด

อุปกรณ์ ให้จัดอุปกรณ์ป้องกันอัตโนมัติ

ให้ทำงานเพียงครั้งเดียว

2.ข้อควรระวังก่อนขึ้นปฏิบัติงาน

งานทุกครั้ง

(ลงชื่อ).....ผู้ออกสวิตซ์ซิง

(นายภูษาดิ พรหมเงิน)

ตำแหน่ง พชง.6

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบสวิตซ์ซิง

(นายณรงค์วิทย์ สุขเพ็ง)

ตำแหน่ง พชง.5

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติสวิตซ์ซิง

(นายนิรันดร์ แนวเงินดี)

ชน.คฟ ปฏิบัติงานแทน หย.คฟ.ฉ.3
