



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.คฟ. ถึง กบป.ฉ.3
เลขที่ ฉ.3 กบป.(คฟ.) / 2563 วันที่
เรื่อง ขออนุมัติดับไฟเพื่อพาดสายส่ง 115 เควี โลว์สฟ.ครบุรี – สฟ.เสิงสาง

เรียน อก.ปบ.ฉ.3

กบป.ฉ.3(ผ.คฟ.) ขออนุมัติดับไฟและส่งแผนสวิตช์ซึ่งเพื่อให้ กกค.ฉ.3 ร่วมกับ ผู้รับจ้าง ดำเนินพาดสายส่ง 115 เควี โลว์สฟ.ครบุรี – สฟ.เสิงสาง ช่วงหน้า สฟ.ครบุรี ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:00 – 17:00 น.

จากการดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในครั้งนี้ ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ได้แนบขั้นตอน สวิตช์ซึ่งดับไฟถ่ายเทโหลด มาพร้อมบันทึกฉบับนี้แล้วจำนวน 1 ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายนิรันดร์ นวนเงินดี)

ชม.คฟ. ปฏิบัติงานแทน ผ.คฟ.ฉ.3

ที่ ฉ.3 กบป.(คฟ.) 30330/2563 27 พ.ค. 2563

เรียน อก.ปบ.ฉ.3(ผ.คฟ.ผ.จฟ.1), ผจก.กฟส.คบ., ผจก.กฟส.สสง.

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุทธกัญจน์ วีระเสถียร)
อก.ปบ.ฉ.3



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.คบ.

ถึง กฟฉ.3

เลขที่ ฉ.3กฟส.อ.คบ.(กป.)30046/2563

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

เรื่อง อนุมัติดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงเพื่อปฏิบัติงาน

เรียน อก.ปป.ฉ.3 (ผคฟ.กปบ.ฉ.3)

ตามที่ ผกร.กกค.ฉ.3 ได้มอบหมายให้ นายฉัตรชนะ กางทาสี ตำแหน่ง พชง. 3 ผกร.กกค.ฉ.3 เป็นผู้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ชั่วคราว เพื่อรองรับการก่อสร้างระบบสายส่ง 115 เควี จากสถานีไฟฟ้าครบุรี – สถานีไฟฟ้าเสิงสาง นั้น

เนื่องจาก การดำเนินการดังกล่าว จำเป็นต้องดับไฟระบบจำหน่ายแรงสูง และ ระบบสายส่ง 115 เควี เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (ตามแผนผัง)

แผนดับไฟ

1.ดับไฟระบบจำหน่าย 22 เควี จาก Riser pole บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าครบุรี ถึง จุดตัดเบรกบริเวณหน้าบริษัทพีเค เอทานอลครบุรี จำกัด ฟีดเดอร์ 5 , 9

2.ดับไฟระบบสายส่ง 115 เควี จากสถานีไฟฟ้าหนองกี่ ถึง สถานีไฟฟ้าครบุรี
ปริมาณงานที่จะดำเนินการ

1.ผู้รับจ้างพาดสายขนาด 400 sq.mm. ข้ามถนนเข้า สถานีไฟฟ้าครบุรี

2.ติดตั้งอุปกรณ์รับสายชั่วคราว ระบบจำหน่าย 22 เควี

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.

เวลาที่ขออนุมัติในครั้งนี้ ไม่นับเวลาที่ดำเนินการ Switching ถ่ายเทโหลดก่อนและหลังการดับไฟปฏิบัติงาน ทั้งนี้ หากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดเวลาจะแจ้งให้

ผกป. และ ศจฟ.กฟฉ.3 ทราบ เพื่อดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการขออนุมัติต่อไป

(นายสุรชาติ พร้อมจะบก)

ผจก.กฟส.อ.คบ.

แบบฟอร์มกำหนดขั้นตอนการดับไฟ (Switching Order)

เพื่อปฏิบัติงานพาดสายส่ง 115 เควี โลว์สฟ.ครบุรี - สฟ.เลิงสาข วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

KYT ☐ ดำเนินการแล้ว

PPE ☐ ดำเนินการแล้ว


ขั้นตอนที่	รายละเอียดการปฏิบัติงาน	รหัสอุปกรณ์	เวลา	หน่วยงานปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
	ขั้นตอนก่อนปฏิบัติงาน ระบบสายส่ง 115 เควี				
1	ปลด	KON01YB-01		ศจพ.ฉ.3	
2	ปลด	KON01YS-01,02		ศจพ.ฉ.3	
3	ปลด	NOK02YS-01,02		ศจพ.ฉ.3	
4	ซื้อดการรวด์	ระบบสายส่ง		ผู้รับจ้าง	
	หลังปฏิบัติงานแล้วเสร็จ				
5	ปลดซื้อดการรวด์	ระบบสายส่ง		ผู้รับจ้าง	
6	สับ	NOK02YS-01,02		ศจพ.ฉ.3	
7	สับ	KON01YS-01,02		ศจพ.ฉ.3	
8	สับ	KON01YB-01		ศจพ.ฉ.3	

หมายเหตุ

- ก่อนดำเนินการสับปลดอุปกรณ์ ให้ตั้งการทำงานของอุปกรณ์ทำงานเพียงครั้งเดียว
- ตรวจสอบแรงดันก่อนขึ้นปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้ออกสวิตชิง นายอดิศักดิ์ ย่อมกระโทก พชง. ผคพ.กปป.ฉ.3

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบสวิตชิง นายอดิเรก บำรุงศิลป์ วศก.7 ผคพ.กปป.ฉ.3

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติสวิตชิง (นายนิรันดร์ แนวเงินดี)
ชผ.คพ. ปฏิบัติงานแทน ผผ.คพ.ฉ.3

เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้าง / ปรับปรุงระบบจำหน่าย

หมายเหตุ :

สิบสอง

ผู้ออกสวิตช์ชิง

1. ก่อนการทำการ ปลด / สับ
อุปกรณ์ให้ตั้งการทำงานของอุปกรณ์
ป้องกันอัตโนมัติทำงานบิตกลับเพียง
ครั้งเดียว

(.....นายธนกร คงอ่ำ.....)

ตำแหน่ง....พชง.ผคฟ.กบป.ฉ.3

สิ่งชื่อ

ผู้ตรวจสวิตช์ชิง

2. ตรวจสอบแรงดันและข้อตกราวด์
ก่อนขึ้นปฏิบัติงาน บนที่สูง

(.....นายกั๊กชาติ พรหมเงิน.....)

ตำแหน่ง....พชง.ผคฟ.กบป.จ.3

สิ่งข้อ


ผู้อนุมัติสวิตช์ซึ่ง

3. ติดต่อศูนย์ฯ กพล.3 ก่อน
ดำเนินการทำสวิตซ์ชิงทุกครั้ง

(.....)

(นายนิรันดร์ แนวเงินดี)

ตำแหน่ง.....ผศ.ดร.กมล.กบ.บ.๓ **ขณ.คพ. ปฏิบัติงานแทน พล.คพ.ร**



NR001


Single phase TR for Load Break



เพิ่มตัว CC102



7.36 km.)



CO08YS-801

CO08YS-802



TR:25 MVA

TR:25 MVA

หม้อแปลง 1 ม.บ. 60

anecar@gmail.com

บริษัท อเนก (ประเทศไทย) จำกัด
Fax: 044-202881
โทร: 044-202333

4 (สถานีไฟฟ้า)
โทร: 085-4959351
โทร: 084-4174339
โทร: 088-5812286

Gen ในภายใน
บริษัท อเนก (ประเทศไทย) จำกัด
โทร: 082-480348 Email: somkrapk@gmail.com


1h.00m KON-WCK(55:44.00 km.) เป็น Reclose Zone2

Underground

KON

จุดพาดสาย 115 เควี


เล็งสาย

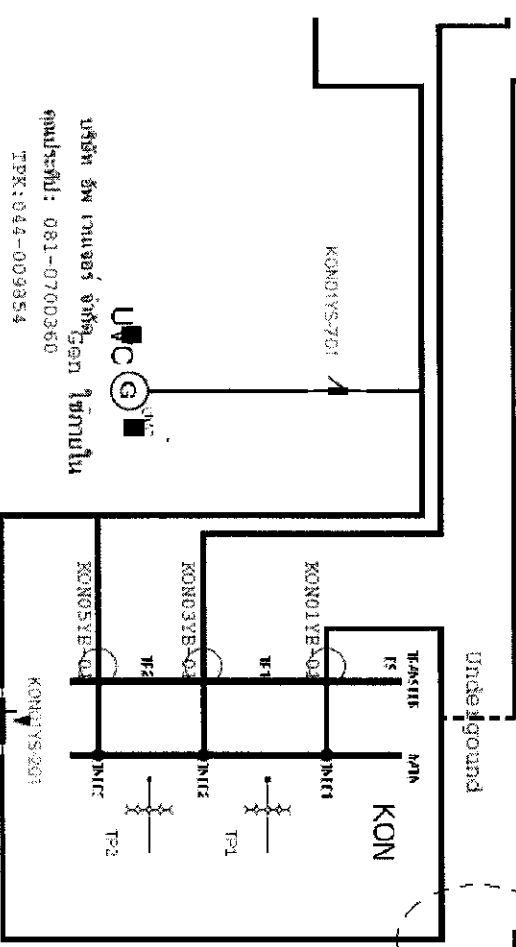

บริษัท อเนก (ประเทศไทย) จำกัด
โทร: 081-0700360
TPK: 044-009354


Email: privateep.1@pkethanal.com

การส่งจ่ายไฟฟ้าจาก KON01YE-01 หรือ NOK02YE-01 ต้องขอรับใบแจ้งไฟฟ้า



MRB01Y

Single phase TR for Load Break
 7.36 km.)
 MTR
 คอนดักเตอร์
 คอนดักเตอร์
 TRANSIT
 NOK04YB-01
 TP2
 TP1
 NOK02YB-01

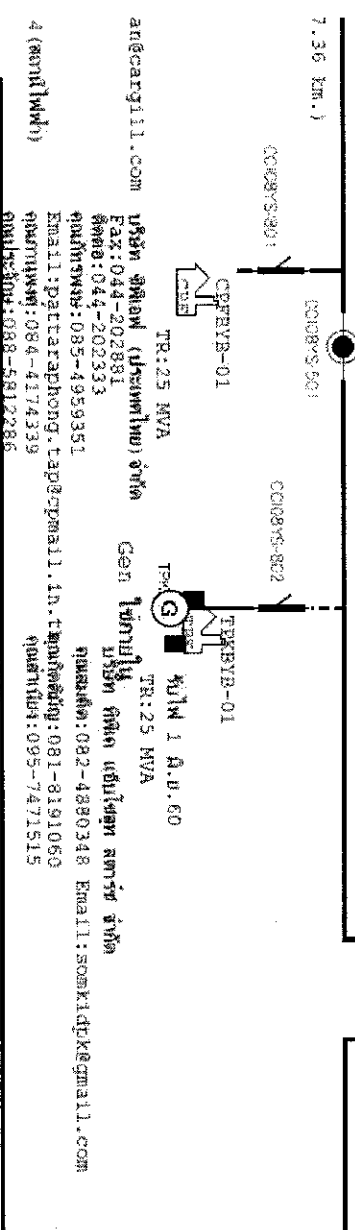


anecargill.com บริษัท อีทีแอล (ประเทศไทย) จำกัด
 Fax: 044-202881
 โทร: 044-202833
 อีเมล: paltacphong.lap@cpmail.in.th
 โทร: 088-5812286
 โทร: 082-4880348 Email: somkidphk@gmail.com
 โทร: 095-7471515

KON-NOK(5:44.00 km.) เปิด Reclose Zone2

เล็งสาย


สภาพการจ่ายพลังงานแล้วเสร็จ

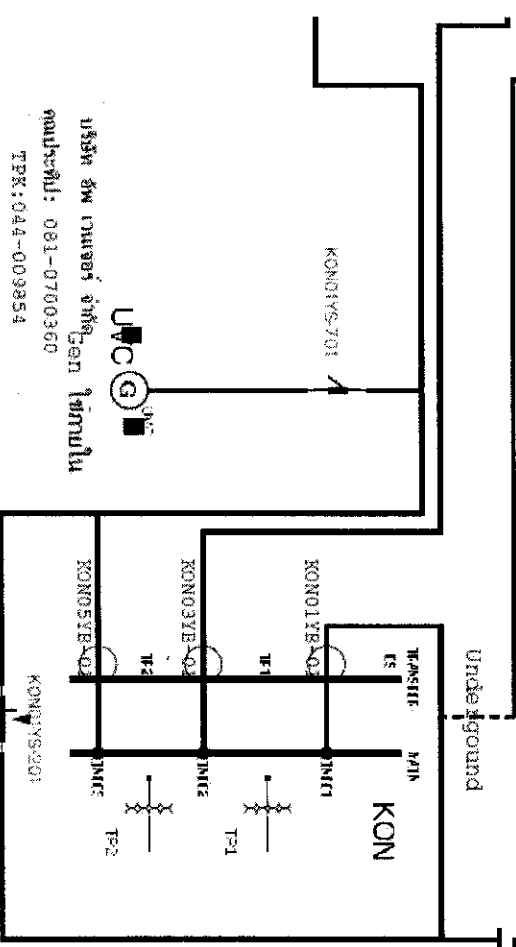

บริษัท อีทีแอล (ประเทศไทย) จำกัด
 โทร: 081-0760360
 โทร: 044-009854

Email: privatep.j@pkethanal.com
 การจ่ายไฟจาก KONO1YB-01 หรือ NOK02YB-01 ต้องขอต้นไฟ

แผนเดินไฟวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
 เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
 บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าครบุรี

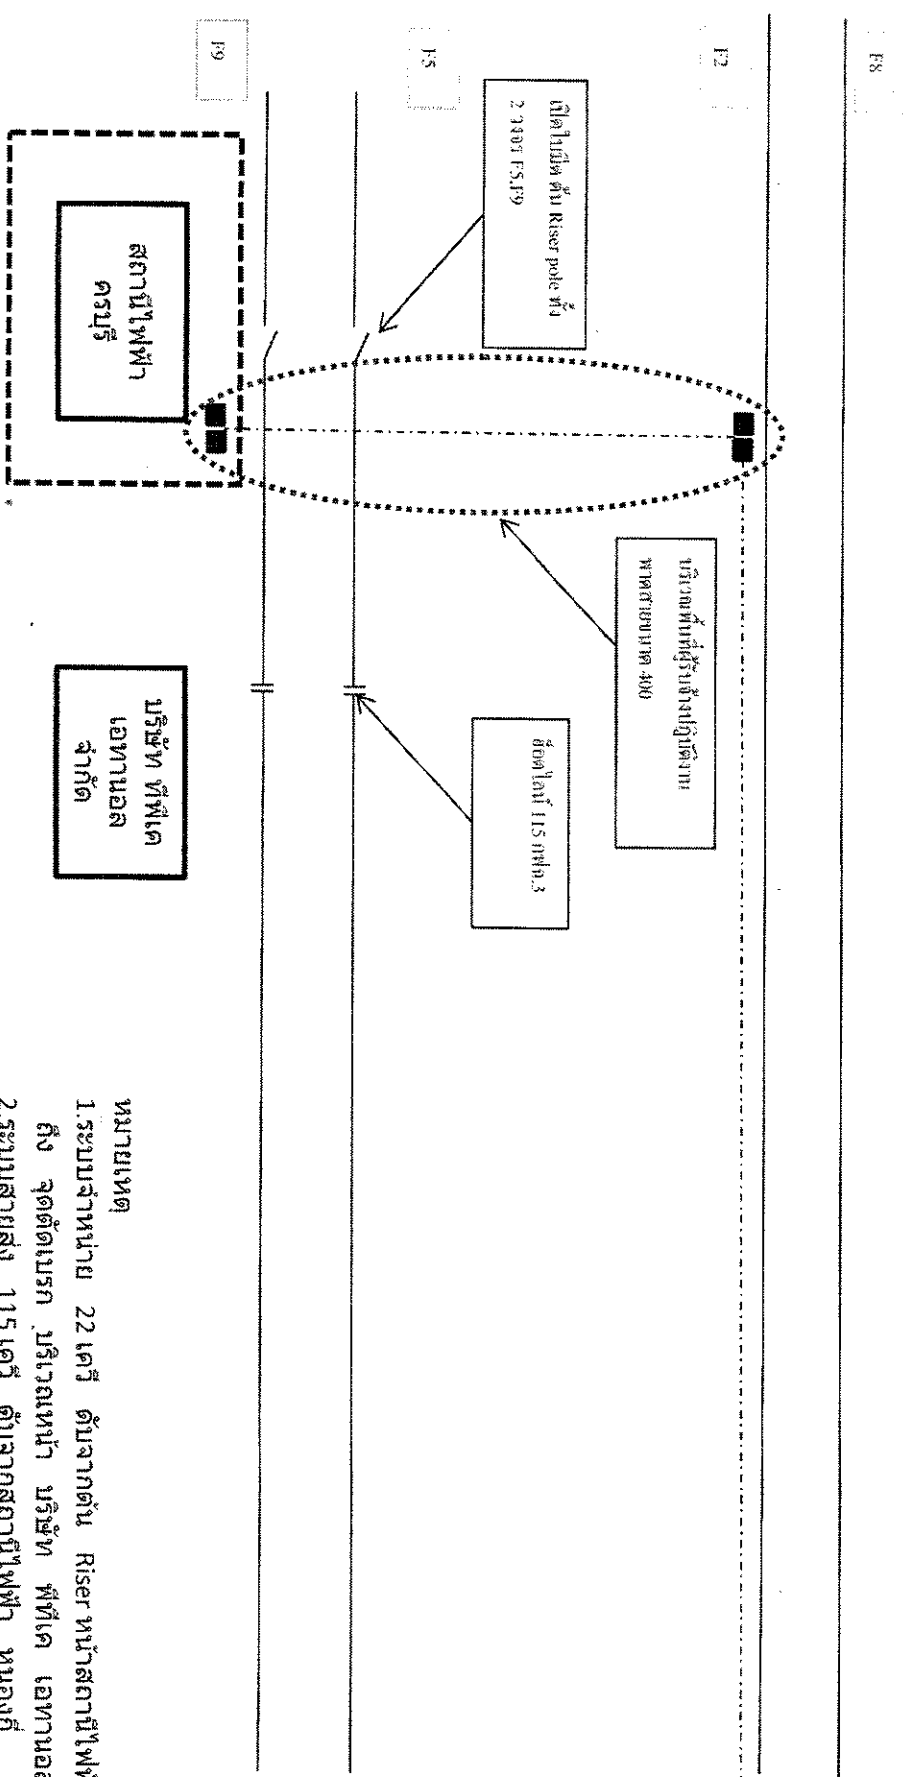

หมายเหตุ
 1.ระบบจำหน่าย 22 เควี ต่บจากต้น Riser หน้าสถานีไฟฟ้าครบุรี
 ถึง จุดตัดเบรก บริเวณหน้า บริษัท ทีพีเค เอทานอลจำกัด
 2.ระบบสายส่ง 115 เควี ต่บจากสถานีไฟฟ้าหนองกี่
 ถึง สถานีไฟฟ้าครบุรี
