



เลขที่รับ 1543
วันที่รับ 7 ธ.ค. 2564
OMS.No. 127780952
รหัสอุปกรณ์ NOK03W-501

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.ผกร.กกค.ฉ.๓
เลขที่ ฉ.๓ คบ.(กบ)
เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงเพื่อปฏิบัติงาน
เรียน ผจก.กฟส.คบ.ผ่าน ทพ.กบ.

ถึง ผจก.กฟส.นครบุรี
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตามที่ ผกร.กกค.ฉ.๓ ได้อนุญาตให้ นายฉัตรชนะ กางทาสี ตำแหน่ง พชง.๔ ผกร.กกค.ฉ.๓ เป็นผู้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เครือ (ถาวร) ได้เส้นระบบสายส่ง ๑๑๕ เครือ จากสถานีไฟฟ้านครบุรี - สถานีไฟฟ้าเสิงสาง ช่วงที่ ๑ นั้น เนื่องจาก การดำเนินการดังกล่าว จำเป็นต้องดับไฟฟ้าแรงสูง ๒๒ เครือ และ ระบบสายส่ง ๑๑๕ เครือ เพื่อปฏิบัติงาน และเพื่อความปลอดภัย (ตามแผนผัง) โดยมีปริมาณงานที่จะดำเนินการ ดังนี้

1. รื้อถอนเสาขนาด ๑๒.๒๐ จำนวน ๘ ต้น
2. ปักเสาขนาด ๑๒.๒๐ จำนวน ๒ ต้น
3. ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา ป.ปลา จำนวน ๓๐ ต้น ๒ วงจร

ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. เวลาที่ขออนุมัติในครั้งนี้ ไม่นับเวลาดำเนินการ Switching ถ่ายเทโหลดก่อนและหลังการดับไฟปฏิบัติงาน ทั้งนี้ หากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะแจ้งให้ ผกบ. และ ศกฟ.กฟฉ.๓ ทราบ เพื่อดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการขออนุมัติต่อไป

เรียน ผจก. กฟส.คบ.

ผกบ.คบ. พิจารณาขออนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงานแล้ว เห็นควรอนุมัติให้ดับไฟได้ตามที่เสนอ ทั้งนี้ มีผู้ใช้ไฟที่ติดตั้งหม้อแปลงรวม ตั้งแต่ ๓๐๐ KVA ขึ้นไปได้รับผลกระทบ จำนวน ราย ตามแผนผังแนบ

(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ พร้อมจะบุก)

พชง.๗ รักษาการแทน ทพ.กบ.คบ.

ที่ ฉ.๓ คบ.(กบ.) - ๕๕๒/๒๕๖๔

เรียน อก.ปบ.ฉ.๓ (ผคฟ.กบ.ป.ฉ.๓)
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ พร้อมจะบุก)

ผจก.คบ.

(ลงชื่อ)

(นายฉัตรชนะ กางทาสี)

พชง.๔ ผกร.กกค.ฉ.๓ (๐๔๓-๓๓๒๔๐๕๗)

เรียน อก.ปบ.ฉ.๓ ศกฟ.กฟฉ.๓ (๐๔๓-๓๓๒๔๐๕๗) 3369/2564

ผคฟ.พิจารณาแล้ว เห็นว่า

- ☒ สามารถดำเนินการดับไฟได้ตามเสนอ พร้อมนี้
ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว
☐ ไม่สามารถดำเนินการดับไฟได้ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตต่อไป

(ลงชื่อ) (นายชัชวาลย์ สาสน์เที่ยง) ผคฟ.

ที่ ผคฟ.กบ.ป.ฉ.๓ ปฏิบัติงานแทน ผคฟ.กบ.ป.ฉ.๓

เรียน ผจก.กฟส.คบ. ทพ.ร.นส.

- ☒ อนุมัติ - และให้ควบคุมการปฏิบัติงานให้สามารถ
จ่ายกระแสไฟฟ้าตามเวลาที่กำหนดด้วย
☐ ไม่อนุมัติดับไฟได้ตามเสนอ จึงขอให้พิจารณากำหนด
แผนงานดับไฟใหม่ ต่อไป


(ลงชื่อ)

(นายสุกรัฐ ศรีมงคล)

ท.ป.บ.๑.๓ รักษาการแทน อก.ปบ.ฉ.๓

บันทึกการดับไฟปฏิบัติงาน	เริ่มดับไฟ	เวลา	(นาย.....)	ผู้แจ้ง
	แจ้งงานแล้วเสร็จ	เวลา	(นาย.....)	ผู้แจ้ง
	จ่ายไฟคืนได้	เวลา	(นาย.....)	ผู้แจ้ง

แผนผังระบบไฟฟ้าปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ได้ใส่สายส่ง 115 เควี สฟ.คบ.-สฟ.สสง. ช่วง ที่ 1
วันที่ 13 ธันวาคม 2564
บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 73 - สามแยกทางเข้า หมู่บ้านตะแบกบาน

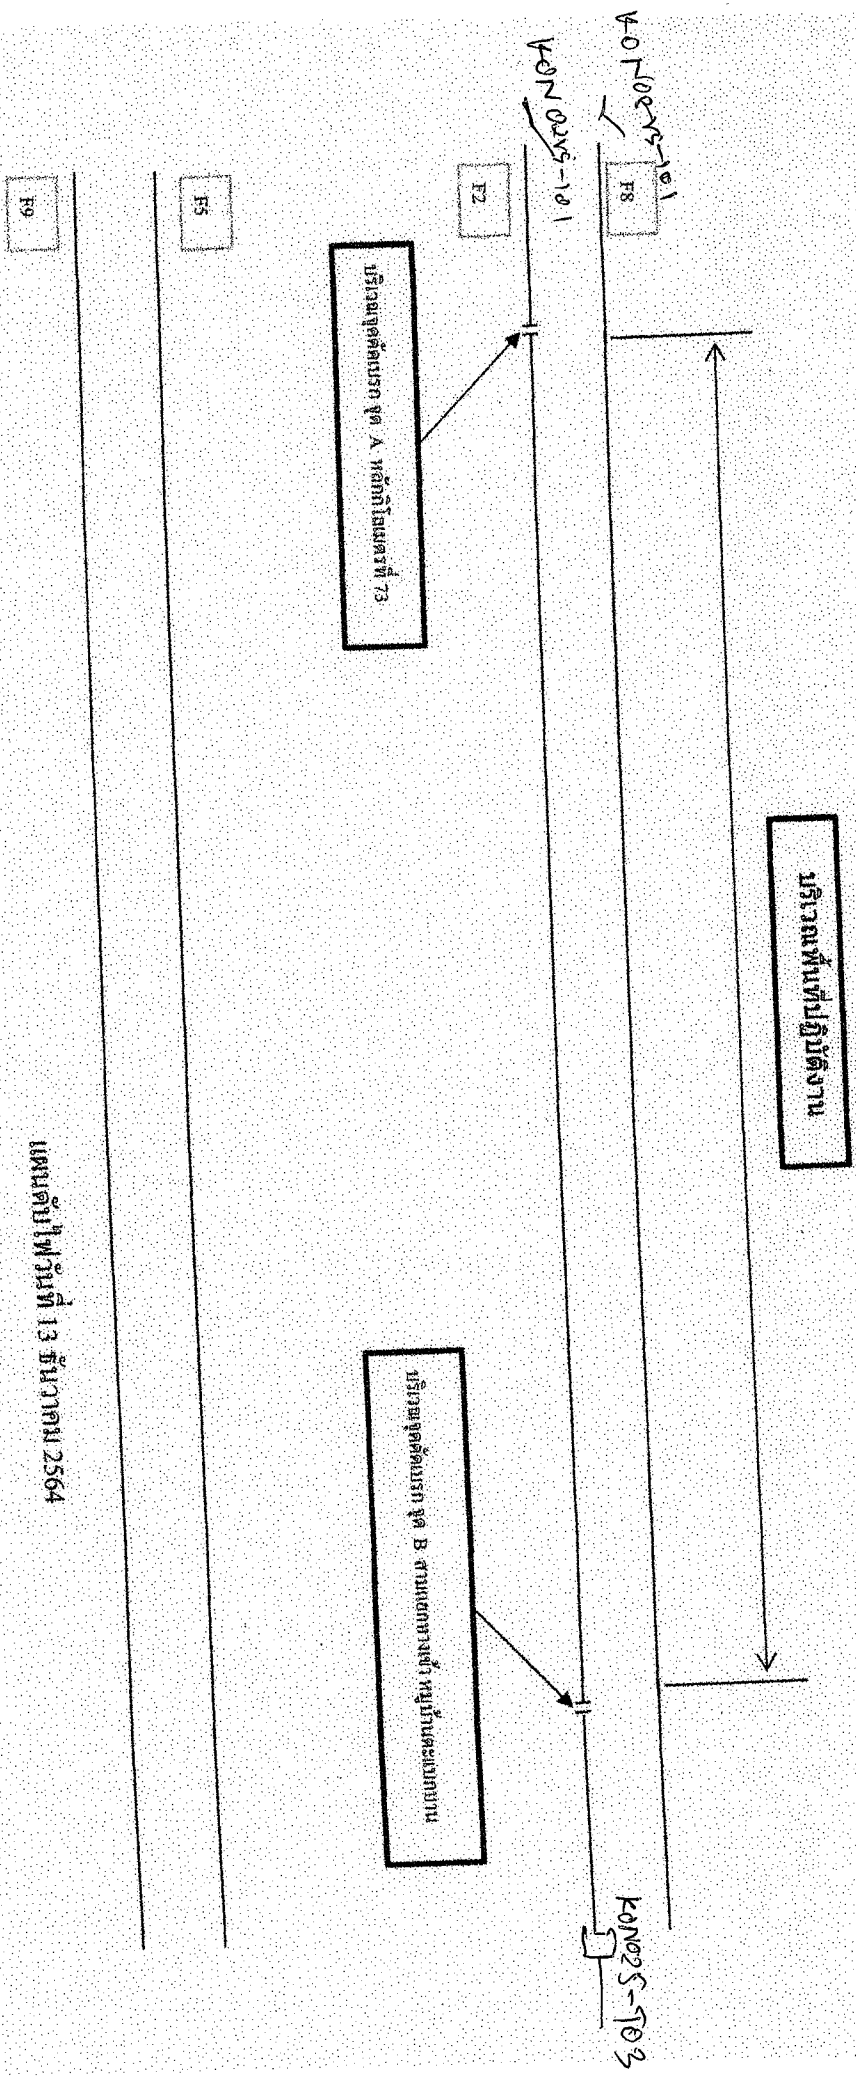

แผนผังไฟฟ้าวันที่ 13 ธันวาคม 2564
เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
* ตั๊บ ไฟโตชีวิตรีปสถานีเพื่อตัดบรกด จุด A และ จุด B (F.2)
* ตั๊บ ไฟ F.10 ที่จ่ายขึ้นสายส่ง 115 เควี
* ตั๊บ F.8 จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แบบฟอร์มกำหนดขั้นตอนการดับไฟ (Switching Order)

เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย..... กฟล.คบ..วันที่..13../...ค..../...2564. เวลา...08.30...-17.00..น.

E/O.....

- ☐ KYT/Safety Talk เวลา..... ผู้ดำเนินการ.....
- ☐ Voltage detector จำนวน.....ชุด, สภาพ (ปกติ/ชำรุด)..... ☐ อุปกรณ์ทำกราวด์ จำนวน.....ชุด, (ปกติ/ชำรุด).....

ผู้ประสานงานดับไฟ.....

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง.....

ขั้นตอนการย้ายโหลด (13 ค.ค.2564)

ลำดับ	การปฏิบัติงาน	รหัสอุปกรณ์ / บริเวณปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน / ผู้ประสานงาน	หมายเหตุ
		ขั้นตอนการปฏิบัติงาน			
1	OFF AUTO	KON 10VB-01		ศจฟ.	
2	OFF AUTO	KON 02VB-01		ศจฟ.	
3	OFF AUTO	KON 08VB-01		ศจฟ.	
4	NON RECLOSING	NOK03VR-501		กฟล.สสง.	
5	สับ	NOK03VS-408		กฟล.สสง.	
6	ปลด+ล็อกคาน	KON 10VS-402		กฟล.สสง.	
7	NON RECLOSING	KON08R-01		กฟล.สสง.	
8	NON RECLOSING	KON09R-01		กฟล.สสง.	
9	สับ	KON08S-09		กฟล.สสง.	
10	ปลด	KON08R-01		กฟล.สสง.	
11	ปลด	KON08S-07		กฟล.สสง.	SW.L.
12	OFF AUTO	KON 05VB-01		ศจฟ.	
13	สับ	KON05S-08		กฟล.สสง.	
14	ปลด	KON02S-T03		กฟล.สสง.	
15	ปลด	KON 10VB-01		ศจฟ.	
16	ปลด	KON 02VB-01		ศจฟ.	
17	ปลด	KON 08VB-01		ศจฟ.	
18	ปลด	KON 10VS-101		กฟล.คบ.	
19	ปลด	KON 02VS-101		กฟล.คบ.	
20	ปลด	KON 08VS-101		กฟล.คบ.	
21	ตรวจสอบแรงดัน	จุด A และ จุด B		กฟล.คบ.	
22	ทำกราวด์ หั่ว-ท้าย	จุด A และ จุด B		กฟล.คบ.	
23	ตัดเบรก	จุด A และ จุด B		กฟล.คบ.	
24	ปลดกราวด์ หั่ว-ท้าย	จุด A และ จุด B		กฟล.คบ.	
25	สับ	KON 02VS-101		กฟล.คบ.	
26	สับ	KON 02VB-01		ศจฟ.	
27	สับ	KON02S-T03		กฟล.สสง.	
28	ชี้แจงบริเวณไฟดับ	KON02 จุด A ถึง จุด B		ศจฟ.	
29	ชี้แจงบริเวณไฟดับ	KON08VB-01 ถึง KON08R-01		ศจฟ.	
30	ชี้แจงบริเวณไฟดับ	KON10VB-01 ถึง KON10VS-402		ศจฟ.	
31	ผู้ประสานงานส่งมอบพื้นที่	จุดปฏิบัติงาน		ชื่อ.....	
32	ตรวจสอบแรงดัน	จุดปฏิบัติงาน		ชื่อ.....	
33	ทำกราวด์ หั่ว-ท้าย	จุดปฏิบัติงาน		ชื่อ.....	
34	ON AUTO	KON 05VB-01		ศจฟ.	
35	ON AUTO	KON 02VB-01		ศจฟ.	
36	NORMAL	KON08R-01		กฟล.สสง.	
37	NORMAL	KON09R-01		กฟล.สสง.	

ขั้นตอนคืนสภาพโหลด					
ลำดับ	การปฏิบัติงาน	รหัสอุปกรณ์ / บริเวณปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน / ผู้ประสานงาน	หมายเหตุ
38	ตรวจสอบแรงดัน	จุดปฏิบัติงาน		ชื่อ.....	
39	ปลดกราวด์ หัว-ท้าย	จุดปฏิบัติงาน		ชื่อ.....	
40	ผู้ควบคุมงานส่งมอบพื้นที่	จุดปฏิบัติงาน		ชื่อ.....	
41	OFF AUTO	KON 02VB-01		ศจพ.	
42	OFF AUTO	KON 05VB-01		ศจพ.	
43	NON RECLOSING	NOK03VR-501		กฟส.สสง.	
44	NON RECLOSING	KON09R-01		กฟส.สสง.	
45	ปลด	KON 02VB-01		ศจพ.	
46	ปลด	KON 02VS-101		กฟส.คบ.	
47	ปลด	KON02S-T03		กฟส.สสง.	
48	ชี้แจงบริเวณไฟดับ	KON02 จุด A ถึง จุด B		ศจพ.	
49	ชี้แจงบริเวณไฟดับ	KON08VB-01 ถึง KON08R-01		ศจพ.	
50	ชี้แจงบริเวณไฟดับ	KON10VB-01 ถึง KON10VS-402		ศจพ.	
51	ตรวจสอบแรงดัน	จุด A และ จุด B		กฟส.คบ.	
52	ทำกราวด์ หัว-ท้าย	จุด A และ จุด B		กฟส.คบ.	
53	เชื่อมต่อเบรก	จุด A และ จุด B		กฟส.คบ.	
54	ปลดกราวด์ หัว-ท้าย	จุด A และ จุด B		กฟส.คบ.	
55	สับ	KON 10VS-101		กฟส.คบ.	
56	สับ	KON 02VS-101		กฟส.คบ.	
57	สับ	KON 08VS-101		กฟส.คบ.	
58	สับ	KON 10VB-01		ศจพ.	
59	สับ	KON 02VB-01		ศจพ.	
60	สับ	KON 08VB-01		ศจพ.	
61	สับ	KON02S-T03		กฟส.สสง.	
62	ปลด	KON05S-08		กฟส.สสง.	
63	สับ	KON08S-07		กฟส.สสง.	SW.L.
64	สับ	KON08R-01		กฟส.สสง.	
65	ปลด	KON08S-09		กฟส.สสง.	
66	ปลดล็อกคาน+สับ	KON 10VS-402		กฟส.สสง.	
67	ปลด	NOK03VS-408		กฟส.สสง.	
68	ON AUTO	KON 10VB-01		ศจพ.	
69	ON AUTO	KON 02VB-01		ศจพ.	
70	ON AUTO	KON 08VB-01		ศจพ.	
71	NORMAL	KON09R-01		กฟส.สสง.	
72	NORMAL	KON08R-01		กฟส.สสง.	
73	NORMAL	NOK03VR-501		กฟส.สสง.	

(ลงชื่อ).....ผู้ออกสวิตซ์ (นายธีรยุทธ ปูนสันเทียะ)
ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบสวิตซ์ (นายภูชาติ พรหมเงิน)
ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติสวิตซ์ (นายชัชวาลย์ สาสนเทียะ)
เขตพื้นที่ปฏิบัติงานแทน พล.ท.กบ.บ.จ.3
