


(กองก.นป.ร.ว.ค.)
an 1592
เลขที่รับ 14 ธ.ค. 2564
วันที่รับ 4283397916
OMS.No. KONGK-01
รหัสโครงการ

งานรับแจ้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดัน 115 เคV ส.พ.บ.-ส.พ.ส.ส.ง. (ถาวร) ช่วงที่ 1
วันที่ 20 ธันวาคม 2564

เขตปฏิบัติงาน

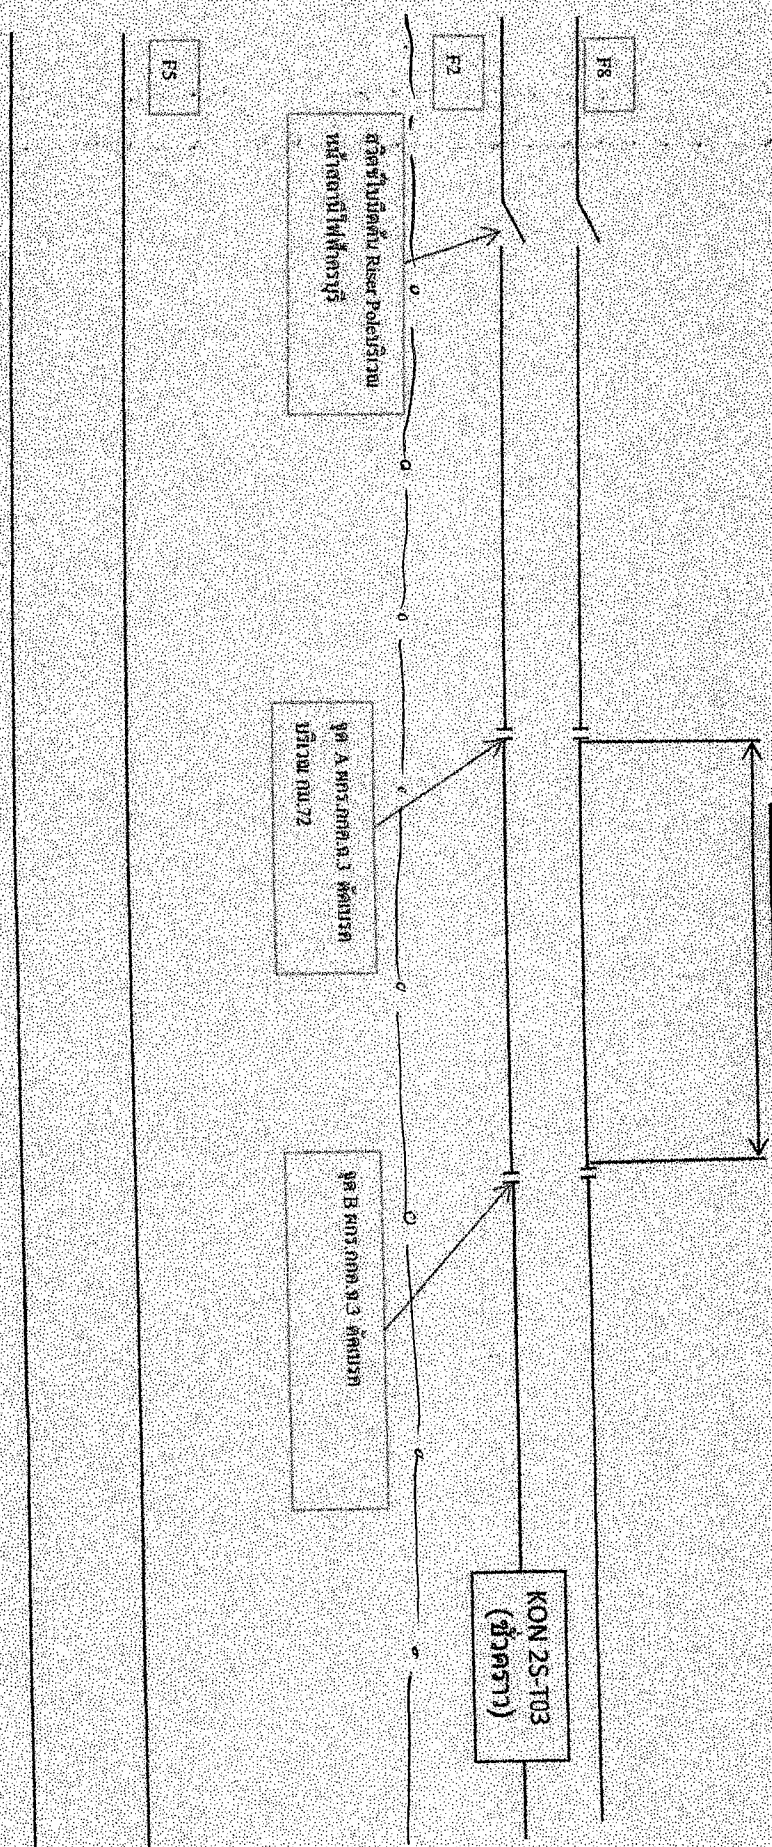

สถานี
ไฟฟ้าบุรี

แผนเดินไฟฟ้า 20 ธ.ค. 2564
เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
บริเวณทางเข้าบ้านหนองตะแบก



จุด A มุม ๓๐๐.๙.๓ ร้อยเมตร
บริเวณ กม. 72

จุด B มุม ๓๐๐.๙.๓ ร้อยเมตร
บริเวณ กม. 73



แบบฟอร์มกำหนดขั้นตอนการดับไฟ (Switching Order)

เพื่อ ปรับปรุงระบบจำหน่าย...บริเวณบ้านสำโรง.. วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.

EO.....เป็นผู้ตรวจสอบ	
☐ KYT/Safety Talk เวลา..... ผู้ดำเนินการ..... ☐ Voltage Detector จำนวน....ชุด , สภาพ(_ปกติ / _ชำรุด)	☐ อุปกรณ์ทำกราวด์ จำนวน....ชุด , สภาพ(_ปกติ / _ชำรุด)
ผู้ประสานงานดับไฟ.....	
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง.....	

ขั้นตอนย้ายโหลดดับไฟปฏิบัติงาน					
ขั้นตอน	การปฏิบัติงาน	รหัสอุปกรณ์	เวลา	หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
1	Non Reslosing	KON09R-01		ศจพ.ฉ.3 / SCADA / กฟส.สสง.	
2	Non Reslosing	KON08R-01		ศจพ.ฉ.3 / SCADA / กฟส.สสง.	
3	Non Reslosing	NOK03VR-501		ศจพ.ฉ.3 / SCADA / กฟส.สสง.	
4	Off Auto	KON02VB-01		ศจพ.ฉ.3 / SCADA	
5	Off Auto	KON10VB-01		ศจพ.ฉ.3 / SCADA	
6	สับ	KON08S-09		กฟส.สสง.	
7	ปลด	KON08R-01 + Sw.Load		กฟส.สสง.	
8	สับ	NOK03VS-408		กฟส.สสง.	
9	ปลด	KON10VS-402 + Lock คาน		กฟส.สสง.	
10	สับ	KON02S-07		ศจพ.ฉ.3 / SCADA	
11	ปลด	KON02S-T03 + Lock คาน		กฟส.สสง.	
12	ปลด	KON02VB-01		ศจพ.ฉ.3 / SCADA	
13	ปลด	KON08VB-01		ศจพ.ฉ.3 / SCADA	
14	ปลด	KON10VB-01		ศจพ.ฉ.3 / SCADA	
15	ปลด	KON02VB-101		กฟส.คบ.	
16	ปลด	KON08VB-101		กฟส.คบ.	
17	ปลด	KON10VB-101		กฟส.คบ.	
18	ชี้แจงบริเวณไฟดับจาก..	KON02VB-01 ถึง KON02S-T03		พนักงาน ศจพ.	ผู้ประสานงาน.....
19	ชี้แจงบริเวณไฟดับจาก..	KON08VB-01 ถึง KON08R-01		พนักงาน ศจพ.	ผู้ประสานงาน.....
20	ชี้แจงบริเวณไฟดับจาก..	KON10VB-01 ถึง KON10VS-402		พนักงาน ศจพ.	ผู้ประสานงาน.....
21	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า จุดตัดเบรก	DDE A		ผกร.กกด.ฉ.3	ผู้แจ้ง.....
22	ทำกราวด์ หัว-ท้าย จุดตัดเบรก	DDE A		ผกร.กกด.ฉ.3	ผู้แจ้ง.....
23	ตัดเบรก	DDE A		ผกร.กกด.ฉ.3	ผู้แจ้ง.....
24	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า จุดตัดเบรก	DDE B		ผกร.กกด.ฉ.3	ผู้แจ้ง.....
25	ทำกราวด์ หัว-ท้าย จุดตัดเบรก	DDE B		ผกร.กกด.ฉ.3	ผู้แจ้ง.....
26	ตัดเบรก	DDE B		ผกร.กกด.ฉ.3	ผู้แจ้ง.....
27	ปลดกราวด์ หัว-ท้าย จุดตัดเบรก	DDE A		ผกร.กกด.ฉ.3	ผู้แจ้ง.....
28	ปลดกราวด์ หัว-ท้าย จุดตัดเบรก	DDE B		ผกร.กกด.ฉ.3	ผู้แจ้ง.....
29	สับ	KON02S-T03		กฟส.สสง.	ปลด Lock คาน ก่อนสับ
30	สับ	KON02VS-101		กฟส.คบ.	
31	สับ	KON02VB-01		ศจพ.ฉ.3 / SCADA	
32	ชี้แจงบริเวณไฟดับจาก..	DDE A ถึง DDE B		พนักงาน ศจพ.	ผู้ประสานงาน.....
33	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	บริเวณจุดปฏิบัติงาน		ผู้แจ้ง.....	
34	ทำกราวด์ คร่อม หัว-ท้าย	บริเวณจุดปฏิบัติงาน		ผู้แจ้ง.....	
35	Normal	KON09R-01		ศจพ.ฉ.3 / SCADA / กฟส.สสง.	
36	Normal	KON08R-01		ศจพ.ฉ.3 / SCADA / กฟส.สสง.	

แบบฟอร์มกำหนดขั้นตอนการดับไฟ (Switching Order)
 เพื่อ ปรับปรุงระบบจำหน่าย...บริเวณบ้านสำโรง.. วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.

EO.....เป็นผู้ตรวจสอบ					
☐ KYT/Safety Talk เวลา..... ผู้ดำเนินการ.....					
☐ Voltage Detector จำนวน....ชุด , สภาพ(__ปกติ / __ชำรุด) ☐ อุปกรณ์ทำกราวด์ จำนวน....ชุด , สภาพ(__ปกติ / __ชำรุด)					
ผู้ประสานงานดับไฟ.....					
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง.....					
ขั้นตอนย้ายโหลดดับไฟปฏิบัติงาน					
ขั้นตอน	การปฏิบัติงาน	รหัสอุปกรณ์	เวลา	หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
37	Normal	NOK03VR-501		ศจพ.ฉ.3 / SCADA / กฟส.สสง.	
38	On Auto	KON02VB-01		ศจพ.ฉ.3 / SCADA	
39	On Auto	KON10VB-01		ศจพ.ฉ.3 / SCADA	
40	ขั้นตอนหลังปฏิบัติงานตามแผน แล้วเสร็จ				
41	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างชี้แจง ผลการปฏิบัติงานให้ผู้ประสานงานดับไฟ			ผู้ควบคุมงานชื่อ.....	ผู้ประสานงาน.....
42	ชี้แจงบริเวณไฟดับจาก..	DDE A ถึง DDE B		พนักงาน ศจพ.	ผู้ประสานงาน.....
43	Non Reslosing	KON09R-01		ศจพ.ฉ.3 / SCADA / กฟส.สสง.	
44	Non Reslosing	KON08R-01		ศจพ.ฉ.3 / SCADA / กฟส.สสง.	
45	Non Reslosing	NOK03VR-501		ศจพ.ฉ.3 / SCADA / กฟส.สสง.	
46	Off Auto	.KON02VB-01		ศจพ.ฉ.3 / SCADA	
47	Off Auto	KON10VB-01		ศจพ.ฉ.3 / SCADA	
48	ปลด	KON02S-T03 + Lock คาน		กฟส.สสง.	
49	ปลด	KON02VB-01		ศจพ.ฉ.3 / SCADA	
50	ปลด	KON02VB-101		กฟส.คบ.	
51	ชี้แจงบริเวณไฟดับจาก..	KON02VB-01 ถึง KON02S-T03		พนักงาน ศจพ.	ผู้ประสานงาน.....
52	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า จุดเชื่อมเบรก	DDE A		ผกร.กคค.ฉ.3	ผู้แจ้ง.....
53	ทำกราวด์ หัว-ท้าย จุดเชื่อมเบรก	DDE A		ผกร.กคค.ฉ.3	ผู้แจ้ง.....
54	เชื่อมเบรก	DDE A		ผกร.กคค.ฉ.3	ผู้แจ้ง.....

แบบฟอร์มกำหนดขั้นตอนการดับไฟ (Switching Order)

เพื่อ ปรับปรุงระบบจำหน่าย...บริเวณบ้านสำโรง.. วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.

EO.....เป็นผู้ตรวจสอบ

☐ KYT/Safety Talk เวลา.....ผู้ดำเนินการ.....

☐ Voltage Detector จำนวน.....ชุด , สภาพ(__ปกติ / __ชำรุด) ☐ อุปกรณ์ทำกราวด์ จำนวน.....ชุด , สภาพ(__ปกติ / __ชำรุด)

ผู้ประสานงานดับไฟ.....

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง.....

ขั้นตอนย้ายโหลดดับไฟปฏิบัติงาน					
ขั้นตอน	การปฏิบัติงาน	รหัสอุปกรณ์	เวลา	หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
55	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า จุดเชื่อมเบรก	DDE B		ผกร.กกค.ฉ.3	ผู้แจ้ง.....
56	ทำกราวด์ หัว-ท้าย จุดเชื่อมเบรก	DDE B		ผกร.กกค.ฉ.3	ผู้แจ้ง.....
57	เชื่อมเบรก 2	DDE B		ผกร.กกค.ฉ.3	
58	ปลดกราวด์ หัว-ท้าย จุดตัดเบรก	DDE A		ผกร.กกค.ฉ.3	ผู้แจ้ง.....
59	ปลดกราวด์ หัว-ท้าย จุดตัดเบรก	DDE B		ผกร.กกค.ฉ.3	ผู้แจ้ง.....
60	ปลดกราวด์ คร่อม หัว-ท้าย	บริเวณจุดปฏิบัติงาน		ผู้แจ้ง.....	
61	สับ	KON02S-T03		กฟส.สสง.	ปลด Lock คาน ก่อนสับ
62	สับ	KON02VS-101		กฟส.คบ.	
63	สับ	KON08VS-101		กฟส.คบ.	
64	สับ	KON10VS-101		กฟส.คบ.	
65	สับ	KON02VB-01		ศจพ.ฉ.3 / SCADA	
66	สับ	KON08VB-01		ศจพ.ฉ.3 / SCADA	
67	สับ	KON10VB-01		ศจพ.ฉ.3 / SCADA	
68	ปลด	KON02S-07		ศจพ.ฉ.3 / SCADA	
69	สับ	KON10VS-402 + Lock คาน		กฟส.สสง.	ปลด Lock คาน ก่อนสับ
70	ปลด	NOK03VS-408		กฟส.สสง.	
71	สับ	Sw.Load + KON08R-01		กฟส.สสง.	
72	ปลด	KON08S-09		กฟส.สสง.	
73	Normal	KON09R-01		ศจพ.ฉ.3 / SCADA / กฟส.สสง.	
74	Normal	KON08R-01		ศจพ.ฉ.3 / SCADA / กฟส.สสง.	
75	Normal	NOK03VR-501		ศจพ.ฉ.3 / SCADA / กฟส.สสง.	
76	On Auto	KON02VB-01		ศจพ.ฉ.3 / SCADA	
77	On Auto	KON10VB-01		ศจพ.ฉ.3 / SCADA	

ลงชื่อ.....ผู้ออกสวิตซ์ชิง
(นายอำนาจ ภูริทัตโสภณ)
พช. ผคพ.ฉ.3 วันที่ 14/12/2564

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบสวิตซ์ชิง
(นายระพีพงษ์ กลอนโคกสูง)
พช. ผคพ.ฉ.3 วันที่ 14/12/2564

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติสวิตซ์ชิง
(นายขรรค์ชัย สาสันเทียะ)
พช. ผคพ.ฉ.3 วันที่ 14/12/2564
ขณ.คพ.ปฏิบัติงานแทน ผคพ.กบป.ฉ.3
