



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

(ผศพ.กปบ.ผบ.บ.จ.3)
เลขที่รับ 031
วันรับ 11 มี.ค. 2565
OMS. No. 4306121933
รหัสโครงการ KON02 VS-01

จาก พงษ.ผกร.กกค.ฉ.๓

ถึง ผจก.กฟส.นครบุรี.

เลขที่ ฉ.๓ คบ.(กป)

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงเพื่อปฏิบัติงาน

เรียน ผจก.กฟส.คบ.ผ่าน ทพ.กบ. ๐๓.๖๖

ตามที่ ผกร.กกค.ฉ.๓ ได้มอบหมายให้ นายฉัตรชนะ กางทาสี ตำแหน่ง พงษ.๔ ผกร.กกค.ฉ.๓ เป็นผู้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เครือ ชั่วโมง เพื่อรองรับการก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เครือ จากสถานีไฟฟ้านครบุรี - สถานีไฟฟ้าเสิงสาง นั้น

เนื่องจาก การดำเนินการดังกล่าว จำเป็นต้องดับไฟฟ้าแรงสูง เพื่อปฏิบัติงาน และเพื่อความปลอดภัย (ตามแผนผัง) โดยมีปริมาณงานที่จะดำเนินการ ดังนี้

1. รื้อถอนเสาขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น
2. ปักเสาขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๘ ต้น
3. รื้อถอนอุปกรณ์หัวเสาเดิม CSC ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาแบบ CCB ป.ปลา จำนวน ๒ วงจร ระยะ ๑ กิโลเมตร

ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. เวลาที่ขออนุมัติในครั้งนี้ ไม่นับเวลาที่ดำเนินการ Switching ถ่ายเทโหลดก่อนและหลังการดับไฟปฏิบัติงาน ทั้งนี้ หากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดเวลาจะแจ้งให้ ผกบ. และ ศกพ.กฟฉ.๓ ทราบ เพื่อดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการขออนุมัติต่อไป

เรียน ผจก. กฟส.คบ.

ผกบ.คบ. พิจารณาขออนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงานแล้ว เห็นควรอนุมัติให้ดับไฟได้ตามที่เสนอ ทั้งนี้ มีผู้ใช้ไฟที่ติดตั้งหม้อแปลงรวม ตั้งแต่ ๓๐๐ KVA ขึ้นไปได้รับผลกระทบ จำนวน ราย ตามแผนผังแนบ

(ลงชื่อ)
(นายประจวบ ฝ่ายกระโทก)
ทพ.กบ.คบ.

ที่ ฉ.๓ คบ.(กป.) - ๒๒ / ๒๕๖๔

เรียน อ.ก.บ.บ.ฉ.๓ (ผศพ.กปบ.บ.จ.๓)
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)
(นายสุชาติ พร้อมจะบก)
ผจก.กฟส.คบ.

(ลงชื่อ)

(นายฉัตรชนะ กางทาสี)

พงษ.๔ ผกร.กกค.ฉ.๓ (๐๔๓-๓๓๒๔๐๕๗)

เรียน อ.ก.บ.บ.ฉ.๓

ผศพ.พิจารณาแล้ว เห็นว่า

- ☒ สามารถดำเนินการดับไฟได้ตามเสนอ พร้อมนี้
ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว
- ☐ ไม่สามารถดำเนินการดับไฟได้ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามต่อไป

(ลงชื่อ) (นายสมศักดิ์ แฉวงเงินดี)..... ทพ.คพ.

ที่ ผศพ.กปบ.บ.จ.๓/ 10712565 14 มี.ค. 2565
เรียน ผจก.กฟส.คบ., ทพ.คพ.

- ☒ อนุมัติ - และให้ควบคุมการปฏิบัติงานให้สามารถ
จ่ายกระแสไฟฟ้าตามเวลาที่กำหนดด้วย
- ☐ ไม่อนุมัติดับไฟได้ตามเสนอ จึงขอให้พิจารณากำหนด
แผนงานดับไฟใหม่ ต่อไป


(ลงชื่อ)

(นายศรัทธา ศรีมงคล)

(๓ ปีปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.ฉ.๓)

บันทึกการดับไฟปฏิบัติงาน	เริ่มดับไฟ	เวลา	(นาย.....)	ผู้แจ้ง
	แจ้งงานแล้วเสร็จ	เวลา	(นาย.....)	ผู้แจ้ง
	จ่ายไฟคืนได้	เวลา	(นาย.....)	ผู้แจ้ง

แผนผังคัมไฟฟ้าปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ได้ใส่สายส่ง 115 เควี สฟ.คบ.-สฟ.สสง. ช่วง ที่ 1
วันที่ 17 มกราคม 2565
บริเวณศาลาหมู่บ้านเทพนิมิตร์ - แยกทางเข้าหมู่บ้านเทพนิมิตร์

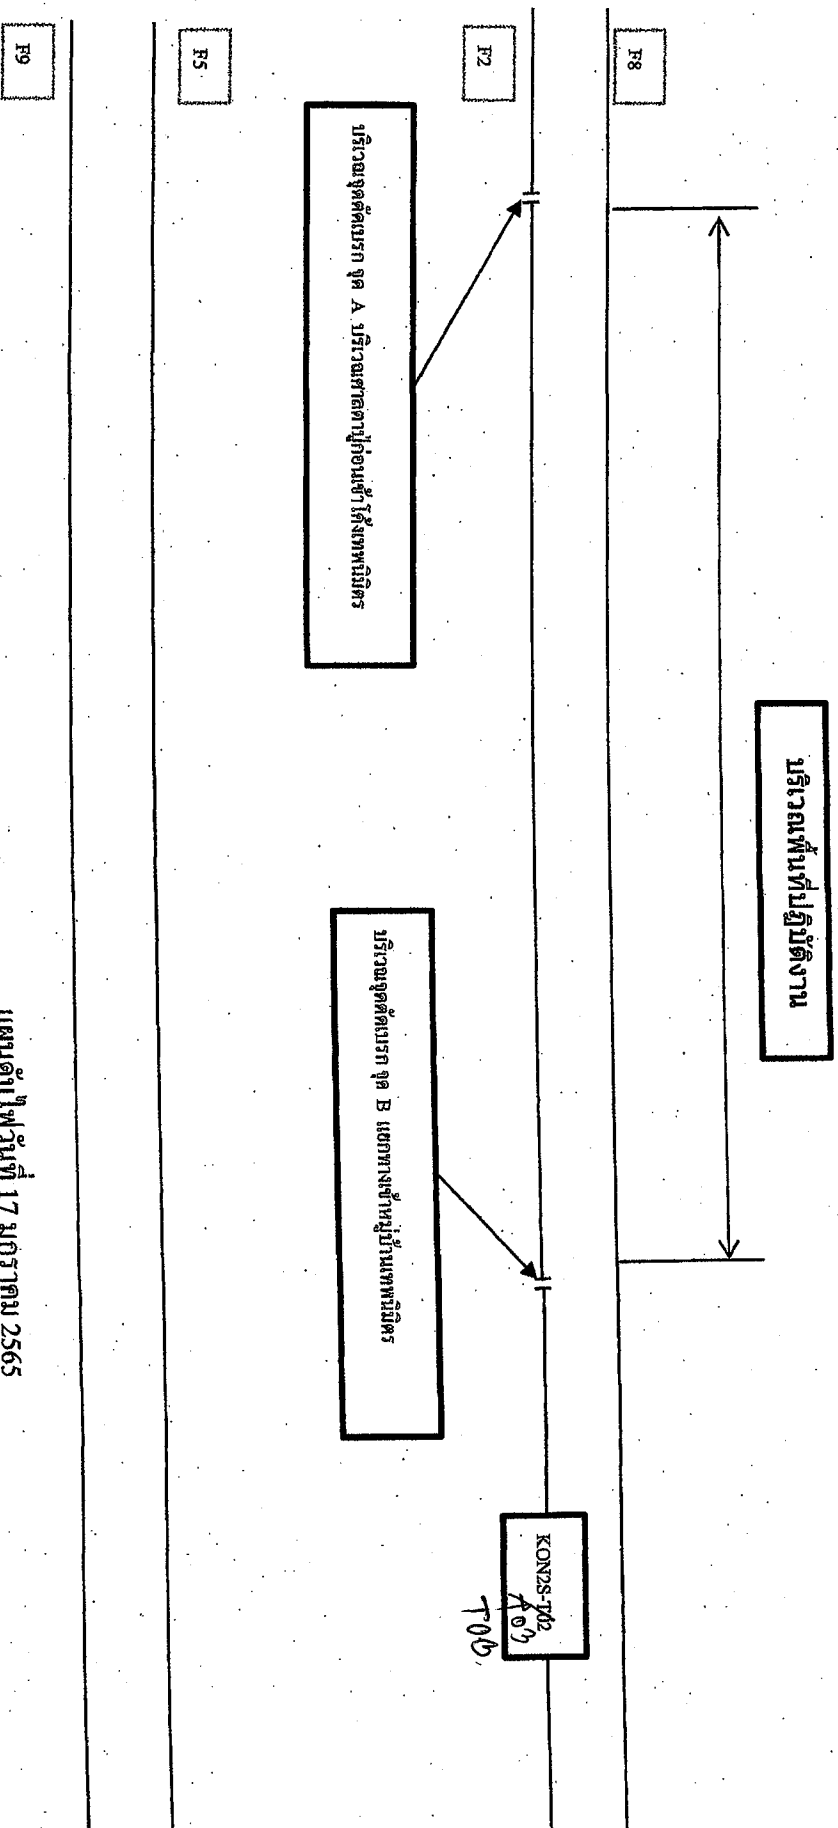

แผนคัมไฟฟ้าวันที่ 17 มกราคม 2565
เวลา 08.00 น. - 17.00 น.

- * คัมไฟฟ้าโดยวิธีที่ปรึกษาเพื่อตัดเบรก จุด A และ จุด B (F.2)
- * คัมไฟฟ้า F.10 ที่จ่ายขึ้นสายส่ง 115 เควี
- * คัม F.8 ยางจนกว่างานจะแล้วเสร็จ

15:54 9.10 น.ค.

15.5

71%

ส/ณ.

บริเวณจุดตัดบรก จุด A บริเวณศาลาปูนอนเข้าโรงพยาบาลนคร

บริเวณจุดตัดบรก จุด B แยกทางเข้าหมู่บ้านพนมมิตร

โรงเรียนบ้านพนมมิตร

แบบฟอร์มกำหนดขั้นตอนการดับไฟ (Switching Order)

การไฟฟ้าครบุรี นายฉัตรชนะ กางทาสี เพื่อ...พาดสายแรงสูงรองรับการก่อสร้างสายส่ง 115 เครี วันที่ 17 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

EO.....เป็นผู้ตรวจสอบ

☐ KYT / Safety Talk เวลา.....ผู้ดำเนินการ.....

☐ Voltage Detector จำนวน.....ชุด , สภาพ (_ ปกติ / _ ชำรุด) ☐ อุปกรณ์ทำกราวด์ จำนวน.....ชุด , สภาพ (_ ปกติ / _ ชำรุด)

ผู้ประสานงานดับไฟ.....

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง.....

ขั้นตอน	การปฏิบัติงาน	รหัสอุปกรณ์	เวลา	หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
ขั้นตอนย้ายโหลด					
1	OFF Auto	KON02VB-01		ศจฟ.ฉ.3	
2	OFF Auto	KON08VB-01		ศจฟ.ฉ.3	
3	OFF Auto	KON10VB-01		ศจฟ.ฉ.3	
4	OFF Auto	KON08R-01		ศจฟ.ฉ.3	
5	OFF Auto	KON09R-01		ศจฟ.ฉ.3	
6	สับ	NOK03VS-408		เสิ่งสาง	
7	ปลด	KON10VS-402		เสิ่งสาง	ฉ้อตาดาน
8	สับ	KON08S-09		เสิ่งสาง	
9	ปลด	KON08R-01		เสิ่งสาง	
10	ปลด	KON08S-07		เสิ่งสาง	SW.LOAD
11	สับ	KON02S-07		ศจฟ.ฉ.3	
12	ปลด	KON02S-T03		เสิ่งสาง	ฉ้อตาดาน
13	ปลด	KON02VB-01		ศจฟ.ฉ.3	
14	ปลด	KON08VB-01		ศจฟ.ฉ.3	
15	ปลด	KON10VB-01		ศจฟ.ฉ.3	
16	ปลด	KON02VS-101		ครบุรี	
17	ปลด	KON08VS-101		ครบุรี	
18	ปลด	KON10VS-101		ครบุรี	
19	ขึ้นแจ้งบริเวณไฟดับเพื่อ ปฏิบัติงาน จาก KON02VB-01 ถึง KON02S-T03 พนักงาน ศจฟ.....				
20	ขึ้นแจ้งบริเวณไฟดับเพื่อ ปฏิบัติงาน จาก KON08VB-01 ถึง KON08R-01 พนักงาน ศจฟ.....				
21	ขึ้นแจ้งบริเวณไฟดับเพื่อ ปฏิบัติงาน จาก KON10VB-01 ถึง KON10VS-402 พนักงาน ศจฟ.....				
22	ชื่อผู้ประสานงาน.....เวลา.....				
23	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า จุดทำกราวด์หัว-ท้าย ศาลาปู บ้านเทพนิมิตร จุด A ผู้แจ้ง.....เวลา.....				
24	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า จุดทำกราวด์หัว-ท้าย ทางเข้าบ้านเทพนิมิตร จุด B ผู้แจ้ง.....เวลา.....				
25	ตัด DDE	จุด A ศาลาปู		ชุด นายฉัตรชนะ	บ้านเทพนิมิตร
26	ตัด DDE	จุด B ทางเข้าหมู่บ้าน		ชุด นายฉัตรชนะ	บ้านเทพนิมิตร
27	ปลดกราวด์ หัว-ท้าย จุด DDE A ผู้แจ้ง.....เวลา.....				
28	ปลดกราวด์ หัว-ท้าย จุด DDE B ผู้แจ้ง.....เวลา.....				
29	สับ	KON02VS-101		ครบุรี	
30	สับ	KON02VB-01		ศจฟ.ฉ.3	
31	สับ	KON02S-T03		เสิ่งสาง	ปลดฉ้อตาดาน
32	ON AUTO	KON02VB-01		ศจฟ.ฉ.3	
33	ON AUTO	KON09R-01		ศจฟ.ฉ.3	

ขั้นตอนหลังปฏิบัติงานแล้วเสร็จ					
ขั้นตอนย้ายโหลด					
34	(ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง).....ชี้แจงผลการปฏิบัติงานให้ (ผู้ประสานงานดับไฟ).....เวลา.....				
35	ปลดกราวด์ จุดปฏิบัติงาน DDE A ศาลาหมู่บ้านเทพนิมิตร ผู้แจ้ง.....เวลา.....				
36	ปลดกราวด์ จุดปฏิบัติงาน DDE B ทางเข้าบ้านเทพนิมิตร ผู้แจ้ง.....เวลา.....				
37	ชื่อผู้ประสานงาน.....เวลา.....				
38	OFF Auto	KON02VB-01		ศจพ.ฉ.3	
39	OFF Auto	KON09R-01		ศจพ.ฉ.3	
40	ปลด	KON02VB-01		ครบุรี	
41	ปลด	KON02S-101		ศจพ.ฉ.3	
42	ปลด	KON02S-T03		เสิงสาง	ท้องถิ่น
43	ชี้แจงบริเวณไฟดับเพื่อ ปฏิบัติงาน..จาก KON02VB-01 ถึง KON02S-T03 พนักงาน ศจพ.....				
44	ชี้แจงบริเวณไฟดับเพื่อ ปฏิบัติงาน..จาก KON08VB-01 ถึง KON08R-01 พนักงาน ศจพ.....				
45	ชี้แจงบริเวณไฟดับเพื่อ ปฏิบัติงาน..จาก KON10VB-01 ถึง KON10VS-402 พนักงาน ศจพ.....				
46	ชื่อผู้ประสานงาน.....เวลา.....				
47	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า จุดทำกราวด์หัว-ท้าย ศาลาหมู่บ้านเทพนิมิตร จุด A ผู้แจ้ง.....เวลา.....				
48	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า จุดทำกราวด์หัว-ท้าย ทางเข้าบ้านเทพนิมิตร จุด B ผู้แจ้ง.....เวลา.....				
49	เชื่อม DDE	จุด A ศาลาหมู่บ้าน		ชุด นายฉัตรชนะ	บ้านเทพนิมิตร
50	เชื่อม DDE	จุด B ทางเข้าหมู่บ้าน		ชุด นายฉัตรชนะ	บ้านเทพนิมิตร
51	ปลดกราวด์ หัว-ท้าย จุด DDE A ผู้แจ้ง.....เวลา.....				
52	ปลดกราวด์ หัว-ท้าย จุด DDE B ผู้แจ้ง.....เวลา.....				
53	สับ	KON02VS-101		ครบุรี	
54	สับ	KON08VS-101		ครบุรี	
55	สับ	KON10VS-101		ครบุรี	
56	สับ	KON02VB-01		ศจพ.ฉ.3	
57	สับ	KON08VB-01		ศจพ.ฉ.3	
58	สับ	KON10VB-01		ศจพ.ฉ.3	
59	สับ	KON02S-T03		เสิงสาง	ปลดท้องถิ่น
60	ปลด	KON02S-07		ศจพ.ฉ.3	
61	สับ	KON10VS-402		เสิงสาง	ปลดท้องถิ่น
62	ปลด	NOK03VS-408		เสิงสาง	
63	สับ	KON08S-07		เสิงสาง	
64	สับ	KON08R-01		เสิงสาง	
65	ปลด	KON08S-09		เสิงสาง	
66	ON AUTO	KON02VB-01		ศจพ.ฉ.3	
67	ON AUTO	KON08VB-01		ศจพ.ฉ.3	
68	ON AUTO	KON10VB-01		ศจพ.ฉ.3	
69	ON AUTO	KON08R-01		ศจพ.ฉ.3	
70	ON AUTO	KON09R-01		ศจพ.ฉ.3	

ข้อมูล DMS 11/01/65

(ลงชื่อ)..... (นายวรพชร ศุภพันธุ์).....ผู้ออกสวิตซ์ พง. ผคพ.ฉ.3 วันที่ 11/01/2565

(ลงชื่อ)..... (นายอรรถ ดงคง).....ผู้ตรวจทานสวิตซ์ 11 ม.ค. 6๕

(ลงชื่อ)..... (นายนิรันดร์ แนวเงินดี).....ผู้อนุมัติสวิตซ์ ทพ.คพ.กปบ.ฉ.3

ทพ.คพ.กปบ.ฉ.3
