



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

เลขที่ ฉ.3

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงเพื่อปฏิบัติงาน

เรียน พล.ก.ป.ฟส.อ.ชลบุรี

ถึง พล.ส.อ.ชลบุรี

วันที่ 12 เม.ย. 2565

ด้วยข้าพเจ้า นายสมจินต์ พันธุศย์ ตำแหน่ง ผช.น.8 กก.ฉ.3 เบอร์ติดต่อ 085-0169005 มีความประสงค์ขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการ ปรับปรุง/ก่อสร้าง/รื้อถอน ระบบจำหน่าย 22 KV / สายส่ง 115 KV บริเวณ แยกบ้านหนองเลื้อยบอง - จุดแบ่งแดนชลบุรี/โขงชัย ตามอนุมัติเลขที่ ฉ.3 กว. (ว.ร.)-1000/2564 ลว. 24 มิ.ย. 2564 ซื้องาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 KV จุดแบ่งแดน อ.ชลบุรี/อ.โขงชัย ช่วง 2 อ.ชลบุรี จ.นครราชสีมา โดยมีปริมาณงานจะดำเนินการ ดังนี้

1. ปักเสา 12.20 ม. จำนวน 34 ต้น

2. ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา

ในวันที่ 22 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. โดยมีแผนผังพื้นที่การดับกระแสไฟฟ้าโดยละเอียดดั่งเอกสารแนบทั้งนี้เวลาที่ขออนุมัติในครั้งนี้ไม่นับรวมเวลาที่จะดำเนินการ Switching ถ่ายเทโหลดก่อนและหลังการดับไฟปฏิบัติงาน หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาจะแจ้งให้ ผ.บ. และ ศก.ฟ.ฉ.3 ทราบเพื่อดำเนินจ่ายไฟคืนระบบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการขออนุมัติ ต่อไป

เรียน ผจก.กฟส.อ.ชลบุรี

ผก.ป.เห็นควรอนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้

.....ตำแหน่ง.....เบอร์ติดต่อ

.....ประสานงานการดับไฟ ทั้งนี้มีข้อมูลผู้ใช้ไฟที่ได้รับ

ผลกระทบ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ใช้ไฟเฉพาะรายที่ติดตั้งหม้อแปลงรวมตั้งแต่ 300 KVA ขึ้นไป

จำนวน ราย ตามแผนผังแนบ

2. ผู้ป่วยติดเตียง ราย

3. ผู้ใช้ไฟรายสำคัญ ราย ทั้งนี้ กฟพ..... ได้

วางแผนบรรเทาผลกระทบดังกล่าวแล้ว

(ลงชื่อ)

นายสุเทพ เนืองระโท

..... (.....) พล.ก.ป.

..... (.....) พล.ก.ป.ค.

ที่ ๑๒๓๔.๕๖๗ ๒๒๒/๒๕๖๕

เรียน อ.ก.ป.ฉ.3 (ผค.ฟ.ก.ป.ฉ.3)

เพื่อโปรดพิจารณาและขออนุมัติ ต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายสุรชาติ พรหมจรรย์)

(.....) ผจก.กฟส.อ.ชลบุรี

บันทึกการดับไฟปฏิบัติ

เริ่มดับไฟ เวลา..... น. (นาย.....) ผู้แจ้ง

แจ้งงานแล้วเสร็จ เวลา..... น. (นาย.....) ผู้แจ้ง

จ่ายไฟคืนได้ เวลา..... น. (นาย.....) ผู้แจ้ง

ลงชื่อ.....

(นายสมจินต์ พันธุศย์)

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

เรียน อ.ก.ป.ฉ.3

ผค.ฟ.พิจารณาแล้วเห็นว่า

☒ สามารถดำเนินการดับไฟได้ตามเสนอ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

☐ ไม่สามารถดำเนินการดับไฟได้ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม ต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายนิรันดร์ แนวเงินทว) พล.คฟ.

พล.คฟ.ก.ป.ฉ.3

ที่ ๑๓๓๓.๕๖๗ 1102/2565 18 เม.ย. 2565

เรียน ผจก.กฟส.อ.ชลบุรี(ผค.ป.), ผจก.กฟอ.ชช.(ผบ.บ.),

อ.ก.ค.ฉ.3(ผกร.)

☒ อนุมัติ - และให้ควบคุมการปฏิบัติงานให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าตามเวลาที่กำหนดด้วย


☐ ไม่อนุมัติดับไฟได้ตามเสนอ จึงขอให้พิจารณากำหนดแผนงานดับไฟใหม่ ต่อไป

(ลงชื่อ)

(.....)

(นายอ.ก.ป.ฉ.3)

ร.ก.ป.ฉ.3 ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.ฉ.3

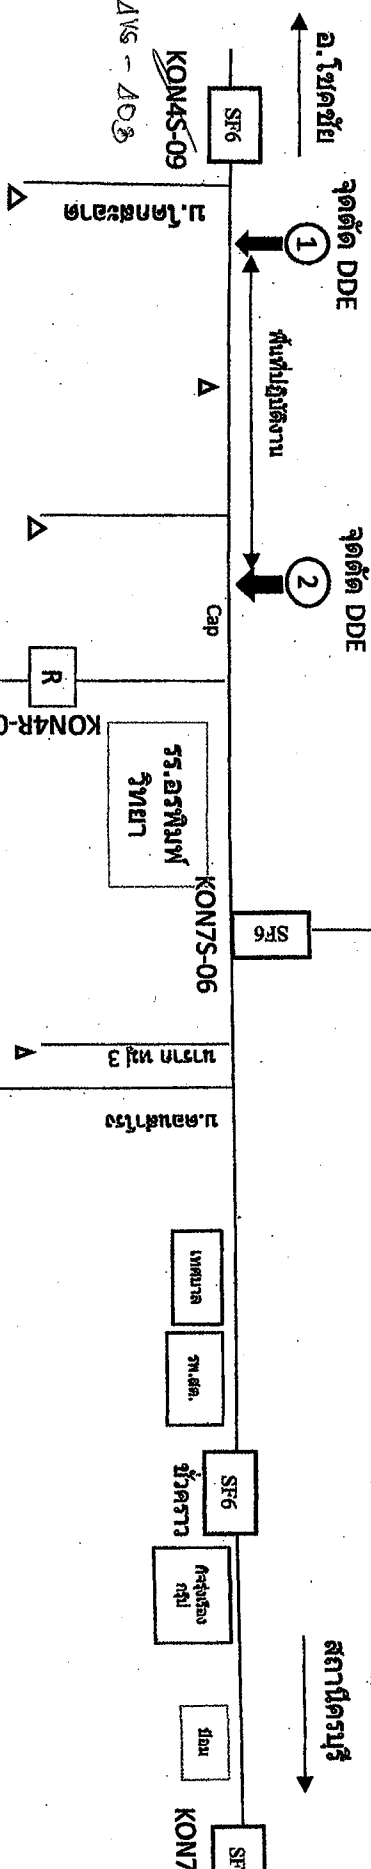

แผนผังตัวไฟวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

จุดตัดเมรก จุดที่ 1. สดทไลน กฟจ.นม.

จุดตัดเมรก จุดที่ 2. สอทไลน์ กฟจ.นม.

ปริมาณงาน - นักเสาะ 12.20 ม. จำนวน 52 ต้น/ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาะ

แบบฟอร์มกำหนดขั้นตอนการดับไฟ (Switching Order)

เพื่อปรับปรุง/ก่อสร้าง ระบบจำหน่าย 22 เควี ปีกเสา 12.20 ม. บ้านหนองเลียบอง

☒ KYT/Safety Talk เวลา..... ผู้ดำเนินการ.....
☒ Voltage detector จำนวน.....จุด, สภาพ (ปกติ/ชำรุด)..... ☐ อุปกรณ์ทำกราวด์ จำนวน.....จุด, สภาพ(ปกติ/ชำรุด).....

ผู้ประสานงานดับไฟ.....
 ผู้ควบคุมการก่อสร้าง.....

ขั้นตอนการย้ายโหลด วันที่ 22 / เม.ย. / 2564 เวลา 08.30น.-17.00น.

ขั้นตอน	การปฏิบัติงาน	รหัสอุปกรณ์, บริเวณปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน, ผู้ประสานงาน	หมายเหตุ
1	OFF AUTO	CCI08VB-01		SCADA	
2	OFF AUTO	KON04VB-01		SCADA	
3	สับ	CCI08S-07		กฟอ.ชร.	
4	ปลด+ล็อกคาน	KON4VS-403		กฟส.คบ.	
5	ปลด โหลด	จากDDE02 ถึง KON04VS-403		กฟส.คบ.	
6	ตัดเบรก	DDE02		HOTLINE นม.	มีไฟ
7	ตัดเบรก	DDE01		HOTLINE นม.	ไม่มีไฟ
8	ปลดล็อกคาน+สับ	KON4VS-403		กฟส.คบ.	
9	จ่าย โหลด	จากDDE01 ถึง KON04VS-403		กฟส.คบ.	
10	ON AUTO	CCI08VB-01		SCADA	
11	ON AUTO	KON04VB-01		SCADA	
12	ชี้แจงบริเวณไฟดับ	จาก DDE จุดB - DDE จุดA		ศกฟ.จ.3	
13	ผู้ประสานงานส่งมอบพื้นที่	จุดปฏิบัติงาน		ผู้ควบคุมงาน	ชื่อ.....
14	ตรวจสอบแรงดัน	จุดปฏิบัติงาน		ชื่อ.....	
15	ทำกราวด์ หัว-ท้าย	จุดปฏิบัติงาน		ชื่อ.....	

ปฏิบัติงานตามแผน

ขั้นตอนการคืนสภาพโหลด

ขั้นตอน	การปฏิบัติงาน	รหัสอุปกรณ์, บริเวณปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน, ผู้ประสานงาน	หมายเหตุ
16	ปลดกราวด์ หัว-ท้าย	จุดปฏิบัติงาน		ชื่อ.....	
17	ตรวจสอบแรงดัน	จุดปฏิบัติงาน		ชื่อ.....	
18	ผู้ควบคุมงานส่งมอบพื้นที่	จุดปฏิบัติงาน		ผู้ประสานงาน	ชื่อ.....
19	ชี้แจงบริเวณจุดจ่ายไฟ	จาก DDE จุดB - DDE จุดA		ศกฟ.จ.3	
20	OFF AUTO	CCI08VB-01		SCADA	
21	OFF AUTO	KON04VB-01		SCADA	
22	ปลด โหลด	จากDDE01 ถึง KON04VS-403		กฟส.คบ.	
23	ปลด+ล็อกคาน	KON4VS-403		กฟส.คบ.	
24	เชื่อมเบรก	DDE01		HOTLINE นม.	ไม่มีไฟ
25	เชื่อมเบรก	DDE02		HOTLINE นม.	มีไฟ
26	จ่าย โหลด	จากDDE02 ถึง KON04VS-403		กฟส.คบ.	
27	ปลดล็อกคาน+สับ	KON4VS-403		กฟส.คบ.	
28	ปลด	CCI08S-07		กฟอ.ชร.	
29	ON AUTO	CCI08VB-01		SCADA	
30	ON AUTO	KON04VB-01		SCADA	

(ลงชื่อ).....ผู้ออกสวิตช์จริง

ตำแหน่ง.....

13/04/65

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบสวิตช์จริง

ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติสวิตช์

(นายนิรันดร์ แนวเงินดี)

ตำแหน่ง ศกฟ.จ.3
