



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

เลขที่ ฉ.3

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงเพื่อปฏิบัติงาน

เรียน ผ.ก.ป.กฟส.อ.นครบุรี

ถึง กฟส.อ.นครบุรี

วันที่

ด้วยข้าพเจ้า นายสมจินต์ พันธุศย์ ตำแหน่ง ผ.ก.ป.ก.ก.ฉ.3 เบอร์ติดต่อ 085-0169005 มีความประสงค์ขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการ ปรับปรุง/ก่อสร้าง/รื้อถอน ระบบ จำหน่าย 22 KV / สายส่ง 115 KV บริเวณ บ้านดอนสำโรง ตามอนุมัติเลขที่ ฉ.3 กว.(ว.ร.)-829/2564 ลว. 28 พ.ค. 2564 ชื่องาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เคริ จุดแบ่งแดน อ.นครบุรี/อ.โขชัย ช่วง 1 - 2 อ.นครบุรี จ.นครราชสีมา โดยมีปริมาณงานจะดำเนินการ ดังนี้

1. ปักเสา 12.20 ม. จำนวน 23 ต้น
2. ปักเสา 14.30 ม. จำนวน 8 ต้น
3. ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา

ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. โดยมีแผนผังพื้นที่การดับกระแสไฟฟ้าโดยละเอียดตั้งเอกสารแนบทั้งนี้เวลาที่ขออนุมัติในครั้งนี้ไม่นับรวมเวลาที่จะดำเนินการ Switching ถ่ายเทโหลดก่อนและหลังการดับไฟปฏิบัติงาน หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาจะแจ้งให้ ผ.บ. และ ศพ.ฉ.3 ทราบเพื่อดำเนินจ่ายไฟคืนระบบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการขออนุมัติ ต่อไป

เรียน ผ.ก.ป.กฟส.อ.นครบุรี

ผ.ก.ป.เห็นควรอนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้

ทาง กฟ.ก.ป. น.อ.ก.ป.ก.ป. ตำแหน่ง ผ.ก.ป.ก.ก.ฉ.3 เบอร์ติดต่อ 085-0169005 ประสานงานการดับไฟ ทั้งนี้มีข้อมูลผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ใช้ไฟเฉพาะรายที่ติดตั้งหม้อแปลงรวมตั้งแต่ 300 KVA ขึ้นไป

จำนวน ราย ตามแผนผังแนบ

2. ผู้ป่วยติดเตียง ราย

3. ผู้ใช้ไฟรายสำคัญ ราย ทั้งนี้ กฟ.ก.ป.ก.ป. ได้

วางแผนบรรเทาผลกระทบดังกล่าวแล้ว

(ลงชื่อ).....

นายประจวบ ฝ่ายกระโทก ผ.ก.ป.

ที่ ๑๒๒ ค.ก.ป. 126/๒๕๖๕ ผ.ก.ป.ค.บ.

เรียน อ.ก.ป.บ.๓ (ผ.ก.ป.บ.๓)

เพื่อโปรดพิจารณาและขออนุมัติ ต่อไป

(ลงชื่อ)..... (นายสุรชาติ พร้อมจะบก,

(..... ผ.ก.ป.ค.บ.) ผ.ก.ป.กฟส.อ.นครบุรี

บันทึกการดับไฟปฏิบัติ

เริ่มดับไฟ เวลา..... น. (นาย.....ผู้แจ้ง)

แจ้งงานแล้วเสร็จ เวลา..... น. (นาย.....ผู้แจ้ง)

จ่ายไฟคืนได้ เวลา..... น. (นาย.....ผู้แจ้ง)

(ผ.ก.ป.บ.๓.๓)
เลขที่รับ 310
วันที่รับ 11 มี.ค. 2565
OMS.No. 4363426174
รหัสอุปกรณ์ KOND7S-06

ลงชื่อ.....

(นายสมจินต์ พันธุศย์)

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

เรียน อ.ก.ป.บ.๓

ผ.ก.ป.พิจารณาแล้วเห็นว่า

- ☒ สามารถดำเนินการดับไฟได้ตามเสนอ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว
- ☐ ไม่สามารถดำเนินการดับไฟได้ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายพัชราภรณ์ สาสนเทียะ) ผ.ก.ป.

ผ.ก.ป.ปฏิบัติงานแทน ผ.ก.ป.ก.ป.บ.๓

ที่ ๑๓๒ ค.ก.ป. (ค.ก.ป.) ๑๑๑/2565 1-4 มี.ค. 2565

เรียน ผ.ก.ป.กฟส.อ.นครบุรี(ผ.ก.ป.), ผ.ก.ป.กฟอ.ช.ช.(ผ.บ.),

อ.ก.ค.ฉ.๓(ผ.ร.)


☐ อนุมัติ - และให้ควบคุมการปฏิบัติงานให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าตามเวลาที่กำหนดด้วย

☐ ไม่อนุมัติดับไฟได้ตามเสนอ จึงขอให้พิจารณากำหนดแผนงานดับไฟใหม่ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวผ่อง กำมะหยี่)

อ.ก.ป.บ.๓

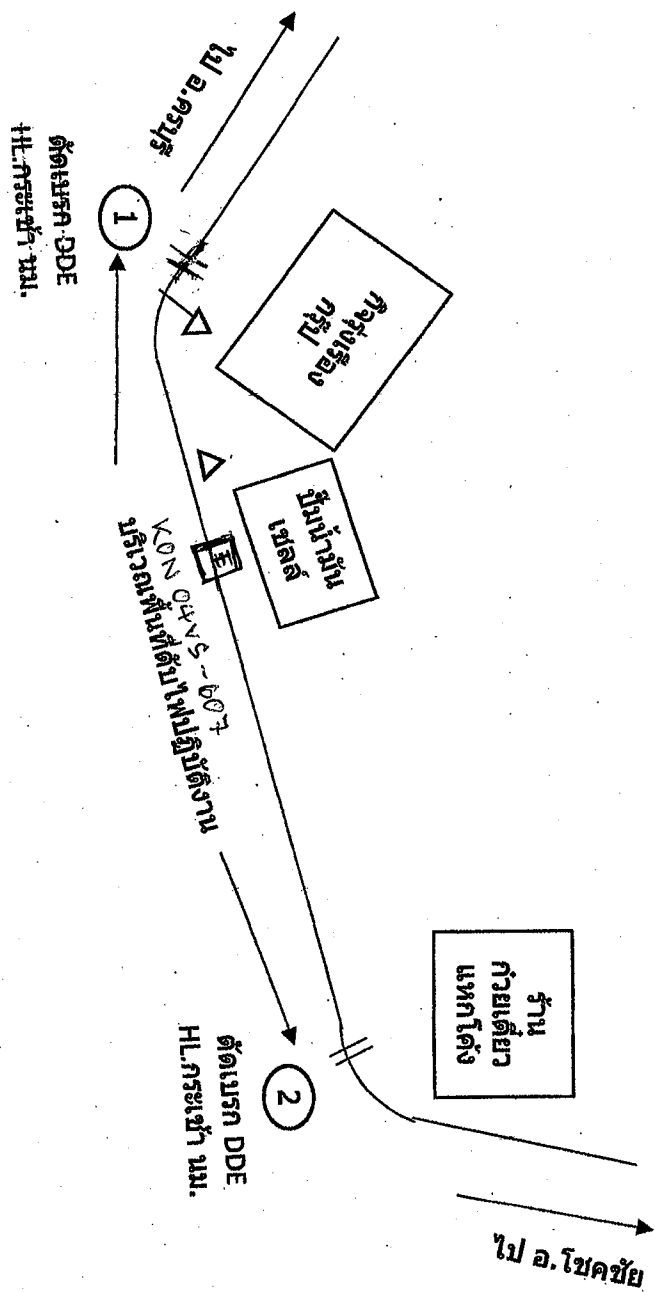

แผนผังบริเวณพื้นที่ ตำบลใหม่เจริญ วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

บริเวณไฟฟ้าดับ

จุดที่ 1 จุดตัดเบรก DDE

จุดที่ 2 จุดตัดเบรก DDE

แบบฟอร์มกำหนดขั้นตอนการดับไฟ (Switching Order)

เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย.....กฟส.คบ.วันที่..24../...มี.ค../...2565. เวลา.....08:30-...17:00..น.

E/O.....

- ☐ KYT/Safety Talk เวลา..... ผู้ดำเนินการ.....
- ☐ Voitage cletector จำนวน.....ชุด, สภาพ (ปกติ/ชำรุด)..... ☐ อุปกรณ์ทำกราวด์ จำนวน.....ชุด, (ปกติ/ชำรุด).....

ผู้ประสานงานดับไฟ.....

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง.....

หมายเหตุ.... 1.ก่อนดำเนินการสวิตซ์ชิง สับ-ปลด อุปกรณ์ ให้จัดอุปกรณ์ป้องกันอัตโนมัติ ให้ทำงานเพียงครั้งเดียว

2.ข้อควรระวังก่อนขึ้นปฏิบัติ งานทุกครั้ง

ขั้นตอนย้ายโหลดปฏิบัติงาน

ลำดับ	การปฏิบัติงาน	รหัสอุปกรณ์ / บริเวณปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน / ผู้ประสานงาน	หมายเหตุ
1	สับ	KON 07S-06		กฟส.คบ.	
2	ปลด+ล็อกคาน	KON 04VS-607		กฟส.คบ.	บีมเชลดอนกรุด
3	ลดโหลด	KON 04VS-607 ถึง DDE จุด 1		กฟส.คบ.	
4	ลดโหลด	KON 04VS-607 ถึง DDE จุด 2		กฟส.คบ.	
5	ตัดเบรก	DDE 1		HOTLINE กระเช้า นม.	มีไฟ
6	ตัดเบรก	DDE 2		HOTLINE กระเช้า นม.	มีไฟ
7	ตรวจสอบแรงดัน	จุดปฏิบัติงาน		ชื่อ.....	
8	ทำกราวด์ หัว-ท้าย	จุดปฏิบัติงาน		ชื่อ.....	
9	ชี้แจงบริเวณไฟดับ	DDE 1 ถึง DDE 2		ศจฟ.	
10	ผู้ประสานงานส่งมอบพื้นที่	จุดปฏิบัติงาน		ชื่อ.....	
11	ตรวจสอบแรงดัน	จุดปฏิบัติงาน		ชื่อ.....	
12	ทำกราวด์ หัว-ท้าย	จุดปฏิบัติงาน		ชื่อ.....	

หลังปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

13	ตรวจสอบแรงดัน	จุดปฏิบัติงาน		ชื่อ.....	
14	ปลดกราวด์ หัว-ท้าย	จุดปฏิบัติงาน		ชื่อ.....	
15	ผู้ควบคุมงานส่งมอบพื้นที่	จุดปฏิบัติงาน		ชื่อ.....	
16	ชี้แจงบริเวณไฟดับ	DDE 1 ถึง DDE 2		ศจฟ.	
17	ตรวจสอบแรงดัน	จุดปฏิบัติงาน		ชื่อ.....	
18	ปลดกราวด์ หัว-ท้าย	จุดปฏิบัติงาน		ชื่อ.....	
19	เชื่อมเบรก	DDE 2		HOTLINE กระเช้า นม.	มีไฟ
20	เชื่อมเบรก	DDE 1		HOTLINE กระเช้า นม.	มีไฟ
21	จ่ายโหลด	KON 04VS-607 ถึง DDE จุด 2		กฟส.คบ.	
22	จ่ายโหลด	KON 04VS-607 ถึง DDE จุด 1		กฟส.คบ.	
23	ปลดล็อกคาน+สับ	KON 04VS-607		กฟส.คบ.	บีมเชลดอนกรุด
24	ปลด	KON 07S-06		กฟส.คบ.	

(ลงชื่อ).....ผู้ออกสวิตซ์ชิง (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบสวิตซ์ชิง

(นายภูษาดิ พรหมเงิน)

ตำแหน่ง.....

(นายธนากร คงอ่ำ)

ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติสวิตซ์ชิง

(นายชัชวาลย์ สาสน์เที่ยง)

ตำแหน่ง.....
