



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง.....
เลขที่

ถึง ทผ.กป.คบ.....
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566..

เรื่อง ขออนุมัติดัดกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV. ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 4 และ 6 สฟ.ครบุรี.
เรียน ทผ.กป.คบ...

ด้วยข้าพเจ้า นาย สมศักดิ์ พยัฆกาฬ ตำแหน่ง พชง.ผกป.คบ. เบอร์ติดต่อ 085-0004151 มีความประสงค์ขอตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการ ปรับปรุง/ก่อสร้าง ระบบ จำหน่าย 22 kv โล้นฟีดเดอร์ 4 และ 6 สฟ.ครบุรี บริเวณ บ้านโนนทอง ต.แซะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ตามอนุมัติเลขที่ ฉ.๓ กวว.(ปร.) ๑๖๕๕/๒๕๖๕ ลว. ๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ โดยมีปริมาณงานจะดำเนินการ ดังนี้

1. บักเสว คอ. ขนาด 14.30 ม. พร้อมอุปกรณ์หัวเสาจำนวน 3 ต้น และ เสว คอ. ขนาด 12.20 จำนวน 1 ต้น
2. ร้อยถอนเสว คอ. ขนาด 14.30 ม. พร้อมอุปกรณ์หัวเสาจำนวน 3 ต้น และ เสว คอ. ขนาด 12.20 จำนวน 1 ต้น
3. ร้อยถอนสาย 185 PIC จำนวน 6 เส้น 2 วงจร และ พวดสาย 185 SAC จำนวน 6 เส้น 2 วงจร

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. โดยมีแผนผังพื้นที่การดัดกระแสไฟฟ้าโดยละเอียดตั้งเอกสารแนบทั้งนี้เวลาที่ขออนุมัติในครั้งนี้ไม่นับรวมเวลาที่จะดำเนินการ Switching ถ่ายเทโหลดก่อนและหลังการดับไฟปฏิบัติงาน หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาจะแจ้งให้ ผ.บ. และ ศจพ.๓ ทราบเพื่อดำเนินจ่ายไฟคืนระบบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการขออนุมัติ ต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายสมศักดิ์ พยัฆกาฬ)

พชง.ผกป.คบ.

เรียน ผจก.กฟส.คบ.

ผ.บ. / กป. เห็นควรอนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้ นาย

สมศักดิ์ พยัฆกาฬ ตำแหน่ง พชง.ผกป. เบอร์ติดต่อ 085-0004151 ประสานงานการดับไฟ ทั้งนี้มีข้อมูลผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ใช้ไฟเฉพาะรายที่ติดตั้งหม้อแปลงรวมตั้งแต่ 300 KVA ขึ้นไป

จำนวน..... ราย ตามแผนผังแนบ

2. ผู้ป่วยติดเตียง ราย

3. ผู้ใช้ไฟรายสำคัญ ราย ทั้งนี้ กฟพ..... ได้วางแผน

บรรเทาผลกระทบดังกล่าวแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายประจวบ ฝ่ายกระโทก) ทผ.กป.คบ.

เรียน อ.ก.บ.๓

ผคพ.พิจารณาแล้วเห็นว่า

- ☒ สามารถดำเนินการดับไฟได้ตามเสนอ พร้อมได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว
- ☐ ไม่สามารถดำเนินการดับไฟได้ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนาม ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายธีรณันท์ แนวเงินดี) ทผ.คพ.

ทผ.คพ.กป.๓

ที่ ๓.๓ กป. (คพ.) 486/2566 - 8 ก.พ. 566

เรียน ผจก.กฟพ.คบ.

☒ อนุมัติ - และให้ควบคุมการปฏิบัติงานให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าตามเวลาที่กำหนดด้วย

☐ ไม่อนุมัติดับไฟได้ตามเสนอ จึงขอให้พิจารณาก่อนแผนงานดับไฟใหม่ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายวีรเทพ พงศ์ศรีเพียร)

อ.ก.บ.๓
ร.ก.บ.๓ ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.๓

ที่ ๓.๓ คพ. ๔๘๖/๒๕๖๖

เรียน อ.ก.บ.๓ (ผคพ.กป.๓)

เพื่อโปรดพิจารณาและขออนุมัติ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายสุรชาติ พร้อมจะบก) ผจก.กฟส.คบ.

บันทึกการดับไฟปฏิบัติ


เริ่มดับไฟ เวลา..... น. (นาย.....) ผู้แจ้ง

แจ้งงานแล้วเสร็จ เวลา..... น. (นาย.....) ผู้แจ้ง

จ่ายไฟคืนได้ เวลา..... น. (นาย.....) ผู้แจ้ง

บริเวณ บ้านโนนทอง ต.แม่ อ.กรบุรี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
เพื่อข้ายแนวนสถานีศึกษาทางานขยายถนนและทำจุดกัปรต

- หมายเหตุ
1. จุดทางแยกระหว่าง จุดตัดบรค A และ B
 2. ไลน์ KON 4 ฝั่งตะวันออก KON 04S-04 ถึง จุดตัดบรค A
 4. ไลน์ KON 6 ฝั่งตะวันออก จุดตัดบรค B ถึง KON06S-05
 5. ไลน์ KON 6 ฝั่งฟอก บรคเกอร์ สฟ. KON 6 ถึง B
 6. ไลน์ KON 4 ฝั่งฟอกบรคเกอร์ ที่ จุดตัดบรค A

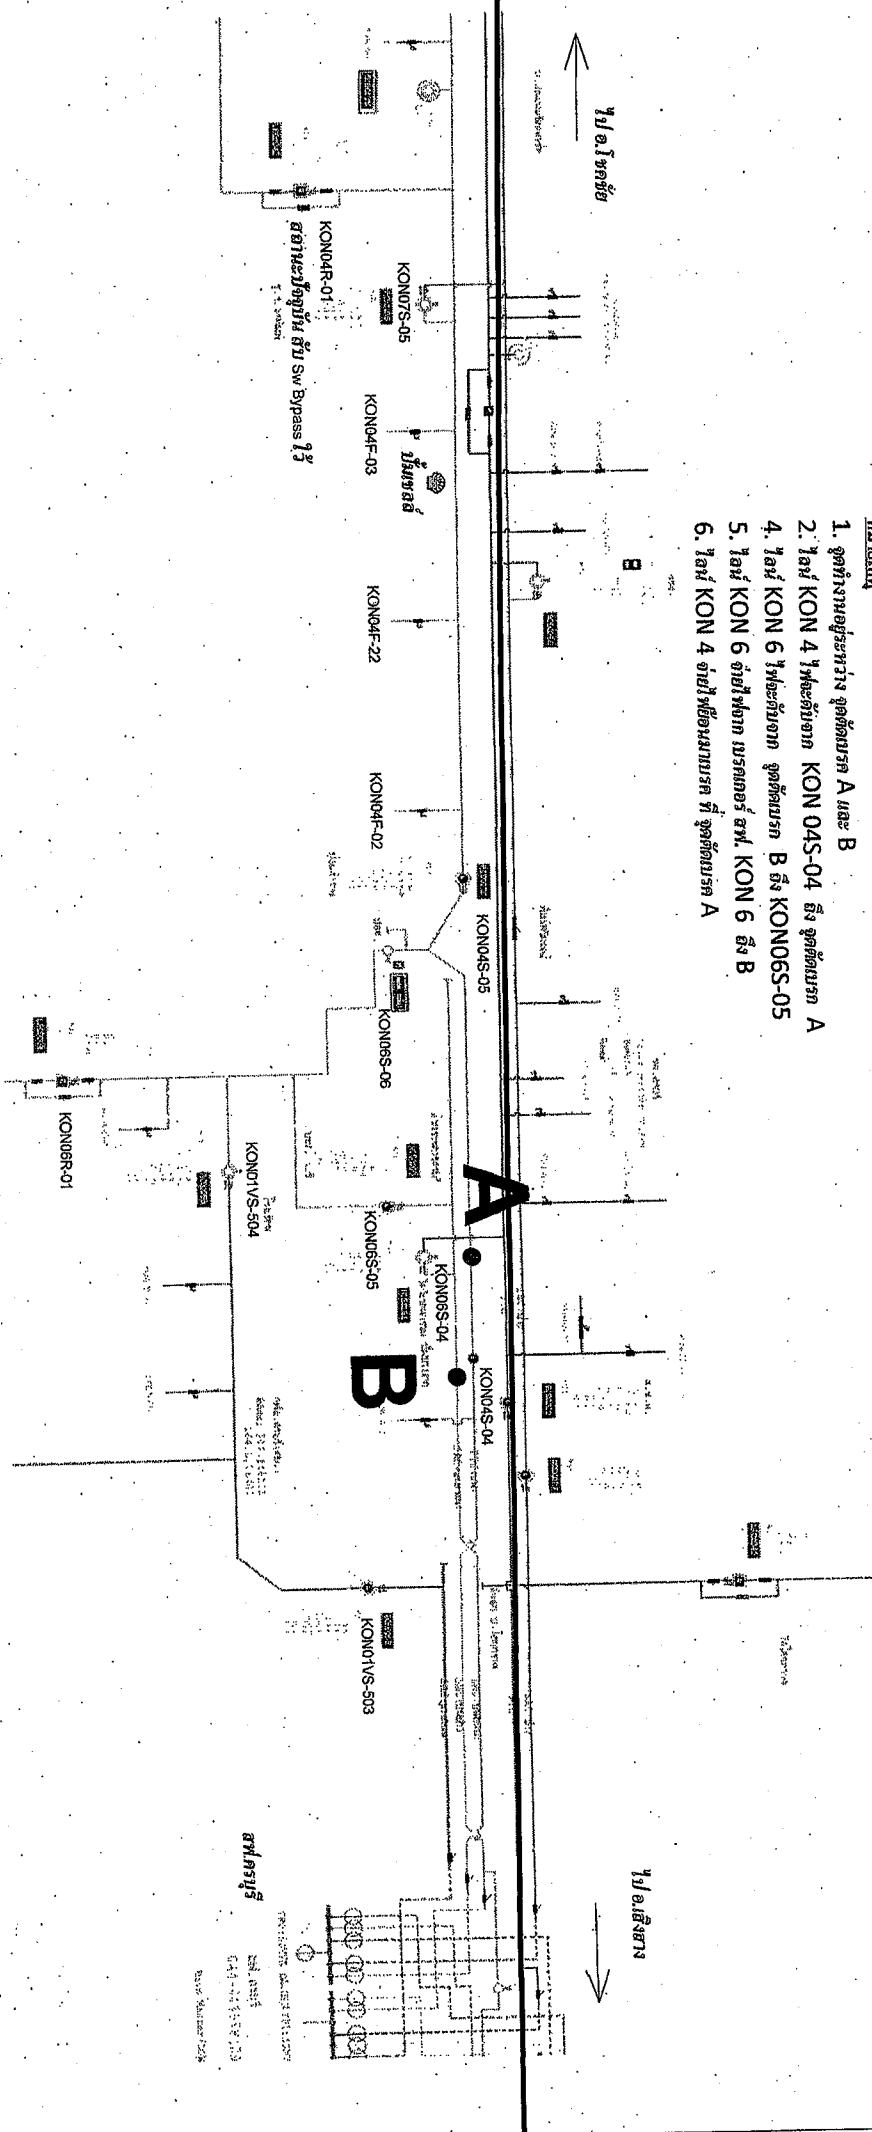

ด 6-7

แบบฟอร์มกำหนดขั้นตอนการดับไฟ (Switching Order)

เพื่อให้ กฟส.ครบุรี ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ บ้านโนนทอง วันที่ 10 ก.พ. 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.

E/Oตรวจสอบ					
☐ KYT/Safety Talk เวลา..... ผู้ดำเนินการ..... ☐ Voltage detector จำนวน ชุด ,สภาพ (ปกติ/ชำรุด)..... ☐ อุปกรณ์ทำกราวด์ จำนวน ชุด ,สภาพ (ปกติ/ชำรุด).....					
ผู้ประสานงานดับไฟ.....					
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง.....นายสมศักดิ์ พัยภาพ.....085-0004151.....					
ที่	การปฏิบัติงาน	รหัสอุปกรณ์	เวลา	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	หมายเหตุ
1	OFF-AUTO	KON01,4,6,7VB-01		ศูนย์โคราช	
2	สับ	KON01VS-504		ศูนย์โคราช	
3	ปลด+ล๊อคคาน	KON06S-05		กฟส.คบ.	
4	ล๊อคคาน	KON06S-06		กฟส.คบ.	
5	สับ	KON07S-06		ศูนย์โคราช	
6	ปลด+ล๊อคคาน	KON04S-05		กฟส.คบ.	
7	ปลด+ล๊อคคาน	KON04S-04		กฟส.คบ.	
8	ปลด	KON06VB-01		ศูนย์โคราช	
9	ปลด	KON06VS-101		กฟส.คบ.	
ชี้แจงบริเวณไฟดับ KON04 ไฟดับจากKON04S-04 ถึง KON04S-05, KON06S-06 พนักงาน ศจพ.ฉ.3 เวลา.....					
ชี้แจงบริเวณไฟดับ KON06 ไฟดับจากKON06VS-101 ถึง KON06S-05 พนักงาน ศจพ.ฉ.3 เวลา.....					
ชี้แจงบริเวณไฟดับเพื่อส่งมอบพื้นที่โดย(ผู้ประสานงานดับไฟ).....ให้(ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง)เวลา.....					
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบแรงดันจุดตัดเบรก A,B เวลา.....ผู้แจ้ง.....เวลา..... ผลการตรวจสอบ (มีไฟ / ไม่มีไฟ)					
ทำกราวด์พร้อมหัว-ท้าย จุดตัดเบรก A,Bเวลา.....ผู้แจ้ง.....เวลา.....					
10	ตัดเบรก	จุด A		กฟส.คบ.	KON04
11	ตัดเบรก	จุด B		กฟส.คบ.	KON06
ปลดกราวด์พร้อมหัว-ท้าย จุดตัดเบรก A,Bเวลา.....ผู้แจ้ง.....เวลา.....					
12	สับ	KON06VS-101		กฟส.คบ.	
13	สับ	KON06VB-01		ศูนย์โคราช	
14	ปลดล๊อคคาน+สับ	KON04S-05		กฟส.คบ.	
15	ON-AUTO	KON01,4,6,7VB-01		ศูนย์โคราช	
ชี้แจงบริเวณไฟดับ KON04 ไฟดับจากKON04S-04 ถึง จุดตัดเบรก จุด A พนักงาน ศจพ.ฉ.3 เวลา.....					
ชี้แจงบริเวณไฟดับ KON06 ไฟดับจาก จุดตัดเบรก จุด B ถึง KON06S-05 พนักงาน ศจพ.ฉ.3 เวลา.....					
ชี้แจงบริเวณไฟดับเพื่อส่งมอบพื้นที่โดย(ผู้ประสานงานดับไฟ).....ให้(ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง)เวลา.....					
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบแรงดันจุดปฏิบัติงานเวลา.....ผู้แจ้ง.....เวลา..... ผลการตรวจสอบ (มีไฟ / ไม่มีไฟ)					
ทำกราวด์พร้อมหัว-ท้าย จุดปฏิบัติงานเวลา.....ผู้แจ้ง.....เวลา.....					

ขั้นตอนคืนสภาพโหลด

(ผู้ควบคุมงานก่อสร้างชี้แจงผลการปฏิบัติงานให้ (ผู้ประสานงานดับไฟ)เวลา.....

ผู้ประสานงานดับไฟ.....ตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน เวลา.....- เวลา..... ผลการตรวจสอบ

ปลดกราวด์พร้อมหัว-ท้าย จุดปฏิบัติงาน เวลา.....ผู้แจ้ง.....เวลา.....

ชี้แจงบริเวณไฟดับ KON04 ไฟดับจากKON04S-04 ถึง จุดตัดเบรก จุด A พนักงาน ศจฟ.ฉ.3 เวลา.....

ชี้แจงบริเวณไฟดับ KON06 ไฟดับจาก จุดตัดเบรก จุด B ถึง KON06S-05 พนักงาน ศจฟ.ฉ.3 เวลา.....

16	OFF-AUTO	KON01,4,6,7VB-01		ศูนย์โคราช	
17	ปลด	KON06VS-101		กฟส.คบ.	
18	ปลด	KON06VB-01		ศูนย์โคราช	
19	ปลด+ล๊อคคาน	KON04S-05		กฟส.สสง.	

ชี้แจงบริเวณไฟดับ KON04 ไฟดับจากKON04S-04 ถึง KON04S-05, KON06S-06 พนักงาน ศจฟ.ฉ.3 เวลา.....

ชี้แจงบริเวณไฟดับ KON06 ไฟดับจากKON06VS-101 ถึง KON06S-05 พนักงาน ศจฟ.ฉ.3 เวลา.....

ชี้แจงบริเวณไฟดับเพื่อส่งมอบพื้นที่โดย(ผู้ประสานงานดับไฟ).....ให้(ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง)เวลา.....

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบแรงดันจุดตัดเบรก A,B เวลา.....ผู้แจ้ง.....เวลา..... ผลการตรวจสอบ (มีไฟ / ไม่มีไฟ)

ทำการกราวด์พร้อมหัว-ท้าย จุดตัดเบรก A,Bเวลา.....ผู้แจ้ง.....เวลา.....

20	เชื่อมต่อเบรก	จุด A		กฟส.คบ.	KON04
21	เชื่อมต่อเบรก	จุด B		กฟส.คบ.	KON06

ปลดกราวด์พร้อมหัว-ท้าย จุดตัดเบรก A,Bเวลา.....ผู้แจ้ง.....เวลา.....

22	ล๊ับ	KON06VS-101		กฟส.คบ.	
23	ล๊ับ	KON06VB-01		ศูนย์โคราช	
24	ล๊ับ	KON04S-04		กฟส.คบ.	
25	ปลดล๊อคคาน+ล๊ับ	KON04S-05		กฟส.คบ.	
26	ปลด	KON07S-06		ศูนย์โคราช	
27	ปลดล๊อคคาน+ล๊ับ	KON06S-05		กฟส.คบ.	
28	ปลด	KON01VS-504		ศูนย์โคราช	
29	ปลดล๊อคคาน	KON06S-06		กฟส.คบ.	
30	ON-AUTO	KON01,4,6,7VB-01		ศูนย์โคราช	

จบขั้นตอนการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ออกสวิตชิง

(นายระพีพงษ์ กลอนทอง) 06/02/66

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบสวิตชิง

(นายอำนาจ ฤทธิ์โสภณ) 06/02/66

(ลงชื่อ).....หม.คฟ.กปบ.ฉ.3

(นายนิรันดร์ แนวเงินดี)

หม.คฟ.กปบ.ฉ.3
