

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
เลขที่ ๓.3

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงเพื่อปฏิบัติงาน

เรียน ทผ.กบ.กฟส.อ.นครบุรี

ด้วยข้าพเจ้า นายสมจินต์ พันธบุศย์ ตำแหน่ง ผช.น.8 กกค.๓.3 เบอร์ติดต่อ 085-0169005 มีความประสงค์ขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการ ปรับปรุง/ก่อสร้าง/รีดถอน ระบบ จำนวน 22 KV / สายส่ง 115 KV บริเวณตรงข้าม บ.บึงมันเจนนอร์ธ สตาร์ช ตามอนุมัติเลขที่ ๓.3 กว. (ว.ร.)-829/2564 ลว. 28 พ.ค. 2564 ชื่องาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เครวี จุดแบ่งแดน อ.นครบุรี/อ.โขงชัย ช่วง 1 - 2 อ.นครบุรี จ.นครราชสีมา โดยมีปริมาณงานจะดำเนินการ ดังนี้

1. รีดถอนสายอลูมิเนียมเบสโยย ต.มม. เปลี่ยน เป็นสายเคเบิลอากาศ 185 ต.มม. ปริมาณ 1.00 วงจร-กม.
2. รีดถอนเสา 14.00 ม. จำนวน 18 ต้น
3. รีดถอน/ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา

ในวันที่ 4 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. โดยมีแผนผังพื้นที่การดับกระแสไฟฟ้าโดยละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งนี้เวลาที่ขออนุมัติในครั้งนี้ไม่นับรวมเวลาที่จะดำเนินการ Switching ถ่ายเทโหลดก่อนและหลังการดับไฟปฏิบัติงาน หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาจะแจ้งให้ ฝปบ. และ ศกฟ.๓.3 ทราบเพื่อดำเนินจ่ายไฟคืนระบบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการขออนุมัติ ต่อไป

เรียน ผ.จก.กฟส.อ.นครบุรี

ผกบ.เห็นควรอนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้

..... ตำแหน่ง..... เบอร์ติดต่อ.....
..... ประสานงานการดับไฟ ทั้งนี้มีข้อมูลผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ใช้ไฟเฉพาะรายที่ติดตั้งหม้อแปลงรวมตั้งแต่ 300 KVA ขึ้นไป

จำนวน ราย ตามแผนผังแนบ

2. ผู้ป่วยติดเตียง ราย

3. ผู้ใช้ไฟรายสำคัญ ราย ทั้งนี้ กฟส. ได้

วางแผนบรรเทาผลกระทบดังกล่าวแล้ว

(ลงชื่อ)..... นายสุเทพ เนื่องกระโทก

ขณ.กบ.คณ. ปฏิบัติงานแทน ทผ.กบ.คณ.

ที่ ๓.๓ คก. (กบ.) ๖๓๑/๒๕๖๖

เรียน อ.ก.บ.๓.๓ (ผค.กบ.๓.๓)

เพื่อโปรดพิจารณาและขออนุมัติ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายสมจินต์ พันธบุศย์) ผจก.กฟส.อ.นครบุรี

บันทึกการดับไฟปฏิบัติงาน

เริ่มดับไฟ เวลา..... น. (นาย.....) ผู้แจ้ง

แจ้งงานแล้วเสร็จ เวลา..... น. (นาย.....) ผู้แจ้ง

จ่ายไฟคืนได้ เวลา..... น. (นาย.....) ผู้แจ้ง

(ผค.กบ.๓.๓.๓.๓)

เลขที่รับ ๓.๓.๐๒๓๐

วันที่รับ ๒๐ ก.พ. ๖๖

OMS.No. 4622130089

รหัสอุปกรณ์ KONO4VB-01

ถึง กฟส.อ.นครบุรี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ลงชื่อ.....

(นายสมจินต์ พันธบุศย์)

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

เรียน อ.ก.บ.๓.๓

ผค.พิจารณาแล้วเห็นว่า

- ☒ สามารถดำเนินการดับไฟได้ตามเสนอ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว
- ☐ ไม่สามารถดำเนินการดับไฟได้ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายนิรันดร์ นวนเงินดี).....) ทผ.คพ.

ที่ ๓.๓ กบ.๓.๓.๓.๓

เรียน ผจก.กฟส.อ.นครบุรี(ผกบ.), ผจก.กฟอ.ชช.(ฝปบ.),

อ.ก.ค.๓.๓(ผกร.)


☒ อนุมัติ - และให้ควบคุมการปฏิบัติงานให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าตามเวลาที่กำหนดด้วย

☐ ไม่อนุมัติดับไฟได้ตามเสนอ จึงขอให้พิจารณากำหนดแผนงานดับไฟใหม่ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสายฝน กำมะหยี่)

อ.ก.บ.๓.๓

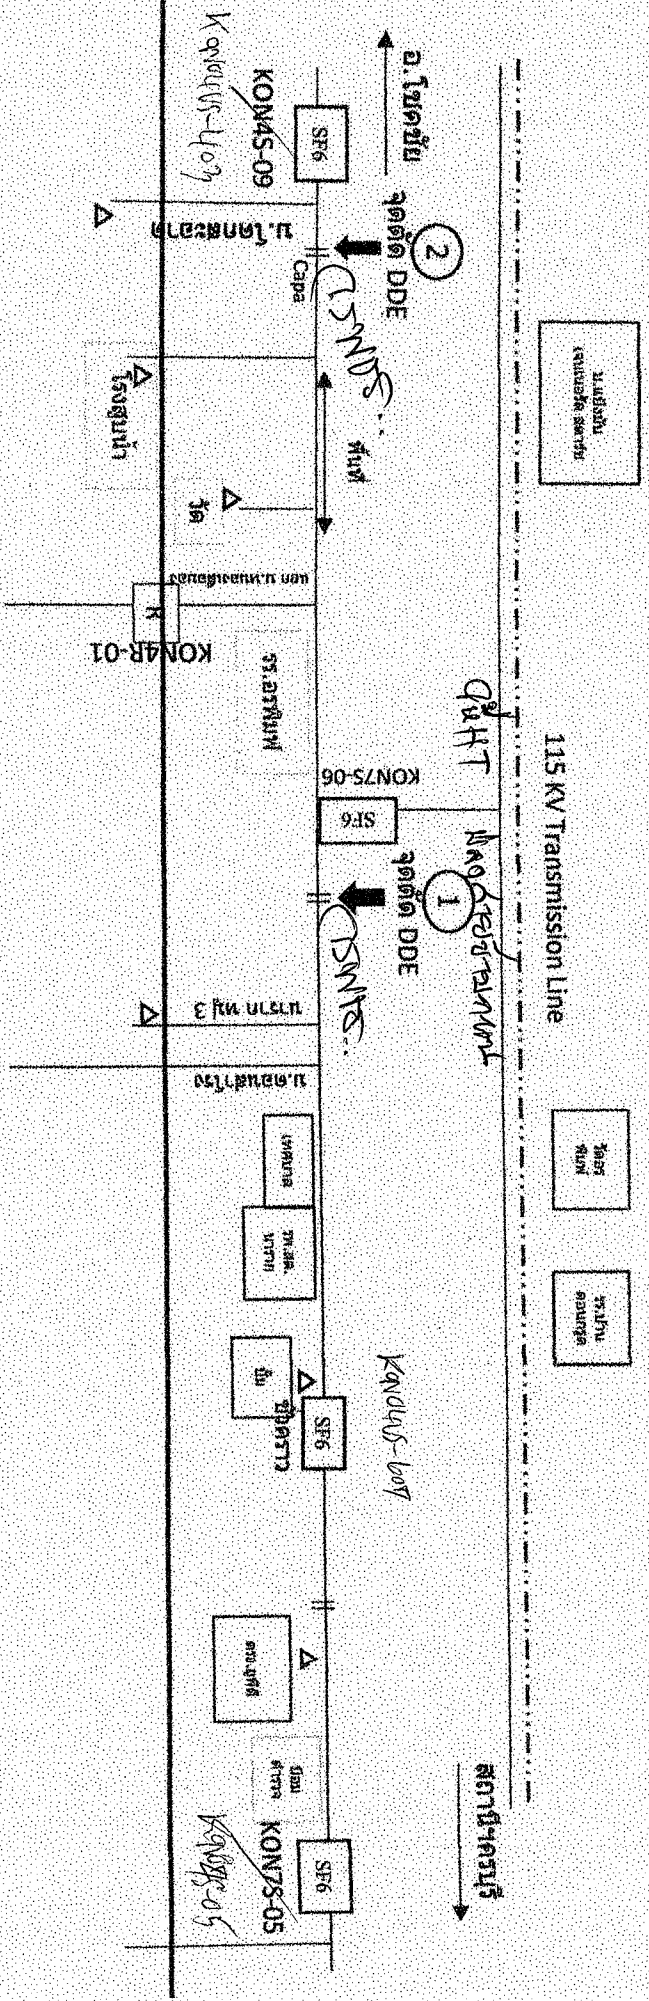

แผนผังระบบไฟฟ้าแรงดัน 115 KV เชนวอศ. สาขา
 จุดตัด 1. DDE ก่อนถึง รร. อรพินพ
 จุดตัด 2. DDE ต้นโรงโกลสเซอร์ (เดิม)
 ปริมาณงาน - รื้อถอนสายลวดเดิมและเปลี่ยนสายใหม่ 185 ต.ม.น. ประมาณ 1.00 กม.
 - พาดสาย SAC 185 ต.ม.น. ประมาณ 1.00 วงจร-กม.
 - รื้อถอนเสา 14.00 ม. จำนวน 18 ต้น พร้อมอุปกรณ์เกี่ยวหัวเสา

แบบฟอร์มกำหนดขั้นตอนการดับไฟ (Switching Order)

การไฟฟ้า (กคค.ฉ.3) นายสมจินต์ พันธุบุศย์ เพื่อ...ปรับปรุงและก่อสร้าง ระบบ 22 เครวี วันที่ 4 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

EO.....เป็นผู้ตรวจสอบ

☐ KYT / Safety Talk เวลา.....ผู้ดำเนินการ.....

☐ Voltage Detector จำนวน.....ชุด , สภาพ (_ ปกติ / _ ชำรุด) ☐ อุปกรณ์ทำกราวด์ จำนวน.....ชุด , สภาพ (_ ปกติ / _

ผู้ประสานงานดับไฟ.....

ขั้นตอน	การปฏิบัติงาน	รหัสอุปกรณ์	เวลา	หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
ขั้นตอนย้ายโหลด					
1	OFF AUTO	KON04VB-01		ศจฟ.ฉ.3	
2	OFF AUTO	CCI08VB-01		ศจฟ.ฉ.3	
3	OFF AUTO	KON07VB-01		ศจฟ.ฉ.3	
4	สับ	POU03S-21		ศจฟ.ฉ.3	
5	ปลด	KON04R-01		ครบุรี	
6	ปลด	KON04S-08		ครบุรี	SW.LOAD
7	สับ	CCI08S-07		โชคชัย	
8	ปลด	KON04VS-403		ครบุรี	
9	ปลด	KON04VS-607		ครบุรี	SF6ชั่วคราว บั้ม SHELL บ.ดอนกรูด
10	ปลด สายข้ามถนน สนามบาสเกตบอล ร.ร.อรพิมพ์			ฮอทไลน์กระเช้า	KON07
11	ชี้แจงบริเวณไฟดับเพื่อ ปฏิบัติงาน จาก KON04VS-607 ถึง KON04VS-403 พนักงาน ศจฟ.....				
12	ชื่อผู้ประสานงาน.....เวลา.....				
13	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ทำกราวด์จุดปฏิบัติงาน ผู้แจ้ง.....เวลา.....				
14	ตัด DDE	จุดที่ 1		ครบุรี	
15	ตัด DDE	จุดที่ 2		ครบุรี	
16	ปลดกราวด์ หัว-ท้าย ผู้แจ้ง.....เวลา.....				
17	สับ	KON04VS-607		ครบุรี	SF6ชั่วคราว บั้ม SHELL บ.ดอนกรูด
18	สับ	KON04VS-403		ครบุรี	
19	ON AUTO	KON04VB-01		ศจฟ.ฉ.3	
20	ON AUTO	CCI08VB-01		ศจฟ.ฉ.3	
21	ON AUTO	KON07VB-01		ศจฟ.ฉ.3	

ขั้นตอนหลังปฏิบัติงานแล้วเสร็จ					
22	(ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง).....ชี้แจงผลการปฏิบัติงานให้ (ผู้ประสานงานดับไฟ).....เวลา.....				
ขั้นตอนย้ายโหลด ปลดกราวด์ จุดปฏิบัติงาน ผู้แจ้ง.....เวลา.....					
24	OFF AUTO	KON04VB-01		ศจพ.ฉ.3	
25	OFF AUTO	CCI08VB-01		ศจพ.ฉ.3	
26	OFF AUTO	KON07VB-01		ศจพ.ฉ.3	
27	ปลด	KON04VS-403		ครบุรี	
28	ปลด	KON04VS-607		ครบุรี	SF6ชั่วคราว บีม SHELL บ.ดอนกรุด
29	เชื่อมสายข้ามถนน สนามบาสเกตบอล ร.ร.อรพิมพ์			ขอทไลน์กระเช้า	KON07
30	ชี้แจงบริเวณไฟดับเพื่อ ปฏิบัติงาน จาก KON04VS-607 ถึง KON04VS-403 พนักงาน ศจพ.....				
31	ชื่อผู้ประสานงาน.....เวลา.....				
32	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ทำกราวด์จุด DDE 1,2 ผู้แจ้ง.....เวลา.....				
33	เชื่อม DDE	จุดที่ 1		ครบุรี	
34	เชื่อม DDE	จุดที่ 2		ครบุรี	
35	ปลดกราวด์ หัว-ท้าย ผู้แจ้ง.....เวลา.....				
36	สับ	KON04VS-607		ครบุรี	SF6ชั่วคราว บีม SHELL บ.ดอนกรุด
37	สับ	CCI08S-07		โชคชัย	
38	สับ	KON04S-08		ครบุรี	SW LOAD
39	สับ	KON04R-01		ครบุรี	
40	ปลด	POU03S-21		ศจพ.ฉ.3	
41	ON AUTO	KON04VB-01		ศจพ.ฉ.3	
42	ON AUTO	CCI08VB-01		ศจพ.ฉ.3	
43	ON AUTO	KON07VB-01		ศจพ.ฉ.3	

ข้อมูล DMS20/02/2566

(ลงชื่อ)..... (นายวรพชร ศุภพันธุ์) พง. ผคพ.ฉ.3 วันที่ 20/02/2566

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจทานสวิตซ์

(ลงชื่อ)..... (นายนิรันดร์ แนวเงินดี) ผู้อนุมัติสวิตซ์

ทผ.คพ.กปน.ฉ.3
