

องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน

ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2560

แผนงาน เคหะและชุมชน (00240)

งาน ไฟฟ้าถนน

เลขที่ผู้เบิก ช. 119 /2560

วันที่จัดทำ 30 มิ.ย. ๒๕๖๐

หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

เลขที่คลังรับ 682 /2560

วันที่คลังรับ 30 มิ.ย. ๒๕๖๐

รายการ

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

มูลค่าสินค้าหรือบริการ

บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จำนวนเงินที่ขอเบิก

หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ค่าปรับ

อื่นๆ (เช่น เงินประกันผลงาน, เงินล่วงหน้า)

จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ

258,000

-

258,000

2,580

255,420

- ขอเบิกเงินค่าจ้างเหมา
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7,9
- (รายละเอียดเบิกเงินปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

(ตัวอักษร)

(-สองแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน-)

หน่วยงานผู้เบิก กองช่าง

ขอเบิกจ่ายตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นายจตุรงค์ พุ่มท่ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 30 มิ.ย. ๒๕๖๐

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

แหล่งเงินที่ขอเบิก คงเหลืออยู่มา คงเหลือยกไป

- 260,000.00 2,000.00

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ขาวจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 30 มิ.ย. ๒๕๖๐

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา

(นางเบญจมาศ วรรณศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. ๒๕๖๐

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นางเบญจมาศ วรรณศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. ๒๕๖๐

เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น

เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นางวิภากรัตน์ นาคทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน

วันที่ 30 มิ.ย. ๒๕๖๐

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

จำนวน 258,000.00 บาท

(ลงชื่อ).....

(นายสายชล ฉิมพาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน

วันที่ 30 มิ.ย. ๒๕๖๐

ธนาคาร ธกส.สาขาบางระจัน บัญชีเลขที่ 269-5-00008-4

เลขที่เช็ค 21788007 ลงวันที่ 30 มิ.ย. ๒๕๖๐

จำนวนเงิน 255,420.00 บาท (-สองแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน-)

ถ่ายให้ นางสาวชมภู ทองสุวรรณ

ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

(ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม

การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่

ลงวันที่ 30 มิ.ย. ๒๕๖๐



ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทองสุวรรณก่อสร้าง

ที่อยู่ เลขที่ ๕๒/๒ หมู่ ๘

ตำบลโคกช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี ๓๒๑๒๐

โทรศัพท์ ๐๘๕๒๔๐๕๐๕๐

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๓๒๐๒๐๐๓๔๕๒๓๕

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อบัญชี

ธนาคาร

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ ๕๘/๒๕๖๐

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิกั่น

ที่อยู่ - ตำบลพิกั่น อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

โทรศัพท์ ๐๓๖๘๕๕๐๓๘

ตามที่ ทองสุวรรณก่อสร้าง ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลพิกั่น ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ/จ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บริเวณลาดยาง ถึงบ้านนางพิสมัย หมู่ที่ ๙ บริเวณบ้านนายสมหวัง ถึงบ้านนายศรีม ไม้ลา ตำบลพิกั่น อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	๑	โครงการ	๒๕๘,๐๐๐.๐๐	๒๕๘,๐๐๐.๐๐
(สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๒๕๘,๐๐๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑๖,๘๗๕.๕๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๗๔,๘๗๕.๕๐

การซื้อ/สั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
- สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนตำบลพิกั่น -
- ระยะเวลาประกัน ๒ ปี
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของราคาสั่งของที่ยังไม่ได้รับมอบแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

หมายเหตุ :

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งซื้อ/จ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๐๐๖๕๐๖๐๗๘๕ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บริเวณ
ลาดยาง ถึง บ้านนางพิสมัย และ หมู่ที่ ๙ บริเวณบ้านนายสมหวัง ถึงบ้านนายศรีม ไม้ลา ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธี
ตกลงราคา

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ/สั่งจ้าง

(นายสายชล นิมพาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....ผู้รับ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

(นางสาวชนฎ ทองสุวรรณ)

เจ้าของกิจการ

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

เลขที่โครงการ 60065060785

เลขค้ำสัญญา 600614293115



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตาม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บริเวณลาดยาง ถึง บ้านนางพิสมัย
ตำบลพัททัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำ
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ใน
ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภทไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือเงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของ
หน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน จึงขอ
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างใน
งานจ้างก่อสร้างผู้ใดจะคัดค้านราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นนี้ให้ยื่นเรื่องคัดค้านภายใน ๗ วัน ตั้งแต่วันที่
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บริเวณลาดยาง ถึง บ้านนางพิสมัย ตำบลพัททัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๙,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บริเวณลาดยาง ถึง บ้านนางพิสมัย ตำบลพัททัน
อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผิวทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร ราคากลาง ๑๒๙,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) นั้น
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๒๙,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - a. แบบ ป.ร.๔
 - b. แบบ ป.ร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสายชล ฉิมพาลี นายกององค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน
 - ๖.๒ นางรัฐกานต์ นาคทอง ปลัด อบต. พัททัน
 - ๖.๓ นายจตุรงค์ พุ่มห่วย ผู้อำนวยการกองช่าง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายสายชล ฉิมพาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บริเวณลาดยาง ถึง บ้านนางพิสมัย ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๙,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บริเวณลาดยาง ถึง บ้านนางพิสมัย ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผิวกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร ราคากลาง ๑๒๙,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) นั้น
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๒๙,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสายชล นิมพาลี นายกององค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน
 - ๖.๒ นางรัฐกานต์ นาคทอง ปลัด อบต. พักทัน
 - ๖.๓ นายจตุรงค์ พุ่มหวัง ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บริเวณถนนลาดยาง ถึง บ้านนางพิสมัย ตำบลพัททัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ราคางานต้นทุนต่อหน่วย

(ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร)

1.1 CLEARING AND GRUBBING

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ ☐ เบา ☐ กลาง ☐ หนัก

กรอกเฉพาะตารางช่องสี่เหลี่ยม

ค่าดำเนินการ+ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 1.39 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.39 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานถางป่าขุดถอนขนาดเล็ก มีเฉพาะการถางวัชพืชเท่านั้น
งานถางป่าขุดถอนขนาดกลาง มีเฉพาะการถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
งานถางป่าขุดถอนขนาดใหญ่ มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดต่อ ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

1.2 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

ลูกรัง 10 ซม. = 8.58 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 8.58 บาท/ตร.ม.

2.1(1) SOIL AGGERGATE SUBBASE

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง) (จากแหล่ง บ่อลูกรังหุแค ต.พุด) = 28.50 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน) = 30.14 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 87.00 กม. = 171.99 บาท/ลบ.ม.

รวม = 230.63 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว 230.63 x 1.60 = 369.00 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) = 44.11 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 413.11 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 413.11 บาท/ลบ.ม.

2.2 ทราห์ยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต

ค่าวัสดุจากแหล่งรวมค่าตัด (บ่อทรายสระแจง ต.สระแจง อ.บางระจัน) = 150.00 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ+ ค่าเสื่อมราคา(ชุด-ชน) = 20.26 บาท/ลบ.ม. (เปิดตาราง ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา)

ค่าขนส่ง 27.00 กม. = 82.32 บาท/ลบ.ม.

รวม = 252.58 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว 1.40 x 252.58 = 353.61 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) 0.75 x 42.78 = 32.08 บาท/ลบ.ม. (เปิดตาราง ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา)

ค่างานต้นทุน = 385.69 บาท/ลบ.ม.

3. SURFACE COURSES

3.1(1) PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT

15.00 CM. THICK

ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

PANEL SIZE 3.00 x 10.00 ม.

ปริมาณทั้งโครงการ 240.00 ตร.ม.

ค่าติดตั้งเครื่องผสมคอนกรีต 150,000 / 28,000 = 5.35 บาท/ตร.ม.

ค่าคอนกรีต+ค่าผสม = 1,414.90 + 175.74 = 1,590.64 บาท/ลบ.ม. (เปิดตาราง ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา)

คิดจากพื้นที่ 40.00 ตร.ม.

ค่าติดตั้งเครื่องผสมคอนกรีต = 40.00 x 5.35 = 214.00 บาท

ค่าคอนกรีต 6.00 ลบ.ม. @ 1,590.64 = 9,543.84 บาท

ค่าขนส่ง 0 กม. = 0 x 0 = 0.00 บาท

ค่าเหล็ก Wire mesh 4 มม. 40.00 ตร.ม. @ 35.88 = 1,435.20 บาท

ลวดผูกเหล็ก กก. @ = บาท

ค่าแบบเหล็ก 18.53 x 10.00 = 185.30 บาท (เปิดตาราง ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา)

ค่า PAVER (ปูผิวคอนกรีต) 40.00 x 11.88 = 475.20 บาท (เปิดตาราง ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา)

ค่าบ่ม	40.00	x	7.43	=	297.20 บาท	(เปิดตาราง ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา)
ค่าใช้จ่ายรวม				=	12,150.74 บาท	
ค่างานต้นทุน	12,150.74	/	40.00	=	303.76 บาท/ตร.ม.	

3.2(2) EXPANSION JOINT

คิดจากความยาว	3.00 ม.			=	บาท	ความกว้างถนน
ค่าเหล็ก	6.69 กก. @	21.80		=	145.84 บาท	
METAL CAP + ยาง AC60+ จาระบี	7.00 ชุด @	10.00		=	70.00 บาท	
แผ่นโฟม หนา 2 ซม.	0.30 ตร.ม. @	35.00		=	10.50 บาท	
JOINT SEALER	0.0038 ลิตร @	22.05		=	0.08 บาท	ราคายาง AC 60-70
ค่าหยอดยาง	3.00 ม. @	13.35		=	40.05 บาท	(เปิดตาราง ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา)
แผ่นพลาสติก	- ม. @	-		=	- บาท	
ไม้แบบ	0.410 ลบ.ฟ. @	316.980		=	130.080 บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม				=	396.55 บาท	
ค่างานต้นทุน	396.55	/	3.00	=	132.18 บาท/เมตร	

3.3(3) CONTRACTION JOINT

คิดจากความยาว	3.00 ม.					ความกว้างถนน
ค่าเหล็ก	4.17 กก. @	22.05		=	91.96 บาท	
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	3.00 ม. @	13.35		=	40.05 บาท	(เปิดตาราง ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา)
ยาง AC 60	7.00 ชุด @	5.00		=	35.00 บาท	
JOINT SEALER	0.0012 ลิตร @	22.05		=	0.02 บาท	ราคายาง AC 60-70
แผ่นพลาสติก	- ม. @	-		=	- บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม				=	167.03 บาท	
ค่างานต้นทุน	167.03	/	3.00	=	55.67 บาท/ม.	

3.4 SOIL AGGERGATE SUBBASE (ไหล่ทาง)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง) (จากแหล่ง บ่อลูกรังหุแค ต.หุแค)				=	28.50 บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)				=	30.14 บาท/ลบ.ม.	
ค่าขนส่ง 87.00 กม.				=	171.99 บาท/ลบ.ม.	
รวม				=	230.63 บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ	230.63	x	0.20	=	46.12 บาท/ลบ.ม.	
ค่างานต้นทุน				=	276.75 บาท/ลบ.ม.	

ข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บริเวณถนนลาดยาง ถึง บ้านนางพิสมัย ตำบลพัททัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ตอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด สิงห์บุรี

เขตฝนตก

ปกติ

ราคามัมนั้ดินเซล

25.00 - 25.99

บาท/ลิตร

วัสดุก่อสร้าง ขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ และลากพ่วง

วัสดุก่อสร้าง ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ

เงินล่วงหน้าจ่าย

0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)

7 %

เงินหลักประกันผลงานหัก

0 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

7 %

กรอบเฉพาะตารางช่องสี่เหลี่ยม

ราคาพาณิชย์สิงห์บุรี

ราคาพาณิชย์สระบุรี

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่า ขึ้น ลง (บาท)	ค่า ตัด เหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็ก RB Ø 15 มม.	บ./ตัน	19,130.84	19.00	41.66	80	2,801.00	22,053.50
2	เหล็ก RB Ø 19 มม.	บ./ตัน	18,878.51	19.00	41.66	80	2,801.00	21,801.17
3	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	60.28					60.28
4	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh	บ./ตร.ม.	33.00	19.00	0.04	0.07	2.77	35.88
5	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	2,429.91	19.00	41.66	50		2,521.57
6	ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	150.00	27.00	82.32			232.32
7	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	150.00	27.00	82.32			232.32
8	หินผสมคอนกรีต (อ.เฉลิมพระเกียรติ)	บ./ลบ.ม.	285.00	87.00	171.99			456.99
9	ลูกรัง (ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ)	บ./ลบ.ม.	28.50	87.00	171.99			200.49
10	ไม้กระดาน 1 x 6"	บ./ลบ.ฟ.	719.63					719.63
12	ไม้ยาง 1½ x 3"	บ./ลบ.ฟ.	925.24					925.24
13	ตะปู	กก.	50.47					50.47
14	ยาง AC 60	บ./ตัน	27,060.00	160.00	344.01	35.00		27,439.01
15	อื่นๆ							
	แผ่นไม้	บ./แผ่น						



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตาม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บริเวณบ้านนายสมหวัง ถึง บ้านนายครีမ် ไม้ลา
ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำ
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ใน
ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภทไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือเงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของ
หน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน จึงขอ
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างใน
งานจ้างก่อสร้างผู้ใดจะคัดค้านราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นนี้ให้ยื่นเรื่องคัดค้านภายใน ๗ วัน ตั้งแต่วันที่
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บริเวณบ้านนายสมหวัง ถึง บ้านนายครีမ် ไม้ลา ตำบลพักทัน
อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๙,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม หมู่ที่ ๙ บริเวณบ้านนายสมหวัง ถึง บ้านนายครีမ် ไม้ลา ตำบลพักทัน
อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผิวทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร ราคากลาง ๑๒๙,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) นั้น
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๒๙,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - a. แบบ ปร.๔
 - b. แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสายชล ฉิมพาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน
 - ๖.๒ นางรัฐกานต์ นาคทอง ปลัด อบต. พักทัน
 - ๖.๓ นายจตุรงค์ พุ่มหวั่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายสายชล ฉิมพาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บริเวณบ้านนายสมหวัง ถึง บ้านนายศรีม ไม้ลา ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๙,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม หมู่ที่ ๙ บริเวณบ้านนายสมหวัง ถึง บ้านนายศรีม ไม้ลา ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผิวทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร ราคากลาง ๑๒๙,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) นั้น
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๒๙,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสายชล ฉิมพาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน
 - ๖.๒ นางรัฐกานต์ นาคทอง ปลัด อบต. พักทัน
 - ๖.๓ นายจตุรงค์ พุ่มห่วย ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านนายสมหวัง ถึง บ้านนายครีมี ไม้ลา ตำบลพัททัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ราคางานต้นทุนต่อหน่วย

(ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร)

1.1 CLEARING AND GRUBBING

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ ☐ เบา ☐ กลาง ☐ หนัก

กรอกเฉพาะตารางช่องสีเหลือง

ค่าดำเนินการ+ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 1.39 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.39 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถางวัชพืชเท่านั้น
งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีเฉพาะการถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

1.2 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

ลูกรัง 10 ซม. = 8.58 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 8.58 บาท/ตร.ม.

2.1(1) SOIL AGGERGATE SUBBASE

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง) (จากแหล่ง บ่อลูกรังหูกแค ต.พุดแค) = 28.50 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน) = 30.14 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 87.00 กม. = 171.99 บาท/ลบ.ม.

รวม = 230.63 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว 230.63 x 1.60 = 369.00 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) = 44.11 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 413.11 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 413.11 บาท/ลบ.ม.

2.2 ทราห์ยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต

ค่าวัสดุจากแหล่งรวมค่าตัก (บ่อทรายสระแจง ต.สระแจง อ.บางระจัน) = 150.00 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ+ ค่าเสื่อมราคา(ขุด-ขน) = 20.26 บาท/ลบ.ม. (เปิดตาราง ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา)

ค่าขนส่ง 27.00 กม. = 82.32 บาท/ลบ.ม.

รวม = 252.58 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว 1.40 x 252.58 = 353.61 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) 0.75 x 42.78 = 32.08 บาท/ลบ.ม. (เปิดตาราง ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา)

ค่างานต้นทุน = 385.69 บาท/ลบ.ม.

3. SURFACE COURSES

3.1(1) PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT

15.00 CM. THICK

ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

PANEL SIZE 3.00 x 10.00 ม.

ปริมาณทั้งโครงการ 240.00 ตร.ม.

ค่าติดตั้งเครื่องผสมคอนกรีต 150,000 / 28,000 = 5.35 บาท/ตร.ม.

ค่าคอนกรีต+ค่าผสม = 1,414.90 + 175.74 = 1,590.64 บาท/ลบ.ม. (เปิดตาราง ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา)

คิดจากพื้นที่ 40.00 ตร.ม.

ค่าติดตั้งเครื่องผสมคอนกรีต = 40.00 x 5.35 = 214.00 บาท

ค่าคอนกรีต 6.00 ลบ.ม. @ 1,590.64 = 9,543.84 บาท

ค่าขนส่ง 0 กม. = 0 x 0 x 0 = 0.00 บาท

ค่าเหล็ก Wire mesh 4 มม. 40.00 ตร.ม. @ 35.88 = 1,435.20 บาท

ลวดผูกเหล็ก กก. @ = - บาท

ค่าแบบเหล็ก 18.53 x 10.00 = 185.30 บาท (เปิดตาราง ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา)

ค่า PAVEN (ปูผิวคอนกรีต) 40.00 x 11.88 = 475.20 บาท (เปิดตาราง ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา)

ค่าบ่ม	40.00	x	7.43
ค่าใช้จ่ายรวม			
ค่างานต้นทุน	12,150.74	/	40.00

3.2(2) EXPANSION JOINT

คิดจากความยาว	3.00	ม.	
ค่าเหล็ก	6.69	กก. @	21.80
METAL CAP + ยางAC60+ จาระบี	7.00	ชุด @	10.00
แผ่นโฟมหนา 2 ซม.	0.30	ตร.ม. @	35.00
JOINT SEALER	0.0038	ลิตร @	22.05
ค่าหยอดยาง	3.00	ม. @	13.35
แผ่นพลาสติก	-	ม. @	-
ไม้แบบ	0.410	ลบ.ฟ. @	316.980
ค่าใช้จ่ายรวม			
ค่างานต้นทุน	396.55	/	3.00

3.3(3) CONTRACTION JOINT

คิดจากความยาว	3.00	ม.	
ค่าเหล็ก	4.17	กก. @	22.05
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	3.00	ม. @	13.35
ยางAC 60	7.00	ชุด @	5.00
JOINT SEALER	0.0012	ลิตร @	22.05
แผ่นพลาสติก	-	ม. @	-
ค่าใช้จ่ายรวม			
ค่างานต้นทุน	167.03	/	3.00

3.4 SOIL AGGERGATE SUBBASE (ไหล่ทาง)

คำนวณจากแหล่ง (ลูกรัง) (จากแหล่ง บ่อลูกรังหุแค ต.พุดแค)			
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)			
ค่าขนส่ง	87.00	กม.	
รวม			
ค่าดำเนินการ	230.63	x	0.20
ค่างานต้นทุน			

=	297.20 บาท	(เปิดตาราง ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา)
=	12,150.74 บาท	
=	303.76 บาท/ตร.ม.	

=	บาท	ความกว้างถนน
=	145.84 บาท	
=	70.00 บาท	
=	10.50 บาท	
=	0.08 บาท	ราคายาง AC 60-70
=	40.05 บาท	(เปิดตาราง ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา)
=	- บาท	
=	130.080 บาท	
=	396.55 บาท	
=	132.18 บาท/เมตร	

		ความกว้างถนน
=	91.96 บาท	
=	40.05 บาท	(เปิดตาราง ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา)
=	35.00 บาท	
=	0.02 บาท	ราคายาง AC 60-70
=	- บาท	
=	167.03 บาท	
=	55.67 บาท/ม.	

=	28.50 บาท/ลบ.ม.	
=	30.14 บาท/ลบ.ม.	
=	171.99 บาท/ลบ.ม.	
=	230.63 บาท/ลบ.ม.	
=	46.12 บาท/ลบ.ม.	
=	276.75 บาท/ลบ.ม.	

ข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านนายสมหวัง ถึง บ้านนายศรี ไม่ลา ตำบลพิทักษ์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ตอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด สิงห์บุรี

วัสดุก่อสร้าง ขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ และลากพ่วง

วัสดุก่อสร้าง ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ

เงินล่วงหน้าจ่าย

เงินหลักประกันผลงานหัก

เขตฝนตก

ปกติ

ราคามันดินเขต

25.00 - 25.99


บาท/ลิตร

กรอกเฉพาะตารางของสีเหลือง

ราคาพาณิชย์สิงห์บุรี

ราคาพาณิชย์สระบุรี

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่า ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็ก RB Ø 15 มม.	บ./ตัน	19,130.84	19.00	41.66	80	2,801.00	22,053.50
2	เหล็ก RB Ø 19 มม.	บ./ตัน	18,878.51	19.00	41.66	80	2,801.00	21,801.17
3	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	60.28					60.28
4	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20*0.20 ม.	บ./ตร.ม.	33.00	19.00	0.04	0.07	2.77	35.88
5	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	2,429.91	19.00	41.66	50		2,521.57
6	ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	150.00	27.00	82.32			232.32
7	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	150.00	27.00	82.32			232.32
8	หินผสมคอนกรีต (อ.เฉลิมพระเกียรติ)	บ./ลบ.ม.	285.00	87.00	171.99			456.99
9	ลูกรัง (ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ)	บ./ลบ.ม.	28.50	87.00	171.99			200.49
10	ไม้กระบอก 1 x 6"	บ./ลบ.ฟ.	719.63					719.63
12	ไม้ยี่ง 1½ x 3"	บ./ลบ.ฟ.	925.24					925.24
13	ตะปู	กก.	50.47					50.47
14	ยาง AC 60	บ./ตัน	27,060.00	160.00	364.01	35.00		27,439.01
15	อื่นๆ							
	เผ่นโพม	บ./แผ่น						

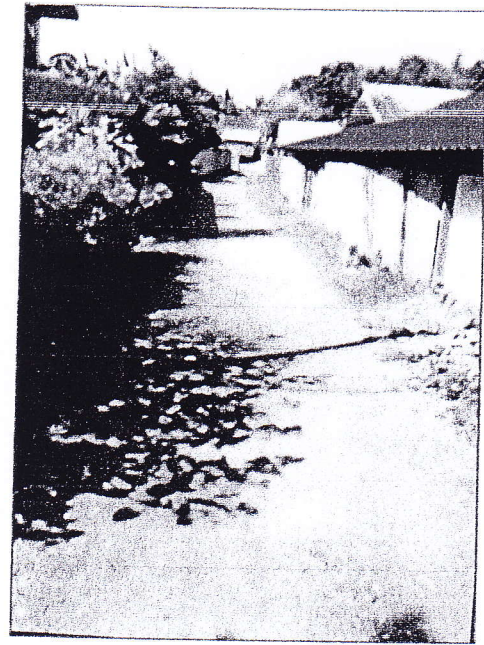


ภาพก่อนดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บริเวณลาดยาง ถึง บ้านนางพิสมัย ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผิวทางกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านนายสมหวัง ถึง บ้านนายคริ้ม ไม้ลา ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผิวทางกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร

ขอรับรองถ่ายจากโครงการจริง

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน
(นายจันทพงศ์ วิสุทธิ์สละ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน





- ทราบ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
(นายจตุรงค์ พุ่มท่วง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(จ.ส.อ.รักเกียรติ รักษาสีมันต์)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมภพ เปี่ยมเมธวงศ์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

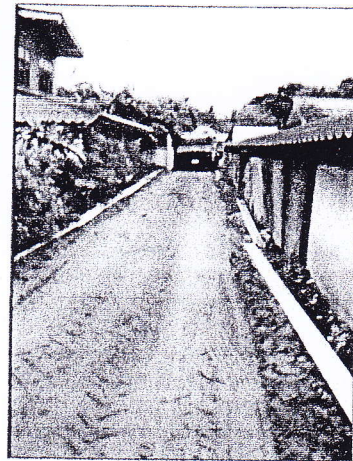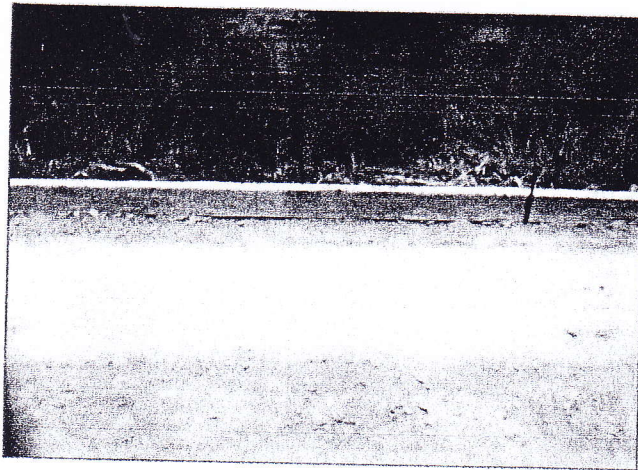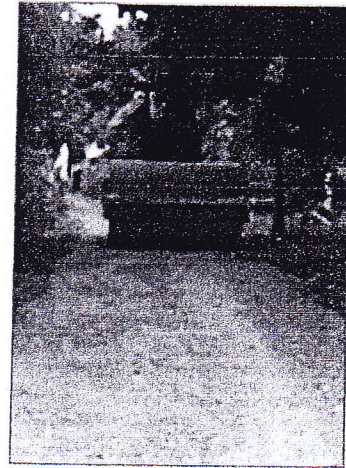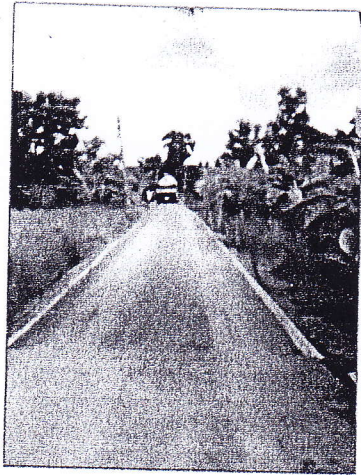


ภาพขณะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บริเวณลาดยาง ถึง บ้านนางพิสมัย ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผิวทางกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านนายสมหวัง ถึง บ้านนายคริ้ม ไม้ลา ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผิวทางกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร

ขอรับรองถ่ายจากโครงการจริง

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน
(นายจันทพงศ์ วิสุทธิ์สละ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



- ทราบ
(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
(นายจตุรงค์ พุ่มห่วน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) จสอ. 
(จ.ส.อ. รักเกียรติ รักษาสิมันต์)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

กรรมการ


(ลงชื่อ)


กรรมการ
(นายสมภพ เปี่ยมเมธางค์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

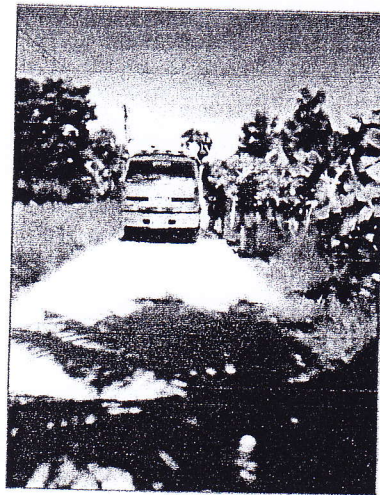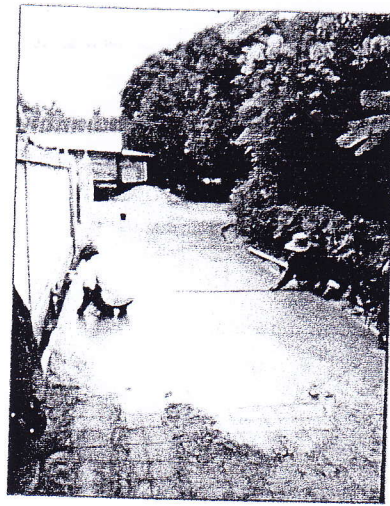

ภาพขณะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บริเวณลาดยาง ถึง บ้านนางพิสมัย ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผิวทางกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านนายสมหวัง ถึง บ้านนายครี๊ม ไม้ลา ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผิวทางกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร

ขอรับรองถ่ายจากโครงการจริง

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน
(นายจันทพงศ์ วิสุทธิ์สละ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


- ทราบ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
(นายจตุรงค์ พุ่มห่วน)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ) 
(จ.ส.อ.รักเกียรติ รักษาสมันต์)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายสมภพ เปี่ยมเมธวงศ์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กรรมการ

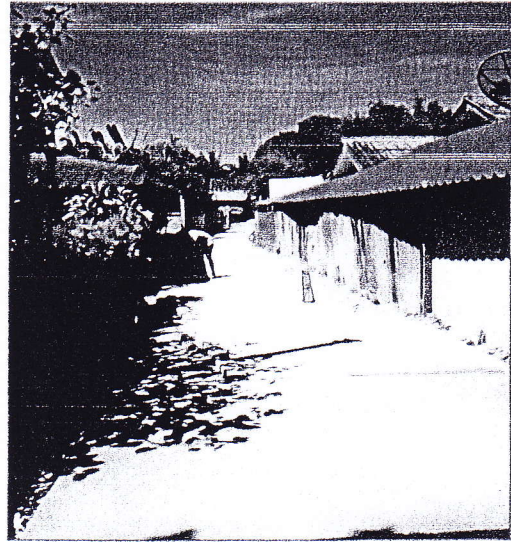

ภาพขณะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บริเวณลาดยาง ถึง บ้านนางพิสมัย ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผิวทางกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านนายสมหวัง ถึง บ้านนายคริ้ม ไม้ลา ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผิวทางกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร

ขอรับรองถ่ายจากโครงการจริง



(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน
(นายจันทพงศ์ วิสุทธิ์สละ)
นายช่างโยธา

- ทราบ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
(นายจตุรงค์ พุ่มห่วน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(จ.ส.อ.รักเกียรติ รักษาสมันต์)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมภพ เปี่ยมเมธงค์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

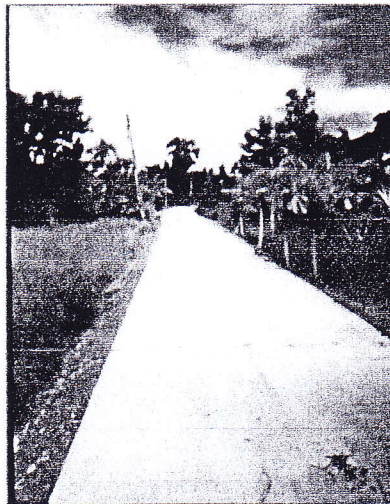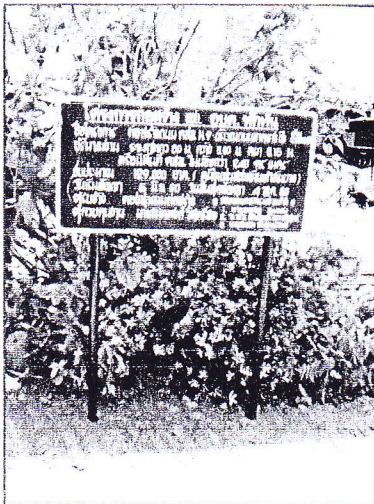

ภาพดำเนินการแล้วเสร็จจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บริเวณลาดยาง ถึง บ้านนางพิสมัย ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผิวทางกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านนายสมหวัง ถึง บ้านนายครีမ် ไม้ลา ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผิวทางกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร

ขอรับรองถ่ายจากโครงการจริง

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายจันทพงศ์ วิสุทธีสละ)

นายช่างโยธา

- ทราบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

(นายจตุรงค์ พุ่มห่วย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(จ.ส.อ.รักเกียรติ รักษาสมันต์)

(นายสมภพ เปี่ยมเมธาคค์)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
