



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ. ถึง กฟส.คลจ.
เลขที่ วันที่ 29 พ.ค. 2567
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นายนพดล ชื่นอุทัย
เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ส)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001426236 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567 ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 34/2 ม.6 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.76394128 ,101.00733904 เบอร์โทร 0890504999

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กกค.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟฟ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟฟ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟฟ.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นายนพดล ชื่นอุทัย บ้านเลขที่ 34/2 ม.6 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟฟ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 1 ฟีดเตอร์ 8 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทาง ประมาณ 6.4 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 9.9 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นายนพดล ชื่นอุทัย เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

วิธีดำเนินการ

- 3.1 แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก
 - รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 40 เมตร
- 3.2 แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก
 - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 60 เมตร
 - ปักเสา คอ ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 2,2 ต้น

ต้นทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0125.01.1

- 3.3 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	330.00 บาท
แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	48,821.18 บาท
กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>49,151.18 บาท</u>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัมย์ บัวลังกา)

ทพ.บส.กฟส.คลจ.


- อนุมัติตามเสนอ

ที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/1243/ ๒๕๖4



นายเชาวลิต โตเจริญ

ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.คลจ.

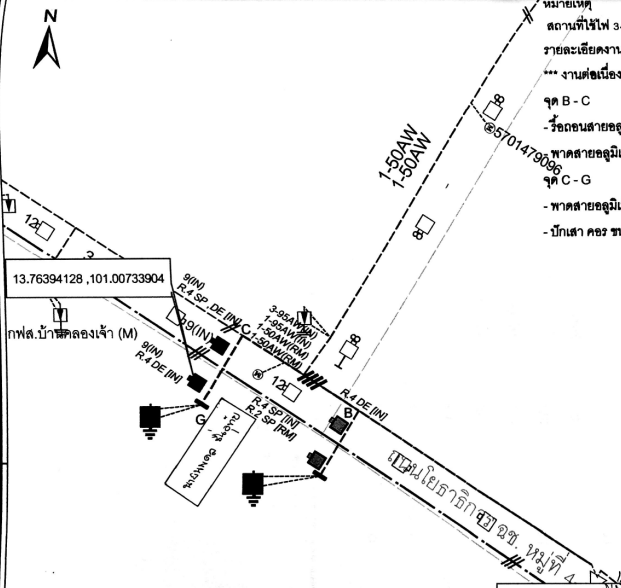

หมายเหตุ

สถานที่ใช้ไฟ 34/2 ม.6 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา โทร.089-0504999

รายละเอียดงาน

*** งานต่อเนื่อง A-B-C-D-E

จุด B-C

- รัดถอนสายลวดมึนยืมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 40 เมตร

- พาดสายลวดมึนยืมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 40 เมตร

จุด C-G

- พาดสายลวดมึนยืมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 20 เมตร

- บักเภา คอว ขนาด 9 เมตร และคอหม้อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 2, 2 ต้น

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
■	เสาเข็มกริด 9 เมตร	2 ต้น
□	เสาเข็ม คอหม้อ 0.25x0.25x4.5	2 ต้น
⏏	เบสติดโคมไฟถนน	ต้น
—	สายแรงสูง 115 KV ชนิด	ม.
—	สายแรงกลาง 22.33 KV ชนิด	ม.
—	สายแรงต่ำ ชนิด 95AW	ม.
→	หม้อแปลง	ชุด
⏏	สวิตช์ L.T.	1 ชุด
⏏	สายต่อลงดิน L.T.	1 ชุด
⏏	Disconnecting Switch	ชุด
⏏	Load Break SF6	ชุด
⏏	Load Break	ชุด
⏏	Dropout Fuse	ชุด
⏏	หม้อแปลง	เครื่อง
⏏	Capacitor	ชุด
⏏	Recloser	ชุด

ผู้เขียน วิศวกรวิชาชีพ ปริญญาตรี
ผู้สำรวจ วิศวกรวิชาชีพ ปริญญาตรี
วิศวกร วิศวกรวิชาชีพ ปริญญาตรี
หัวหน้าแผนก นายสมชาย นามศิริ
ผู้ช่วยกรรมการกองช่าง (ร.ร.ร.ร.ร.) (ก.ร.ร.ร.)
ผู้ดำเนินการเขตไฟฟ้า

รองผู้ว่าการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Erst PE A Generate TitleBox

<นายสมชาย นามศิริ>

C-67-H-BKCSR.0125.01.1

ผู้ว่าการ

ใช้แบบ
ออกแบบด้วยแบบ
วันที่แก้ไขวันที่ 23 พฤษภาคม 2567
แก้ไขวันที่
วันที่เป็น เมตร
มาตราส่วน 1:1,000

แบบเลขที่ R033-015070125
วันที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น
