



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลอง.

ถึง กฟส.คลอง.

เลขที่

วันที่ **16 พ.ค. 2567**

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นายวชิร อนันตชัย

เรียน ผจก.กฟส.คลอง. ผ่าน รจก.(ล) **๒**

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001429065 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 64 ม.12 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.774000 ,100.993710 เบอร์โทร 0897474808

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กกค.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ,ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี),หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟฟ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นายวชิร อนันตชัย บ้านเลขที่ 64 ม.12 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 2 พิดเดอร์ 10 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 2.4 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นายวชิร อนันตชัย เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 20 เมตร
- ปีกเสา คอ ขนาด 9 เมตร และดอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 1, 1 ต้น

ต้นเงินลงทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0117.01.1

3.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้


แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

18,806.85 บาท

กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น

18,806.85 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายทำงานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัทย์ บัวลังกา)

ผ.บ.ส.กฟส.คลจ.

อนุมัติตามเสนอ


ที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/ 11๒๖ | ๒๕๖๔



(นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล)

ผ.จก.กฟส.คลจ.

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๔

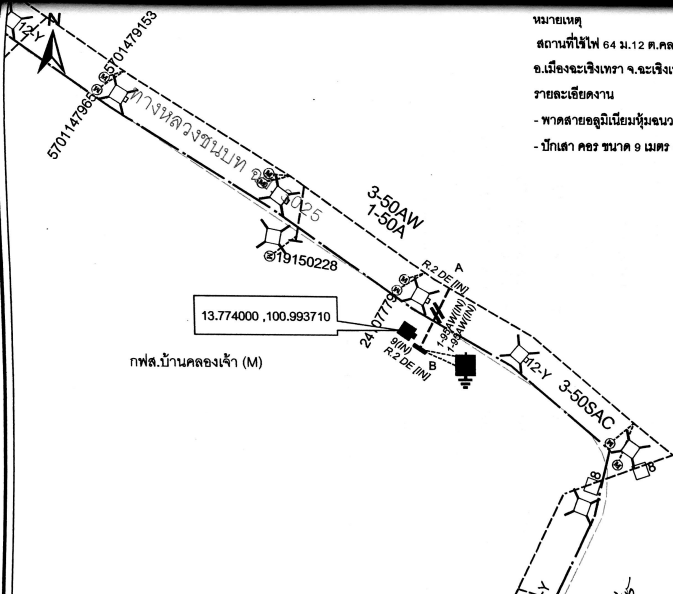

หมายเหตุ

สถานที่ใช้ไฟ 64 ม.12 ต.คลองนครเนื่องเขต

อ.เมืองจะเจียงเพรา จ.จะเจียงเพรา โทร.089-7474808

รายละเอียดงาน

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 20 เมตร

- บีกเสา คอ ขนาด 9 เมตร และดอมบ่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 1,1 ต้น

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
■	เสาเข็มกริด เมตร	1 ต้น
□	เสาเข็มคานกริด เมตร	1 ต้น
⊕	เสาเข็มโฟตอน ต้น	ต้น
---	สายแรงสูง 115 KV ชนิด ม.	ม.
---	สายแรงกลาง 22.33 KV ชนิด ม.	ม.
---	สายแรงต่ำ ชนิด 95AW ม.	20 ม.
→	หมอบ ชุด	ชุด
⊕	ส่วฟ้า L.T.	1 ชุด
⊕	สายต่อดิน L.T.	1 ชุด
⊕	Disconnecting Switch ชุด	ชุด
⊕	Load Break SF6 ชุด	ชุด
⊕	Load Break ชุด	ชุด
⊕	Dropout Fuse ชุด	ชุด
⊕	หม้อแปลง เครื่อง	เครื่อง
⊕	Capacitor ชุด	ชุด
⊕	Recloser ชุด	ชุด

ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการส่วน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Erath PEA Generate TitleBox <นายวิธ อ้นทรัพย์> C-67-H-BKCSR.0117.01.1	ใ้แทนแบบ ถูกแทนด้วยแบบ ขึ้นไปเมื่อวันที่ แก้ไขเมื่อวันที่ ผลิตเป็น มาตรฐาน แบบเลขที่ หน้าที่
--	---	---
