



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ. ถึง กฟส.คลจ.
เลขที่ วันที่ 16 พ.ค. 2567
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นายสมพล ขำเถื่อน
เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล) ๒

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001427359 ลงวันที่ 29 เมษายน 2567 ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 17/3 ม.5 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.76912136 , 100.89974964 เบอร์โทร 0907203330

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟพ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟพ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟพ.และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นายสมพล ขำเถื่อน บ้านเลขที่ 17/3 ม.5 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟพ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 2 ฟีดเดอร์ 7 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 14 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นายสมพล ขำเถื่อน เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 20 เมตร
- ปักเสา คอกร ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด $0.25 \times 0.25 \times 4.5$ เมตร จำนวน 1,1 ต้น

ต้นทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0113.01.1

3.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้


แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

18,923.24 บาท

กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น

18,923.24 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัมย์ บัวลังกา)

ทพ.บส.กฟส.คลจ.

อนุมัติตามเสนอ

ที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/ 1134 / 2564



(นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล)

ผจก.กฟส.คลจ.

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๔



หมายเหตุ


สถานที่ใช้ไฟ 17/3 ม.5 ต.คลองหลวงแพ่ง

อ.เมืองจะเจียงเทรา จ.จะเจียงเทรา โทร.090-7203330

รายละเอียดงาน

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 20 เมตร

- บักเสาคอ ขนาด 9 เมตร และคอมือ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 1, 1 ต้น

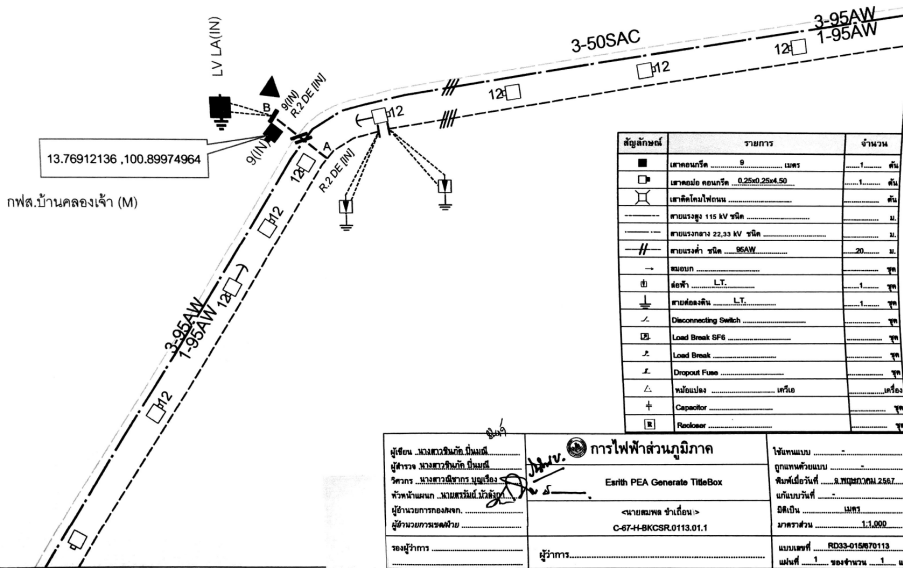

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
■	เสาคอนกรีต 9 เมตร	1 ต้น
□	เสาคอมือ คอนกรีต 0.25x0.25x4.50	1 ต้น
⚡	เสาดีไอเอโฟลน	ต้น
—	สายแรงสูง 115 kV ชนิด	ม.
—	สายแรงกลาง 22.33 kV ชนิด	ม.
—	สายแรงต่ำ ชนิด 95AW	20 ม.
—	ฉนวน	ชุด
⚡	สวิตช์ L.T.	1 ชุด
⚡	สายต่อสลับ L.T.	1 ชุด
⚡	Disconnecting Switch	ชุด
⚡	Load Break SF6	ชุด
⚡	Load Break	ชุด
⚡	Dropout Fuse	ชุด
⚡	ฟิวส์เบส	เครื่อง
⚡	Capacitor	ชุด
⚡	Radio	ชุด

ผู้เขียน วิศวกรรับใช้ บัณฑิต ผู้สำรวจ วิศวกรรับใช้ บัณฑิต วิศวกร วิศวกรรับใช้ บัณฑิต หัวหน้าแผนก วิศวกรรับใช้ บัณฑิต ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการระบบ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Esrith PEA Generate TitleBox นายสมพล ขำเถื่อน > C-67-H-BKCSR.0113.01.1	ใช้แบบ ถูกแทนด้วยแบบ พิมพ์เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม 2567 แก้ไขครั้งที่ จัดเป็น มาตรฐาน 1:1,000
รองผู้ว่าการ	ผู้ว่าการ	แบบเลขที่ RD33-015870113 วันที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น
