



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ. ถึง กฟส.คลจ.
เลขที่ วันที่ 21 พ.ค. 2567
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นายสุรศักดิ์ ใจสงบ

เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล) @

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001426237 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 18/1 ม.11 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.74384855 ,100.96352505 เบอร์โทร 095-4612603

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงาน ขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตาม หลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟพ.สาขามี อำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟพ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟพ.และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นายสุรศักดิ์ ใจสงบ บ้านเลขที่ 18/1 ม.11 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟพ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 2 ฟีดเดอร์ 2 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทาง ประมาณ 5.3 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นายสุรศักดิ์ ใจสงบ เป็นไปตามระเบียบและ หลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 125 เมตร
- ปีกเสา คอ ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 5 ,5 ต้น

ต้นทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0121.01.1

3.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้


แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

86,223.65 บาท

กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น

86,223.65 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัมย์ บัวลังกา)

หน.บส.กฟส.คลจ.

อนุมัติตามเสนอ

ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/ 1184 / 2564



(นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล)

ผจก.กฟส.คลจ.

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๔

หน้า 1

สถานที่ใช้ไฟ 18/1 ม.11 ต.คลองเปรง

อ.เมืองจะเจียงเทรา จ.จะเจียงเทรา โทร.095-4612603


รายละเอียดงาน

***งานต่อเนื่อง จุด A - B - C

จุด A - B

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 125 เมตร

- ปักเสา คอว ขนาด 9 เมตร และดอมบ่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 5 ,5 ต้น

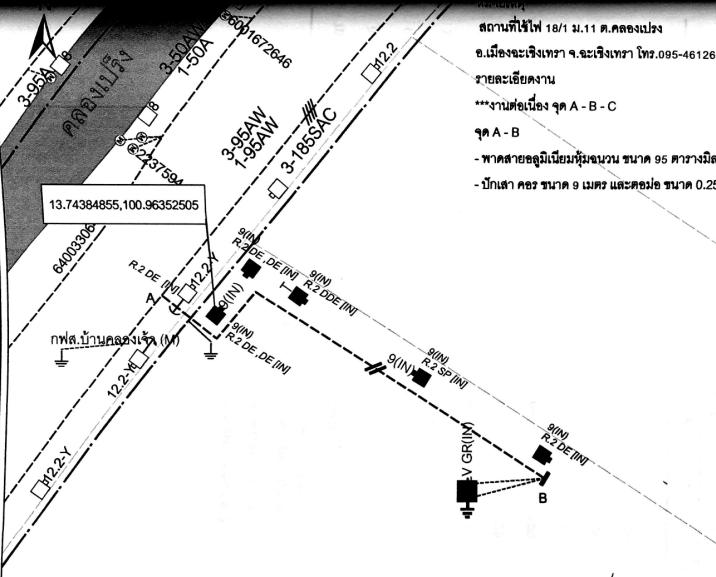

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
■	เสาคอนกรีต 9 เมตร	5 ต้น
□	เสาขม่อ คอนกรีต 0.25x0.25x4.50	5 ต้น
⊞	เสาตีโคมไฟถนน	ต้น
—	สายแรงสูง 115 KV ชนิด	ม.
—	สายแรงกลาง 22.33 KV ชนิด	ม.
—	สายแรงต่ำ ชนิด 95AW	125 ม.
→	สมบอก L.T.	1 ชุด
⇄	ส่วส่า L.T.	1 ชุด
⊥	สายต่อลงดิน L.T.	1 ชุด
⌵	Disconnecting Switch	ชุด
⌵	Load Break SFB	ชุด
⌵	Load Break	ชุด
⌵	Dropout Fuse	ชุด
△	หม้อแปลง	หรือ
+	Capacitor	ชุด
⌵	Recloser	ชุด

ผู้เขียน: นางสาวจินต ปิ่นมณี ผู้สำรวจ: นางสาวจินต ปิ่นมณี วิศวกร: นางสาวฉัตรกร บุญเรือง หัวหน้าแผนก: นายสมรชัย บำลือภัก ผู้ควบคุมการก่อสร้าง: ผู้ควบคุมการเงิน: ลงชื่อ/การ:	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Eairth PEA Generate Title Box <นายสุรศักดิ์ ใจสงบ> C-67-4-BKCSR.0121.01.1 ผู้ว่าราชการ:	ใ้ภาพแบบ: - ถูกแทนด้วยแบบ: - ขึ้นเมื่อวันที่: 17 พฤษภาคม 2567 แก้ไขวันที่: - ผลิตเป็น: 1 ชุด ราคาส่ง: 1,100.00 แบบเลขที่: B033-019870121 แผ่นที่: 1 ของจำนวน 1 แผ่น
---	---	--
