



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง ผจก.กฟส.คลจ.

เลขที่

วันที่ 31 มี.ค. 2567

เรื่อง

ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นายณรงค์ กิจพาณิชย์

เรียน

ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รงก. เล่า

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001384757 ลงวันที่ 22 มกราคม 2567 ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อขอใช้ไฟฟ้าใหม่ 11/1 ม.6 ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.70741 100.98932 เบอร์โทร 0815924044

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ ,ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี),หม้อแปลง(ถ้ามี)) ใน หัว ข้อที่ 1.3 โดย ให้ ผจก.กฟฟ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1)สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดย ใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นายณรงค์ กิจพาณิชย์ บ้านเลขที่ 11/1 ม.6 ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีฉะเชิงเทรา ฟีดเคอร์ 7 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 13 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 9.9 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นายณรงค์ กิจพาณิชย์ เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้.

วิธีดำเนินการ

1.1 แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 550 เมตร

1.2 แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก

- รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 420 เมตร
- รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 130 เมตร
- รื้อถอนสายเปลือย ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 420 เมตร

เงินลงทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0022.01.1

2.1 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้


แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

_____ 148,190.41 บาท

กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น

_____ 148,190.41 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัมย์ บัวลังกา)

ทพ.บส.กฟส.คลจ.

- อนุมัติตามเสนอ

ที่ ก.2 กฟส.คลจ.(ผบส.)/ ๗๕๐ / ๕๖๖๔



(นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล)

ผจก.กฟส.คลจ.

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕

สถานที่ใช้ไฟ 11/1 ม.6 ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา

๙. ฉะเชิงเทรา โทร.081-5924044

รายละเอียดงาน

৭৮ A - B

- รีดถนนสาย 50AW จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 130 เมตร

- พาดสาย 95AW จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 130 เมตร


၇၃ B - C

- รีดทอนสาย 50AW จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 420 เมตร

- รื้อถอนสาย 50A จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 420 เมตร

- พาดสาย 95AW จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 420 เมตร

กฟส.คลองเจ้า

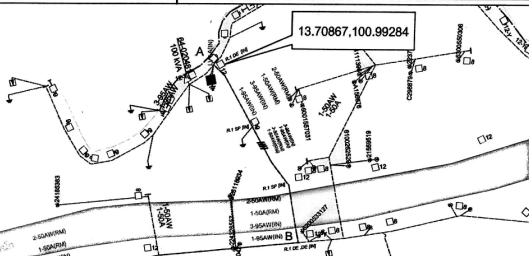

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
	สายควบคุม UNIT	คัน
	สายแรงดัน สายกริ่ง	คัน
	สายลิฟท์ไต่บันได	คัน
	สายแรงดัน 115 KV ชนิด	ม.
	สายแรงดัน 22.33 KV ชนิด	ม.
	สายแรงดัน ชนิด BSAW	550 ม.
→	สายลม	คัน
⇄	สายฟ้า L.T.	2
↓	สายต่อดิน L.T.	2
↗	Disconnecting Switch	คัน
⚡	Load Break SF6	คัน
⚡	Load Break	คัน
⚡	Dripout Fuse	คัน
△	หม้อแปลง	เครื่อง
+	Capacitor	คัน
⊞	Reactor	คัน

ผู้ยื่นเรื่อง <u>นางสาววิมลทิพย์ นามะ</u>	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Earth PEA Generate TitleBox	ใบทะเบียนเลข -
ผู้รับทราบ <u>นางสาววิมลทิพย์ นามะ</u>		เลขที่ใบทะเบียนเลข -
การกรอก <u>นางสาววิมลทิพย์ นามะ</u>		วันที่ขึ้นทะเบียนเลข - 31.12.2567
จำนวนหน้า <u>นางสาววิมลทิพย์ นามะ</u>		บันทึกวันที่ -
ผู้ดำเนินการออกเอกสาร -	นางธนกร กสิยาธิราช	สถานที่ - MH1
ผู้ดำเนินการลงนาม -	C-67-48KCSR.0022.01.1	วันที่ผ่าน - 12.09.2020
ขอผู้กรอก	ผู้กรอก	เลขที่ใบ - RD33-015670022
		เลขที่ - 1
