



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ. ถึง กฟส.คลจ.
เลขที่ วันที่ - 3 ก.ย. 2567
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นายรชต ยะโสธร
เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001470671 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2567 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 53/1 ม.2 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.68162501 , 100.91606316 เบอร์โทร 0813329210

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กกก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟฟ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟฟ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟฟ.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นายรชต ยะโสธร บ้านเลขที่ 53/1 ม.2 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟฟ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีฉะเชิงเทรา 1 ฟีดเดอร์ 10 อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ 15.8 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นายรชต ยะโสธร เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 20 เมตร
- ปีกเสา คอกร ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.50 เมตร จำนวน 2 ,2 ต้น

ต้นทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0184.01.1

3.6 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้


แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

30,334.44 บาท

กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น

30,344.44 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัชต์ บัวลังกา)

ทพ.บส.กฟส.คลจ.

- อนุมัติตามเสนอ


ที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/ ๕๕๓๖ | ๕๖๖๔



นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล

ผจก.กฟส.คลจ.

- ๓ กย. ๒๕๖๔

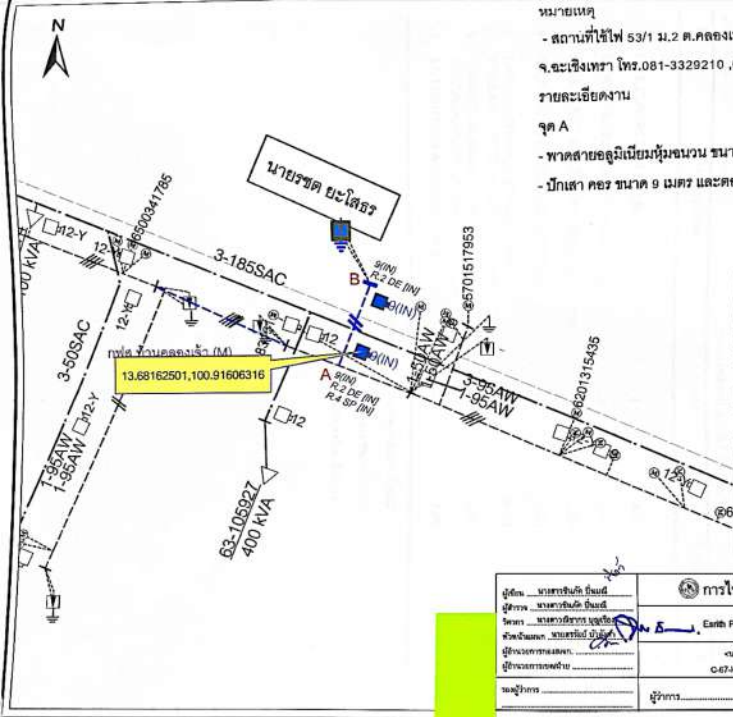

- สถานที่ใช้ไฟ 53/1 ม.2 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา

รายละเอียดงาน

अथ A

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 20 เส้น

- ปีกเสา คอว ขนาด 9 เมตร และค่อมือ ขนาด 0.25x0.25x4.50 เมตร จำนวน 2 ,2 ต้น

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
	สายส่งชนิด ๘ ๒๕๗	2 ชิ้น
	สายส่งชนิด ๐.25x0.25x4.50	2 ชิ้น
	สายส่งชนิด 115 KV ชนิด	๒
	สายส่งชนิด 22.33 KV ชนิด	๒
	สายส่งชนิด 85AIV	20 ชิ้น
	สายส่ง	๒ ชิ้น
	สายส่ง	1 ชิ้น
	สายส่ง	1 ชิ้น
	Disconnecting Switch	๒ ชิ้น
	Load Break SW	๒ ชิ้น
	Load Break	๒ ชิ้น
	Dropout Fuse	๒ ชิ้น
	สายส่ง	๒ ชิ้น
	Capacitor	๒ ชิ้น
	Resistor	๒ ชิ้น

ผู้ยื่น: นายสมชาย ใจดี	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Earth PEA Generate TitleBox <นายสม ใจดี> C-67-M-BKCR018A.01.1	ใบหักภาษี: -
ผู้รับ: นายสมชาย ใจดี		ประเภทของงาน: -
วิศวกร: นายสมชาย ใจดี		วันที่: 2 มิถุนายน 2567
ผู้ควบคุมงาน: นายสมชาย ใจดี		วันที่: -
ผู้ดำเนินการก่อสร้าง: นายสมชาย ใจดี		วันที่: -
ผู้ดำเนินการอนุมัติ: นายสมชาย ใจดี	C-67-M-BKCR018A.01.1	วันที่: 1-1-2000
อนุมัติ: นายสมชาย ใจดี	ผู้ทำ: นายสมชาย ใจดี	วันที่: 2023-01-01
