



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง กฟส.คลจ.

เลขที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/๒๔๐๙/๒๕๖๙

วันที่ 21 ต.ค. 2567

เรื่อง ขอย้ายแนวเสาไฟฟ้า กฟส.บ้านคลองเจ้า นางสาวพนอ แซ่เตีย

เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่120001493406 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2567 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ ขอย้ายแนวเสาไฟฟ้า บริเวณ ม.7 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.757981 ,100.993153 เบอร์โทร 0615136419

2) รายละเอียด

2.1 นางสาวพนอ แซ่เตีย บริเวณ ม.7 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ.รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 2 ฟีดเดอร์ 02 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 0.1 กม.

2.2 มีความประสงค์ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านคลองเจ้าดำเนินการย้ายแนวเสาไฟฟ้า

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นางสาวพนอ แซ่เตีย เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้.

4) วิธีดำเนินการ

4.1 แผนก่อสร้างแรงสูงภายนอก (02.1)

- ปักเสา คอ ขนาด 14 เมตร และต่อม่อ ขนาด 0.36x0.36x4.50 เมตร จำนวน 1,1 ต้น

4.2 แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก

- รื้อถอนเสา คอ ขนาด 14 เมตร และต่อม่อ ขนาด 0.36x0.36x4.50 เมตร จำนวน 2,2 ต้น

5) เงินลงทุน

เงินลงทุน ที่คิดจากผู้ใช้ไฟฟ้า C-67-H-BKCSR.0225.02.1 โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

- แผนกก่อสร้างแรงสูงภายนอก	65,957.50	บาท
- แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก	10,150.00	บาท
- ค่าขอท่อน	46,760.18	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	8,600.74	บาท
ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	131,468.42	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายพัฒนะ ลายประดิษฐ์)

พง.7 รักษาการแทน หผ.บส.

- อนุมัติตามเสนอ



(นายขวัญชัย นวมดี)

ผจก.กฟส.คลจ.

โครงการ C-67-H-BKC - งานผู้ใช้ไฟฟ้า 67 มหฟ. จุฬารามงาน บ้านคลองเจ
นายเตโชใน่งงาน C-67-H-BKCSR.0225.02.1 - นางสาวพนม แซ่เตย / นายเจเนนณ่ง RD33-015/670225 / ชื่อผู้ควบคุมงาน นายเตโชเนร เดรพิทักษ์
แผนก 1103 HT-C-E แผนกก่อสร้างแรงสูงภายนอก / เลขที่โครงข่าย 008004837328 / เลขที่ใบจอง 0179489522 / วันที่ต้องการพัสดุ

กลุ่มพัสดุ	คำอธิบายกลุ่มพัสดุ	รหัสพัสดุ	รายการ (ชื่อพัสดุ)	หน่วย	จำนวนพัสดุใบ	จำนวนเบิกสะสม	จำนวนเบิกครั้ง	เบิกครั้งนี้แล้วคงเหลือ	จำนวนพัสดุเบิกกลับมาใช้ใหม่
1	Concrete Products	1-00-001-0006	POLE 14 M.	EA	1.000	0.000		1.000	
		1-00-002-0400	STUB 0.36X0.36 M. 4.5 M. LONG	EA	1.000	0.000		1.000	
		1-00-011-0001	CROSSARM 100X100X2.500 MM.	EA	3.000	0.000		3.000	
		1-00-011-0003	CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2.500 MM.	EA	2.000	0.000		2.000	
2	Concrete Products	1-01-020-0001	BRACE, FLAT, FOR CROSSARM 30X6X...	EA	8.000	0.000		8.000	
2	Accessories for Concrete	1-01-010-0000	WIRE, ST. SOLID DIA. 4.0 MM. T...	KG	1.450	0.000		1.450	
2	Accessories for Concrete	1-01-018-0201	WASHER, SQUARE, CURVED 60X60X5...	EA	12.000	0.000		12.000	
3	Insulator & Accessories	1-03-001-0101	INSULATOR, PIN POST, 22 KV. P/A	EA	12.000	0.000		12.000	
		1-03-002-0000	INSULATOR, SUSPENSION, CLASS 52...	EA	24.000	0.000		24.000	
3	Insulator & Accessories	1-01-010-0004	ST. WIRE, STRANDED 50/7 SQ MM...	M	2.000	0.000		2.000	
4	Steel wire & Accessories	1-01-023-0000	CLAMP, SINGLE U-BOLT, M. 8 (WIRE...	EA	9.000	0.000		9.000	
		1-02-044-0102	CLAMP, GUY, TRIPLE BOLT	EA	1.000	0.000		1.000	
4	Steel wire & Accessories	1-02-020-0002	TIE WIRE, AL 4.0 MM.	KG	1.330	0.000		1.330	
5	Conductor & Accessories	1-02-044-0103	LINK, CABLE SPACER	EA	1.000	0.000		1.000	
		1-04-007-0005	LB SW., SF6, 3 P22 KV., 400 A.	EA	0.000	0.000		1.000	1.000
5	Conductor & Accessories	1-01-011-0200	BOLT, MACHINE M. 16X130 MM.	EA	6.000	0.000		6.000	
6	Protection Eq. & Accessories	1-01-011-0201	BOLT, MACHINE M. 16X170 MM.	EA	3.000	0.000		3.000	
		1-01-011-0202	BOLT, MACHINE M. 16X200 MM.	EA	2.000	0.000		2.000	
		1-01-011-0204	BOLT, MACHINE M. 16X300 MM.	EA	4.000	0.000		4.000	
		1-01-011-0206	BOLT, MACHINE M. 16X400 MM.	EA	1.000	0.000		1.000	
		1-01-013-0003	BOLT, DOUBLE ARMING, ROUND EYE ...	EA	3.000	0.000		3.000	
		1-01-016-0002	BOLT, STUB M. 24X1.000 MM.	EA	3.000	0.000		3.000	
		1-01-018-0001	NUT, EYE M. 16 DIN 582	EA	3.000	0.000		3.000	
		1-01-018-0100	WASHER, PLAIN SQUARE, 52X52X4...	EA	31.000	0.000		31.000	
		1-01-018-0301	WASHER, LOCK, SPRING, SIZE 16 MM...	EA	4.000	0.000		4.000	
11	Accessories								
**แผนก 1103 HT-C-E แผนกก่อสร้างแรงสูงภายนอก									

ผู้เบิกพัสดุ

ผู้ลงนามตรวจสอบ


ผู้ลงนามอนุมัติ

ได้หาผลมา

– วิทยานิพนธ์ สาขา วิศวกรรมศาสตร์ 0.36x0.36x4.50 เมตร จำนวน 2,2 ชิ้น

- บั๊กเส้า คอรับ ขนาด 14 เมตร และตอม่อ ขนาด $0.36 \times 0.36 \times 4.50$ เมตร จำนวน 1, 1 ต้น

****ย้าย SF6 จากต้นเดิม ติดตั้งต้นใหม่**

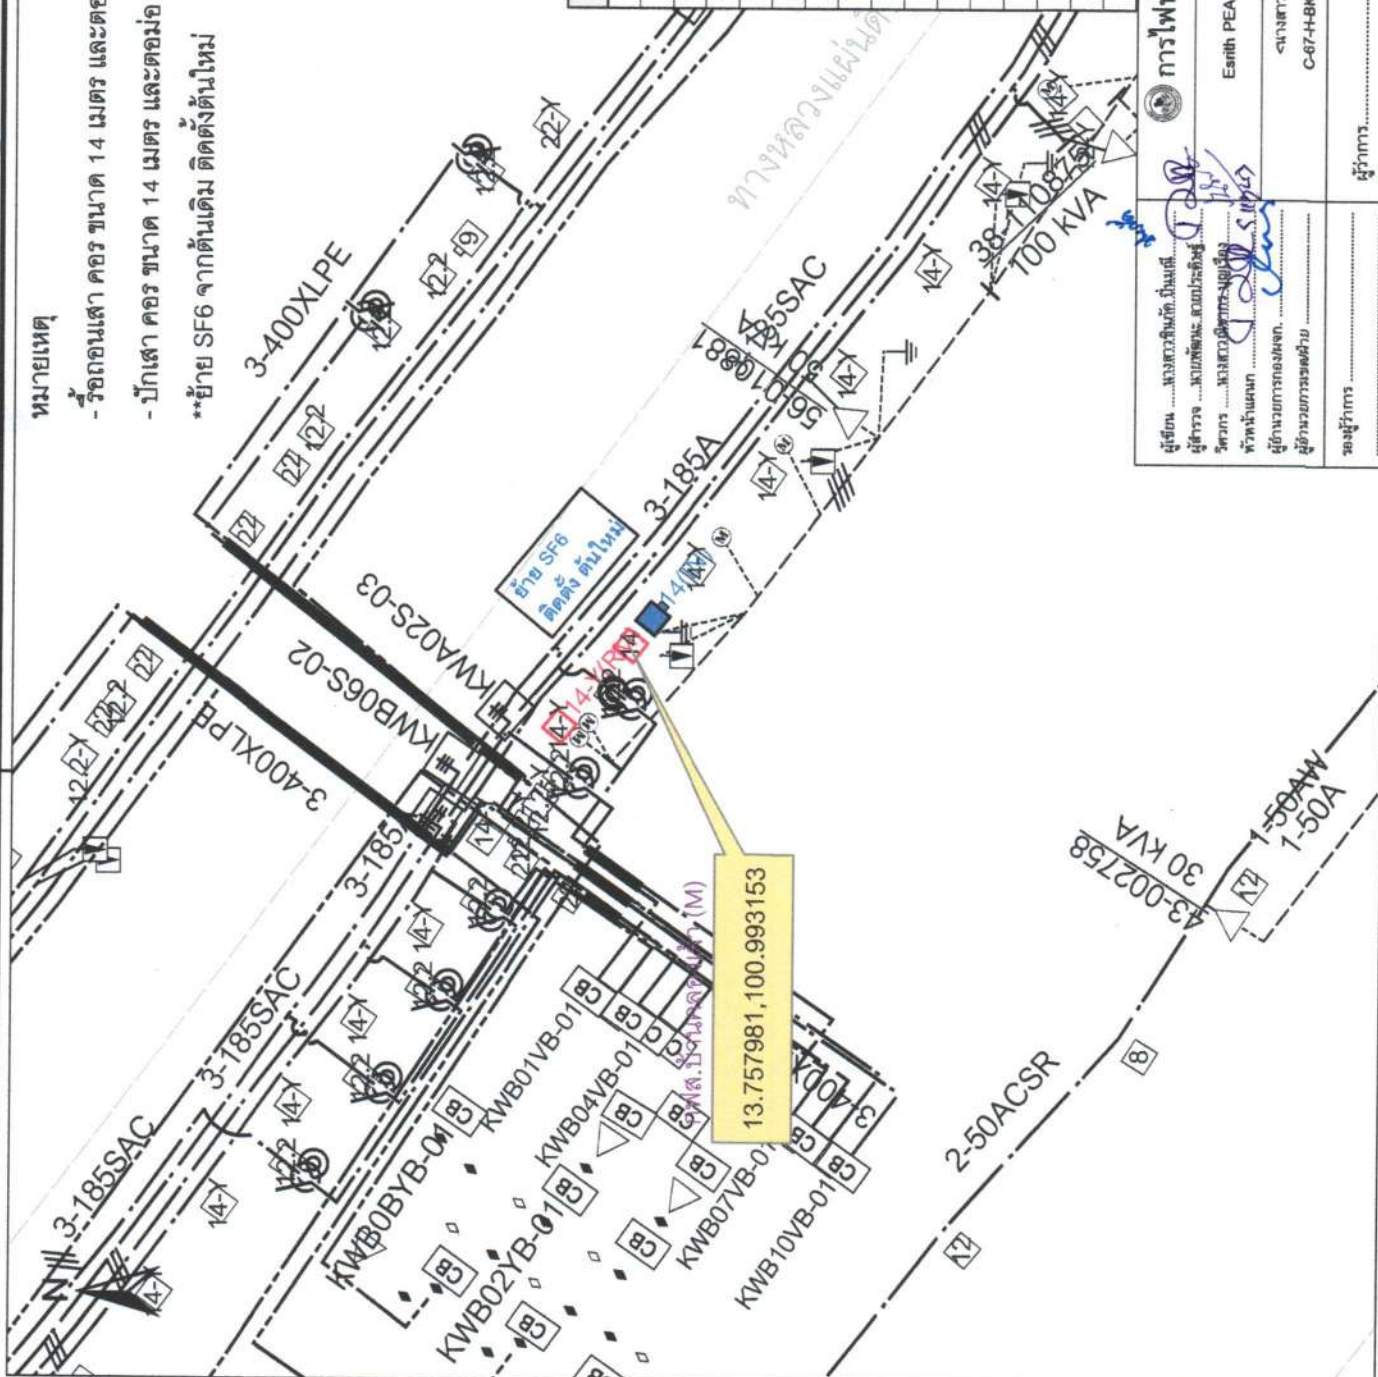

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
■	เสาถนน..... 14..... เมตร	1
□	เสาธง เสาหมุด..... 0.36x0.36x4.50.....	1
⌋	เสาติดโคมไฟถนน.....	21.
NO. 18. HOLLOW SECTION 75 X 75	สายแขวงสูง 115 KV ชนิด.....	21.
HOLLOW SECTION 75 X 75	สายแขวงกลาง 22.35 KV ชนิด.....	21.
HOLLOW SECTION 75 X 75	สายแขวงต่ำ ชนิด.....	21.
—○—	สมอบก.....	ชุด
ป	สัดน้ำ.....	ชุด
⏚	สายต่อลงดิน.....	ชุด
/	Disconnecting Switch.....	ชุด
Ⓜ	Load Break SF6.....	ชุด
⌒	Load Break.....	ชุด
⌑	Droptout Fuse.....	ชุด
△	หม้อแปลง..... เครื่อง	เครื่อง
⦶	Capacitor.....	ชุด
⊞	Reclaser.....	ชุด

ผู้ยื่นขอ.....นางสาวสินัด ปิ่นแป๊ะ	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Esath PEA Generate TitleBox <นางสาวพวง แซ่เตี> C-67-H-BKCSR.0225.02.1	ใช้แบบฉบับ.....
ผู้พิจารณา.....นายพิชิตและ สมปองกิจนัฏ		ถูกแก้ไขแบบ.....
ผู้รับรอง.....นางสาวสินัด ปิ่นแป๊ะ		วันที่ได้รับที่.....16 มิถุนายน 2567
หัวหน้าแผนก.....		แนบแบบฉบับที่.....
ผู้ดำเนินการกองกลาง.....		กรณี.....มาตราส่วน.....1:1,000
ผู้ดำเนินการตรวจสอบ.....		แบบแผนที่.....PG33-015670225
ของผู้นำการ.....		แผนที่.....1 ของจำนวน.....1 แผ่น
