



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง กฟส.คลจ.

เลขที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.) 2624/2567

วันที่ 11 ต.ค. 2567

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางปราณี จันทรัมย์

เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001489069 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 12/2 ม.1 ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.76187156 ,100.97961722 เบอร์โทร 0868182027

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ,ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี),หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟพ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นางปราณี จันทรัมย์ บ้านเลขที่ 12/2 ม.1 ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 2 ฟีดเดอร์ 7 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 2 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นางปราณี จันทรัมย์ เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก


- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 20 เมตร
- ปีกเสา คอ ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.50 เมตร จำนวน 1,1 ต้น

ต้นทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0211.01.1

3.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	_____ 18,861.17 _____ บาท
กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	_____ 18,861.17 _____ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



นายพัฒนะ ลายประดิษฐ์

พช.7 ผบส 525, นว.นค.

.11 ต.ค. 2567

- อนุมัติตามเสนอ



(นายขวัญชัย นวมดี)

ผจก.กฟส.คลจ.


โครงการ C-67-H-BKC - งบบุคลากร 67 กพ. จุฬรณงาน บ้านคลองเจ
หมายเลขใบสั่งงาน C-67-H-BKCSR.0211.01.1 - นางปวีณ์ จันทะนิยม / หมายเลขแผนผัง RD33-015/670211 / ชื่อผู้ควบคุมงาน นายคุณธร เกรตทิพย์
แบบ 1104 LT-C-E แผนก่อสร้างงานต่างภายนอก / เลขที่โครงการ 008004829664 / เลขที่ใบของ 0178754213 / วันที่ต้องการวัสดุ -

กลุ่มวัสดุ	คำอธิบายกลุ่มวัสดุ	รหัสวัสดุ	รายการ (ชื่อวัสดุ)	หน่วย	จำนวนวัสดุใน	จำนวนเบิกสะสม	จำนวนเบิกครั้ง	เบิกครั้งไม่เสร็จเพื่อ	จำนวนวัสดุที่กลับเข้าใช้ใหม่
		1-02-026-0302	PERFORMED D/E, AW 95 SQ MM.	EA	2.000	0.000		2.000	
		1-02-032-0012	H-CONNECTOR, MAIN AL 50-95, TAP ...	EA	1.000	0.000		1.000	
		9-09-001-0035	ผงโลหะสำหรับเชื่อมสายไฟฟ้า	KG	0.020	0.000		0.020	
*		9-09-001-1007	WELDING POWDER, ST. WIRE 50 S...	EA	3.000	0.000		3.000	
	1 Concrete Products	1-00-001-0002	POLE 9 M.	EA	1.000	0.000		1.000	
*	1 Concrete Products	1-00-002-0002	STUB 0.25X0.25 M. 4.5 M. LONG	EA	1.000	0.000		1.000	
	3 Insulator & Accessories	1-03-003-0000	INSULATOR, SPOOL, CLASS 53-2 T...	EA	4.000	0.000		4.000	
	3 Insulator & Accessories	1-03-013-0000	RACK, 2X200 MM. EXT. BACK	EA	2.000	0.000		2.000	
*	4 Steel wire & Accessories	1-01-010-0004	ST. WIRE, STRANDED 50/7 SQ MM...	M	21.000	0.000		21.000	
	5 Conductor & Accessories	1-02-007-0004	CABLE, AL, 750 V, 95 SQ MM. TIS...	M	44.000	0.000		44.000	
		1-02-018-0001	TAPE, PVC, O/D. 0.18X19X10, 000 M...	EA	2.000	0.000		2.000	
		1-02-020-0000	TAPE, ARMOR, AL 1X10 MM.	KG	0.030	0.000		0.030	
		1-02-030-0102	CONN., PG, DOUBLE BOLT, AL 25-95...	EA	2.000	0.000		2.000	
		1-02-031-0002	CONNECTOR, D/E, AL 95-120 SQ MM.	EA	2.000	0.000		2.000	
*	5 Conductor & Accessories	1-04-000-0300	S.A. 250-500 V. 2.5-5.0 KA	EA	1.000	0.000		1.000	
*	6 Protection Eq. & Accessories								
	11 Accessories	1-01-011-0201	BOLT, MACHINE M. 16X170 MM.	EA	1.000	0.000		1.000	
		1-01-011-0202	BOLT, MACHINE M. 16X200 MM.	EA	1.000	0.000		1.000	
		1-01-011-0204	BOLT, MACHINE M. 16X300 MM.	EA	2.000	0.000		2.000	
		1-01-016-0000	BOLT, STUB M. 24X600 MM.	EA	3.000	0.000		3.000	
		1-01-018-0100	WASHER, PLAIN, SQUARE, 52X52X4...	EA	3.000	0.000		3.000	
*	11 Accessories	1-01-022-0002	GROUND ROD, 60X60X5 MM. 2 M. LO...	EA	1.000	0.000		1.000	
*	12 Other								
	12 Other	1-08-004-0001	CONDUIT, PVC, RIGID, 20X2500 MM...	EA	3.000	0.000		3.000	
**แบบ 1104 LT-C-E แผนก่อสร้างงานต่างภายนอก									



หมายเหตุ

- สถานที่ใช้ไฟ 12/2 ม.1 ต.หมามแดง อ.เมืองจะเจียงเทรา
- จ.จะเจียงเทรา โทร.086-8182027 ,083-9479061
- รายละเอียดงาน
- จุด A - B
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 20 เมตร
- บักเสา คอ 9 เมตร และดอมโม่ ขนาด 0.25x0.25x4.50 เมตร จำนวน 1, 1 ต้น

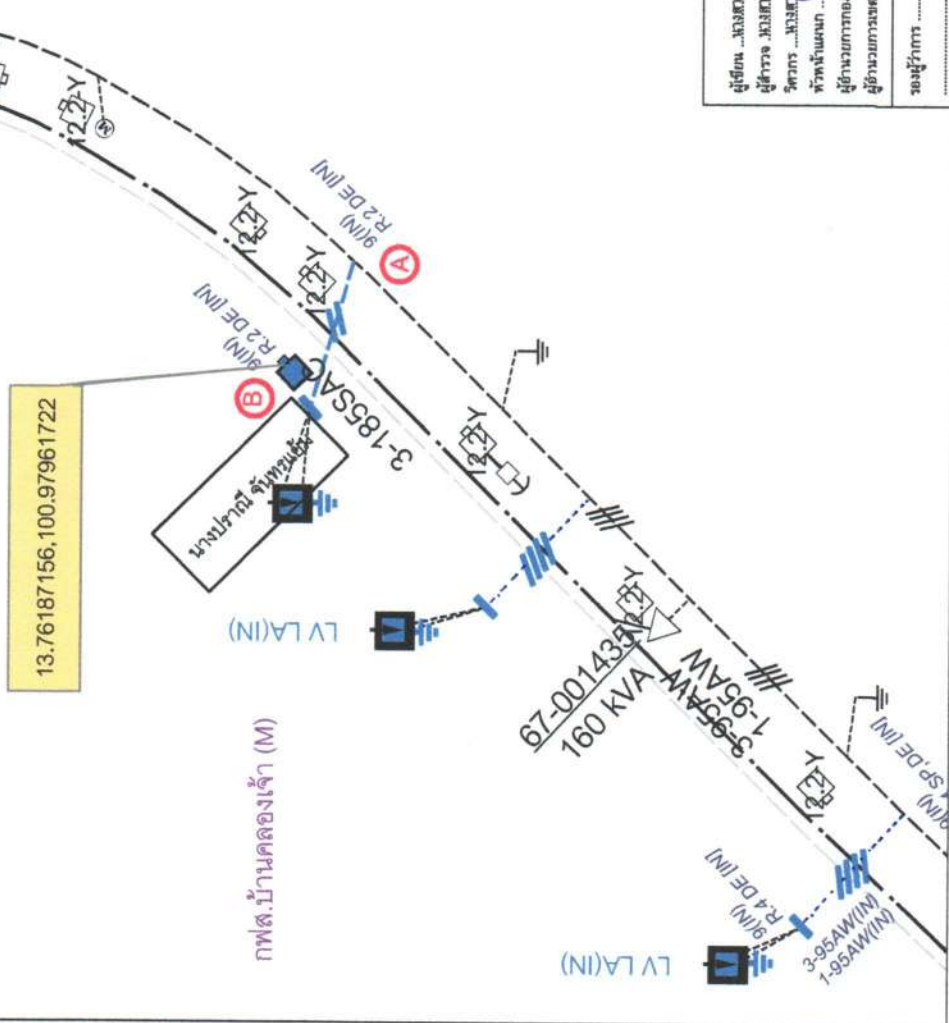

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
■	เสาคอนกรีต เมตร	1 ต้น
□	เสาขอมือ คอนกรีต 0.25x0.25x4.50	1 ต้น
⌋	เสาโคเค็มไฟถนน	ต้น
—	สายแรงสูง 115 kV ชนิด	ม.
—	สายแรงกลาง 22.33 kV ชนิด	ม.
—	สายแรงต่ำ ชนิด 95AW	20 ม.
→	หมอบก	ชุด
⌋	ส่ฟ้า L.T.	1 ชุด
⌋	สายส่งดิน L.T.	1 ชุด
⌋	Disconnecting Switch	ชุด
⌋	Load Break SF6	ชุด
⌋	Load Break	ชุด
⌋	Dropout Fuse	ชุด
⌋	หม้อแปลง	เครื่อง
+	Capacitor	ชุด
⌋	Recluser	ชุด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		ใช้แบบ ถูกแทนด้วยแบบ วันที่แก้ไข 3 ตุลาคม 2567
Esrith PEA Generate TitleBox		แก้ไขวันที่ แก้ไขเป็น เมตร ขนาดสาย 1:1,000
<งานประติ จักรณย์> C-87-H-BKCSR.0211.01.1		มวนตราที่ RD33-015879211 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น
ผู้เขียน นางสาววิมล นิ่มมณี ผู้ตรวจ นางสาววิมล นิ่มมณี วิศวกร นางสาววิมล นิ่มมณี หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกองหลัก ผู้อำนวยการเขตสาย รองผู้ว่าการ	ผู้ว่าราชการ	
