



ที่ สท ๐๐๐๓ /ว ๗/๕

สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย
ถนนนิกรเกษม สท ๖๔๐๐๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน บัญชีแนบท้าย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท ๐๐๐๓/ว ๔๓๕๕ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อ้างถึง จังหวัดสุโขทัยได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่
๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อติดตาม กำกับ เร่งรัดและรับทราบปัญหา อุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย) เพื่อให้ส่วนราชการที่เข้าร่วม
การประชุมฯ ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม โดยแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัยทราบ ภายในวันที่
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมฯ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน
คลังจังหวัดสุโขทัย www.cgd.go.th/sti เลือกหนังสือเวียนคลังจังหวัด หัวข้อ “รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖” หรือ QR Code หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางประภาวดี สุคันธมาลัย)
คลังจังหวัดสุโขทัย

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร.๐ ๕๕๖๑ ๓๓๖๓ ต่อ ๓๑๗

โทรสาร ๐ ๕๕๖๑ ๒๐๔๓

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ sti@cgd.go.th



บัญชีแนบท้าย

- ๑) ปลัดจังหวัดสุโขทัย
- ๒) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย
- ๓) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
- ๔) ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
- ๕) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย
- ๖) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย
- ๗) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔
- ๘) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย
- ๙) ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย
- ๑๐) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
- ๑๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
- ๑๒) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒
- ๑๓) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
- ๑๔) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย
- ๑๕) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสวรรค์สุโขทัย
- ๑๖) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย
- ๑๗) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
- ๑๘) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุโขทัย
- ๑๙) ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย
- ๒๐) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
- ๒๑) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
- ๒๒) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
- ๒๓) นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
- ๒๔) นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย
- ๒๕) นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก
- ๒๖) ผู้อำนวยการงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

ผู้มาประชุม

๑. นายสุชาติ ทิศสุข	ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย	รองประธานกรรมการ
๓. นายชัยพงษ์ สุขยากร	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔	กรรมการ
๔. นายบัณฑิต โพธิ์ดก	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๕. นางสาวภัทรศิริ จันแก้ว	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย	กรรมการ
๖. นางสาวดาวรุ่ง ทองอำไพ	แทน ปลัดจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๗. นางสาวรุ่ง บัญมี	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๘. นางสาวรุจาภา ตัดกัน	แทน ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๙. นางยุพิน กิติเวชโกศลวัฒน์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย	กรรมการ
๑๐. นางสาวรุ่งกานต์ ธงชัย	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	กรรมการ
๑๑. นางนัฐธิดา เขียวบาง	แทน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย	กรรมการ
๑๒. นางสาวเพ็ญจันทร์ มั่นคง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุโขทัย	กรรมการ
๑๓. นางญาณินท์ จิตตรงค์อาภรณ์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑	กรรมการ
๑๔. นางณัฏฐิญา พัฒนพิเชียร	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒	กรรมการ
๑๕. นางสาวทิพวรรณ ขำไท้	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๑๖. นางเถาว์วัลย์ รากคำ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย	กรรมการ
๑๗. นางสาวโสภา หล้าวงศ์สาย	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสวรรค์สุโขทัย	กรรมการ
๑๘. นางอรุณศรี บรรณสีเขียว	แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย	กรรมการ
๑๙. นายนฤชา ลิ้มภูษิตเจริญ	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีสุโขทัย	กรรมการ
๒๐. นางสาวนิตยวรรณ พิชากุล	แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุโขทัย	กรรมการ
๒๑. นายปรามาช ตรีศรี	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	กรรมการ
๒๒. นายชรินทร์ พิทักษ์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง	กรรมการ
๒๓. นายธนสร กลีมาลี	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย	กรรมการ
๒๔. นางปวง สารเทศ	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๒๕. นางอรกัญญา กิตติถิณ	แทน นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี	กรรมการ
๒๖. นางสาวกฤตวรรณ มธุระ	แทน นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย	กรรมการ
๒๗. นางณปรีศา ม่วงหมี	แทน นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก	กรรมการ

รับทราบปัญหา อุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายงบประมาณ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ยังคงใช้คำสั่งชุดเดิม

จากรายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดสุโขทัย มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ อยู่ลำดับที่ ๓๗ ของประเทศ แต่มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔.๒๐ อยู่ลำดับที่ ๑๘ ของประเทศ ในขณะที่งบลงทุนมีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ ๑๐.๕๓ อยู่ลำดับที่ ๕ ของประเทศ ถือว่าอยู่ในลำดับที่สูง แม้ว่าในระหว่างปีแต่ละหน่วยงานจะประสบปัญหาอุปสรรคต่างๆ เช่นไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ตามแผน เนื่องจากมีน้ำท่วมขัง รอผลการอนุญาตใช้พื้นที่อุทยาน พื้นที่ป่า ผู้รับจ้างไม่ยอมเข้าทำงานหรือเข้าทำงานล่าช้า ปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ก็ตาม ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ที่ให้ความร่วมมือเร่งรัดการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม วันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จึงไม่มีรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการดำเนินงานตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการฯ นำเสนอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดสุโขทัย ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ดังนี้
งบประจำ ได้รับจัดสรร ๒,๔๒๓.๓๔๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒,๒๕๑.๑๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๙ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕.๑๑ ใช้จ่าย ๒,๔๔๕.๕๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๙๒ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๐.๙๒
งบลงทุน ได้รับจัดสรร ๓,๐๔๐.๔๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒,๖๐๐.๕๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๓ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐.๕๓ ใช้จ่าย ๓,๐๒๕.๓๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๐ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๕๐
ภาพรวม ได้รับจัดสรร ๕,๔๖๓.๗๔๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔,๘๕๑.๖๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๐ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔.๒๐ ใช้จ่าย ๕,๔๗๐.๘๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๑๓ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๑๓
ลำดับการใช้จ่าย ผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนได้เป็นลำดับที่ ๕๓ ของประเทศและผลการใช้จ่ายภาพรวมได้เป็นลำดับที่ ๓๗ ของประเทศ
ลำดับการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนได้เป็นลำดับที่ ๕ ของประเทศและผลการเบิกจ่ายภาพรวมได้เป็นลำดับที่ ๑๘ ของประเทศ

/ปัญหาอุปสรรค...

ปัญหาอุปสรรค

การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๕๐) เนื่องจาก

๑. อยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
๒. อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้/ป่าสงวนแห่งชาติ
๓. ได้รับจัดสรรงบประมาณปลายปีงบประมาณ
๔. ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐
๕. อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบบูรณาการ
๖. มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างและไม่ได้ส่งคืนต้นสังกัดหรือส่งคืนแล้วแต่ต้นสังกัดไม่โอนกลับ ของหน่วยงานหลัก ดังนี้

- ๑) โครงการชลประทานสุโขทัย งบประมาณ ๒.๐๒๕ ล้านบาท
- ๒) งบพัฒนาจังหวัด (สำนักงานจังหวัด) งบประมาณ ๒.๓๔๓ ล้านบาท
- ๓) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๙.๕๓๒ ล้านบาท
- ๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ งบประมาณ ๐.๙๓๙ ล้านบาท

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕.๑๑) เนื่องจาก

๑. มีเงินเหลือจ่ายและไม่ได้ส่งคืนต้นสังกัดหรือส่งคืนแล้วแต่ต้นสังกัดไม่โอนกลับ ของหน่วยงานหลัก ดังนี้

- ๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ งบประมาณ ๐.๘๓๔ ล้านบาท
- ๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย งบประมาณ ๒.๕๙๑ ล้านบาท
- ๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ งบประมาณ ๑.๙๖๗ ล้านบาท
- ๔) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๓.๐๗๘ ล้านบาท
- ๕) วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชาลัย งบประมาณ ๐.๒๘๕ ล้านบาท

๒. ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม และกันยายน ๒๕๖๕ ของหน่วยงานหลัก ดังนี้

- ๑) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑๖๖.๒๘๓ ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

- ๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๙.๙๗๓ ล้านบาท โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ประธาน

ขอให้ทุกหน่วยงานทบทวนสาเหตุของปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายในปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเดิม ๆ เช่น การขอใช้พื้นที่ หากโครงการไหนเห็นว่ายังมีปัญหา และใช้เวลานานก็ยังไม่ต้องเสนอโครงการ ให้ดำเนินการขออนุญาตให้เรียบร้อย แล้วขออนุมัติโครงการมาในคราวหลังได้ หรือโครงการที่ต้องปรับปรุงแบบบูรณาการดำเนินงานหรือรูปแบบงานก่อสร้าง จึงขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันตรวจสอบ ปัญหาใดสามารถแก้ไขได้ก่อนให้เร่งแก้ไข และเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน เพราะการรีบเร่งดำเนินการโดยเร็วจะช่วยลดปัญหาที่เคยเกิดขึ้นลงได้ จะช่วยให้สามารถก่อนนี้ผูกพันได้เร็วขึ้น และอย่าให้เกิดปัญหาเดิม ๆ ซ้ำ ๆ ยกเว้นปัญหาที่ไม่อาจคาดการณ์ได้

/เลขานุการฯ...

เลขานุการฯ กล่าวถึงปัญหาที่เกิดจากการมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างและไม่ได้ส่งคืนต้นสังกัดหรือส่งคืนแล้วแต่ต้นสังกัดไม่โอนกลับ ส่วนหนึ่งเป็นปัญหาด้านเทคนิคระหว่างหน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง แต่สิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อมีเงินเหลือจ่ายไม่ประสงค์ใช้ต่อ คือให้รับทำหนังสือส่งคืนเงินเหลือจ่ายให้ส่วนกลาง เพื่อนำเงินดังกล่าวไปบริหารต่อ โดยไม่ต้องรอส่งคืนเมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณ

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการต่อไป

๓.๒ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการฯ นำเสนอมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอ เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่ ๓๓๖๕/ว ๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕) เห็นควรให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑) เงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ให้เบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ ๑ สำหรับเงินกันที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วให้เร่งก่อหนี้และเบิกจ่ายโดยเร็ว

๒) ให้ดำเนินการตามหนังสือสำนักงบประมาณ ส่วนที่ ๓๓๖๕/ว ๑๘๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ และรายการที่มีลักษณะรายการจ่ายงบลงทุน ให้เร่งก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๒

๓) การเบิกจ่ายโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่งดำเนินโครงการ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

๔) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ประจำ	๓๕	๓๕.๓๓	๕๕	๕๕.๗๘	๘๐	๘๑.๗๖	๙๘	๑๐๐.๐๐
ลงทุน	๑๙	๒๘.๙๖	๓๙	๕๘.๑๕	๕๗	๘๑.๖๕	๗๕	๑๐๐.๐๐
ภาพรวม	๓๒	๓๔.๐๘	๕๒	๕๖.๒๔	๗๕	๘๑.๗๔	๙๓	๑๐๐.๐๐

/เพื่อให้การ...

เพื่อให้การเร่งรัดติดตามผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายของส่วนราชการในจังหวัดสุโขทัย เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยให้ความใกล้เคียงข้อเท็จจริงตามสถานการณ์มากที่สุด เห็นควรกำหนด เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายเดือน ดังนี้

**เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายเดือน**

หน่วย: ร้อยละ

เดือน	ประจำ		ลงทุน		ภาพรวม	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ตุลาคม ๒๕๖๕	๑๑	๑๑.๗๘	๖	๙.๖๕	๑๐	๑๑.๓๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๒๓	๒๓.๕๖	๑๓	๑๙.๓๐	๒๑	๒๒.๗๒
ธันวาคม ๒๕๖๕	๓๕	๓๕.๓๓	๑๙	๒๘.๙๖	๓๒	๓๔.๐๘
มกราคม ๒๕๖๖	๔๑	๔๒.๑๕	๒๕	๓๘.๖๙	๓๘	๔๑.๔๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๔๘	๔๘.๙๗	๓๒	๔๘.๔๒	๔๕	๔๘.๘๖
มีนาคม ๒๕๖๖	๕๕	๕๕.๗๘	๓๙	๕๘.๑๕	๕๒	๕๕.๗๘
เมษายน ๒๕๖๖	๖๓	๖๔.๔๔	๔๕	๖๕.๙๘	๕๙	๖๔.๒๘
พฤษภาคม ๒๕๖๖	๗๑	๗๓.๑	๕๑	๗๓.๘๒	๖๗	๗๒.๗๘
มิถุนายน ๒๕๖๖	๘๐	๘๑.๗๖	๕๗	๘๑.๖๕	๗๕	๘๑.๗๔
กรกฎาคม ๒๕๖๖	๘๖	๘๗.๘๔	๖๓	๘๗.๗๗	๘๑	๘๗.๘๓
สิงหาคม ๒๕๖๖	๙๒	๙๓.๙๒	๖๙	๙๓.๘๙	๘๗	๙๓.๙๒
กันยายน ๒๕๖๖	๙๘	๑๐๐.๐๐	๗๕	๑๐๐.๐๐	๙๓	๑๐๐.๐๐

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เลขานุการฯ นำเสนอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดสุโขทัย ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดังนี้
งบประจำ ได้รับจัดสรร ๘๙๕.๘๕๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕๒๗.๓๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘๖ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๓.๘๖ ใช้จ่าย ๕๓๓.๘๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๙ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๔.๒๖
งบลงทุน ได้รับจัดสรร ๒,๕๙๑.๖๓๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๔๔.๖๔๑ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๓.๓๐ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕.๗๐ ใช้จ่าย ๖๘๔.๔๙๒ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๖.๔๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๕๕

/ภาพรวม...

ภาพรวม ได้รับจัดสรร ๓,๔๘๗.๔๙๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘๗๑.๙๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๗.๐๐ ใช้จ่าย ๑,๒๑๘.๓๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙๓ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๘๕

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ ส่วนกลางจัดสรรให้จังหวัด งบ (Function)													
รายการ	เงินจัดสรร	ผลการก่อหนี้ (PO)+ สำรองเงินมีหนี้		เบิกจ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		รวมใช้จ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๑/๖๖	+/- เป้าหมาย	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๑/๖๖	+/- เป้าหมาย		
- งบประจำ	๘๗๐.๔๕๕	๖.๒๑๒	๐.๗๑	๕๑๕.๘๒๔	๕๙.๖๖	๓๕.๐๐	๒๔.๒๖	๕๒๐.๐๓๖	๕๙.๙๗	๓๕.๓๓	๒๔.๖๔	๓๔๘.๔๑๓	
- งบลงทุน	๒,๔๕๙.๑๓๘	๓๓๙.๘๕๑	๑๓.๘๒	๓๔๔.๖๔๑	๑๔.๐๑	๑๙.๐๐	-๔.๙๙	๖๘๔.๔๙๒	๒๗.๘๓	๒๘.๙๖	-๑.๑๓	๑,๗๗๔.๖๔๖	
- ภาพรวม	๓,๓๒๙.๖๐๓	๓๔๖.๐๖๓	๑๐.๓๓	๘๖๐.๔๖๕	๒๕.๘๔	๕๔.๐๐	-๖.๑๖	๑,๒๐๔.๕๒๘	๔๓.๘๐	๓๕.๐๘	๒.๑๖	๒,๑๒๓.๐๗๕	

งบจังหวัด													
รายการ	เงินจัดสรร	ผลการก่อหนี้ (PO)+ สำรองเงินมีหนี้		เบิกจ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		รวมใช้จ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๑/๖๖	+/- เป้าหมาย	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๑/๖๖	+/- เป้าหมาย		
- งบประจำ	๒๕๔.๕๐๐	๐.๓๐๓	๑.๑๙	๑๑.๕๐๕	๔.๕๓	๓๕.๐๐	๑๐.๓๐	๑๑.๕๐๕	๔.๖๙	๓๕.๓๓	๑๑.๑๖	๑๓๓.๙๙๕	
- งบลงทุน	๑๓๒.๔๕๕	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	๑๙.๐๐	-๑๙.๐๐	-	๐.๐๐	๒๘.๙๖	-๒๘.๙๖	๑๓๒.๔๕๕	
- ภาพรวม	๓๘๖.๙๕๕	๐.๓๐๓	๑.๑๙	๑๑.๕๐๕	๔.๕๓	๕๔.๐๐	-๖.๖๐	๑๑.๕๐๕	๔.๖๙	๓๕.๐๘	-๒๔.๓๖	๒๖๕.๔๕๐	

รวมงบประมาณทั้งสิ้น													
รายการ	เงินจัดสรร	ผลการก่อหนี้ (PO)+ สำรองเงินมีหนี้		เบิกจ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		รวมใช้จ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๑/๖๖	+/- เป้าหมาย	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๑/๖๖	+/- เป้าหมาย		
- งบประจำ	๘๙๕.๘๕๕	๖.๕๑๕	๐.๗๓	๕๒๗.๓๒๙	๕๙.๘๖	๓๕.๐๐	๒๔.๒๖	๕๓๑.๕๔๑	๕๙.๙๗	๓๕.๓๓	๒๔.๖๔	๓๖๔.๓๑๔	
- งบลงทุน	๒,๕๙๓.๖๐๓	๓๓๙.๘๕๑	๑๓.๑๑	๓๔๔.๖๔๑	๑๔.๐๑	๑๙.๐๐	-๔.๙๙	๖๘๔.๔๙๒	๒๗.๘๓	๒๘.๙๖	-๑.๑๓	๑,๙๐๙.๑๑๑	
- ภาพรวม	๓,๔๘๙.๔๕๘	๓๔๖.๓๖๖	๑๑.๘๓	๘๗๑.๙๗๐	๒๕.๘๔	๕๔.๐๐	-๖.๖๐	๑,๒๑๖.๐๓๓	๔๓.๘๐	๓๕.๐๘	๒.๑๖	๒,๒๗๓.๔๒๕	

ผลการจัดลำดับ (Ranking) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่าย

ระดับประเทศ / คลังในเขต ๖ (๙ จังหวัด) / กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ (๕ จังหวัด)

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

รายการ	ประเทศ				คลังจังหวัดในเขต ๖ (๙ จังหวัด)				กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ (๕ จังหวัด)			
	งบภาพรวมจังหวัด		งบพัฒนาจังหวัด		งบภาพรวมจังหวัด		งบพัฒนาจังหวัด		งบภาพรวมจังหวัด		งบพัฒนาจังหวัด	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
งบประจำ	๑๓	๑๓	๒	๔	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑
งบลงทุน	๙	๒๑	๗๕	๗๕	๑	๔	๘	๘	๑	๓	๕	๓
ภาพรวม	๑๔	๒๖	๓	๙	๑	๓	๑	๑	๑	๓	๑	๑

หมายเหตุ > ๙ คลังจังหวัดในเขต ๖ ประกอบด้วย พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี

> ๕ จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์

มติที่ประชุม รับทราบ

/ ๓.๔ รายงานผล...

๓.๔ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เลขานุการฯ นำเสนอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อมูลถึงวันที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี				
รายการ	เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย		คงเหลือ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
- งบ Function	๕๗๖.๙๕๑	๖๖.๗๕๗	๑๑.๕๗	๕๑๐.๑๙๔
- งบพัฒนาจังหวัด	๔๗.๙๔๓	๑๒.๖๒๐	๒๖.๓๒	๓๕.๓๒๓
รวมเงินเหลื่อมปี	๖๒๔.๘๙๔	๗๙.๓๗๗	๑๒.๗๐	๕๔๕.๕๑๗

๓.๕ รายงานผลการใช้จ่ายโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓) ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เลขานุการฯ นำเสนอรายงานผลการใช้จ่ายโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ข้อมูลถึงวันที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๖ หน่วยงาน โดยต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการ	เงินกัน	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ หลัง เบิกจ่าย
๑	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	๑๙	๑๙.๑๗๙	๐.๐๐๐	๒.๖๕๑	๑๓.๘๒	๑๖.๕๒๘
๒	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	๓	๕๓.๒๑๕	๐.๐๐๐	๕๑.๐๙๓	๙๖.๐๑	๒.๑๒๒
๓	โรงพยาบาลสุโขทัย	๑	๐.๐๑๕	๐.๐๐๐	๐.๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๑๕
๔	โรงพยาบาลศรีสวรรค์สุโขทัย	๒	๐.๑๔๒	๐.๐๐๐	๐.๑๓๙	๙๗.๕๓	๐.๐๐๓
๕	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	๑๖	๘.๑๗๘	๔.๙๒๗	๐.๑๕๑	๑.๘๔	๘.๐๒๘
๖	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	๒	๑๐.๑๑๐	๑๐.๐๙๘	๐.๐๐๐	๐.๐๐	๑๐.๑๑๐
รวม		๔๓	๙๐.๘๓๙	๑๔.๐๒๕	๕๔.๐๓๒	๕๙.๔๘	๓๖.๘๐๖

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๖ แนวทางปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐

ผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ ซึ่งบังคับให้กับสัญญาที่เข้าเงื่อนไขตาม ว ๖๙๓ และ ว ๖๔๕ โดยสืบเนื่องจาก ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดฯ โดยกำหนดค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นอัตราร้อยละ ๐ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การให้ความช่วยเหลือสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยจำนวนวันที่คิดค่าปรับเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญา จนถึงวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ ซึ่งต่อมาได้มี ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ แก้ไขระยะเวลาตาม ว ๖๙๓ เป็นสิ้นสุดการนับระยะเวลาการได้อัตราค่าปรับร้อยละ ๐ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เนื่องจากพบว่าภาพรวมของประเทศไทยมีแนวโน้มพบผู้ป่วยรายใหม่และผู้ป่วยเสียชีวิตที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด และต่อเนื่อง ประกอบกับการขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ออกไป มิได้มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐแต่อย่างใด

และหลังจากที่มีการแก้ไขสัญญาให้ค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ แล้ว คู่สัญญาบางรายไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา เนื่องจากถึงแม้งานล่าช้าก็ไม่ถูกปรับหรือถูกปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐไม่สามารถใช้พัสดุได้ตามความต้องการภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญา อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ จึงกำหนดมาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ ตาม ว ๑๔๕๙ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานประเมินผลการทำงานตามสัญญาหรือข้อตกลง เป็นการเร่งรัดให้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนการทำงาน และหากไม่เร่งดำเนินการสามารถบอกเลิกสัญญาได้ เช่น กรณีแจ้งให้ผู้ประกอบการแก้ไขสัญญาและปรับแผนงานใหม่ หากเพิกเฉยไม่ดำเนินการ ให้หน่วยงานประเมินผลการทำงานตามข้อ ๕ เช่น ข้อ ๕.๑ สัญญาครบกำหนดการส่งมอบ ประเมินผลงานแล้วผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนเกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของผู้ประกอบการ หน่วยงานสามารถใช้ดุลพินิจบอกเลิกสัญญา เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเร่งรัดให้คู่สัญญาเร่งดำเนินงาน ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบและประเมินโครงการที่คู่สัญญายังไม่ส่งมอบงานและดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ว่าอยู่ในขั้นตอนข้อใด หากเข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขตาม ว ๑๔๕๙ สามารถบอกเลิกสัญญาและหลังบอกเลิกสัญญาให้ดำเนินการตาม ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ต่อไป

แนวทางปฏิบัติตาม ว 1459 มาตราการเร่งรัดการปฏิบัติงาน สำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0




1 บังคับกับสัญญาที่เข้าเงื่อนไขตาม ว 693 และ ว 645

2 การแก้ไขสัญญาและการปรับแผนใหม่

- 2.1 แจ้งแก้ไขสัญญาและปรับแผนใหม่ (แจ้งภายใน 15 + 15 วันทำการ)
- 2.2 แก้ไขสัญญาแล้วแต่ยังไม่ปรับแผน (แจ้งภายใน 15 - 15 วันทำการ)
- 2.3 ยังไม่มีแผนแนบท้ายมาก่อน ให้ทำแผนใหม่ (ส่วนหนึ่งของสัญญา)
- 2.4 ส่งงานงวดเดียว หรือ งานเหลือ เวลาไม่เกิน 60 วัน หรือวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทแผนใหม่หรือไม่ก็ได้




3 แนวทางปรับแผนการทำงานใหม่

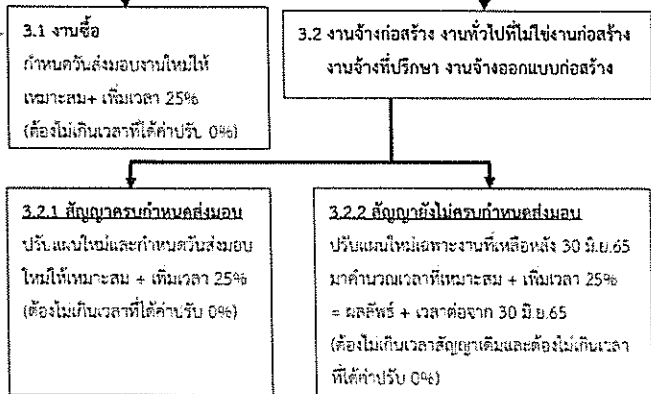

4 แนวทางติดตามการประเมินผลการทำงาน

- 4.1 คู่สัญญาไม่เข้าปฏิบัติงาน > แจ้งเร่งเข้าทำงาน (ภายใน 15 + 15 วันทำการ)
- 4.2 คู่สัญญาเข้าปฏิบัติงาน ประเมินผลตาม ข้อ 5.3

5 แนวทางบอกเลิกสัญญา และคิดค่าปรับ (น 103 วรรค 1)

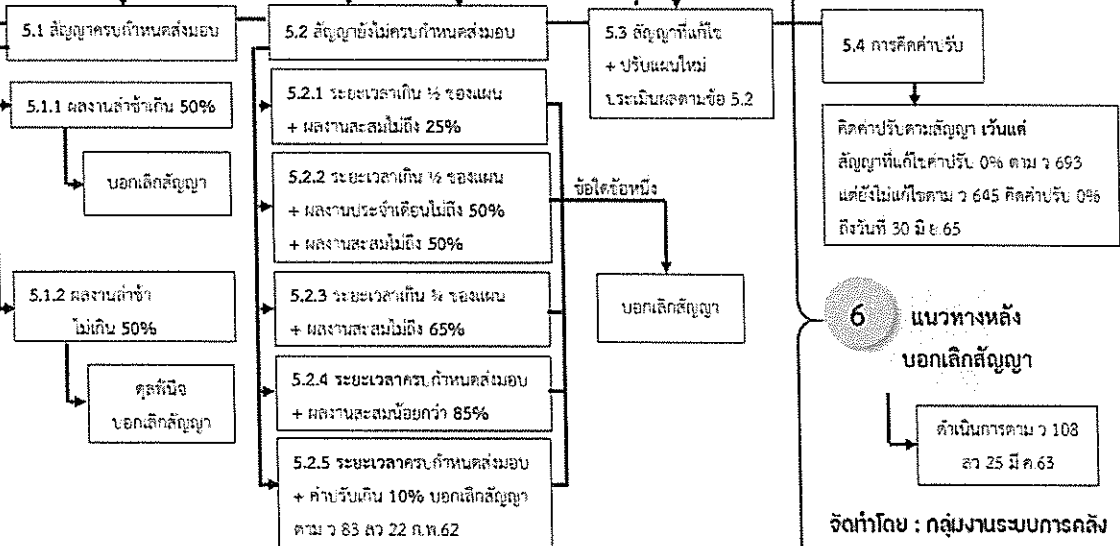

สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
ชั้น 1 ถนนเกษม ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย 64000



โทรศัพท์ 0-5561-3363 มือถือ 08-8278-8950
โทรสาร 0-5561-2043



E-Mail: stlscgd.go.th
Facebook: สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย

มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่มีโครงการและยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๒๓ หน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เลขานุการฯ ขอตีตามหน่วยงานที่โครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ข้อมูล ณ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

ผู้แทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน
๑๓ โครงการ ดังนี้

- โครงการคาดว่าจะประกาศประกวดราคาสัปดาห์หน้า จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ จักรยาน
วัดงาน งบประมาณ ๐.๕๕๐ ล้านบาท เครื่องฝึกและออกกำลังกายแบบมือหมุน งบประมาณ
๐.๗๗๐ ล้านบาท เครื่องฝึกและออกกำลังกายแบบมือหมุน งบประมาณ ๐.๘๘๕ ล้านบาท
และชุดวิเคราะห์ข้อมูลแข่งขันกีฬา งบประมาณ ๐.๗๒๐ ล้านบาท
- โครงการที่ทำ PO แล้ว จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับห้องประชุม
งบประมาณ ๐.๑๔๕ ล้านบาท และเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง งบประมาณ ๐.๐๓๐
ล้านบาท
- โครงการที่ส่งมอบแล้วและอยู่ระหว่างติดตั้ง จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ สนามแข่งขันกีฬา
ปันจักสีลัต งบประมาณ ๐.๒๘๘ ล้านบาท และชุดอุปกรณ์กีฬาออกกั๊ (กลางแจ้ง) งบประมาณ
๐.๓๐๐ ล้านบาท
- โครงการที่อยู่ระหว่างพิจารณาตรวจสอบครุภัณฑ์ และคาดว่าจะประกาศประกวดราคาวันนี้
จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน คณะศึกษาศาสตร์ งบประมาณ ๐.๕๒๔
ล้านบาท และครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน คณะศิลปศาสตร์ งบประมาณ ๐.๕๒๔ ล้านบาท
- โครงการที่อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาปรับแบบรูปรายการ และคาดว่าจะสัปดาห์หน้า
จะประกาศ TOR ได้จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ปรับปรุงโรงจอดรถ งบประมาณ ๒.๗๐๐ ล้านบาท
และปรับปรุงถนน งบประมาณ ๑.๘๙๐ ล้านบาท
- โครงการที่อยู่ระหว่างประชุมคณะกรรมการแบบรูปรายการ คือ ปรับปรุงอฒจันทร์
งบประมาณ ๒๕.๓๕๐ ล้านบาท

๒. โครงการชลประทานสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๑๑ โครงการ ดังนี้

๑. ค่าใช้จ่ายตามแผนป้องกันแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๐.๑๖๕ ล้านบาท
วางแผนการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เริ่มเบิกจ่ายเดือนมกราคม ๒๕๖๖
๒. ปรับปรุง ทรบ.กลางคลองแคว กม.๔+๓๑๔ งบประมาณ ๗.๒๒๕ ล้านบาท มีการ
เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและก่อหนี้ผูกพันเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
๓. ปรับปรุง ทรบ.ปากคลองแยกซอยคลองแคว กม.๓+๖๒๓ ผังซ้าย งบประมาณ ๒.๘๙๗
ล้านบาท มีการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและก่อหนี้ผูกพันเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
๔. ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งบประมาณ ๐.๐๕๔ ล้านบาท เบิกจ่ายเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

๕. กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรในเขตโครงการชลประทานสุโขทัย งบประมาณ ๒.๑๒๐ ล้านบาท ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงศูนย์ดำเนินการ คาดว่าจะเบิกจ่าย เดือนธันวาคม ๒๕๖๕
 ๖. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองแคว งบประมาณ ๑.๙๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะ ก่อหนี้ผูกพันเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
 ๗. ซ่อมแซมพัฒนาเป่าล้างบ่อสูบน้ำใต้ดินภายในฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ งบประมาณ ๒.๖๐๕ ล้านบาท คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
 ๘. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย งบประมาณ ๐.๘๘๙ ล้านบาท ได้ผลการประกวดราคาแล้วคาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
 ๙. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา งบประมาณ ๐.๘๔๐ ล้านบาท ได้ผลการประกวดราคาแล้วคาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
 ๑๐. ซ่อมแซมคันคลองระบาย DL.๓ กม งบประมาณ ๐.๕๖๒ ล้านบาท งานดำเนินการเอง ถ้าจะกว่านี้ผูกพันเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
 ๑๑. ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูง งบประมาณ ๑๔.๘๐๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้วคาดว่าจะเริ่มเบิกจ่ายเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
- ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากโครงการชลประทานสุโขทัย มีหน่วยงานเบิกจ่าย ๕ ศูนย์ต้นทุน และมีเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการทั้ง ๕ ศูนย์ต้นทุน มีปัญหาอุปสรรคด้านการประสานงาน และการติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการ จึงไม่สามารถรายงานผลได้อย่างชัดเจน

เลขานุการฯ	เมื่อได้ผู้ชนะการเสนอราคาและลงนามในสัญญาแล้ว ให้บันทึก PO ในระบบ New GFMIS Thai โดยไม่ต้องรอส่งมอบ และให้คำแนะนำกับหน่วยงานย่อยต่อไปด้วย
ประธาน	ขอให้บริหารการใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย หากมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ที่ต้องชี้แจง ให้เชิญหน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมด้วย

๓. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔ รายงานผลการดำเนินงาน ทำนบดินหัวงาน และอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำมี จังหวัดแพร่ งบประมาณ ๑๑๘.๙๑๔ ล้านบาท เป็นงานต่อเนื่อง ๕ ปี อยู่ระหว่างการก่อสร้างและเบิกจ่ายเรื่อย ๆ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ

เลขานุการฯ ขอให้ตรวจสอบการบันทึก PO ในระบบ New GFMIS Thai ด้วย

๔. แขวงทางหลวงสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๒๗ โครงการ งบประมาณ ๒๔๔.๒๒๑ ล้านบาท ลงนามครบแล้ว และวันนี้มีลงนามในสัญญาเพิ่มอีก ๕ สัญญา และ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างอีก ๗ สัญญา และสัญญาที่ลงนามได้ทำ PO แล้วหลังวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

๕. แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๔๑.๗๙๒ ล้านบาท ทุกโครงการลงนามในสัญญาแล้ว และโครงการที่ลงนามในวันที่ ๒ และ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทำ PO เรียบร้อยแล้ว

๖. ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนปลัดจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ปรับปรุงและต่อเติมเวทีหน้าว่าการอำเภอองไกรลาศ
งบประมาณ ๐.๔๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

๗. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองบางยม งบประมาณ ๐.๕๐๘ ล้านบาท
บันทึก PO ในระบบ แล้วเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
๒. ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ
ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน งบประมาณ ๑.๗๐๒ ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะ
ลงนามในสัญญาและทำ PO ในระบบได้ในสัปดาห์หน้า
๓. การสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูปแบบที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ งบประมาณ
๐.๐๔๐ ล้านบาท เป็นงบดำเนินงานค่าเบี้ยประชุม จะดำเนินการในไตรมาสที่ ๒

๘. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับอนุมัติจัดสรร
งบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน ๑๔๘ โครงการ ๔๒๖.๙ ล้านบาทเศษ
ซึ่งอยู่ระหว่างเร่งรัดให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในเบื้องต้น
ได้ประชุมชี้แจงแล้วพร้อมทั้งได้จัดลงนิเทศงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้ง ๙ อำเภอ

ประธาน

ขอให้สำนักงานคลังจังหวัดจัดให้มีการประชุมติดตามเร่งรัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

เลขานุการฯ

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสามารถติดต่อและปรึกษาได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย

๙. สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๘ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการที่อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบบูรณาการ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ บูรณะและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบราณสถานด้านทิศตะวันตก งบประมาณ ๗.๒๕๐ ล้านบาท และ
เสริมความมั่นคงส่วนยอดพระปรางค์ งบประมาณ ๓.๑๐๐ ล้านบาท
๒. บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบราณสถานเขาพระบาทใหญ่ งบประมาณ ๓.๐๐๐
ล้านบาท อยู่ระหว่างเขียนแบบและภาพ
๓. เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายประตูอ้อ – วัดป่าสัก งบประมาณ
๔.๙๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างอธิบดีลงนามแบบบูรณาการและรายการประมาณราคา
๔. ปรับปรุงแก้ไขนิทรรศการถาวรและอาคารพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช
งบประมาณ ๐.๗๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำ PO ในระบบ
๕. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน
๔ ล้อ งบประมาณ ๐.๘๗๙ ล้านบาท ทำ PO ในระบบแล้ว วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
๖. บูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวโบราณสถานวัดโพธิ์ประทับ
ช้าง งบประมาณ ๑๕.๐๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอวิศวกรออกแบบโครงสร้างใหม่

/ ๗. รถบรรทุก...

๗. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ งบประมาณ ๐.๘๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างหน่วยงานย่อยส่งเอกสารมาบันทึก PO ในระบบ

๑๐. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๙๗ โครงการ ดังนี้

๑. โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครุภัณฑ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์งานอาชีพและครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ จำนวน ๓๐ โครงการ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ
๒. โรงอาหาร ๘๔ ที่นั่ง จำนวน ๓ โครงการ อยู่ระหว่าง e-bidding
๓. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน ๕๘ โครงการ ขณะนี้ได้ส่งมาทำ PO ในระบบ จำนวน ๙ โรงเรียน ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้ทำหนังสือเร่งรัดแจ้งให้โรงเรียนทำ PO ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
๔. ลานกีฬาอเนกประสงค์ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน หอพักนักเรียน อาคาร สพฐ.๔ จำนวน ๖ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๑๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒ รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๑๒๘ โครงการ ดังนี้

๑. โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ครุภัณฑ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์งานอาชีพ ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ จำนวน ๔๔ โครงการ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ
๒. โรงอาหาร หอพักนักเรียนชายและอาคารเรียน จำนวน ๕ โครงการ อยู่ระหว่าง e-bidding ซึ่งทางเขตพื้นที่การศึกษาได้แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
๓. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน ๓๙ โครงการ ขณะนี้ได้ส่งมาทำ PO ในระบบ จำนวน ๒๐ โรงเรียน ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้ทำหนังสือเร่งรัดแจ้งให้โรงเรียนทำ PO ภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

๑๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๓๙ โครงการ ดังนี้

๑. โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครุภัณฑ์งานอาชีพและครุภัณฑ์ส่งเสริมศึกษา จำนวน ๒๑ โครงการ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและให้โรงเรียนดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖
๒. โรงอาหาร บ้านพักครู ๘ ครอบครัว หอพักนักเรียนหญิง หอนอนแบบมาตรฐาน และอาคารเรียน จำนวน ๑๘ โครงการ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการ
๓. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน ๔๐ โครงการ ขณะนี้ได้ส่งมาทำ PO ในระบบ จำนวน ๗ โรงเรียน ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้ทำหนังสือเร่งรัดแจ้งให้โรงเรียนดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

๑๓. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ชุดปฏิบัติการพื้นฐาน STEAM Active Learning ด้วยภาษา Swift งบประมาณ ๓.๐๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่าง ทบทวนกำหนดคุณสมบัติครุภัณฑ์

๑๔. วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ชุดปฏิบัติการช่างเสริมสวย งบประมาณ ๑.๕๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

๑๕. วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง รายงานผลการดำเนินงาน ชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ ๗ สถานี ส่งการผ่าน IOT พร้อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ๖D งบประมาณ ๓.๐๐๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญาและจะเร่งบันทึก PO ในระบบ

๑๖. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๓๑ โครงการ ดังนี้

๑. บ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหินพาทย์ งบประมาณ ๑.๑๓๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒
๒. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านยาว งบประมาณ ๐.๒๐๒ ล้านบาท รอเบิกจ่าย
๓. โครงการที่รอส่งมอบงาน จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๒.๓๘๐ ล้านบาท ได้แก่ ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรนอก ต่อเติมหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุม ต่อเติมหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรนอก เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผล โรงพยาบาลกงไกรลาศ ตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ คิว โรงพยาบาลกงไกรลาศ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม และโทรทัศน์ (LED TV) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม
๔. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม งบประมาณ ๐.๘๘๖ ล้านบาท เนื่องจากมีผู้อุทธรณ์ จึงยกเลิกประกาศและดำเนินการใหม่
๕. เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลศรีสัชชาลัย งบประมาณ ๑.๗๕๐ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒ แล้ว แต่ยังไม่ได้รับจ้าง
๖. บ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลคีรีมาศ งบประมาณ ๒.๒๗๖ ล้านบาท อยู่ระหว่าง รายงานราคากลาง
๗. บ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย งบประมาณ ๑.๑๓๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้วและอยู่ระหว่างบริหารสัญญางวด ๑

๘. อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลศรีสัชชาลัย งบประมาณ ๑๗.๔๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา หากแก้ไขเสร็จจะสามารถส่งมอบงานงวด ๑ ได้
๙. อาคารผู้ป่วยนอก ๖ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๖ ชั้น โรงพยาบาลสวรรค์โลก งบประมาณ ๑๗.๒๗๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างปรับแบบบูรณาการและกำหนดราคากลาง
๑๐. โครงการที่ขอคืนงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๐.๒๘๔ ล้านบาท ได้แก่ ผ้า màn พร้อมติดตั้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนคร
๑๑. โครงการที่ทำ PO แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๗๒๘ ล้านบาท ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนคร เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนคร เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนคร
๑๒. บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวรรค์โลก งบประมาณ ๑.๖๐๐ ล้านบาท รอพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕
๑๓. ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบคลองวนเวียน โรงพยาบาลศรีสัชชาลัย งบประมาณ ๒.๙๗๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างรายงานแบบบูรณาการ

๑๗. โรงพยาบาลสุโขทัย

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๗๒ ยูนิต งบประมาณ ๑๙.๕๔๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ยื่นเสนอราคาวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

๑๘. โรงพยาบาลศรีสวรรค์สุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสวรรค์สุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๑๐ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๑๖.๖๒๐ ล้านบาท ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ เครื่องฟอกไตแบบวัดค่าโซเดียมในเลือดอัตโนมัติ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ เครื่องดมยาสลบ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่

/ ๒. โครงการ...

๒. โครงการที่อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๒.๒๘๐ ล้านบาท ได้แก่ เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัล ฟลูออโรสโคป และเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล

๑๙. งบประมาณจังหวัด-สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด (สำนักงานจังหวัดสุโขทัย)

รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๑๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเสาไฟ เนื่องจากมีราคาสูงขึ้น และอยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๕.๕๐๐ ล้านบาท ได้แก่ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร ชนิด HPSL ๒๕๐ WATT, CUT - OFF พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายแยก ทล.๑๐๒ - บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย
๒. โครงการที่อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๕๒.๓๗๒ ล้านบาท ได้แก่ ปรับปรุงหนองกระสา หมู่ที่ ๕ บ้านเกาะตาเลีย่ง ปรับปรุงหนองตะเข้ หมู่ที่ ๑ บ้านปากพระ ปรับปรุงหนองห้วยส้มคันใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านปากพระ ปรับปรุงคลองเพชรหึง (กิ้วัวดำ) ตำบลน้ำพุ อำเภอศรีมาศ ขุดลอกคลองตลุกน้ำ (คลองเปลือย) ตำบลน้ำพุ อำเภอศรีมาศ และปรับปรุงคลองทำช้างพร้อมระบบระบายน้ำ บ้านทำช้าง
๓. โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงจุดดำเนินการ เนื่องจากสภาพพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๓๘.๐๐๐ ล้านบาท ได้แก่ ซ่อมสร้างฝั้วจระจก แอสฟัลต์คอนกรีต สายหมู่ที่ ๖ บ้านนิคมสหกรณ์ และงานปรับปรุงฝั้วจระจกแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและวางระบายน้ำ
๔. โครงการที่ได้รับอนุมัติและมอบอำนาจแล้ว หน่วยดำเนินการอยู่ระหว่างจัดทำเอกสาร TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑.๕๘๓ ล้านบาท ได้แก่ ปรับปรุงบ้านพักอารยสถาปัตย์ และก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขารวม ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยว น้ำตกลำเกลียวของอุทยานแห่งชาติรามคำแหง

๒๐. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการอยู่ระหว่างเขียนแบบและกำหนดราคากลาง จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑.๙๐๐ ล้านบาท ได้แก่ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคูหาสุวรรณบริเวณสะพานพระร่วงถึงคลองแม่ลำพัน และก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบบคลองแม่ลำพัน
๒. โครงการที่กำหนด TOR แล้ว และเตรียมประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๔.๖๓๖ ล้านบาท ได้แก่ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ และรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ๔ สูบ

๒๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๓๓.๐๒๒ ล้านบาท ซึ่งทุกโครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการราคากลาง และคาดว่าจะดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

๒๒. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลานตากข้าว งบประมาณ ๔.๕๕๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างร่าง TOR และคำนวณราคากลาง
๒. ครุภัณฑ์ทางการศึกษาห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (หนองช้าง) หมู่ ๕ และครุภัณฑ์ทางการศึกษาห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย หมู่ ๓ งบประมาณ ๐.๘๐๐ ล้านบาท ดำเนินการ e-bidding ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างดำเนินการครั้งที่ ๒
๓. ปรับปรุงระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าชัย งบประมาณ ๓.๖๗๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างร่าง TOR

๒๓. เทศบาลเมืองสวรรคโลก

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก รายงานผลการดำเนินงาน ขยายผิวจราจร Asphaltic concrete พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก งบประมาณ ๑๑.๔๐๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒ เนื่องจากผู้ชนะการเสนอราคาไม่นำหลักประกันสัญญาเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนดและเป็นผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว

เลขานุการฯ

เมื่อลงนามในสัญญาแล้ว ให้ดำเนินการทำ PO ในระบบทันที เพราะอาจจะอยู่ในขั้นตอนของการจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร ซึ่งอาจจะทำให้ล่าช้า และเมื่อถึงกำหนดส่งมอบหรือเบิกจ่ายจะทำให้ดำเนินการได้ทันที และจะมีผลต่อผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาพรวมของจังหวัด เนื่องจากหน่วยงานไม่ดำเนินการทำ PO ในระบบ

มติที่ประชุม

เห็นชอบและดำเนินการตามที่ประธาน และฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ

๔.๒ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีเงินกันฯ คงเหลือมากกว่า ๒๐ ล้านบาท จำนวน ๕ หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เลขานุการฯ

ขอติดตามหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยขอติดตามหน่วยงาน จำนวน ๕ หน่วยงาน ตามลำดับ ดังนี้

๑. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๗ โครงการ ดังนี้

๑. ค่าก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๗.๓๘๘ ล้านบาท ส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๔ แล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

/ ๒. ค่าปรับปรุง...

๒. ค่าปรับปรุงศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (หลังเก่า) งบประมาณ ๒.๘๑๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญา เรื่องอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ และได้เร่งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแล้ว
๓. ค่าก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑๑.๒๓๔ ล้านบาท ส่งเบิกงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ แล้ว
๔. โครงการฝายคลองน้ำโจน กม. ๓+๓๖๘ ตำบลวังพิณพาทย์ งบประมาณ ๕.๕๕๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งขณะนี้เกษตรกรในพื้นที่ขอให้หยุดงานชั่วคราวเนื่องจากขอใช้น้ำทำเกษตรกรรม คาดว่าจะขอคืนเงินต่ออีก ๖ เดือน
๕. โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านน้ำพุ งบประมาณ ๓.๒๕๐ ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
๖. โครงการซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำยม ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๑.๕๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
๗. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาซอ ๑๓ งบประมาณ ๑.๘๘๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๒. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมหมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองบางยม งบประมาณ ๓.๓๔๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ๑๐๐% ในไตรมาสที่ ๒
๒. เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมบ้านเหนือ หมู่ที่ ๑๒ (จุดที่ ๑) ตำบลกง งบประมาณ ๑๗.๖๖๖ ล้านบาท ติดปัญหาระดับน้ำสูง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ ผู้รับจ้างจึงขอหยุดงาน
๓. เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลยางซ้าย งบประมาณ ๑๒.๖๐๖ ล้านบาท ติดปัญหาระดับน้ำสูง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ เกษตรขอใช้น้ำทำเกษตรกรรม ผู้รับจ้างจึงขอหยุดงาน

๓. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๓ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๕ โครงการ กู้เงินไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๕ โครงการ และช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ และ อปท.ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ งบประมาณจากเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒๑ โครงการ งบประมาณ ๓๘ ล้านบาทเศษ และงบกลางอุทกภัย จำนวน ๖๗ โครงการ งบประมาณ ๑๖๖ ล้านบาท รวมกันเงินทั้งสิ้น ๑๑๖ โครงการ เป็นเงิน ๒๘๒.๔๐๐ ล้านบาท ซึ่งได้เร่งรัดให้ลงนามครบทุกโครงการแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย งบผูกพันข้ามปี จำนวน ๒๐ งวดงาน ปี ๒๕๖๔ เบิกแล้ว ๑๐ งวดงาน ปี ๒๕๖๕ งวด ๑๑ - ๒๐ งบประมาณกันเงิน ๔๖.๘๘๘ ล้านบาท งวดที่ ๑๑ คาดว่าจะเบิกจ่ายเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

๕. งบประมาณจังหวัด-สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด (สำนักงานจังหวัดสุโขทัย)

รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๑๑ โครงการ ดังนี้

๑. ซ่อมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย สท ๓๐๒๔ งบประมาณ ๙.๙๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
๒. ปรับปรุงสายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ งบประมาณ ๕.๔๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
๓. เชื้อนป้องกันกักตุนน้ำแม่อก งบประมาณ ๕.๗๗๖ ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๕% อยู่ระหว่างตรวจรับงานและรอผลทดสอบ คาดว่าจะส่งมอบงานเดือนมกราคม ๒๕๖๖
๔. ปรับปรุงน้ำแม่อกท้ายท่อระบายขี้มกคล งบประมาณ ๑๐.๘๙๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งล่าช้าเนื่องจากมีน้ำในพื้นที่ดำเนินการและเกษตรกรขอให้หยุดงานชั่วคราวเนื่องจากขอใช้น้ำทำเกษตรกรรม
๕. รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน งบประมาณ ๑.๐๐๐ ล้านบาท ติดปัญหาการอุทธรณ์ ทำให้ดำเนินการล่าช้า คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๖. รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน งบประมาณ ๒.๔๑๘ ล้านบาท งบประมาณสัมพันธงานลอกกระทง อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้าง
๗. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ ๐.๕๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
๘. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๑ รายการ งบประมาณ ๑๑.๐๐๗ ล้านบาท ขอยกเลิก ๑ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๗ โครงการ และ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๙. จ้างเหมาขุดลอกเปิดทางน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร งบประมาณ ๐.๒๔๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
๑๐. ปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองกระติ งบประมาณ ๐.๔๘๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

ประธาน

โครงการใดถ้าพบปัญหาไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ให้รีบหาทางแก้ไขโดยเร็ว หรือปรึกษาปัญหาได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย

มติที่ประชุม

เห็นชอบและดำเนินการตามที่ประธาน และฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ

๔.๓ ติดตามผลการใช้จ่ายโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๖ หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เลขานุการฯ ขอติดตามหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ขอติดตามหน่วยงาน จำนวน ๖ หน่วยงานตามลำดับ ดังนี้

๑. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๑๙ โครงการ ดำเนินการล่าช้า เนื่องจาก กรมยังไม่ได้โอนเงินมาให้ทำให้ทาง อบท.ยังไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ขณะนี้ได้รับเงินจัดสรร แล้ว และได้เร่งรัดให้ อบท.เบิกจ่ายภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ พร้อมทั้งได้ทำหนังสือย้ำแล้ว

๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๓ โครงการ แจกจ่ายเงินเหลือจ่ายแล้ว

๓. โรงพยาบาลสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๑ โครงการ แจกจ่ายเงินเหลือจ่ายแล้ว

๔. โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ แจกจ่ายเงินเหลือจ่ายแล้ว

๕. งบประมาณจังหวัด-สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด (สำนักงานจังหวัดสุโขทัย) รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๑๖ โครงการ บางหน่วยงานจะขอขยายระยะเวลาดำเนินการ และบางหน่วยงานดำเนินการแล้วเสร็จแต่เบิกจ่ายไม่ทัน จึงขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายในเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติให้ขอขยายระยะเวลาได้โดยทำเรื่องไปยัง รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

๖. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ มีโครงการที่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ๑ โครงการ งบประมาณ ๖.๙ ล้านบาทและอีก ๑ โครงการ งบประมาณ ๓.๒ ล้านบาท ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม เห็นชอบและดำเนินการฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ

๔.๔ ขออนุมัติแผนการปฏิบัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจงและขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๔.๔.๑ แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	กิจกรรม	การดำเนินการ	ปีงบประมาณ				
			ปี ๒๕๖๖				ปี ๒๕๖๗
			ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔	ไตรมาสที่ ๑
๑	กิจกรรมที่ ๑ การสร้างแรงจูงใจ การมีส่วนร่วมของส่วนราชการและการเร่งรัดติดตามหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ดำเนินการได้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด	๑.๑ การมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด (ประชุมคณะกรรมการจังหวัด เดือนตุลาคม ๒๕๖๕)	ค.ค.๖๕				
		๑.๒ การประชุมชี้แจงนโยบายการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ค.ค. -ธ.ค. ๖๕				
		๑.๓ กำหนดรูปแบบการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับส่วนราชการ	พ.ย.๖๕				
๒	กิจกรรมที่ ๒ การเร่งรัดติดตามหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ไม่เบิกจ่ายคล่องตัว พ.ศ.๒๕๖๕ และโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๒.๑ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดสุโขทัยและรายงานให้ผู้บริหารของจังหวัดสุโขทัยทราบ	เป็นประจำทุกสัปดาห์				
		๒.๒ ติดตามหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน และมีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอย่าใกล้ชิด (Watch List) เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา	เป็นประจำทุกเดือน				
		๒.๓ การประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	เป็นประจำทุกเดือน				
		๒.๔ การลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการที่มีปัญหาการใช้จ่าย ไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน ๒ ระยะ (ไตรมาส ๒ / ไตรมาส ๔)	ก.พ. - มี.ค. ๖๖			ก.ค. - ส.ค.๖๖	
		๒.๕ ติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย/ติดตามการโอนเงินเหลือจ่ายโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว หรือเริ่มโครงการที่ถูกยกเลิกส่วนกลาง				ส.ค. - ก.ย. ๖๖	
๓	กิจกรรมที่ ๓ การกระตุ้น ติดตามเร่งรัดส่วนราชการให้เบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด	๓.๑ จัดลำดับหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงิน สูงสุด/ต่ำสุด นำเสนอในที่ประชุมกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด	เป็นประจำทุกเดือน				
		๓.๒ การมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐ เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด					ค.ค. ๖๖

มติที่ประชุม อนุมัติตามแผนปฏิบัติการตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และให้มีการประชุมติดตามเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

๔.๔.๒ รูปแบบการรายงานของส่วนราชการ แบบ สท-๑ / แบบ สท-๒

ผู้ช่วยเลขานุการฯชี้แจงและขออนุมัติแบบการรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

แบบ สท-๑ เป็นแบบติดตามแผน/ผล การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย “งบลงทุน” รายโครงการของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย

ส่วนที่ ๑ การรายงานสรุปงบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรร ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย และการใช้จ่าย

ส่วนที่ ๒ การรายงานผลความก้าวหน้าด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในขั้นตอนใด โดยระบุความชัดเจนของแต่ละโครงการ

ส่วนที่ ๓ การรายงานผลการลงนามในสัญญาแต่ละโครงการ วงเงินตามสัญญา วันเริ่มต้น สิ้นสุดของสัญญา การบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai

ส่วนที่ ๔ การรายงานเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง โดยระบุจำนวนเงินที่ส่งคืนหรือเงินเหลือจ่ายขอให้อำนาจ

ส่วนที่ ๕ การรายงานปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน

แบบ สท-๑

แบบ สท - ๑																										
แบบติดตามแผน/ผล การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย “งบลงทุน” รายโครงการของจังหวัดสุโขทัย																										
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงาน.....																										
ข้อมูล ณ วันที่..... เดือน..... พ.ศ. ๒๕๖.....																										
(** ารับรองความก้าวหน้า จัดซื้อจัดจ้าง 15 และ ทุกสิ้นเดือนของทุกเดือน)																										
งบลงทุน																										
ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai										ขั้นตอนการดำเนินงานได้ใช้หรือขยาย (V)																
ลำดับ	วันที่	รหัส	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	งบ	ก่อนสัญญา (PO)		เบิกจ่าย (S)		ใช้เงิน (S)	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	
						จำนวน	เงิน	จำนวน	เงิน																	
1						0.00		0.00		0.00																
2						0.00		0.00		0.00																
3						0.00		0.00		0.00																
4						0.00		0.00		0.00																
5						0.00		0.00		0.00																
6						0.00		0.00		0.00																
7						0.00		0.00		0.00																
8						0.00		0.00		0.00																
9						0.00		0.00		0.00																
10						0.00		0.00		0.00																
รวมทั้งสิ้น						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															

กำหนดการจัดส่งรายงานตามแบบ สท-๑ กำหนดส่ง ๒ ครั้ง/ เดือน

๑. ข้อมูลทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน จัดส่งภายในวันที่ ๒๐ ของเดือน

- เพื่อนำข้อมูลประกอบการประชุมเร่งรัดคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน (ก่อนการประชุมคณะกรรมการจังหวัด)

๒. ข้อมูลทุกวันสิ้นเดือนของทุกเดือน จัดส่งภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

- เพื่อนำข้อมูลประกอบการสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำเดือน

แบบ สท-๒ เป็นแบบติดตามแผน/ผล การเบิกจ่าย “งบลงทุน” รายโครงการของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กำหนดการจัดส่งรายงานตามแบบ สท-๒ ข้อมูลทุกวันสิ้นเดือนของทุกเดือน จัดส่งภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

- เพื่อติดตามแผน/ผลการดำเนินงานภาพรวมแต่ละโครงการ

- เพื่อคาดการณ์การเบิกจ่าย “งบลงทุน” ภาพรวมแต่ละไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ

/ แบบ สท-๒...

แบบ สท-๒

แบบ สท - 2

แบบติดตามแผน/ผล การเบิกจ่าย งบลงทุน รายการโครงการของจังหวัดสุโขทัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงาน.....

ข้อมูล ณ วันที่..... เดือน..... พ.ศ. 256.....

(** รายงานแผน/ผล ข้อมูล ณ วันที่สิ้นสุดของงวด)

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รหัส งบประมาณ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ก่อนหักเงิน (ล้านบาท)	แผน/ผล เบิกจ่าย	แผนการเบิกจ่ายเงิน												รวมแผน/ผล การเบิกจ่าย
						ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66	
1					แผน													0.00
					ผล													0.00
2					แผน													0.00
					ผล													0.00
3					แผน													0.00
					ผล													0.00
4					แผน													0.00
					ผล													0.00
5					แผน													0.00
					ผล													0.00
6					แผน													0.00
					ผล													0.00
7					แผน													0.00
					ผล													0.00
8					แผน													0.00
					ผล													0.00
9					แผน													0.00
					ผล													0.00
10					แผน													0.00
					ผล													0.00
รวมทั้งสิ้น			0.00	0.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

มติที่ประชุม อนุมัติตามรูปแบบการรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มี-

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายยุทธนา หมูเทศ)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวรัตนฐาภัทร พรหมพร)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
