



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักการเงินและทรัพย์สิน

ที่ ทส ๑๑๐๔/ ๖๗๕๔

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เรียน	☒ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน	☒ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
	☒ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย	☒ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
	☒ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ	☒ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา
	☒ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ	☒ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา
	☒ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล	☒ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี
	☒ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์	☒ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น
	☒ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	☒ ผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
	☒ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ	☒ ผู้จัดการโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่
	☒ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	

ตามที่ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย อนุมัติให้สำนักการเงินและทรัพย์สิน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบ สำหรับการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานในการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำนักการเงินและทรัพย์สิน จึงขอรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบตามระเบียบการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อให้คณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณฯ รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานตามระเบียบวาระการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพิมวรรณ อนนท์)

ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน

คณะทำงานและเลขานุการ



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักการเงินและทรัพย์สิน ฝ่ายงบประมาณ

ที่ ทส ๑๑๐๔.๓/๔๑๖

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน

ตามที่ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย อนุมัติให้สำนักการเงินและทรัพย์สิน ปรับเปลี่ยน รูปแบบการประชุมเป็นรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบ สำหรับการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานในการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำนักการเงินและทรัพย์สิน จึงขอรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบตามระเบียบการประชุม คณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อให้คณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณฯ รับทราบความคืบหน้า ในการดำเนินงานตามระเบียบวาระการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอโปรดลงนามในหนังสือตามที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวสุกัญญา หงส์พันธุ์)
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

- กต.๕๑

- ลมท.๕๑

Hi
27/12/64



การประชุม

คณะกรรมการด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของ
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 2/2565

การประชุมเป็นรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานพร้อม
ภาพประกอบ

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 2/2565

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีเดือนตุลาคม 2564
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 (สำนักกฎหมาย/สำนักการเงินและทรัพย์สิน)
3.2 ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่
(สวนสัตว์แห่งใหม่)
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี พ.ศ. 2564
4.2 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4.3 รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำปีเดือนเดือนพฤศจิกายน 2564
4.4 รายงานผลการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2564 (สวนสัตว์เชียงใหม่)
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 2/2565

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานกรรมการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมคณะกรรมการการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบตามหนังสือที่ ทส 1104/6261 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานผลการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2564

สำนักการเงินและทรัพย์สิน ได้ส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบตามระเบียบการประชุมคณะกรรมการด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 ให้คณะทำงานฯ เพื่อรับทราบ ตามหนังสือที่ ทส 1104/6261 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โดยสำนัก สถาบัน สวนสัตว์ และโครงการ ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว และรายงานผลการดำเนินงาน กลับให้สำนักการเงินและทรัพย์สิน ทาง e-mail และทาง line เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายการที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 กันยายน 2563 จำนวน 5 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 74.2216 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวถูกพับไปแล้ว	มติที่ประชุม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการ องค์การสวนสัตว์ฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีสัญญาซื้อขายสัตว์ และงานก่อสร้างปี 2561 และปี 2562 ดำเนินการเก็บรวบรวมเอกสาร กระบวนของงาน และ รายละเอียดที่สำคัญของงานทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา กรณีมีปัญหาในอนาคต	
ส่วนกลาง 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ สัญญาที่ 24/2561 วงเงินตามสัญญา 12.430 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4.040 ล้านบาท คงเหลือ 8.390 ล้านบาท 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ สัญญาที่ 28/2562 วงเงินตามสัญญา 13.690 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.960 ล้านบาท คงเหลือ 11.730 ล้านบาท	1. สำนักการเงินและทรัพย์สิน ดำเนินการทำหนังสือแจ้งบริษัทฯ ให้เร่งรัด ดำเนินการตามสัญญา ตามหนังสือที่ ทส 1101/543 และ 1101/544 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ของสัญญาที่ 24/2561 และสัญญาที่ 28/2562 2. บริษัทฯ ตอบกลับมาให้องค์การสวนสัตว์ฯ มอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็น ผู้นำสัตว์เข้าเนื่องจากเป็นสัตว์ตาม CITES ตามหนังสือเลขที่ 13/2564 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 3. สำนักการเงินและทรัพย์สิน ได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องนำเสนอสำนัก กฎหมายเพื่อพิจารณา ตามหนังสือที่ ทส 1104/3395 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 4. สำนักกฎหมายอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณา 5. สำนักการเงินและทรัพย์สิน อยู่ระหว่างติดตามความคืบหน้าในการ พิจารณาของสำนักกฎหมาย 6. สำนักกฎหมายได้จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้บริษัทฯ เพื่อดำเนินการ ด้านเอกสารการนำเข้าสัตว์จากต่างประเทศต่อกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตามที่ร้องขอแล้ว และให้ สงท.แจ้งคณะกรรมการตรวจรับสัตว์ ปี 2562 พิจารณาเสนอความเห็นตามองค์ประกอบของกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปเสนอ ผอ.อสส.ทราบและสั่งการต่อไป ตามเอกสารที่ ทส 1106/916 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564 7. สำนักการเงินและทรัพย์สินมีหนังสือแจ้งคณะกรรมการ ตามหนังสือที่ 1104/5149 ลว.27 ก.ย.2564 2562 พิจารณาเสนอความเห็นตาม องค์ประกอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปเสนอ ผอ.อสส 8. คณะกรรมการตรวจรับเสนอความเห็นต่อ ผอ.อสส. ว่าบริษัทฯ เข้า หลักเกณฑ์ผู้ขายส่งมอบสัตว์ล่าช้าเห็นควรให้มีหนังสือแจ้งสิทธิการปรับและ เร่งรัดการส่งสัตว์ให้ผู้ขายทราบ โดยผอ.อสส.ให้ทางคณะกรรมการดำเนินการ ตามหนังสือที่ ทส.1107/1707 ลงวันที่ 6 ต.ค.2564	1. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีสัญญาซื้อขายสัตว์ปี 2561 และปี 2562 ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด เพื่อความชัดเจนในการดำเนินงาน 2. มอบให้สำนักกฎหมายเข้ามาดูรายละเอียด และให้ สรุปประเด็นปัญหาและการดำเนินงานให้ชัดเจนแล้วนำเข้า คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อพิจารณา

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	9. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย มีหนังสือที่ 1101/1430 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ไปยังกรมปศุสัตว์ เพื่อสอบถามการยกเลิกประกาศโรคปากเท้าเปื่อยจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE ในพื้นที่สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในการนำออกจากประเทศต้นทางเพื่อนำกลับมาส่งยังประเทศปลายทาง (ประเทศไทย) ว่าขณะนี้สามารถดำเนินการได้แล้วหรือไม่ ตามที่ บริษัท คาสซิบา (ประเทศไทย) จำกัด ได้อ้างถึงประกาศดังกล่าว เพื่อเป็นการยืนยันจากกรมปศุสัตว์	

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 1. ปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์สัตว์ให้เป็นศูนย์พัฒนาเพื่อการวิจัยและอนุรักษ์สัตว์ป่าระดับมาตรฐานภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว - วงเงิน 2.484 ล้านบาท - เบิกจ่ายแล้ว 1.351 ล้านบาท - คงเหลือ 1.133 ล้านบาท โดยกิจการร่วมค้า แพลนดิอ็อป 689	1. สวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีหนังสือแจ้งบริษัท เพื่อขอบอกเลิกสัญญาจ้าง ตามหนังสือที่ 1112/1196 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 2. บริษัทฯ ขออุทธรณ์ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างฯ ตามหนังสือที่ 53/2562.202104.01 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 โดยผู้อำนวยการพิจารณาให้ยืนยันการบอกเลิกสัญญา ตามหนังสือที่ ทส. 1101/595 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 3. สำนักการเงินและทรัพย์สิน ได้แจ้งให้บริษัทฯ รับทราบแต่หนังสือตีกลับ จึงได้จัดส่งอีกครั้งในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ตอบรับและทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 4. สำนักการเงินและทรัพย์สิน ได้ส่งสำเนาหนังสือและเอกสารต่าง ๆ ให้สำนักกฎหมาย และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เพื่อรับทราบการดำเนินการดังกล่าวด้วยแล้ว ตามหนังสือที่ ทส 1104/3278 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 5. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์สัตว์ฯ โดยใช้จากเงินประกันสัญญาของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ 6. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว นำส่งเอกสารประกอบการแจ้งเป็นผู้ทำงานของ กิจการร่วมค้า แพลนดิอ็อป 689 มายังองค์การสวนสัตว์ ฯ เพื่อจัดส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาเป็นผู้ทำงาน ตามหนังสือเลขที่ 1112/899 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 7. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นำส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงการคลัง แจ้งให้ กิจการร่วมค้า แพลนดิอ็อป 689 เป็นผู้ทำงานตามหนังสือเลขที่ ทส 1101/1076 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 8. ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลัง ยังไม่มีหนังสือตอบกลับแจ้งให้เป็นผู้ทำงาน	1. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไปควรใช้คูปริบัติบริษัท ผู้รับจ้างและสถานะของบริษัท 2. กรณีได้รับรับจ้างมาแล้ว คณะกรรมการควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานควรดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่แบ่งตามสัญญา 3. หากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา ควรเชิญผู้รับจ้างมาร่วมประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกันและควรมีรายงานการประชุมเพื่อให้รับรู้ทั้ง 2 ฝ่าย 4. หากยังดำเนินการล่าช้า สวนสัตว์ต้องดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยออกหนังสือเป็นหลักฐาน ทุกครั้ง

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
2. ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์เสื่อลายเมฆ ภายใต้โครงการความร่วมมือการเพาะขยายพันธุ์เสื่อลายเมฆร่วมกับภาชี เพื่อรองรับและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร - วงเงิน 18.892 ล้านบาท - เบิกจ่ายแล้ว 4.723 ล้านบาท - คงเหลือ 14.169 ล้านบาท โดยกิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ 689	1. สวนสัตว์เปิดเขาเขียวบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์ฯ ตามหนังสือที่ ทส 1104/1119 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 2. บริษัทฯ ทำหนังสือขออุทธรณ์การบอกเลิกสัญญา และขอสงวนสิทธิ์รับหลักประกันสัญญา ตามหนังสือเลขที่ 38/2562.202104.02 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 3. สำนักการเงินและทรัพย์สิน มีหนังสือที่ ทส 1104/3195 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้สำนักกฎหมายพิจารณาการขออุทธรณ์การบอกเลิกสัญญาและขอสงวนสิทธิ์รับหลักประกันสัญญา 4. สำนักกฎหมายพิจารณา ให้ยืนยันการรับหลักประกันสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์เสื่อลายเมฆ โดยองค์การสวนสัตว์ฯ ได้แจ้งให้บริษัทฯ รับทราบการยืนยันการรับหลักประกันตามหนังสือองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ที่ ทส ๑๑๐๑/๗๗๒ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ 5. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้รับหลักประกันสัญญาตาม ระเบียบฯ ซึ่งทางธนาคารกรุงไทย ได้นำส่งเงินหลักประกันสัญญาให้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเรียบร้อยแล้ว 6. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว นำส่งเอกสารประกอบการแจ้งเป็นผู้ทำงานของ กิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ 689 มายังองค์การสวนสัตว์ฯ เพื่อจัดส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาเป็นผู้ทำงาน ตามหนังสือเลขที่ 1112/897 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 7. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นำส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงการคลัง แจ้งให้ กิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ 689 เป็นผู้ทำงานตามหนังสือเลขที่ ทส 1101/1065 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564 8. ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลัง ยังไม่มีหนังสือตอบกลับแจ้งให้เป็นผู้ทำงาน	1. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไปควรเช็คประวัติบริษัทผู้รับจ้างและสถานะของบริษัท 2. กรณีได้รับรับจ้างมาแล้ว คณะกรรมการควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานควรดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่แบ่งตามสัญญา 3. หากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา ควรเชิญผู้รับจ้างมาร่วมประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกันและควรมีรายงานการประชุมเพื่อให้รับรู้ทั้ง 2 ฝ่าย 4. หากยังดำเนินการล่าช้า สวนสัตว์ต้องดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยออกหนังสือเป็นหลักฐานทุกครั้ง

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
สวนสัตว์สงขลา 1. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณน้ำตกสวนตุล ภายในสวนสัตว์สงขลา - วงเงิน 38.0000 ล้านบาท - โดยบริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด	1. องค์การสวนสัตว์ฯ ทำหนังสือแจ้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์และบอกเลิกสัญญา ตามหนังสือที่ ทส 1101/13 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 2. บริษัทฯ ได้ขอคัดค้านการบอกเลิกสัญญา ตามหนังสือเลขที่ CHR 2563/01026 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 3. องค์การสวนสัตว์ฯ ได้ให้บริษัทชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามหนังสือที่ ทส 1101/114 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 4. บริษัทฯ ทำหนังสือชี้แจงกลับองค์การฯ ตามหนังสือเลขที่ CHR 2564/02054 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 5. องค์การสวนสัตว์ฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงได้ทำหนังสือแจ้งกระทรวงการคลัง ตามหนังสือที่ ทส 1101/271 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ให้บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด เป็นผู้ทำงาน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากการกระทรวงการคลัง 6. บริษัทฯ กรุงไทย จำกัด ชำระเงินตามสัญญาค้ำประกันของ บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด ฐานะลูกหนี้ร่วมให้สวนสัตว์สงขลาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 โดยจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คจำนวน 1,940,000 บาท 7. ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลัง ยังไม่มีหนังสือตอบกลับแจ้งให้เป็นผู้ทำงาน	1. ควรมีการสำรวจสภาพพื้นที่ภายในสวนสัตว์ ก่อนการออกแบบและเสนอของงบประมาณ 2. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไปควรเช็คประวัติบริษัทผู้รับจ้างและสถานะของบริษัท 3. กรณีได้รับรับจ้างมาแล้ว คณะกรรมการควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานควรดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่แบ่งตามสัญญา 4. หากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา ควรเชิญผู้รับจ้างมาร่วมประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกันและควรมีรายงานการประชุมเพื่อให้รับรู้ทั้ง 2 ฝ่าย 5. หากยังดำเนินการล่าช้า สวนสัตว์ต้องดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยออกหนังสือเป็นหลักฐานทุกครั้ง

3.2 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ มีผล การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 ประกอบด้วย 1. ปรับปรุงอาคารสำนักงานสนาม งบประมาณ 1.20 ล้านบาท	ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว	
2. ก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบพร้อม ก่อสร้างเรือนเพาะขยายพันธุ์ งบประมาณ 5.85 ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว	
3. ก่อสร้างถนนชั่วคราวแล้รรอบ โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ งบประมาณ 8.66 ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว	
4. ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัด ปทุมธานี ในการสร้างสะพานบริเวณ ทางเข้าพื้นที่สวนสัตว์แห่งใหม่	อยู่ระหว่างดำเนินการได้ร้อยละ 90 คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564	
5. ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์ แห่งใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น 146.8251 ลบ. จำนวน 6 งวดงาน - งบประมาณปี 2563 จำนวน 36.0000 ลบ. - งบประมาณปี 2564 จำนวน 110.8251 ลบ.	1. เบิกจ่ายงวดที่ 1-3 แล้ว จำนวน 44.0475 ลบ. โดยใช้จากงบประมาณปี 2563 จำนวน 36.000 ลบ. งบประมาณปี 2564 จำนวน 8.0475 ลบ. 2. งานงวดที่ 4 บริษัทฯ ได้ส่งมอบงาน แล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ	เร่งรัดให้คณะกรรมการ ทุกชุดตรวจสอบ และสรุปผล การดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ จังหวัดปทุมธานี

1. ปรับปรุงอาคารสำนักงานสนาม งบประมาณ 1.20 ล้านบาท (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)



2. ก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบพร้อมก่อสร้างเรือนเพาะขยายพันธุ์ งบประมาณ 5.85 ล้านบาท (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)



3. งานก่อสร้างถนนชั่วคราวและรั้วรอบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

การดำเนินการ

บริษัท ศัพเพธรเทค จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ก่อสร้างถนนชั่วคราวและรั้วรอบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ เรียบร้อยแล้ว งานรั้วชั่วคราวระยะ 3,500 เมตร วงเงินรวมทั้งสิ้น 8,660,000 บาท

ด้านทิศเหนือ



ด้านทิศใต้



ด้านทิศตะวันออก



ด้านทิศตะวันตก



4. งานที่ได้รับการสนับสนุนจาก จ.ปทุมธานี

- งานก่อสร้างสะพานทางข้าม ดำเนินการได้ร้อยละ 92 คาดว่าจะแล้วเสร็จสิ้นเดือน ธันวาคม 2564



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี พ.ศ. 2564

เรื่องเดิม

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 806.3130 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. งบอุดหนุน จำนวน 491.6703 ล้านบาท
2. งบลงทุน จำนวน 314.6427 ล้านบาท

การดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ได้เบิกจ่ายงบอุดหนุนรัฐบาล ได้ครบทุกรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับงบลงทุน เบิกจ่ายจำนวน 148.4122 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.17 และได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 166.2305 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. ครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ คือรายการค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ จำนวน 5.1060 ล้านบาท
2. สิ่งก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ ประกอบด้วย
 - 2.1 ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ จำนวน 102.7776 ล้านบาท
 - 2.2 ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมี ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ จำนวน 11.4125 ล้านบาท
 - 2.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์และอัตลักษณ์บริเวณส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 9.3156 ล้านบาท
 - 2.4 ปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center) ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 6.2500 ล้านบาท
 - 2.5 ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัสและส่วนแสดงจระเข้ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 17.3688 ล้านบาท
 - 2.6 ก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวิน ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน 3.6500 ล้านบาท
 - 2.7 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน 10.3500 ล้านบาท

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

ข้อเสนอเพื่อทราบ

เพื่อโปรดทราบ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 2564



ข้อมูล ณ 30 พ.ย.2564

1.ส่วนกลาง - ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ สัญญาสิ้นสุด 24 พ.ค. 2565 มี 6 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว 3 งวดงาน จำนวน 8.0475 ลบ. กันเหลื่อมปี 3 งวดงาน เป็นเงินจำนวน 102.7776 ลบ.

- ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ สัญญาสิ้นสุด 16 ธ.ค.2564 กันเหลื่อมปี จำนวน 5.1060 ลบ. เบิกจ่ายในปี 2565 จำนวน 2.1160 ลบ

2.สวนสัตว์เชียงใหม่ - ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมี สัญญาสิ้นสุด 20 พ.ย. 2564 มี 6 งวดงาน กันเหลื่อมปี 3 งวดงาน เป็นเงินจำนวน 11.4125 ลบ.

4. สวนสัตว์อุบลราชธานี -ปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center) สัญญาสิ้นสุด 25 ก.ย.64 มี 5 งวดงาน กันเหลื่อมปี 3 งวดงาน เบิกจ่ายครบแล้ว

- ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัสและส่วนแสดงจระเข้ สัญญาสิ้นสุด 23 ธ.ค.64 มี 5 งวดงาน กันเหลื่อมปี 3 งวดงาน เป็นเงินจำนวน 17.3688 ลบ. เบิกจ่ายในปี 2565 จำนวน 6.9475 ลบ. คงเหลือ 2 งวดงาน

5.สวนสัตว์ขอนแก่น- ก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวิน สัญญาสิ้นสุด 30 ก.ย. 2564 มี 4 งวดงาน กันเหลื่อมปี 1 งวดงาน เบิกจ่ายครบแล้ว

-ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ สัญญาสิ้นสุด 16 ธ.ค.2564 มี 4 งวดงาน กันเหลื่อมปี 2 งวดงาน จำนวน 10.3500 ลบ.

ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

เลขที่สัญญาจ้าง	11/2564 วงเงิน 146,825,100 บาท งบปี 2563 จำนวน 36,000,000 บาท งบปี 2564 จำนวน 110,825,100 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ	540 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา 24 พฤษภาคม 2565
ผู้รับจ้าง	บริษัท ดีไซน์+วิเวลลอป จำกัด

การดำเนินงาน



- งานงวดที่ 1 ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีการเบิกจ่ายแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2564 เป็นเงินจำนวน 7,341,200 บาท
 - แบบแนวความคิดหลัก (ต้นฉบับในรูปเล่ม) ขนาด A 1 จำนวน 3 ชุด
 - แบบแนวความคิดหลัก (สำเนาในรูปเล่ม) ขนาด A 1 จำนวน 10 ชุด
 - แบบแนวความคิดหลัก (ปิดบนกระดาษแข็ง) ขนาด A 1 จำนวน 1 ชุด
 - แบบแนวความคิดหลัก (ต้นฉบับในรูปเล่ม) ขนาด A 3 จำนวน 3 ชุด
 - แบบแนวความคิดหลัก (สำเนาในรูปเล่ม) ขนาด A 3 จำนวน 10 ชุด
 - รายงานเบื้องต้น (Inception Report) (ต้นฉบับในรูปเล่ม) ขนาด A 3 จำนวน 3 ชุด
 - รายงานเบื้องต้น (Inception Report) (สำเนาในรูปเล่ม) ขนาด A3 จำนวน 10 ชุด
- งานงวดที่ 2 ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีการเบิกจ่ายแล้วเมื่อกันยายน 2564 เป็นเงินจำนวน 14,682,510 บาท
 - แบบร่างขั้นต้น (ต้นฉบับในรูปเล่ม) ขนาด A3 จำนวน 3 ชุด
 - แบบร่างขั้นต้น (สำเนาในรูปเล่ม) ขนาด A3 จำนวน 10 ชุด
- งานงวดที่ 3 ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีการเบิกจ่ายแล้วเมื่อกันยายน 2564 เป็นเงินจำนวน 22,023,765 บาท
 - แบบร่างขั้นพัฒนา (ต้นฉบับในรูปเล่ม) ขนาด A3 จำนวน 3 ชุด
 - แบบร่างขั้นพัฒนา (สำเนาในรูปเล่ม) ขนาด A3 จำนวน 10 ชุด
 - รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ (ต้นฉบับในรูปเล่ม) ขนาด A4 จำนวน 5 ชุด
 - เอกสารแบบรูปรายการและการประมาณราคาเพื่อยื่นขอประมาณ (ต้นฉบับในรูปเล่ม) ขนาด A4 จำนวน 1 ชุด
 - เอกสารแบบรูปรายการและการประมาณราคาเพื่อยื่นขอประมาณ (สำเนาในรูปเล่ม) ขนาด A4 จำนวน 4 ชุด



4. งานงวดที่ 4 ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ เป็นเงินจำนวน 44,047,530 บาท ประกอบด้วย

4.1 แบบรายละเอียดรายการก่อสร้าง

4.2 รายละเอียดประกอบแบบ บัญชีงานก่อสร้าง ราคากลาง ครอบคลุมรวมทุกสาขา



ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจากมีคณะกรรมการ ที่กำกับดูแลหลายชุด และมีความเห็นที่แตกต่างกัน จึงต้องใช้ระยะเวลา ในการสรุปแนวความคิด

แนวทางแก้ไข




เร่งรัดให้คณะกรรมการทุกชุดตรวจสอบและสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

งานก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมี ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

เลขที่สัญญาจ้าง 10/2564 วงเงินก่อสร้าง 20,750,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มทำงานวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนเทค เอสโซซิเอท
ระยะเวลาดำเนินงาน : 24 กุมภาพันธ์ 2564 – 20 พฤศจิกายน 2564
: แบ่งงานออกเป็น 6 งวด

ผลการดำเนินงาน

- งวดที่ 1 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 2 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 3 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 4 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 5 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 6 (สุดท้าย) ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

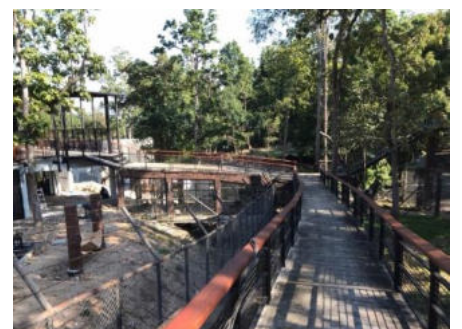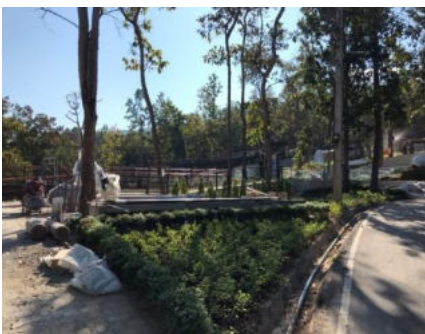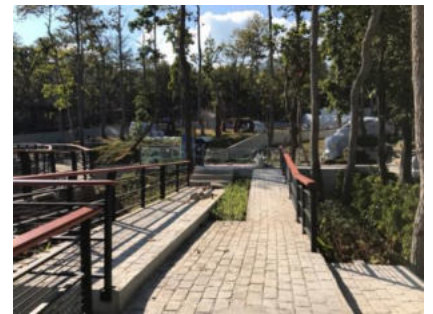

ปัญหาอุปสรรค

1. ผู้รับจ้างมีการสับเปลี่ยนวิศวกรโครงการทำงาน ไม่ต่อเนื่อง
2. ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เนื่องจากที่ผ่านมาได้ระดม คนงานเพื่อเร่งงานสัตว์นกก่า (งบปี 63) ก่อน และขณะนี้ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายต่อไป

แนวทางแก้ไข

คณะกรรมการฯ ได้ทำหนังสือเร่งรัดการดำเนินงานไปแล้ว 3 ครั้ง พร้อมทั้งติดตามการดำเนินเพื่อให้เป็นไปตามแผนเรียบร้อยแล้ว

ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัสและส่วนจัดแสดงจระเข้ สวนสัตว์อุบลราชธานี

เลขที่สัญญาจ้าง 16/2564 วงเงินก่อสร้าง 34,737,700 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มทำงานวันที่ 4 มิถุนายน 2564 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 23 ธันวาคม 2564 จำนวน 5 งวดงาน
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนเทค เอสโซซิเอท
การดำเนินงาน

- งวดที่ 1 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 2 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 3 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 4 กำหนดการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

รายละเอียดงานงวดที่ 4 มีดังนี้

- งานโครงสร้าง คสล land Scape
- งานปูนปั้น ตกแต่ง อื่นๆประกอบ
- งานระบบกรองน้ำใส
- งานบ่อน้ำ ส่วนจัดแสดง



แนวทางแก้ไข

เนื่องจากรายการดังกล่าว ลงนามสัญญาล่าช้า จึงได้มีการประชุมติดตามและเร่งรัดระหว่างคณะกรรมการและผู้ประกอบการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2565

งานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น

เลขที่สัญญาจ้าง 23/2564 วงเงินก่อสร้าง 20,700,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มทำงานวันที่ 19 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 15 กันยายน 2564
ขยายเป็นสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 21 ธันวาคม 2564
ผู้รับจ้าง บริษัท ขุนพลพัฒนาการ จำกัด
ผลการดำเนินงาน

งวดที่ 1 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 3 อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง

รายละเอียดงานงวดที่ 3 มีดังนี้

1. งานดินเหนียวบดอัดแน่น
2. งานดินลูกรังบดอัด
3. งานอาคารระบายน้ำล้น
4. งานหินทิ้ง พร้อมทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในงวดถัดไปเข้าพื้นที่



ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. ปัญหาการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า เนื่องจากสวนสัตว์ขอนแก่น ตั้งอยู่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งในการดำเนินการก่อสร้างต้องทำการขออนุญาตใช้พื้นที่และขออนุญาตทำไม้หวงห้าม ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทุกครั้ง โดยทางสวนสัตว์ขอนแก่น ได้ดำเนินการตามขั้นตอนในข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. ผู้รับจ้างสงวนสิทธิ์ขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ตามที่ทางผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขอสงวนสิทธิ์การขยายเวลา 97 วัน จากเดิมสิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 15 กันยายน 2564 ขยายเป็นสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 21 ธันวาคม 2564

แนวทางแก้ไข

1. คณะกรรมการ ทำหนังสือเร่งรัดการส่งมอบงาน เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา
2. ให้ผู้ประกอบการส่งแผนการดำเนินงานและจัดให้มีการประชุมหารือร่วมกัน เพื่อรายงานความคืบหน้าปัญหาและอุปสรรคเป็นประจำ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2565

4.2 รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เรื่องเดิม

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้รับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับการพิจารณากรอบเงินทั้งสิ้น จำนวน 708.0265 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. งบบุคลากร	181.9375	ล้านบาท
2. งบอุดหนุน	223.9820	ล้านบาท
3. งบลงทุน	<u>302.1070</u>	ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	<u>708.0265</u>	ล้านบาท

การดำเนินงาน

สำนักงานเงินและทรัพย์สิน ได้ดำเนินการรวบรวมแผน และผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 54 รายการ วงเงิน 302,107,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย

- 1 ครุภัณฑ์ จำนวน 41 รายการ วงเงิน 33,445,100 บาท
ทำสัญญาแล้ว จำนวน 39 รายการ
- 2 สิ่งก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ วงเงิน 268,661,900 บาท
ทำสัญญาแล้ว จำนวน 7 รายการ

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

ข้อเสนอเพื่อทราบ

เพื่อโปรดทราบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหมวดรายจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รายงานสถานภาพตามกระบวนการพัสดุ ของงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2565 จำนวน 13 รายการ



1. ปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์ (สอบ)
 - วันที่ 9-15 ธค. 64 คณะกรรมการพิจารณาผล
 - วันที่ 16 ธค. 64 ประกาศผู้ชนะ
 - วันที่ 17-27 ธค. 64 ระยะเวลาในการอุทธรณ์
 - วันที่ 28 ธค. 64 ทำหนังสือเชิญบริษัทฯ ลงนามสัญญา
 - วันที่ 30 ธค. 64 ลงนามสัญญา

2. ปรับปรุงถนนแนวรั้วและสิ่งอำนวยความสะดวก (สขช.)
3. ก่อสร้างเตาเผาซากสัตว์ปลอดมลพิษพร้อมปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการ (สขช.)
 - (ข้อ 2 และ ข้อ 3)
 - วันที่ 13 ธค. 64 ประกาศผู้ชนะ
 - วันที่ 14-24 ธค. 64 ระยะเวลาในการอุทธรณ์
 - วันที่ 22-28 ธค. 64 ทำหนังสือเชิญบริษัทฯ ลงนามสัญญา
 - วันที่ 30 ธค. 64 ลงนามสัญญา

1. ก่อสร้างโครงข่าย ท่อน้ำทิ้งและระบบ บำบัดน้ำเสีย เพื่อรองรับ การตรวจประเมิน คุณภาพการจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม (สขม.)
 - ประสานกรมบัญชีกลาง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จะพิจารณาภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ธันวาคม 2564


1. ปรับปรุงส่วนจัดแสดง อาณาจักรนกกล้า (สขก.)
 - สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์ วันที่ 16 ธค. 2564
 - ทำหนังสือแจ้งบริษัทฯ เข้ามาทำสัญญา 17 ธค. 2564
 - คาดว่าลงนามสัญญา วันที่ 22 ธค. 2564

1. ก่อสร้างส่วนจัดแสดงสัตว์ อาณาจักรผู้ล่า (สนม.)
 - (ลงนามสัญญาวันที่ 16 ธค 64)

1. ปรับปรุงอาคารฝ่ายอนุรักษ์และวิจัย พร้อมอาคารอนุบาลลูกสัตว์ (สขม.)
2. ปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวน้ำ (สขก.)
3. ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสัตว์และ อาคารประกอบต่างๆ (สขก.)
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระการบินไทย (สสร.)
5. ปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วน ขยายพันธุ์สมเสร็จ (สสช.)
6. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (สนม.)
7. ปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ (สสช.)

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธ.ค. 2564


รายงานสถานภาพตามกระบวนการพัสดุ ของงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ ประจำปี 2565 จำนวน 41 รายการ

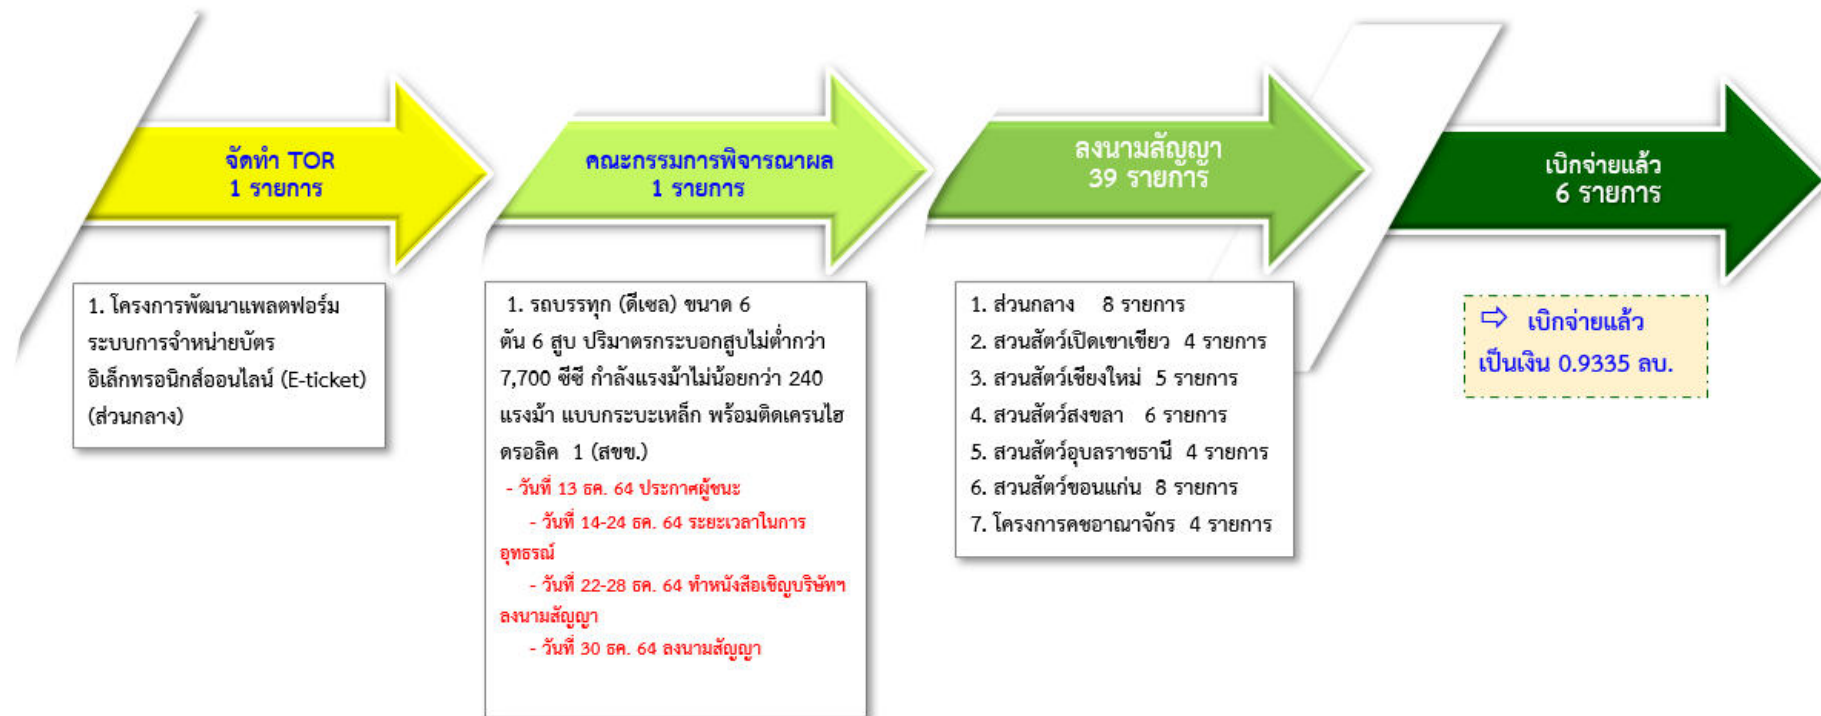

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธ.ค. 2564

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

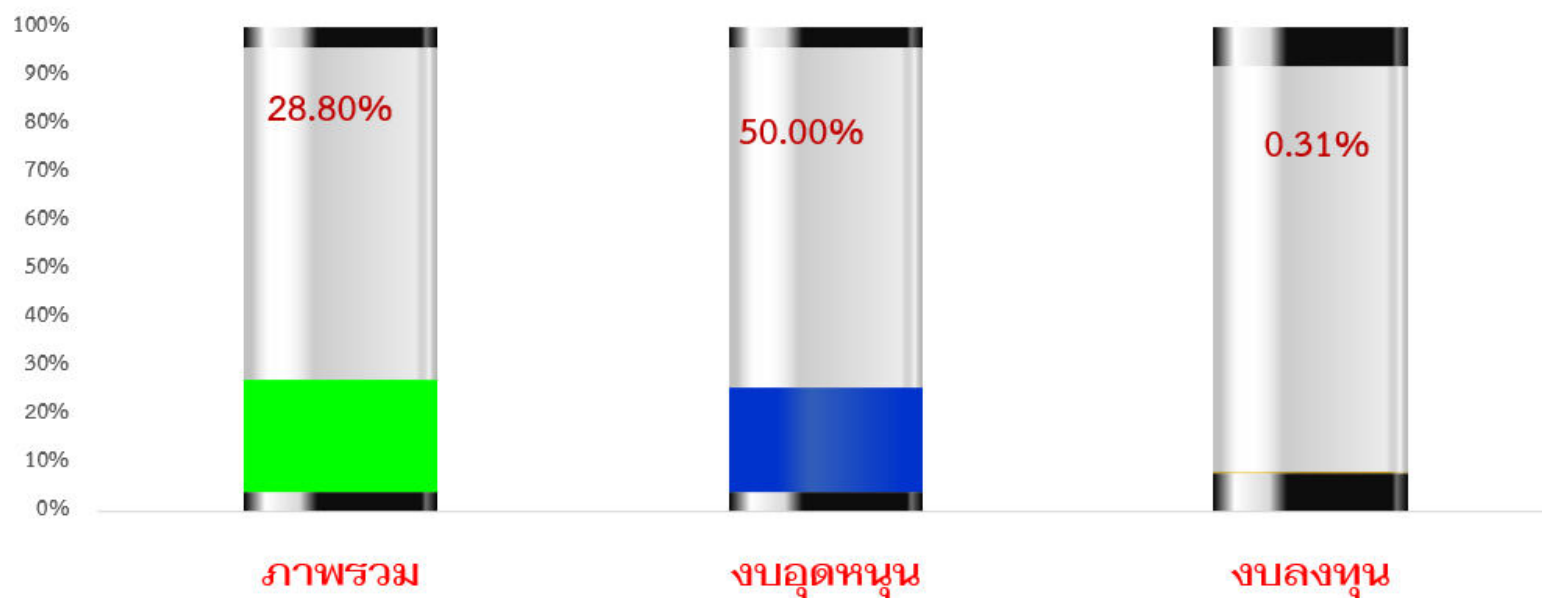

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธ.ค. 64

รายการ		งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คิดเป็น (%)	คงเหลือ
1. งบอุดหนุน		405.9195	202.9580	50.00	202.9615
2. งบลงทุน		302.1070	0.9335	0.31	301.1735
* ครุภัณฑ์		33.4451	0.9335	2.79	32.5116
* สิ่งก่อสร้าง		268.6619	-	-	268.6619
รวมทั้งสิ้น		708.0265	203.8915	28.80	504.1350

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564)

ลำดับ	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ		ครุภัณฑ์ จำนวน 41 รายการ	
		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	หมายเหตุ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	หมายเหตุ
	รวม	13 รายการ		40 รายการ	
1	ขออนุมัติแบบ ,จัดทำ TOR และราคากลาง -แก้ไขแบบและขออนุมัติที่ อสส -จัดทำ TOR และราคากลาง			1 รายการ	1. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-ticket)
2	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 2.1 หาผู้ประกอบการ SME (อย่างน้อย 6ราย)	5 รายการ		รายการ	
	2.2 รายงานขอซื้อขอจ้าง				
	2.3 ประกาศร่าง TOR (ถ้ามี)				
	2.4 ประกาศ TOR (ในระบบ e-gp)				
	2.5 จัดทำหนังสือเชิญชวน (คัดเลือก)				
	2.6 ยื่นข้อเสนอราคา				
	2.7 คณะกรรมการพิจารณาผล	3	1. ปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์ (สวนสัตว์อุบลราชธานี) 2. ปรับปรุงถนนแนวรั้วและสิ่งอำนวยความสะดวก (สวนสัตว์เปิดเขาเขียว) 3. ก่อสร้างเตาเผาซากสัตว์ปลอดมลพิษ พร้อมปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการ (สวนสัตว์เปิดเขาเขียว)	1	1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 สูบ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ลำดับ	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ		ครุภัณฑ์ จำนวน 41 รายการ	
		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	หมายเหตุ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	หมายเหตุ
	2.8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา				
	2.9 ระยะเวลาอุทธรณ์	1	1. ปรับปรุงส่วนจัดแสดงอาณาจักร์นักล้า (สวนสัตว์ขอนแก่น)		
	2.10 แจ้งลงนามในสัญญา	1	1. ก่อสร้างส่วนจัดแสดงสัตว์อาณาจักร์ผู้ล่า (สวนสัตว์นครราชสีมา)		
3	ลงนามสัญญา	7 รายการ	จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว 1. สวนสัตว์เชียงใหม่ 1 รายการ 2. สวนสัตว์ขอนแก่น 2 รายการ 3.โครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์ 1 รายการ 4. สวนสัตว์สงขลา 2 รายการ 5. สวนสัตว์นครราชสีมา 1 รายการ	39 รายการ	จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว 1. ส่วนกลาง 8 รายการ 2. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 4 รายการ 3. สวนสัตว์เชียงใหม่ 5 รายการ 4. สวนสัตว์สงขลา 6 รายการ 5. สวนสัตว์อุบลราชธานี 4 รายการ 6. สวนสัตว์ขอนแก่น 8 รายการ 7. โครงการคชอาณาจักร 4 รายการ
4	ปัญหา อื่น ๆ -มีการอุทธรณ์ ส่งกรมบัญชีกลางพิจารณาผล	1 รายการ	ก่อสร้างโครงข่ายท่อน้ำทิ้งและระบบบำบัด น้ำเสีย (สวนสัตว์เชียงใหม่) ส่งผลการอุทธรณ์ ให้กรมบัญชีกลางพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการ มีการพิจารณาครั้งที่ 1 แล้ว และรอการ นำเสนอเข้าคณะกรรมการอีกครั้งในวันที่ 21 ธันวาคม 2564		

แผน - ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (วันที่ 9 ธันวาคม 2564)

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ	รายงานขอซื้อขอจ้าง		เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคา/ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคา (ถ้ามี)		อนุมัติและลงนามประกาศเชิญชวน		เสนอราคาและพิจารณาผล		ขออนุมัติรับราคา/ประกาศผู้ชนะ		ระยะเวลาอุทธรณ์		หนังสือแจ้งลงนามในสัญญา		ลงนามในสัญญา		วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	หมายเหตุ
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
	ก่อสร้าง 13 รายการ		268,661,900																		
1	ปรับปรุงอาคารฝ่ายอนุรักษ์และวิจัย พร้อมอาคารอนุบาลลูกสัตว์	สวนสัตว์เชียงใหม่	2,500,000	10ส.ค. 64	10ส.ค. 64	-	ไม่มี	9 ส.ค. 64	10ส.ค. 64	20 ส.ค. 64	19-24 ส.ค.64	25 ส.ค. 64	25 ส.ค. 64	26 ส.ค. -3 ก.ย. 64	26 ส.ค. - 7 ก.ย. 64	1 ต.ค. 64	4 ตค 64	15 ต.ค. 64	-	e-bidding	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
2	ปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวน้ำ	สวนสัตว์ขอนแก่น	16,278,000	11 ส.ค. 64	18 ส.ค. 64	18 ส.ค. 64	17-20 ส.ค. 64	26 ส.ค. 64	25 ส.ค. 64	16 ก.ย.64	14 ก.ย. 64	20 ก.ย.64	16 ก.ย. 64	21-29 ก.ย.64	17-27 ก.ย .64	30 ก.ย.64	4 ต.ค. 64	8 ต.ค.64	-	e-bidding	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
3	ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสัตว์และอาคารประกอบต่างๆ	สวนสัตว์ขอนแก่น	9,000,000	11 ส.ค. 64	18 ส.ค. 64	18 ส.ค. 64	18-23ส.ค. 64	26 ส.ค. 64	25 ส.ค. 64	16 ก.ย.64	14 ก.ย. 64	20 ก.ย.64	16 ก.ย. 64	21-29 ก.ย.64	17-27 ก.ย .64	30 ก.ย.64	4 .ต.ค64	8 ต.ค.64	-	e-bidding	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
4	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระการบินไทย	โครงการคชอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์	12,000,000	23 ส.ค. 64	14 ก.ย. 64	27 ส.ค.64	16 - 21 ก.ย. 64 ประกาศจริง 22 กย 64-8 ตค 64	3-20 ก.ย. 64	22 ก.ย. 64	21-24 ก.ย. 64	30 ก.ย. 64	30 ก.ย. 64	20 ต.ค. 64	1-11 ต.ค.64	20 ตค- 2พ.ย. 64	14 ต.ค. 64	3 พ.ย.64	25 ต.ค. 64	10 พ.ย.64	e-bidding	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
5	ปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธุ์ลมเสร็จภายในสวนสัตว์สงขลา	สวนสัตว์สงขลา	16,500,000	23 ส.ค. 64	23 ส.ค. 64	24 ส.ค. 64	24 ส.ค. 64	30 ส.ค. 64	11-24 ตค 64 25 ตค 64 ยื่นซอง	17 ก.ย.64	25 ต.ค. 64	21 ก.ย.64	28 ต.ค.64	22 ก.ย. 64 - 29 ก.ย.64	28 ต.ค. - 5 พ.ย.64	1 ต.ค.64	9 พ.ย. 64	6 ต.ค.64	-	e-bidding เป็นวิธีคัดเลือกตาม ว 845	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
6	ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	สวนสัตว์นครราชสีมา	10,000,000	6 ก.ย.64	14 ตค 64	6 ก.ย.64		10 ก.ย.64	18 ต.ค. 64	29 ก.ย.64	2 พ.ย.64	9 ต.ค.64	3 พ.ย.64	9-17 ต.ค.64	-	20 ต.ค.64	4 พ.ย.64	1 พ.ย.64	-	วิธีคัดเลือก	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
7	ปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์	สวนสัตว์สงขลา	35,800,000	30 ส.ค. 64	7 ต.ค. 64	31 ส.ค. 64	8-12 ต.ค 64	6 ก.ย. 64	14 ต.ค.-2 พ.ย.64	24 ก.ย.64	3 พ.ย. 64	28 ก.ย.64	9 พ.ย.64	29 ก.ย. 64 - 6 ต.ค.64	9 พ.ย. 64 - 17 พ.ย. 64	7 ต.ค.64	-	12 ต.ค.64	-	e-bidding เป็นวิธีคัดเลือกตาม ว 845	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
8	ปรับปรุงถนนวันวิ่งและลิ้งอำนวยความสะดวก	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	29,945,900	23 ส.ค. 64	25 ตค 64	23 ส.ค. 64	-	24 ส.ค. 64	-	10 ก.ย.64	-	16 ก.ย.64	-	13-22 ต.ค.64	-	24 ต.ค.64	-	1 พ.ย.64	-	วิธีคัดเลือก	ใช้วิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างหาผู้ประกอบการ SME ว845 โดยทำหนังสือเชิญเข้ายื่นเสนอราคา 26 พ.ย.-13 ธค.64อยู่ระหว่าง คณะกรรมการพิจารณาผล คาดว่าจะลงนาม 30 ธค.64
9	ก่อสร้างเตาเผาซากสัตว์ปลอดมลพิษพร้อมปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการ	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	4,774,000	23 ส.ค. 64	-	23 ส.ค. 64	-	24 ส.ค. 64	-	10 ก.ย.64	-	16 ก.ย.64	-	13-22 ต.ค.64	-	24 ต.ค.64	-	1 พ.ย.64	-	วิธีคัดเลือก	ใช้วิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างหาผู้ประกอบการ SME ว845 โดยทำหนังสือเชิญเข้ายื่นเสนอราคา 26 พ.ย.-13 ธค.64อยู่ระหว่าง คณะกรรมการพิจารณาผล คาดว่าจะลงนาม 30 ธค.64
10	ปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์	สวนสัตว์อุบลราชธานี	61,848,000	15 ก.ย. 64	-	18 ก.ย. 64	2-5 พ.ย.64	18 ต.ค. 64	8 พย 64 - 7 ธ.ค. 64	22 ต.ค. 64	-	26 ต.ค. 64	-	27 ต.ค. 64 - 4 พ.ย. 64	-	5 พ.ย. 64	-	10 พ.ย. 64	-	e-bidding	อยู่ระหว่างประกาศขายซองตามระเบียบฯ เกิน 50 ล้านบาท ไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ ขายซอง 8 พ.ย. 64 - 7 ธ.ค. 64 อยู่ระหว่าง คณะกรรมการพิจารณาผล คาดว่าจะลงนาม 30 ธค.64
11	ก่อสร้างส่วนจัดแสดงสัตว์อานาจักรผู้ล่า	สวนสัตว์นครราชสีมา	25,000,000	6 ก.ย.64	5 .ต.ค 64	6 ก.ย.64	5-8 ต.ค. 64	10 ก.ย.64	-	5 ต.ค.64	-	15 ต.ค.64	-	15-23 ต.ค.64	-	28 ต.ค.64	-	5 พ.ย.64	-	วิธีคัดเลือก	ใช้วิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างหาผู้ประกอบการ SME ว845 โดยทำหนังสือเชิญเข้ายื่นเสนอราคา 25 พย-3 ธค.64 ทำหนังสือแจ้งบริษัทเข้ามาลงนามสัญญา วันที่ 16 ธค. 2564
12	ปรับปรุงส่วนจัดแสดงอานาจักรนักร้อง	สวนสัตว์ขอนแก่น	15,016,000	11 ส.ค. 64	25 ตค 64	18 ส.ค. 64	-	26 ส.ค. 64	-	16 ก.ย.64	-	20 ก.ย.64	-	21-29 ก.ย.64	-	30 ก.ย.64	-	8 ต.ค.64	-	วิธีคัดเลือก	ใช้วิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างหาผู้ประกอบการ SME ว845 โดยกำหนดวันยื่นเสนอราคา 26 พย.64 พิจารณาผล 29 พย.64 อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์ 16 ธค. 64 และ คาดว่าจะลงนาม 22 ธค.64
13	ก่อสร้างโครงข่ายท่อน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	สวนสัตว์เชียงใหม่	30,000,000	13 ส.ค. 64	1 ก.ย. 64	19 ส.ค. 64	2-6 ก.ย. 64	13 ส.ค. 64	13 ก.ย. 64	8 ก.ย.64	4-6 ต.ค. 64	13 ก.ย.64	7 .ต.ค64	14 - 22 ก.ย. 64	7-18 ตค 64	1 ต.ค. 64	-	11 ต.ค. 64	-	e-bidding	มีการอุทธรณ์ผู้ชนะ และอยู่ระหว่างรายงานความเห็นการอุทธรณ์พร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (กรมบัญชีกลาง) โดยมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ครั้งที่ 1 แล้ว และการนำเสนอเข้าคณะกรรมการฯ อีกครั้งวันที่ 21 ธค.64

แผน - ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (วันที่ 9 ธันวาคม 2564)

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ	เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคา/ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคา (ถ้ามี)		อนุมัติและลงนามประกาศเชิญชวน		เสนอราคาและพิจารณาผล		ขออนุมัติรับราคา/ประกาศผู้ชนะ		ระยะเวลาอุทธรณ์		หนังสือแจ้งลงนามในสัญญา		ลงนามในสัญญา		เบิกจ่ายงานงวดสุดท้าย		วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	หมายเหตุ
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
	ครุภัณฑ์ จำนวน 41 รายการ		33,445,100		-		-		-		-		-		-		-		-		
1	กล้องถ่ายภาพระบบ wifi สำหรับกล้องจุลทรรศน์ 1 เครื่อง	ส่วนกลาง	120,000	-	-	-	28 ก.ย. 64	15 ก.ย. 64	30 ก.ย. 64	30 ก.ย. 64	5 ต.ค. 64	-	-	10 ต.ค.64	6 ต.ค. 64	15 ต.ค.64	6 ต.ค.64	14 ม.ค. 64	4 ม.ค. 65	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
2	ตู้เก็บเปลือกหทาราฟิน 2 ตู้	ส่วนกลาง	150,000	-	-	-	23 ก.ย. 64	15 ก.ย. 64	28 ก.ย. 64	30 ก.ย. 64	29 ก.ย. 64	-	-	10 ต.ค.64	30 ก.ย. 64	15 ต.ค.64	2 ต.ค. 64	15 ธ.ค.64	29 ธ.ค.64	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
3	ตู้เก็บแผ่นกระจกสไลด์ 1 ตู้	ส่วนกลาง	82,500	-	-	-	-	15 ก.ย. 64	-	30 ก.ย. 64	-	-	-	10 ต.ค.64	-	15 ต.ค.64	-	15 ธ.ค.64	14 ธ.ค.64	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
4	เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงโนโมโครเพลท 1 เครื่อง	ส่วนกลาง	406,600	-	-	-	15 ก.ย. 64	15 ก.ย. 64	27 ก.ย. 64	30 ก.ย. 64	2 ต.ค. 64	-	-	10 ต.ค.64	2.ต.ค 64	15 ต.ค.64	11 ต.ค. 64	15มี.ค.64	9 ม.ค. 65	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
5	ตู้เย็นแช่น้ำยา 1 ตู้	ส่วนกลาง	142,000	-	-	-	-	15 ก.ย. 64	-	30 ก.ย. 64	-	-	-	10 ต.ค.64	-	15 ต.ค.64	-	13 ก.พ. 64	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
6	เครื่องตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ 1 เครื่อง	ส่วนกลาง	250,000	-	-	-	-	15 ก.ย. 64	-	30 ก.ย. 64	-	-	-	10 ต.ค.64	-	15 ต.ค.64	20 ต.ค64	13 ก.พ. 64	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
7	เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพในสัตว์ 1 เครื่อง	ส่วนกลาง	300,000	-	-	-	-	15 ก.ย. 64	-	30 ก.ย. 64	-	-	-	10 ต.ค.64	-	15 ต.ค.64	20 ต.ค64	13 ก.พ. 64	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
8	ตู้แช่แข็ง -40 องศาเซลเซียส 1 ตู้	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	150,000	-	-	-	16 ส.ค. 64	6 ก.ย. 64	18 ส.ค. 64	8 ส.ค. 64	23 ส.ค. 64	-	-	16 ต.ค.64	4 ตค 64	1 พ.ย. 64	-	29 ม.ค. 65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
9	เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วรอบต่ำ 1 เครื่อง	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	170,000	-	-	-	6 สค 64	18 ส.ค. 64	18 สค 64	-	23 ส.ค. 64	-	-	-	2 ต.ค.64	-	-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
10	เครื่องปั่นเหวี่ยงฮีมาโตคริต 1 เครื่อง	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	130,000	-	-	-	6 สค 64	18 ส.ค. 64	18 สค 64	-	23 ส.ค. 64	-	-	-	2 ต.ค.64	-	-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
11	เครื่องซิงไฟฟ้าแบบทศนิยม 3 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	80,000	-	-	-	6 สค 64	18 ส.ค. 64	18 สค 64	-	23 ส.ค. 64	-	-	-	2 ต.ค.64	-	-	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
12	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู สำหรับคอกกักหมีแพนด้า	สวนสัตว์เชียงใหม่	65,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 ก.ย. 64	-	30 พ.ย. 64	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
13	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) สวนสัตว์เชียงใหม่ 1 คัน	สวนสัตว์เชียงใหม่	715,000	-	-	2 ส.ค. 64	2 ส.ค. 64	10 ส.ค. 64	10-13 ส.ค. 64	16 ส.ค. 64	13 ส.ค. 64	17-25 ส.ค. 64	-	1 ต.ค.64	4 ต.ค. 64	8 ต.ค. 64	-	30 ธ.ค. 64	-	e-bidding	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
14	ถังเก็บน้ำบนดิน โพลีเมอร์ ขนาด 3,000 ลิตร 10 ใบ	สวนสัตว์เชียงใหม่	77,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 ก.ย. 64	-	30 พ.ย. 64	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
15	เครื่องอัลตราซาวด์แบบพกพาสำหรับสัตว์ป่า 1 เครื่อง	สวนสัตว์เชียงใหม่	1,455,200	-	-	2 ก.ย. 64	2 ก.ย.64	-	30 กย64-5 ตค64	6 ตค64	6 ตค64	-	-	12 ตค 64	12 ตค 64	21 ต.ค. 64	21 ต.ค.64	-	-	e-bidding	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
16	เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิทัล พร้อมเครื่องเอกซเรย์แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	สวนสัตว์เชียงใหม่	1,800,000	-	-	11 ส.ค. 64	22 ก.ย. 64	23 ส.ค. 64	30 ก.ย. 64 - 6ต.ค. 64	26 ส.ค. 64	7 ตค 64	-	7-18 ตค64	1 ต.ค. 64	19 ตค.64	20 ต.ค. 64	-	28 ก.พ. 65	-	e-bidding	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
17	เครื่องชี้ห้ามเลือด และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า 1 เครื่อง	สวนสัตว์สงขลา	89,500	-	-	-	-	8 ก.ย.64	-	13 ก.ย.64	-	-	-	1.ต.ค.64	-	6ต.ค.64	-	3 ก.พ. 65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
18	เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพในสัตว์ 1 เครื่อง	สวนสัตว์สงขลา	265,000	-	-	-	-	8 ก.ย.64	-	13 ก.ย.64	-	-	-	1.ต.ค.64	-	6ต.ค.64	26 ต.ค.64	3 ก.พ. 65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
19	เครื่องบันทึกและติดตามปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจรสำหรับสัตว์ 1 เครื่อง	สวนสัตว์สงขลา	18,000	-	-	-	-	8 ก.ย.64	-	13 ก.ย.64	-	-	-	1.ต.ค.64	-	6ต.ค.64	26 ต.ค.64	3 ก.พ. 65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
20	เครื่องติดตามและบันทึกค่าคาร์บอนไดออกไซด์ทางเดินหายใจแบบแมนสตริม 1 เครื่อง	สวนสัตว์สงขลา	56,000	-	-	-	-	8 ก.ย.64	-	13 ก.ย.64	-	-	-	1.ต.ค.64	-	6ต.ค.64	26 ต.ค.64	3 ก.พ. 65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ	เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคา/ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคา (ถ้ามี)		อนุมัติและลงนามประกาศเชิญชวน		เสนอราคาและพิจารณาผล		ขออนุมัติรับราคา/ประกาศผู้ชนะ		ระยะเวลาอุทธรณ์		หนังสือแจ้งลงนามในสัญญา		ลงนามในสัญญา		เบิกจ่ายงานงวดสุดท้าย		วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	หมายเหตุ
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
21	โคม่ไฟฟ้าตัด 1 ชุด	สวนสัตว์สงขลา	28,000	-	-	-	-	8 ก.ย.64	-	13 ก.ย.64	-	-	-	1 ต.ค.64	-	6ต.ค.64	26 ต.ค.64	3 ก.พ. 65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
22	แผ่นบันทึกภาพเอกซเรย์แบบดิจิทัล 4 แผ่น	สวนสัตว์อุบลราชธานี	228,000	-	-	27 ก.ค. 64	27 ก.ค. 64	30 ก.ค. 64	30 ก.ค. 64	30 ก.ค. 64	30 ก.ค. 64	-		10 ต.ค. 64	30 ก.ย. 64	17 ต.ค. 64		30 ธ.ค. 64		วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
23	ชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล 1 ชุด	สวนสัตว์อุบลราชธานี	1,650,000	28 ส.ค. 64	2-7 กย 64	5 ก.ย. 64	8-15 ก.ย.64	8 ก.ย. 67	21 ก.ย. 64	8 ก.ย. 67	21 ก.ย. 64	11-20 ก.ย. 64	-	21 ต.ค. 64	30 ก.ย. 64	27 ต.ค. 64	-	30 ธ.ค. 64	-	e-bidding	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
24	กล้องวงจรปิดติดตั้ง 8 จุด 66 ตัว	สวนสัตว์อุบลราชธานี	873,800	28 ส.ค. 64	7-9กย64	5 ก.ย. 64	9 ก.ย. 64	8 ก.ย. 67	28 ก.ย. 64	8 ก.ย. 67	28 ก.ย. 64	11-20 ก.ย. 64	-	21 ต.ค. 64	-	27 ต.ค. 64	-	15 มี.ค. 65	-	e-bidding	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
25	หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 Kva สวนสัตว์อุบลราชธานี 5 เครื่อง	สวนสัตว์อุบลราชธานี	839,500	28 ส.ค. 64	21-27 ก.ย. 64	5 ก.ย. 64	28 ก.ย. - 5ต.ค 64	8 ก.ย. 67	6 ต.ค. 64	8 ก.ย. 67	29 ก.ย.64	11-20 ก.ย. 64	19-28 ตค 64	21 ต.ค. 64	-	27 ต.ค. 64	-	15 ก.พ. 65	-	e-bidding	ทำใบสั่งซื้อ เรียบร้อยแล้ว
26	เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวี 1 เครื่อง	สวนสัตว์ขอนแก่น	52,900	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 64	-	-	-	18 ต.ค. 64	-	27 ต.ค. 64	-	23 ก.พ. 65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำใบสั่งซื้อ เรียบร้อยแล้ว
27	เครื่องเลเซอร์รักษาแผลสำหรับสัตว์ 1 เครื่อง	สวนสัตว์ขอนแก่น	850,000	25 ส.ค. 64	-	26 ส.ค. 64	13 ก.ย. 64	14-16 ก.ย. 64	30 ก.ย. 64	20 ก.ย. 64	7 ต.ค. 64	21 - 29 ก.ย. 64	-	30 ก.ย. 64	-	8 ต.ค. 64	-	4 ก.พ. 65	-	e-bidding	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
28	เครื่องควบคุมรั่วไฟฟ้า 2 เครื่อง	สวนสัตว์ขอนแก่น	70,000	28 ส.ค. 64	-	5 ก.ย. 64	-	8 ก.ย. 67	-	8 ก.ย. 67	-	11-20 ก.ย. 64	-	21 ต.ค. 64	-	27 ต.ค. 64	-	30 ธ.ค. 64	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำใบสั่งซื้อ เรียบร้อยแล้ว
29	เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า 2 เครื่อง	สวนสัตว์ขอนแก่น	19,000	28 ส.ค. 64	-	5 ก.ย. 64	-	8 ก.ย. 67	-	8 ก.ย. 67	-	11-20 ก.ย. 64	-	21 ต.ค. 64	-	27 ต.ค. 64	-	30 ธ.ค. 64	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำใบสั่งซื้อ เรียบร้อยแล้ว
30	ตู้แช่อาหาร ขนาด 32 คิวบิกฟุต 1 ตู้	สวนสัตว์ขอนแก่น	27,000	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 64	-	-	-	18 ต.ค.64	-	27 ต.ค.64	-	23 ก.พ. 65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำใบสั่งซื้อ เรียบร้อยแล้ว
31	ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต 1 ตู้	สวนสัตว์ขอนแก่น	46,000	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 64	-	-	-	18 ต.ค.64	-	27 ต.ค.64	-	23 ก.พ. 65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำใบสั่งซื้อ เรียบร้อยแล้ว
32	เครื่องมือรักษาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดความเข้มต่ำ 1 เครื่อง	โครงการคช อาณาจักร จ. สุรินทร์	850,000	31 ส.ค. 64	30 ส.ค. 64	3 ก.ย.64	1 ก.ย. 64	15 ก.ย.64	10 ก.ย. 64	1 ต.ค.64	16 ก.ย. 64	4-12 ต.ค.64	-	22 ต.ค.64	1 ตค 64	8 พ.ย. 64	-	28ก.พ.65	-	e-bidding	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
33	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 1 เครื่อง	โครงการคช อาณาจักร จ. สุรินทร์	30,700	-	-	20 ส.ค. 64	-	25 ส.ค. 64	23 ส.ค.64	27 ส.ค. 64	31 ส.ค. 64	-	-	1 ก.ย.64	8 ก.ย.64	29 ต.ค. 64	-	28 ม.ค. 65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
34	เครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมในสภาพจริงแบบเคลื่อนที่ 1เครื่อง	โครงการคช อาณาจักร จ. สุรินทร์	480,000	-	-	20 ส.ค. 64	-	25 ส.ค. 64	20 ส.ค.64	27 ส.ค. 64	25 ส.ค.64	-	-	1 ก.ย. 64	8 ก.ย.64	29 ต.ค. 64	-	28ม.ค.65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
35	โครงการระบบบริหารจัดการสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (Thai Zoo Ark)	ส่วนกลาง	4,412,600	3 ก.ย. 64	-	15 ก.ย. 64	14 -22 ตค.64 กำหนดยื่นขอของ 25 ต.ค.64	21 ก.ย. 64	26 ต.ค.64	28 ก.ย. 64	28 ต.ค. 64	9 ก.ย.64 -5 ต.ค.64	28 ต.ค. 64-5 พ.ย. 64	7 ต.ค. 64	1 พ.ย.64	15 ต.ค. 64	9 พ.ย. 64	31 ส.ค. 65	-	e-bidding	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
36	เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ 3 เครื่อง	สวนสัตว์ขอนแก่น	444,200	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 64	-	-	-	18 ต.ค. 64	-	27 ต.ค. 64	-	23 ก.พ. 65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว
37	รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบะบอกลูกไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	สวนสัตว์สงขลา	1,358,000	31 ส.ค. 64	-	6 ก.ย. 64	10 ก.ย. 64	16 ก.ย.64	25 ต.ค. 64	21 ก.ย.64	28-ต.ค.-64	20 - 29 ก.ย. 64	ค.ค. 64-5 พ.ย. 64	1 ต.ค.64	9-พ.ย.-64	6 ต.ค.64	16 พ.ย.64	3 ก.พ. 65	-	e-bidding	ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว
38	รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน	โครงการคช อาณาจักร จ. สุรินทร์	3,300,000	31 ส.ค.64	28 ก.ย. 64	3 ก.ย.64	1 ต.ค.64	15 ก.ย.64	12 ต.ค. 64	1 ต.ค.64	14 ต.ค. 64	4-12 ต.ค.64	1-9 พย 64	22 ต.ค.64	11 พ.ย. 64	8 พ.ย. 64	19 พ.ย.64	6 ก.พ.65	-	e-bidding	ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ	เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคา/ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคา (ถ้ามี)		อนุมัติและลงนามประกาศเชิญชวน		เสนอราคาและพิจารณาผล		ขออนุมัติรับราคา/ประกาศผู้ชนะ		ระยะเวลาอุทธรณ์		หนังสือแจ้งลงนามในสัญญา		ลงนามในสัญญา		เบิกจ่ายงานงวดสุดท้าย		วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	หมายเหตุ
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
39	เครื่องเป่าใบไม้ 2 จังหวะ 3 เครื่อง	สวนสัตว์ขอนแก่น	30,300	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 64	-	-	-	18 ต.ค.64	-	27 ต.ค.64	-	23 ก.พ. 65	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	ออกไปสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว
40	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า 7,700 ซีซี กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า แบบกระบะเหล็ก พร้อมติดเครนไฮดรอลิค 1 คัน	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	2,882,600	3 ส.ค. 64	3-5 ส.ค. 64	11 ส.ค. 64	10 ก.ย. 64 ยกเลิกผู้ชนะ 14 ต.ค. 64	27 ส.ค. 64		2 ก.ย.64	-	8-16 ก.ย.64	-	1ต.ค.64	-	15 ต.ค.64	-	29 ม.ค. 65	-	e-bidding	ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงตาม TOR และได้มีการปรับปรุง TOR เรียบร้อยแล้ว ขึ้นประกาศร่าง TOR วันที่ 26 พย.- 1 ธค.64 และอยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล
41	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-ticket)	ส่วนกลาง	8,449,800	15 ก.ย. 64	-	22 ก.ย. 64	-	8 ต.ค.64	-	15 ต.ค.64	-	15-23 พ.ย.64	-	24พ.ย.64	-	30 พ.ย.64	-	29 พ.ค. 65	-	e-bidding	คณะกรรมการส่ง TOR วันที่25 ต.ค. 64 อยู่ระหว่างการพิจารณา TOR

4.3 รายงานผลการดำเนินงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำพฤศจิกายน 2564

รายงานผลการดำเนินงานรายได้ ค่าใช้จ่าย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่องเดิม

๑. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เสนอแผนปฏิบัติการด้านการเงิน (เงินนอกงบประมาณ) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

๑.๑ ประมาณการรายได้ จำนวน ๒๙๕.๑๘๒๐ ล้านบาท

๑.๒ ประมาณการรายจ่าย จำนวน ๓๙๓.๖๓๗๖ ล้านบาท

๒. ในคราวประชุมคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีมติที่ประชุมดังนี้

๒.๑ อนุมัติแผนปฏิบัติการด้านการเงิน (เงินนอกงบประมาณ) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๒ อนุมัติให้ใช้เงินสะสมองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จำนวน ๑๘๖.๒๙๐๐ ล้านบาท กรณีเพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานในส่วนที่รายได้ (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่าย และกรณีเกิดรายได้ไม่เป็นไปตามแผน จากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-๑๙

ข้อเท็จจริง

๑. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดทำแผนรายได้ และค่าใช้จ่ายแยกเป็นรายเดือน โดยผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้อนุมัติแผนรายได้ และค่าใช้จ่าย เพื่อให้สำนัก สวนสัตว์ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้มีรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านการเงิน

๒. รายงานงบการเงินได้ผ่านการสอบทานจากสำนักตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๕

ผลการดำเนินงาน

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ขอรายงานผลการดำเนินงาน รายได้ ค่าใช้จ่าย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

	แผน	ผล	สูง (ต่ำ) กว่าแผน	หน่วย : ล้านบาท
๑. รายได้	๒๑.๒๒	๒๓.๑๐	๑.๘๘	
๒. รายจ่าย	๕๗.๖๙	๕๗.๗๘	๐.๐๙	
(ค่าใช้จ่าย งบรัฐบาล+องค์การ)				

ข้อเสนอเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานรายได้ ค่าใช้จ่าย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
รายได้จากการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

หน่วย : ล้านบาท


สวนสัตว์	แผน - ผลรายได้	
	แผน	ผล
ส่วนกลาง	0.69	0.54
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	6.75	11.71
สวนสัตว์เชียงใหม่	4.88	2.88
สวนสัตว์นครราชสีมา	4.35	3.32
สวนสัตว์สงขลา	1.10	0.83
สวนสัตว์อุบลราชธานี	1.33	1.32
สวนสัตว์ขอนแก่น	1.72	1.82
โครงการ คชอาณาจักร	0.40	0.07
รวมรายได้ดำเนินงาน (เบื้องต้น)	21.22	22.49
รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้พนักงาน		0.07
รายได้บริจาคกองทุนเพื่อหมูปันด้า		0.11
รายได้ทางบัญชี - รายได้บริจาค (สินทรัพย์)		0.43
รวมรายได้ดำเนินงาน	21.22	23.10
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล		57.10
รวมทั้งสิ้น	21.22	81.93

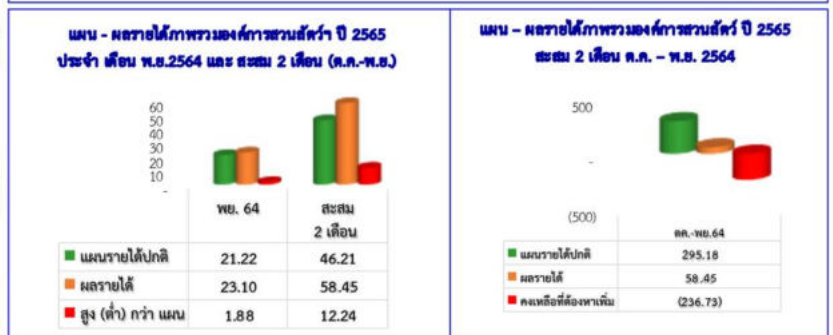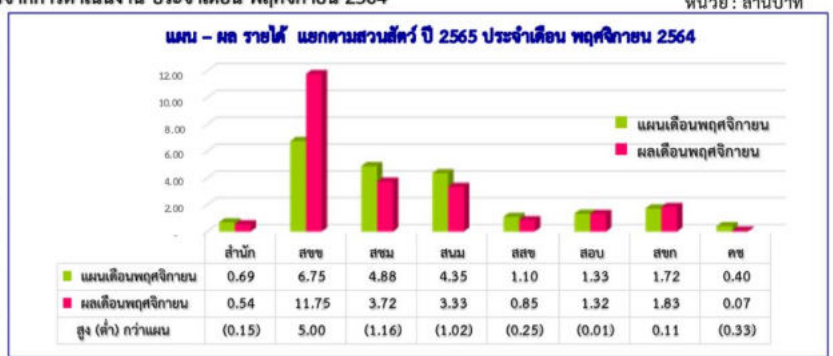

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
ค่าใช้จ่าย (รัฐบาล + องค์การ) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

หน่วย : ล้านบาท

สวนสัตว์	แผน - ผล ค่าใช้จ่าย	
	แผน	ผล
ส่วนกลาง	17.93	14.92
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	9.91	10.14
- แผนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9.28	9.60
- แผนส่วนแบ่งผู้ประกอบการ	0.63	0.54
สวนสัตว์เชียงใหม่	9.92	10.22
- แผนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6.92	7.47
- แผนค่าใช้จ่ายอควาเรียม	3.00	2.75
สวนสัตว์นครราชสีมา	7.18	7.95
สวนสัตว์สงขลา	5.82	5.77
สวนสัตว์อุบลราชธานี	2.43	3.07
สวนสัตว์ขอนแก่น	3.50	4.45
โครงการ คชอาณาจักร	1.31	1.26
รวมทั้งสิ้น	57.69	57.78
ค่าใช้จ่ายทางบัญชี		36.25
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	57.69	94.03

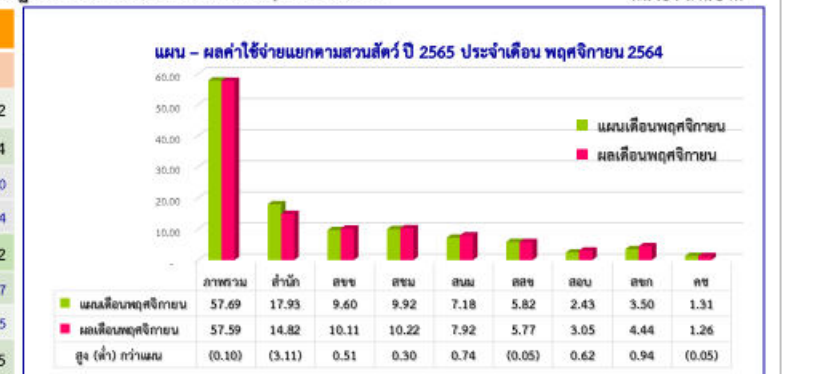


4.4 รายงานผลการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แบบสะสม 2 เดือน ประจำเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2564

การดำเนินงาน

สวนสัตว์เชียงใหม่ ขอรายงานผลการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบสะสม 2 เดือน ประจำเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2564 สรุปได้ ดังนี้ (ข้อมูลเบื้องต้น)

รายการ	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	รวม
รายได้ดำเนินงาน	1.161	0.891	-	2.052
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2.655	2.760	-	5.415
รายได้ สูง(-ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	- 1.494	- 1.869	-	- 3.363
ผู้เข้าชม (คน)	9,896	7,469	-	17,365

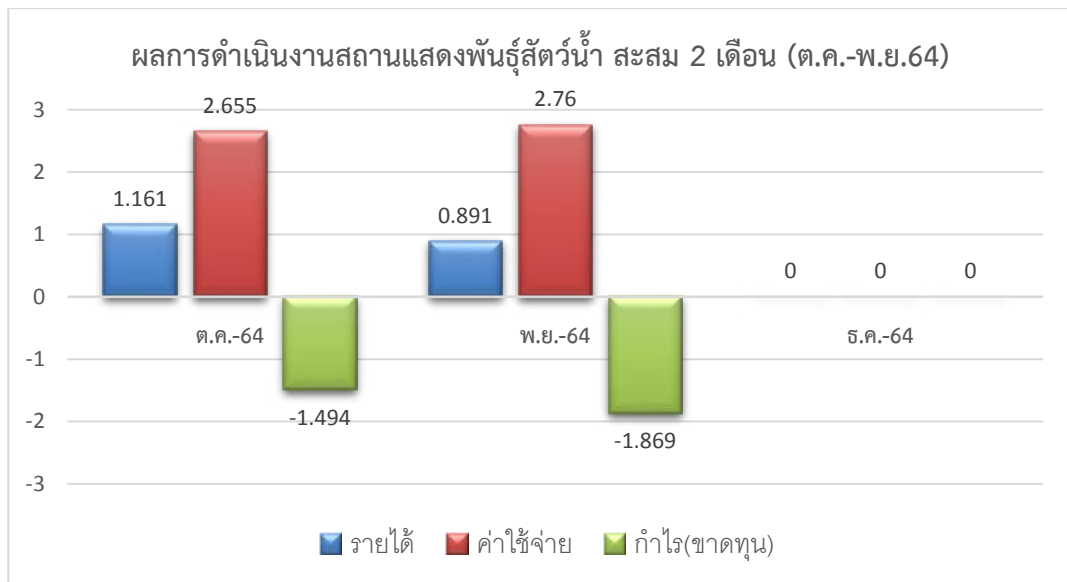

ผลการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ แบบสะสม 2 เดือน ในภาพรวมมีรายได้ดำเนินงานเกิดขึ้นจำนวน 2.052 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ที่มาจาก การจองเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานสะสม 2 เดือน เกิดขึ้นจำนวน 5.415 ล้านบาท โดยเฉลี่ยเดือนละ 3 ล้านบาท (36 ล้านบาทต่อปี) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างเหมา 2.996 ล้านบาท ค่าจ้างบริหาร 1.284 ล้านบาท และค่าไฟฟ้า 0.750 ล้านบาท ค่าอาหารสัตว์น้ำ 0.180 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.205 ล้านบาท

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ ผลการดำเนินงานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบสะสม 2 เดือน (เดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2564) ข้อมูลเบื้องต้น

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

มติที่ประชุม
