



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบท.กฟอ.แม่สาย ถึง กฟอ.แม่สาย
เลขที่ น.1มสย.(บท.) /2561 วันที่ 19 เมษายน 2561
เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.แม่สาย ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.แม่สาย

ตามมาตรฐาน กฟภ. โปร่งใส มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านบริหาร
จัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ มาตรฐานที่ 6 ให้มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผล
การจัดซื้อจัดจ้างปี ทุก 6 เดือน ในลักษณะร้อยละของจำนวนโครงการ และร้อยละของจำนวนงบประมาณ
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดให้เผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน นั้น

กฟอ.แม่สาย ขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่าง
เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาแจ้งส่วนเกี่ยวข้องนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาในงานจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสถัดไป

(นางสาวอุไรลักษณ์ วงศ์นิ่ม)

ประธานคณะกรรมการ การไฟฟ้าโปร่งใส มิติที่ 2

ที่ น.1มสย(บท) 1584/2561

เรียน รจก.(ท),รจก.(บ),นทน.9,ผชน.9,วศก.8,
ผผ.ทุกแผนก,คณะกรรมการไฟฟ้าโปร่งใส

เพื่อทราบ และดำเนินการเผยแพร่
รายงานในศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ต่อไป

(นายประพันธ์ วิรุรวาณิชย์)

ผจก.กฟอ.แม่สาย

19 เม.ย. 2561

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.แม่สาย ประจำปีงบประมาณ 2560
ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

1. สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.แม่สาย ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

ลำดับ ที่	งาน/โครงการ/ รายการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	เลขที่โครงการ	ร้อยละของ จำนวน โครงการ	วงเงิน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ร้อยละของ วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน ราคากลาง	วงเงิน ที่จัดซื้อ/จัดจ้าง (ทำ PO แล้ว)	ร้อยละของวงเงิน ที่จัดซื้อ/จัดจ้าง (ทำ PO แล้ว) เปรียบเทียบกับ วงเงินราคากลาง	ร้อยละของวงเงินที่ จัดซื้อ/จัดจ้าง (+)สูง/(-)ต่ำกว่า วงเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ร้อยละของวงเงินที่ จัดซื้อ/จัดจ้าง (+)สูง/(-)ต่ำกว่า วงเงินราคากลาง		
1	จัดซื้อพัสดุ	ตกลงราคา	(ขต)น.1แม่สาย(บห)55/2560		407,188.50	4.11%	407,188.50	460,635.00	113.13%	13.13%	13.13%		
			(ขต)น.1แม่สาย(บห)59/2560		299,814.00	3.02%	299,814.00	321,000.00	107.07%	7.07%	7.07%		
			(ขต)น.1แม่สาย(บห)63/2560		103,241.09	1.04%	103,241.09	93,234.45	90.31%	-9.69%	-9.69%		
			(ขต)น.1แม่สาย(บห)64/2560		340,409.80	3.43%	340,409.80	341,437.00	100.30%	0.30%	0.30%		
			(ขต)น.1แม่สาย(บห)69/2560		264,076.00	2.66%	264,076.00	208,821.20	79.08%	-20.92%	-20.92%		
		รวมตกลงราคา			5	18.52%	1,414,729.39	14.27%	1,414,729.39	1,425,127.65	100.73%	0.73%	0.73%
		เฉพาะเจาะจง	(ขจ)น.1แม่สาย(บห)74/2560		168,774.31	1.70%	168,774.31	157,798.25	93.50%	-6.50%	-6.50%		
			(ขจ)น.1แม่สาย(บห)77/2560		453,936.80	4.58%	453,936.80	413,929.50	91.19%	-8.81%	-8.81%		
			(ขจ)น.1แม่สาย(บห)80/2560		216,321.90	2.18%	216,321.90	192,279.00	88.89%	-11.11%	-11.11%		
			(ขจ)น.1แม่สาย(บห)81/2560		380,887.90	3.84%	380,887.90	487,117.50	127.89%	27.89%	27.89%		
			(ขจ)น.1แม่สาย(บห)87/2560		372,638.20	3.76%	372,638.20	334,268.00	89.70%	-10.30%	-10.30%		
			(ขจ)น.1แม่สาย(บห)89/2560		400,000.00	4.04%	383,807.40	299,476.95	78.03%	-25.13%	-21.97%		
			(ขจ)น.1แม่สาย(บห)93/2560		277,096.00	2.80%	240,953.30	211,967.00	87.97%	-23.50%	-12.03%		
รวมเฉพาะเจาะจง			7	25.93%	2,269,655.11	22.90%	2,217,319.81	2,096,836.20	94.57%	-7.61%	-5.43%		
รวมจัดซื้อพัสดุ				12	44.44%	3,684,384.50	37.17%	3,632,049.20	3,521,963.85	96.97%	-4.41%	-3.03%	
2	จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต	ตกลงราคา	(ขต)น.1แม่สาย(บห)58/2560		211,860.00	2.14%	211,860.00	211,111.00	99.65%	-0.35%	-0.35%		
			(ขต)น.1แม่สาย(บห)60/2560		480,109.00	4.84%	480,109.00	479,146.00	99.80%	-0.20%	-0.20%		
			(ขต)น.1แม่สาย(บห)65/2560		494,340.00	4.99%	494,340.00	493,665.90	99.86%	-0.14%	-0.14%		
			(ขต)น.1แม่สาย(บห)68/2560		494,340.00	4.99%	494,340.00	493,665.90	99.86%	-0.14%	-0.14%		
		รวมตกลงราคา			4	14.81%	1,680,649.00	16.95%	1,680,649.00	1,677,588.80	99.82%	-0.18%	-0.18%
		สอบราคา	(ขส)น.1แม่สาย(บห)62/2560		941,600.00	9.50%	941,600.00	939,460.00	99.77%	-0.23%	-0.23%		
		รวมสอบราคา			1	3.70%	941,600.00	9.50%	941,600.00	939,460.00	99.77%	-0.23%	-0.23%
		เฉพาะเจาะจง	(ขจ)น.1แม่สาย(บห)72/2560		455,606.00	4.60%	455,606.00	452,877.50	99.40%	-0.60%	-0.60%		
			(ขจ)น.1แม่สาย(บห)75/2560		494,340.00	4.99%	494,340.00	493,441.20	99.82%	-0.18%	-0.18%		
			(ขจ)น.1แม่สาย(บห)78/2560		493,672.32	4.98%	493,672.32	491,446.72	99.55%	-0.45%	-0.45%		
			(ขจ)น.1แม่สาย(บห)83/2560		494,340.00	4.99%	494,340.00	493,890.06	99.91%	-0.09%	-0.09%		
			(ขจ)น.1แม่สาย(บห)91/2560		497,657.00	5.02%	497,657.00	494,527.25	99.37%	-0.63%	-0.63%		
		รวมเฉพาะเจาะจง			5	18.52%	2,435,615.32	24.57%	2,435,615.32	2,426,182.73	99.61%	-0.39%	-0.39%
รวมจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต				10	37.04%	5,057,864.32	51.02%	5,057,864.32	5,043,231.53	99.71%	-0.29%	-0.29%	
3	จัดจ้าง	ตกลงราคา	(จต)น.1แม่สาย(บห)61/2560		138,230.86	1.39%	138,230.86	126,608.82	91.59%	-8.41%	-8.41%		
		รวมตกลงราคา			1	3.70%	138,230.86	1.39%	138,230.86	126,608.82	91.59%	-8.41%	-8.41%
		เฉพาะเจาะจง	(จจ)น.1แม่สาย(บห)82/2560		145,332.13	1.47%	145,332.13	99,935.00	68.76%	-31.24%	-31.24%		
			(จจ)น.1แม่สาย(บห)84/2560		245,757.60	2.48%	245,757.00	243,960.00	99.27%	-0.73%	-0.73%		
			(จจ)น.1แม่สาย(บห)86/2560		282,480.00	2.85%	433,350.00	282,480.00	65.19%	0.00%	-34.81%		
รวมเฉพาะเจาะจง			3	11.11%	673,569.73	6.80%	824,439.13	626,375.00	75.98%	-7.01%	-24.02%		
รวมจัดจ้าง				4	14.81%	811,800.59	8.19%	962,669.99	752,983.82	78.22%	-7.25%	-21.78%	
4	จัดซื้อเครื่องมือตัดต้นไม้	เฉพาะเจาะจง	(ขจ)น.1แม่สาย(บห)70/2560		358,631.90	3.62%	358,631.90	358,000.00	99.82%	-0.18%	-0.18%		
		รวมเฉพาะเจาะจง			1	3.70%	358,631.90	3.62%	358,631.90	358,000.00	99.82%	-0.18%	-0.18%
	รวมจัดซื้อเครื่องมือตัดต้นไม้				1	3.70%	358,631.90	3.62%	358,631.90	358,000.00	99.82%	-0.18%	-0.18%
รวมทั้งหมด				27	100.00%	9,912,681.31	100.00%	10,011,215.40	9,676,179.20	96.65%	-2.39%	-3.35%	

ในภาพรวมปีงบประมาณ 2560 ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 กฟอ.แม่สาย มีผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 100,000.00 บาทขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น 27 โครงการ แบ่งตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้างได้ 4 ประเภท ซึ่งมีวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรวม 9,912,681.30 บาท และวงเงินราคากลางรวม 10,011,215.40 บาท ประกอบไปด้วย

1.1 งานจัดซื้อพัสดุ จำนวน 12 โครงการ วงเงินงบประมาณ 3,684,384.50 บาท วงเงินราคากลาง 3,632,049.20 บาท ดำเนินการจนถึงขั้นตอนได้คู่สัญญาแล้ววงเงินที่จัดซื้อ 3,521,963.85 บาท ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ 4.41% และต่ำกว่าวงเงินราคากลาง 3.03%


1.2 งานจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 10 โครงการ วงเงินงบประมาณ 5,057,864.32 บาท วงเงินราคากลาง 5,057,864.32 บาท ดำเนินการจนถึงขั้นตอนได้คู่สัญญาแล้ววงเงินที่จัดซื้อ 5,043,231.53 บาท ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ 0.29% และต่ำกว่าวงเงินราคากลาง 0.29%

1.3 งานจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ วงเงินงบประมาณ 811,800.59 บาท วงเงินราคากลาง 962,669.99 บาท ดำเนินการจนถึงขั้นตอนได้คู่สัญญาแล้ววงเงินที่จัดจ้าง 752,983.82 บาท ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ 7.25% และต่ำกว่าวงเงินราคากลาง 21.78%


1.4 งานจัดซื้อเครื่องมือตัดต้นไม้ จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 358,631.90 บาท วงเงินราคากลาง 358,631.90 บาท ดำเนินการจนถึงขั้นตอนได้คู่สัญญาแล้ววงเงินที่จัดซื้อ 358,000.00 บาท ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ 0.18% และต่ำกว่าวงเงินราคากลาง 0.18%

2. ร้อยละของจำนวนโครงการ จำแนกตามประเภทและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดง ร้อยละของจำนวนโครงการ จำแนกตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง		
งาน/โครงการ/รายการ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ
จัดซื้อพัสดุ	12	44.44%
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต	10	37.04%
จัดจ้าง	4	14.81%
จัดซื้อเครื่องมือตัดต้นไม้	1	3.70%
Grand Total	27	100.00%

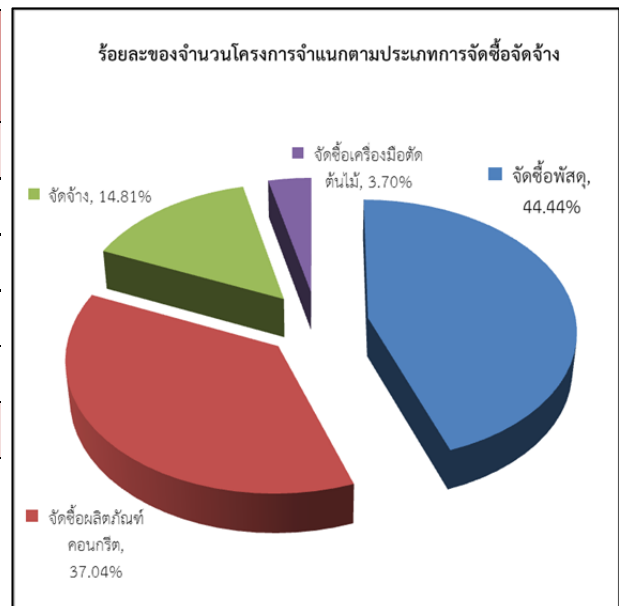


ตารางแสดง ร้อยละของจำนวนโครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
งาน/โครงการ/รายการ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ
ตกลงราคา	10	37.04%
สอบราคา	1	3.70%
เฉพาะเจาะจง	16	59.26%
Grand Total	27	100.00%

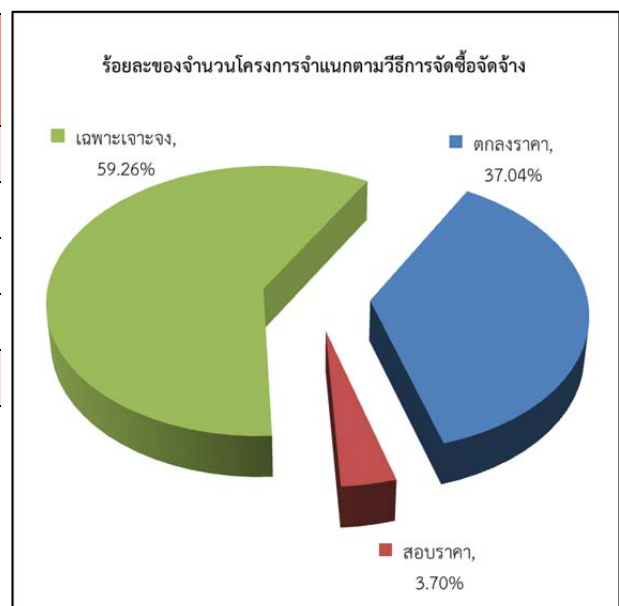


3. ร้อยละของจำนวนงบประมาณ จำแนกตามประเภทและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดง ร้อยละของจำนวนงบประมาณ จำแนกตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง		
งาน/โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
จัดซื้อพัสดุ	3,684,384.50	37.17%
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต	5,057,864.32	51.02%
จัดจ้าง	811,800.59	8.19%
จัดซื้อเครื่องมือตัดต้นไม้	358,631.90	3.62%
Grand Total	9,912,681.31	100.00%

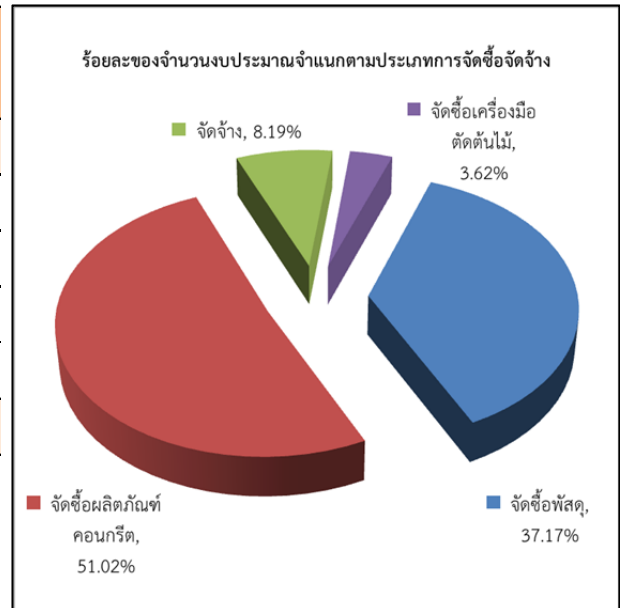

ตารางแสดง ร้อยละของจำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
งาน/โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ตกลงราคา	3,233,609.25	32.62%
สอบราคา	941,600.00	9.50%
เฉพาะเจาะจง	5,737,472.06	57.88%
Grand Total	9,912,681.31	100.00%

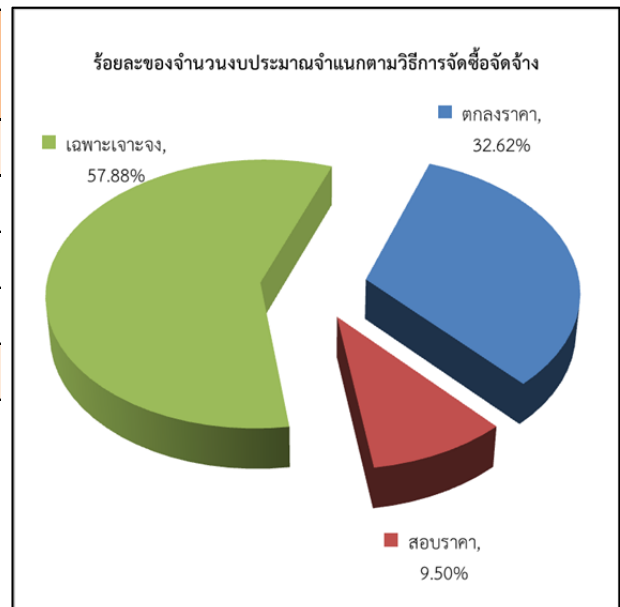

4. ข้อมูลระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามประเภทโครงการและวิธีดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

ระยะเวลาดำเนินการเฉลี่ย (วัน)	ประเภทโครงการและวิธีดำเนินการ								
	จัดจ้าง		จัดจ้าง (งานสัญญารายปี)	จัดซื้อเครื่องมือตัดต้นไม้	จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต			จัดซื้อพัสดุ	
	เฉพาะเจาะจง	ตกลงราคา	เฉพาะเจาะจง	เฉพาะเจาะจง	เฉพาะเจาะจง	ตกลงราคา	สอบราคา	เฉพาะเจาะจง	ตกลงราคา
วันแจ้งความต้องการ - วันได้สัญญา	7	32	41	35	15	16	39	18	21
วันสั่งซื้อ - วันตรวจรับของ	16	92	-	35	24	34	64	23	21
รวมระยะเวลาดำเนินการ - วันตรวจรับของ	23	124	41	70	39	50	103	41	42
วันตรวจรับของ - วันส่งเอกสารใบสำคัญจ่าย	1	28	-	5	8	12	15	9	5
วันตรวจเอกสารก่อนจ่ายเงิน - วันตั้งหนี้	7	1	-	16	5	7	14	9	6
รวมระยะเวลาดำเนินการตรวจรับของ-วันตั้งหนี้	8	29	-	21	13	19	29	18	11
รวมระยะเวลาดำเนินการทั้งหมด (วัน)	31	153	41	91	52	69	132	59	53

จากผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 กพอ.แม่สาย มีวิธีการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภทโครงการอยู่ 3 วิธี คือ **วิธีตกลงราคา**, **วิธีสอบราคา** (สำหรับโครงการที่มีมีการเริ่มดำเนินการก่อน 23 สิงหาคม 2560), และ**วิธีเฉพาะเจาะจง** (สำหรับโครงการที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) ซึ่งแต่ละโครงการ แต่ละวิธีการ มีการระยะเวลาในการดำเนินการและพิจารณาแตกต่างกัน สามารถสรุปข้อมูลระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 ได้ดังนี้

4.1 งานจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการตลอดทั้งกระบวนการโดยเฉลี่ย 31 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติดำเนินการจนถึงวันที่คู่สัญญาใช้เวลา 7 วัน นับจากวันสั่งจ้างจนถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้เวลา 16 วัน และใช้ระยะเวลาในการรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน ตรวจเอกสารถึงวันตั้งหนี้ 8 วัน

4.2 งานจัดจ้าง วิธีตกลงราคา ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการตลอดทั้งกระบวนการโดยเฉลี่ย 153 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติดำเนินการจนถึงวันที่คู่สัญญาใช้เวลา 32 วัน นับจากวันสั่งจ้างจนถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้เวลา 92 วัน และใช้ระยะเวลาในการรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน ตรวจเอกสารถึงวันตั้งหนี้ 29 วัน

4.3 งานจัดจ้าง (งานจ้างเหมาบริการฯ สัญญารายปี) วิธีเฉพาะเจาะจง ใช้ระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินการจนถึงวันที่คู่สัญญาใช้เวลา 41 วัน

4.4 งานจัดซื้อเครื่องมือตัดต้นไม้ วิธีเฉพาะเจาะจง ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการตลอดทั้งกระบวนการโดยเฉลี่ย 91 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติดำเนินการจนถึงวันที่คู่สัญญาใช้เวลา 35 วัน นับจากวันสั่งจ้างจนถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้เวลา 35 วัน และใช้ระยะเวลาในการรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน ตรวจเอกสารถึงวันตั้งหนี้ 21 วัน

4.5 งานจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต วิธีเฉพาะเจาะจง ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการตลอดทั้งกระบวนการโดยเฉลี่ย 52 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติดำเนินการจนถึงวันที่คู่สัญญาใช้เวลา 15 วัน นับจากวันสั่งจ้างจนถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้เวลา 24 วัน และใช้ระยะเวลาในการรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน ตรวจเอกสารถึงวันตั้งหนี้ 13 วัน

4.6 งานจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต วิธีตกลงราคา ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการตลอดทั้งกระบวนการโดยเฉลี่ย 69 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติดำเนินการจนถึงวันที่คู่สัญญาใช้เวลา 16 วัน นับจากวันสั่งจ้างจนถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้เวลา 34 วัน และใช้ระยะเวลาในการรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน ตรวจเอกสารถึงวันตั้งหนี้ 19 วัน

4.7 งานจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต วิธีสอบราคา ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการตลอดทั้งกระบวนการโดยเฉลี่ย 132 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติดำเนินการจนถึงวันที่คู่สัญญาใช้เวลา 39 วัน นับจากวันสั่งจ้างจนถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้เวลา 64 วัน และใช้ระยะเวลาในการรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน ตรวจเอกสารถึงวันตั้งหนี้ 29 วัน

4.8 งานจัดซื้อพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการตลอดทั้งกระบวนการโดยเฉลี่ย 59 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่รับอนุมัติดำเนินการจนถึงวันที่คู่สัญญาใช้เวลา 18 วัน นับจากวันสั่งจ้างจนถึง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้เวลา 23 วัน และใช้ระยะเวลาในการรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน ตรวจเอกสารถึงวันตั้งหนี้ 18 วัน

4.9 งานจัดซื้อพัสดุ วิธีตกลงราคา ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการตลอดทั้งกระบวนการโดยเฉลี่ย 53 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่รับอนุมัติดำเนินการจนถึงวันที่คู่สัญญาใช้เวลา 21 วัน นับจากวันสั่งจ้างจนถึง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้เวลา 21 วัน และใช้ระยะเวลาในการรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน ตรวจเอกสารถึงวันตั้งหนี้ 11 วัน

5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ กฟอ.แม่สาย สำหรับเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 ในแต่ละขั้นตอน พบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ดังนี้

5.1 การจัดส่งพัสดุ

ปัญหาและอุปสรรค

ในการจัดซื้อ 2 ไตรมาสที่ผ่านมา มีการจัดซื้อพัสดุที่มีการจัดส่งล่าช้ากว่ากำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ และได้คิดค่าปรับจากผู้ขาย จำนวน 2 โครงการ จากผู้ขาย 2 ราย ได้แก่

1) บริษัท ท็อปแลนด์ คอนกรีต จำกัด จากใบสั่งซื้อเลขที่ 3001317362 มีการส่งของเกินกำหนดจำนวน 18 วัน ได้คิดค่าปรับเป็นเงิน 13,328.92 บาท

2) บริษัท เอเอ อีเลคทริค จำกัด จากใบสั่งซื้อเลขที่ 3001335320 มีการส่งของเกินกำหนดจำนวน 13 วัน คิดค่าปรับเป็นเงิน 3,644.42 บาท

ข้อเสนอแนะ

ควรจัดเก็บข้อมูลการส่งของ ของแต่ละบริษัท หากมีการส่งของล่าช้าเกิน 3 ครั้ง ให้มีผลต่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ขาย

การปรับปรุงแก้ไข

ให้ ผบห. ทำเก็บข้อมูลการส่งของล่าช้าทุกไตรมาส เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาซื้อครั้งต่อไป
