

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๒

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๗ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

ตามที่ได้ยื่นยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

เกี่ยวกับเรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท และเรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังได้เสนอเรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งกระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน สำนักงานประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามบัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ว่า

๑. รับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพิพัตได้พิจารณาแล้วในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

๒. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐนำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาทดังกล่าวไปถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

๓. ให้กระทรวงมหาดไทยประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขอความร่วมมือให้นำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวไปใช้ในการจัดจ้างก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย โดยอนุมัติ
ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไปต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

อำพน กิตติอำพน

(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๒ (นันทน์ภัส) ๔๔๔ (ชัยพล)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th ๒๒ ๖๖ ๖๖

บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน
อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๒/๑๕๑๘๓ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุด ที่ คค (ปคร) ๐๒๐๒/๓๕๙ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙
๓. สำเนาหนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๐๖/๔๖๙๑๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
๔. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๓๑.๑/๗๓๙ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙
๕. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๔/๕๑๙๕
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
๖. สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ คสช (คตร)/๙๑๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ ๑๖๑๘๓



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๓/ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอ เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับการบริหารราชการ (กระทรวงการคลัง) ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือสรุปได้ ดังนี้

๑.๑.๑ เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างเท่านั้น

๑.๑.๒ การขยายระยะเวลา

(๑) ผู้ประกอบการก่อสร้างที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาขยายระยะเวลา ก่อสร้าง ต้องเป็นคู่สัญญาที่ได้ลงนามทำสัญญาจ้างก่อสร้างกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยบังคับใช้กับสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ลงนามไว้กับหน่วยงาน ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ หรือสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ลงนามไว้กับหน่วยงาน ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งสัญญาดังกล่าว ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และยังมิได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือสัญญาดังกล่าวยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ แต่ได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายในช่วงระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ยกเว้นสัญญาที่หน่วยงานได้พิจารณา ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ แล้วว่า จะบอกเลิกสัญญาเนื่องจากคู่สัญญาปฏิบัติผิดสัญญา กรณีดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีนี้

(๒) สัญญาจ้างก่อสร้างที่อยู่ในเกณฑ์ตามข้อ (๑) ให้หน่วยงานขยายระยะเวลาออกไปอีกจำนวน ๑๕๐ วัน ในกรณีอายุสัญญาจ้างก่อสร้างน้อยกว่า ๑๕๐ วัน ก็ให้ขยายระยะเวลาได้เท่ากับอายุสัญญาเดิม

/(๓) ...

(๓) สัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้รับการขยายระยะเวลาออกไปตามข้อ (๒) ให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

(๓.๑) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างได้ดำเนินการล่วงหน้าแล้วเสร็จตามสัญญา และได้ถูกปรับไว้ในช่วงก่อนหน้าวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ยังคงเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการที่ต้องรับผิดชอบในส่วนของการปรับในช่วงก่อนหน้าที่จะได้รับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี แต่จะได้รับการลดหรือลดค่าปรับเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการนี้เท่านั้น

(๓.๒) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างที่ยังอยู่ภายในระยะเวลาตามสัญญาให้ขยายระยะเวลา โดยนับถดถอยวันสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาเดิม

(๔) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างที่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี หากขยายระยะเวลาออกไป มีผลทำให้ผู้รับจ้างไม่ถูกปรับ ก็ให้คง ลดค่าปรับ หรือคืนเงินค่าปรับตามความเป็นจริง แล้วแต่กรณี

๑.๑.๓. การพิจารณาไม่ลงโทษให้เป็นผู้ทำงาน

หากในกรณีที่หน่วยงานได้มีการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างไปแล้วสืบเนื่องจากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ซึ่งได้บอกเลิกสัญญาในช่วงระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ให้ถือว่าไม่เป็นผู้ทำงาน

๑.๒ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือสรุปได้ ดังนี้

๑.๒.๑ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งใช้กับสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นมาแล้วเท่านั้น

๑.๒.๒ เป็นการให้ความช่วยเหลือสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือไปแล้ว แต่ยังไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา ซึ่งหากสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับถดถอยจากระยะเวลาที่ได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ไปแล้ว ให้หน่วยงานพิจารณาเพิ่มระยะเวลาในการดำเนินงานออกไปอีกเท่ากับระยะเวลาส่งมอบงานงวดสุดท้าย โดยนับถดถอยวันครบกำหนดตามที่ได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ไปจนถึงวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย ทั้งนี้ ไม่เกินจำนวน ๑๕๐ วัน ยกเว้นสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายหลัง ๑๕๐ วัน นับถดถอยจากระยะเวลาที่ได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นไปแล้ว สัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวจะไม่ได้ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในครั้งนี้

๑.๒.๓ กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แล้ว ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในครั้งนี้ หากสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาตามที่ได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินงานที่เหลืออยู่มากกว่าจำนวน ๑๕๐ วัน นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติในครั้งนี้ สัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวจะไม่ได้ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในครั้งนี้

๑.๒.๔ กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติม หากการเพิ่มระยะเวลาดำเนินงานออกไปแล้ว มีผลทำให้ผู้รับจ้างไม่ถูกปรับ ก็ให้คงค่าปรับ หรือคืนเงินค่าปรับตามความเป็นจริงแล้วแต่กรณี

๑.๒.๕ การพิจารณาไม่ลงโทษเป็นผู้ทำงาน (เพิ่มเติม)

หากกรณีที่หน่วยงานได้มีการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างไปแล้ว สืบเนื่องจากผู้รับจ้างก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ซึ่งได้บอกเลิกสัญญาในช่วงระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ จนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้ถือว่าไม่เป็นผู้ทำงาน

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ได้ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมถึงเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างไปยังภาคอุตสาหกรรมอื่น เช่น ย้ายไปแรงงานภาคอุตสาหกรรมโรงงาน ทำให้ผู้ประกอบการก่อสร้างไม่สามารถหาแรงงานมาปฏิบัติตามสัญญาจ้างได้อันเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการก่อสร้างส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่ากำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้างให้สามารถดำเนินการตามสัญญาต่อไปได้

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เนื่องจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ได้ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน แม้ที่ผ่านมาผู้ประกอบการก่อสร้างจะได้รับการช่วยเหลือมาแล้วในบางส่วน แต่เหตุดังกล่าวยังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อเป็นการ บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้าง และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการก่อสร้างเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการที่จะได้ใช้ประโยชน์จากงานก่อสร้างต่อไป

๔. สาระสำคัญของเรื่อง

๔.๑ กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง ได้มีหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ทบทวนการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท และขอให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม เนื่องจากผลกระทบจากเหตุดังกล่าว ยังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ โดยประเด็นที่ขอให้พิจารณาช่วยเหลือสรุปได้ ดังนี้

๔.๑.๑ ขอให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจกตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยขอให้คงหรือลดค่าปรับนับแต่สิ้นสุดสัญญาเดิม โดยผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจึงจะมาขอคงหรือลดค่าปรับได้จำนวน ๑๕๐ วัน

สำหรับสัญญาจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย เนื่องจากการพิจารณาให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ หากนับระยะเวลาจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบันนั้นผ่านมาเป็นระยะเวลานานกว่า ๔๐๐ วัน กลุ่มผู้ประกอบการก่อสร้างจึงขอให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่สัญญาจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานดังกล่าวเพิ่มเติมจากเดิม ที่ให้ความช่วยเหลือในการคงหรือลดค่าปรับจำนวน ๑๕๐ วัน โดยขอให้เพิ่มจำนวนระยะเวลาที่ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกจำนวนไม่เกิน ๙๐ วัน รวมเป็นระยะเวลาที่ให้ความช่วยเหลือทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน ๒๔๐ วัน โดยผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจึงจะนำมาขอคงหรือลดค่าปรับได้

๔.๑.๒ ขอให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือกรณีที่หน่วยงานคู่สัญญาได้ดำเนินการประกาศจัดจ้างและประกาศว่าผู้ประกอบการรายนั้นเป็นผู้ชนะการประมูลก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ หรือระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ แต่ได้ลงนามในสัญญาภายหลังวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ สัญญาจ้างดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือตามข้อ ๔.๑.๑

๔.๑.๓ ขอให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือสัญญาจ้างก่อสร้างที่ลงนามตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือ คือ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เนื่องจากเป็นกรณีการขาดแคลนแรงงานที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จึงขอให้พิจารณาดทหรือลดค่าปรับจำนวน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดสัญญา ซึ่งมีเงื่อนไขว่าสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจึงจะนำมาของดทหรือลดค่าปรับได้

๔.๑.๔ ขอให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือสัญญาที่มีนิติสัมพันธ์อยู่ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ และได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือยื่นคำร้องขอต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีฯ

๔.๒ กระบวนการคลี่คลาย โดยกรมบัญชีกลาง ในฐานะฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ซึ่งเป็นการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างเพิ่มเติมรวม ๔ กรณี ดังนี้

๔.๒.๑ กรณีที่ ๑ ผู้ประกอบการก่อสร้างได้รับความช่วยเหลือตามข้อ ๑.๑ มาแล้ว แต่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะได้รับความช่วยเหลือตามข้อ ๑.๒ ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดังนี้

(๑) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ซึ่งงานก่อสร้างดังกล่าวยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย เมื่อผู้ประกอบการก่อสร้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา ให้หน่วยงานพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยดทหรือลดค่าปรับให้จำนวน ๑๕๐ วัน โดยให้ผู้ประกอบการก่อสร้างยื่นคำร้องขอต่อหน่วยงานคู่สัญญาไปพร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย

(๒) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ให้หน่วยงานพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยดทหรือลดค่าปรับให้จำนวน ๑๕๐ วัน โดยให้ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือยื่นคำร้องขอต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้

๔.๒.๒ กรณีที่ ๒ ให้ความช่วยเหลือกับสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท โดยเป็นสัญญาจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานได้ดำเนินการจัดจ้างถึงขั้นตอนการเสนอราคาแล้วก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ แต่ไม่สามารถลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างได้ในช่วงระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ และได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างในช่วงระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

(๑) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ซึ่งงานก่อสร้างดังกล่าวยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ให้หน่วยงานพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยดทหรือลดค่าปรับจำนวน ๑๕๐ วัน ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ประสงค์จะขอรับ

ความช่วยเหลือให้ยื่นคำร้องขอต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ และเมื่อผู้ประกอบการก่อสร้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา ให้หน่วยงานพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยดหรือลดค่าปรับให้อีกจำนวน ๑๕๐ วัน โดยให้ผู้ประกอบการก่อสร้างยื่นคำร้องขอต่อหน่วยงานคู่สัญญาไปพร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย

(๒) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ให้หน่วยงานพิจารณาให้ความช่วยเหลือจำนวน ๓๐๐ วัน โดยให้ผู้ประกอบการก่อสร้างยื่นคำร้องขอต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้

๔.๒.๓ กรณีที่ ๓ ให้ความช่วยเหลือสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ลงนามในช่วงระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นสัญญาจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน เป็นผลทำให้สัญญาจ้างก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา โดยให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

(๑) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ซึ่งงานก่อสร้างดังกล่าวยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย เมื่อผู้ประกอบการก่อสร้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา ให้หน่วยงานพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยดหรือลดค่าปรับให้จำนวน ๑๕๐ วัน โดยให้ผู้ประกอบการก่อสร้างยื่นคำร้องขอต่อหน่วยงานคู่สัญญาไปพร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย

(๒) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ให้หน่วยงานพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยดหรือลดค่าปรับให้จำนวน ๑๕๐ วัน โดยให้ผู้ประกอบการก่อสร้างยื่นคำร้องขอต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้

๔.๒.๔ กรณีที่ ๔ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ซึ่งไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑.๒ เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา และถูกพิจารณาลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน ซึ่งกระทรวงการคลังได้แจ้งเวียนข้อให้ส่วนราชการทราบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๔๕ ทวิ แล้ว ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเสนอรายชื่อผู้ทิ้งงานไปยังผู้รักษาการตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเพิกถอนคำสั่งลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน

๕. ประเด็นปัญหาที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

เนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมใช้บังคับกับส่วนราชการ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ นำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นำไปถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน และเห็นควรมอบให้กระทรวงมหาดไทยนำมาตรการนี้ไปใช้บังคับในการจัดจ้างก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย โดยอนุโลม

๖. ความเห็นชอบหรือการอนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีองค์ประกอบของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ซึ่งเป็นผู้แทนมาจากหน่วยงานต่างๆ

/ทั้ง...

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้พิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างเพิ่มเติมร่วมกันในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔


๗. ข้อเสนอของส่วนราชการ

๗.๑ รับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพิสดารได้พิจารณาแล้วในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

๗.๒ เห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐนำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพิสดารได้พิจารณาแล้ว ไปถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยนำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวไปใช้บังคับในการจัดจ้างก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย โดยอนุโลม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

กองการพัสดุภาครัฐ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕-๖

ด่วนที่สุด

ที่ คค (ปคร) ๐๒๐๒/ ๗๕๕



กระทรวงพาณิชย์

ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๕ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง ความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอื่นเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ก) ๓๐๒๖๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงพาณิชย์เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอื่นเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาทเพิ่มเติมจากมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งกระทรวงการคลังได้เสนอมา นั้น

กระทรวงพาณิชย์พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอื่นเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานปลัดกระทรวง

กองการเจ้าหน้าที่

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๓๐๐๔

โทรสาร. ๐ ๒๒๘๑ ๑๔๖๐

ด่วนที่สุด
ที่ รง ๐๒๐๖/๕๖๓/๑๖



กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน
อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๐๒๖๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า กระทรวงการคลัง ได้เสนอเรื่อง
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน
อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และขอให้กระทรวงแรงงานพิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นั้น

กระทรวงแรงงานพิจารณาแล้วเห็นว่า มาตรการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรอง
จากคณะกรรมการว่าด้วยการพิสดารระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิสด พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ซึ่งมีองค์ประกอบมาจากผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรให้
ความเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

N. ๑/๕

(ศิริชัย ดิษฐกุล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

สำนักงานปลัดกระทรวง

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๒ ๑๒๘๗

โทรสาร ๐ ๒๒๔๘ ๒๐๒๖

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๓๑.๑/๗๓๙

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๕ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน
อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๐๒๖๒
ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการคลังเสนอ เรื่อง การพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับ
ค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า กระทรวงการคลังได้เสนอการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการก่อสร้างของหน่วยงานของภาครัฐในภาพรวมที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน
อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
เพิ่มเติมรวม ๔ กรณี ได้แก่

(๑) กรณีผู้ประกอบการก่อสร้างได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มาแล้ว แต่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้พิจารณาได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยดหรือลดค่าปรับจำนวน
๑๕๐ วัน ทั้งนี้ กรณียังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ให้ผู้ประกอบการก่อสร้างดังกล่าวยื่นคำร้องขอต่อ
หน่วยงานคู่สัญญาไปพร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว ให้ยื่นคำร้องขอต่อ
หน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้

(๒) กรณีจัดจ้างถึงขั้นตอนการเสนอราคาแล้วก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ แต่ไม่สามารถลงนาม
ในสัญญาจ้างก่อสร้างได้ในช่วงระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ และได้ลงนาม
ในสัญญาจ้างก่อสร้างในช่วงระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แล้วนั้น
กรณียังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ให้พิจารณาได้รับความช่วยเหลือโดยดหรือลดค่าปรับจำนวน ๑๕๐ วัน
โดยให้ผู้ประกอบการก่อสร้างดังกล่าวยื่นคำร้องขอต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่

/คณะรัฐมนตรี...

คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี และเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา ให้พิจารณาได้รับความช่วยเหลือโดยงดหรือลดค่าปรับให้อีกจำนวน ๑๕๐ วัน โดยให้ผู้ประกอบการก่อสร้างยื่นคำร้องขอต่อหน่วยงานคู่สัญญาไปพร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย กรณีผู้ประกอบการก่อสร้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว ให้พิจารณาได้รับความช่วยเหลือโดยงดหรือลดค่าปรับจำนวน ๓๐๐ วัน โดยให้ผู้ประกอบการก่อสร้างดังกล่าวยื่นคำร้องขอต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้


(๓) กรณีมีการลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างในช่วงระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แต่ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ให้พิจารณาได้รับความช่วยเหลือโดยงดหรือลดค่าปรับจำนวน ๑๕๐ วัน ทั้งนี้ กรณียังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ให้ผู้ประกอบการก่อสร้างดังกล่าวยื่นคำร้องขอต่อหน่วยงานคู่สัญญาไปพร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว ให้ยื่นคำร้องขอต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้

(๔) กรณีผู้ประกอบการก่อสร้างไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา และได้รับการพิจารณาลงโทษให้เป็นผู้ทำงาน ให้พิจารณาได้รับความช่วยเหลือ โดยให้คณะกรรมการว่าด้วยการพิศุพิกถอนคำสั่งลงโทษเป็นผู้ทำงานดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้างและเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการก่อสร้างเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา อันเป็นประโยชน์ต่อทางราชการที่จะได้ใช้งานก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณต่อไป จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะรับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาให้ความช่วยเหลือฯ ดังกล่าว รวมทั้งเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม นำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาให้ความช่วยเหลือฯ เพิ่มเติม ไปถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อความเป็นธรรมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างภาครัฐในภาพรวม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองมาตรฐานงบประมาณ ๑

โทร. ๐ ๒๖๖๕ ๒๐๑๔

โทรสาร ๐ ๒๖๗๓ ๙๒๔๐

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๑๑๐๔/ ๕๖๙๘



สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๔๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน
อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๐๒๖๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน
อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้วขอเสนอความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรรับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐
บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพิสดารพิจารณาแล้วในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ เนื่องจากการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็กให้สามารถ
ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาต่อไปได้ และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนในภาคเอกชนเพิ่มขึ้น

๒. เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
นำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการ
ขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพิสดารพิจารณาแล้ว
ไปถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยนำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวไปใช้
บังคับในการจัดจ้างก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย โดยอนุโลม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการก่อสร้างที่มีนิติสัมพันธ์
กับหน่วยงานภาครัฐในภาพรวม

๓. อย่างไรก็ดี เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้เกิดการขยายธุรกิจและการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งในและต่างประเทศ ประเทศไทยควรใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีบริการขยายตลาดการลงทุนไปยังประเทศต่างๆ ที่ไทยทำข้อเจรจาทกลงการค้าเสรี โดยมอบหมายให้สถาบันก่อสร้างแห่งประเทศไทยบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสมาคมวิชาชีพต่างๆ กำหนดแนวทางการพัฒนาแรงงานทั้งระดับบนและล่างให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านภาษาและมีมือแรงงานให้ได้ตามมาตรฐาน พัฒนาศักยภาพความสามารถผู้ประกอบการให้เข้มแข็งขึ้น และพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้างที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุง แก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาธุรกิจก่อสร้างไทย ซึ่งจะช่วยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีสากล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรเมธี วิมลศิริ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๕๖๐๗

โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๑๘๒๑-๒

Email: Suriyon@nesdb.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/๙๑๐



คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๕ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน
อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๐๒๖๒
ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

๑. ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการคลัง เสนอเรื่องการพิจารณาให้
ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน
รายละเอียดตามอ้างถึง สรุปได้ดังนี้

๑.๑ รับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้าง
ขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้พิจารณาแล้ว ในการประชุมครั้งที่
๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

๑.๒ เห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐนำ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับ
ผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติม
จากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้พิจารณาแล้ว ไปถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน และมอบหมาย
ให้กระทรวงมหาดไทยนำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวไปใช้บังคับในการจัดจ้างก่อสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

/๒. คณะกรรมการ...

๒. คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ต่อภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน ซึ่ง ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้ผู้ประกอบการก่อสร้างไม่สามารถหาแรงงานมาปฏิบัติตามสัญญาจ้างได้ จึงสมควรสนับสนุน ทั้งนี้ การดำเนินการทุกขั้นตอน จะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(ชาติอุดม ทิตตะสิริ)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐๒๒๘๐ ๖๖๔๐

สรุป มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน
อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท


การให้ความช่วยเหลือ	เงื่อนไข	ความช่วยเหลือที่ได้รับ
1. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 56 (แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 208 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556)	เป็นสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการ ขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ซึ่งเป็นสัญญาที่มีนิติสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 56 - 22 เม.ย. 56	1. ขยายระยะเวลา หรือลด หรือลดค่าปรับ จำนวน 150 วัน 2. หากหน่วยงานได้บอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบ จากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ไปแล้ว ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 56 - 22 เม.ย. 56 ให้ถือว่าไม่เป็นผู้ทำงาน
2. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2557 (แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 141 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557)	ต้องเป็นสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้รับความช่วยเหลือตามข้อ 1. (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 56) มาแล้ว เท่านั้น	1. หากส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 56 จะได้งด หรือลดค่าปรับตามระยะเวลาที่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย (หากส่งมอบงานงวดสุดท้ายเกิน 150 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ ความช่วยเหลือตาม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 56 หรือ หากเป็นสัญญาที่มีระยะเวลาดำเนินงานเหลืออยู่มากกว่า 150 วัน นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติครั้งนี้ คือ 25 พ.ย. 56 สัญญาดังกล่าว จะไม่ได้ได้รับความช่วยเหลือ) 2. หากหน่วยงานได้บอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบ จากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ไปแล้ว ในช่วงระหว่างวันที่ 23 เม.ย. 56 วันที่ ครม. มีมติ (25 พฤศจิกายน 2556) ให้ถือว่าไม่เป็นผู้ทำงาน

การให้ความช่วยเหลือ	เงื่อนไข	ความช่วยเหลือที่ได้รับ
3. การให้ความช่วยเหลือที่เสนอครั้งนี้ 3.1 กรณีที่ 1	เป็นสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้รับความช่วยเหลือตามข้อ 1. (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 56) มาแล้ว แต่สัญญาดังกล่าวไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับความช่วยเหลือตามข้อ 2. (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 57) เนื่องจากส่งงานงวดสุดท้ายเกิน 150 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 56 หรือเป็นสัญญาที่มีระยะเวลาดำเนินงานเหลืออยู่มากกว่า 150 วัน นับจากวันที่ คณะรัฐมนตรีมีมติ (25 พ.ย. 56))	1. กรณีสัญญาที่ยังไม่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ณ วันที่ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือครั้งนี้ เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ได้รับความช่วยเหลือโดยการงดหรือลดค่าปรับ จำนวน 150 วัน โดยให้ผู้ประกอบการยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือต่อหน่วยงานคู่สัญญาพร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย 2. กรณีสัญญาที่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว ก่อนวันที่ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ให้ได้รับความช่วยเหลือโดยการงดหรือลดค่าปรับ จำนวน 150 วัน โดยให้ผู้ประกอบการยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีครั้งนี้ให้ความช่วยเหลือ
3.2 กรณีที่ 2	เป็นสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ที่หน่วยงานได้ดำเนินการจัดจ้างถึงขั้นตอนที่หน่วยงานรู้ตัวผู้รับจ้างที่จะลงนามเป็นคู่สัญญาแล้ว ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 56 แต่ได้ลงนามในสัญญาในช่วงระหว่างวันที่ 23 เม.ย. 56 – 25 พ.ย. 56 (สัญญาดังกล่าวยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ ตามข้อ 1. (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 56) และข้อ 2. (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 57) เนื่องจากไม่ได้ลงนามในสัญญาในช่วงระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 56 – 22 เม.ย. 56)	1. กรณีสัญญาที่ยังไม่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ณ วันที่ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือครั้งนี้ ให้ได้รับความช่วยเหลือโดยการงดหรือลดค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 56 จำนวน 150 วัน และเมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ส่วนราชการให้ความช่วยเหลือโดยการงดหรือลดค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรีครั้งนี้อีกจำนวน 150 วัน โดยให้ผู้ประกอบการยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือต่อหน่วยงานคู่สัญญาพร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย รวมทั้งสิ้นได้รับความช่วยเหลือจำนวน 300 วัน 2. กรณีสัญญาที่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว ก่อนวันที่ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ให้ได้รับความช่วยเหลือโดยการงดหรือลดค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 56 จำนวน 150 วัน และตามมติคณะรัฐมนตรีครั้งใหม่นี้ อีกจำนวน 150 วัน รวมทั้งสิ้นได้รับความช่วยเหลือจำนวน 300 วัน

การให้ความช่วยเหลือ	เงื่อนไข	ความช่วยเหลือที่ได้รับ
3.3 กรณีที่ 3	เป็นสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากภาครัฐได้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท แล้ว ซึ่งเป็นสัญญาที่ได้ลงนามกับภาครัฐ ในช่วงระหว่างวันที่ 23 เม.ย. 56 – 25 พ.ย. 56 (สัญญาดังกล่าวยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือตามข้อ 1. และ ข้อ 2. จากภาครัฐ)	1. กรณีสัญญาที่ยังไม่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ณ วันที่ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือครั้งนี้ เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ส่วนราชการให้ความช่วยเหลือโดยการงดหรือลดค่าปรับ จำนวน 150 วัน โดยให้ผู้ประกอบการยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือ ต่อหน่วยงานคู่สัญญาพร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย 2. กรณีสัญญาที่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว ก่อนวันที่ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ให้ได้รับความช่วยเหลือ โดยการงดหรือลดค่าปรับ จำนวน 150 วัน โดยให้ผู้ประกอบการ ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ คณะรัฐมนตรีครั้งนี้ให้ความช่วยเหลือ
3.4 กรณีการพิจารณาไม่ลงโทษเป็นผู้ทำงาน	เป็นกรณีผู้ประกอบการก่อสร้างที่ถูกลงโทษให้เป็นผู้ทำงาน เนื่องจากไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 57 เนื่องจากส่งงานเกิน 150 วัน หรือระยะเวลาดำเนินงานตาม สัญญาเหลือมากกว่า 150 วัน นับแต่วันที่ได้รับความช่วยเหลือ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 56	ให้ถือว่าไม่เป็นผู้ทำงาน โดยให้ กวพ. เสนอรายชื่อผู้ทำงานไปยัง ผู้รักษาการตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเพิกถอนคำสั่งลงโทษเป็นผู้ทำงาน

๑. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ว ๒๐๘) (ให้ความช่วยเหลือฯ ครั้งที่ ๑)

ช่วงระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ ครั้งที่ ๑

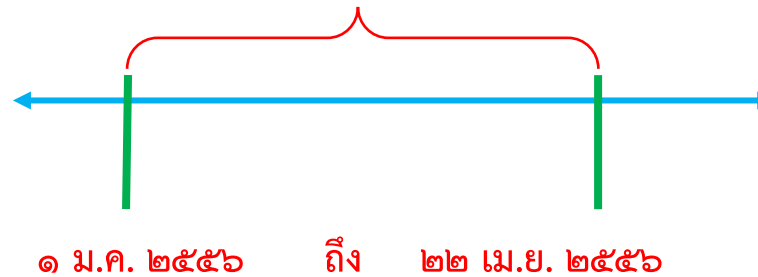

- สัญญายังมีนิติสัมพันธ์อยู่ ขยายระยะเวลาหรือลดค่าปรับ จำนวน ๑๕๐ วัน


๒. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ว ๑๐๔) (ให้ความช่วยเหลือฯ ครั้งที่ ๒)

- ขยายระยะเวลาเพิ่มเติมจาก ข้อ ๑. อีก ๑๕๐ วัน โดยมีเงื่อนไขว่างานจ้างตามสัญญาต้องแล้วเสร็จ ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับความช่วยเหลือตามข้อ ๑




๓. ข้อเสนอคณะรัฐมนตรีในครั้งนี เพิ่มเติมจากข้อ ๒ (ว ๑๔๑) มี ๔ ประเด็น ดังนี้


๓.๑ ต้องได้รับความช่วยเหลือฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ว ๒๐๘) (ครั้งที่ ๑) มาแล้ว และผู้รับจ้างต้องทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา จึงจะขอลดหรือลดค่าปรับได้ จำนวน ๑๕๐ วัน

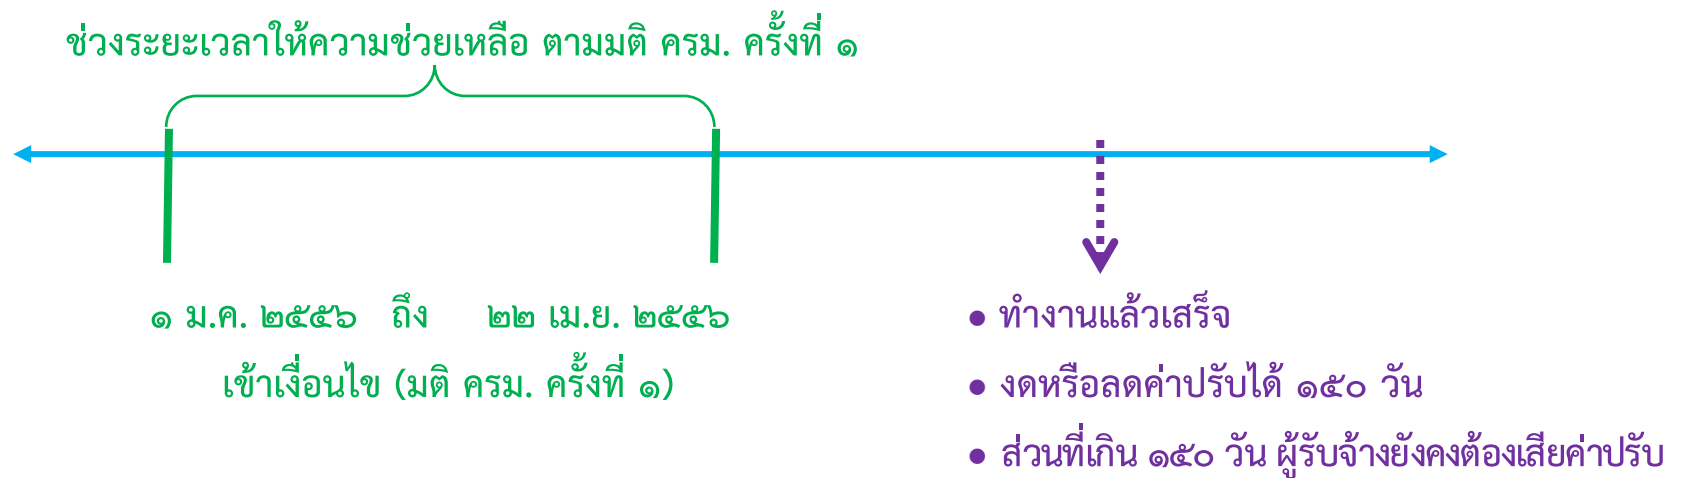

๓.๒ เป็นกรณีที่หน่วยงานได้ดำเนินการจัดจ้างจนได้ตัวผู้รับจ้างก่อนวันที่ ๑ ม.ค. ๕๖ แต่ลงนามในสัญญาในช่วงระหว่างวันที่ ๒๓ เม.ย. – ๒๕ พ.ย. ๕๖ จึงจะได้รับความช่วยเหลือฯ ตาม ข้อ ๓.๒

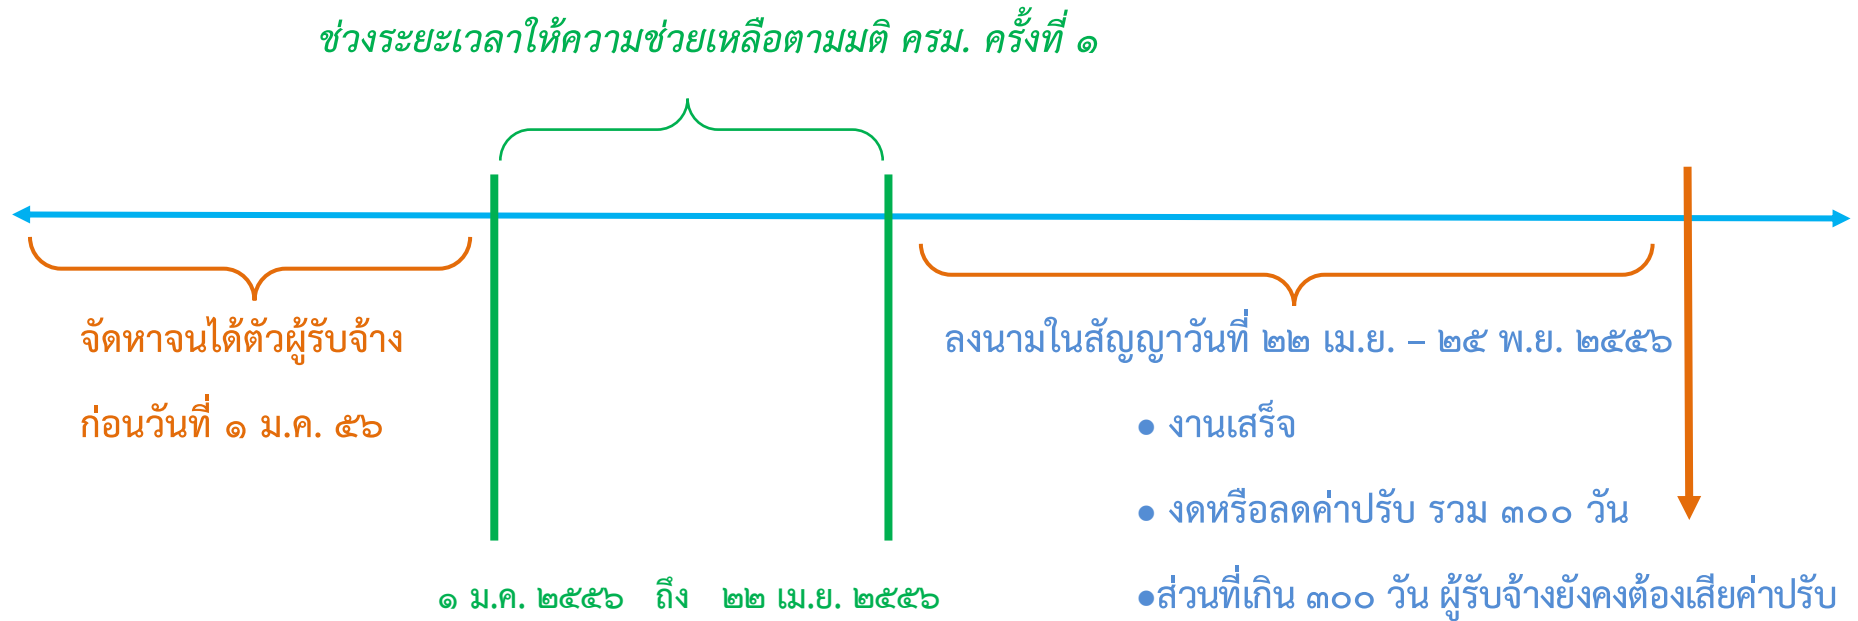

๓.๓ ให้ความช่วยเหลือฯ สัญญาจ้างก่อสร้างที่ลงนามตั้งแต่ ๒๓ เม.ย. - ๒๕ พ.ย. ๕๖ ทั้งนี้ สัญญาต้องแล้วเสร็จจึงของดหรือลดค่าปรับได้ ๑๕๐ วัน

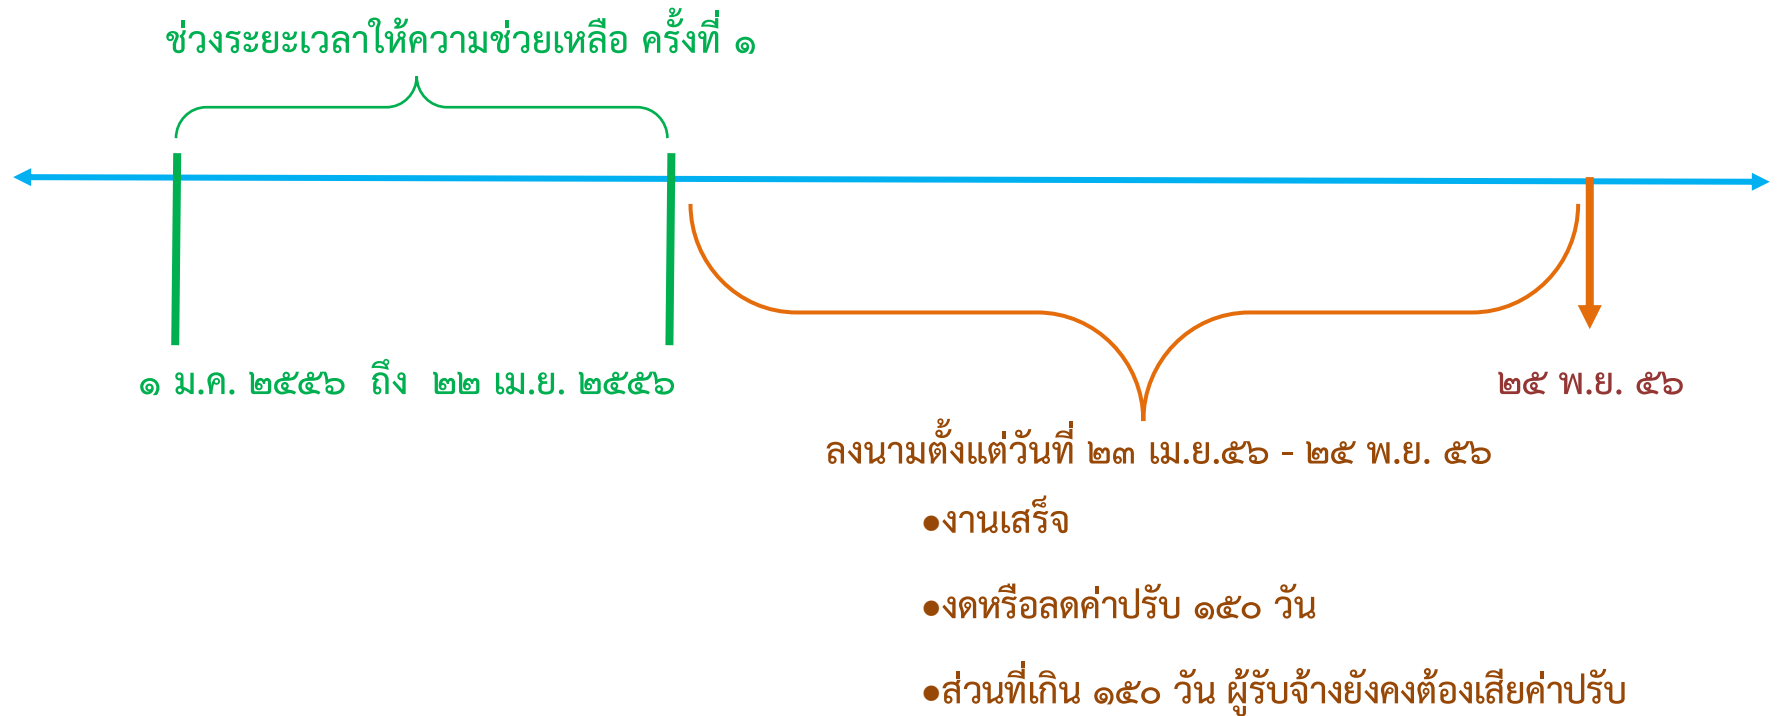

๓.๔ ผู้รับจ้างที่ถูกทิ้งงานไปแล้ว ให้พิจารณาเพิกถอนคำสั่งทิ้งงาน
